



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
CULTURA
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Evaluación enero - noviembre

Inicio de la transmisión en vivo
03 de diciembre de 2019



Orden del día

Reportes

Turnos e incidencias urbanas

Mesas de trabajo

Asuntos generales

Acuerdos

Asistencia

Transmisión en vivo



ACH

Tema	Indicador	Periodicidad	Semana al 25/11	Semana al 02/12	Próximo reporte
Tiraderos clandestinos	Metros cúbicos de residuos sólidos levantados en tiraderos clandestinos en el perímetro de ACH	Semanal	1,087 m3	1,083 m3	09 de diciembre
Limpieza	Metros cúbicos de basura recolectada en el Perímetro de la ACH (Producto de Barrido)	Semanal	2,583 m3	2,403 m3	09 de diciembre
Mantenimiento a infraestructura	Número de Incidencias de daño en infraestructura del Perímetro de la ACH reparadas y atendidas	Semanal	56	20	09 de diciembre



ACH | Eliminación de grafiti

487

m² totales

*La mayoría son reincidencias

- calles atendidas **37**
- cortinas metálicas **34**
- fachadas **75**





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

CENTRO
HISTÓRICO

Eliminación de grafiti en cantera

**Se retiraron 43 m2 de grafiti sobre cantera esta semana
En Av. 5 de Mayo**

Se han limpiado
1,400 m²

Se trabajó en
inmuebles que no
son catalogados con
gel desincrustante.



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
CULTURA Y
PATRIMONIO
HISTÓRICO

ACH | obras menores

Se realizaron trabajos en:

Regina
República de Brasil
16 de Septiembre
Tacuba

Los trabajos realizados consistieron en **demolición de piso para 5 cajetes** en Regina entre Isabel la Católica y primer Callejón de Mesones, **colocación de 7 bolardos y reparación de 7 puntos de banqueta** en República de Brasil entre República de Cuba y Belisario Domínguez, **colocación de 2 bolardos y reparación de 2 puntos de banqueta** en 16 de Septiembre y Palma, **desazolve de 15 metros de drenaje en Palacio de Minería** en Tacuba entre Callejón de la Condesa y Filomeno Mata.



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS





ACH | ene - nov


Acciones de limpieza ACH

108,879 m³

Basura recolectada por barrido en perímetro ACH

60,366 m³

Residuos sólidos levantados de tiraderos clandestinos del perímetro ACH

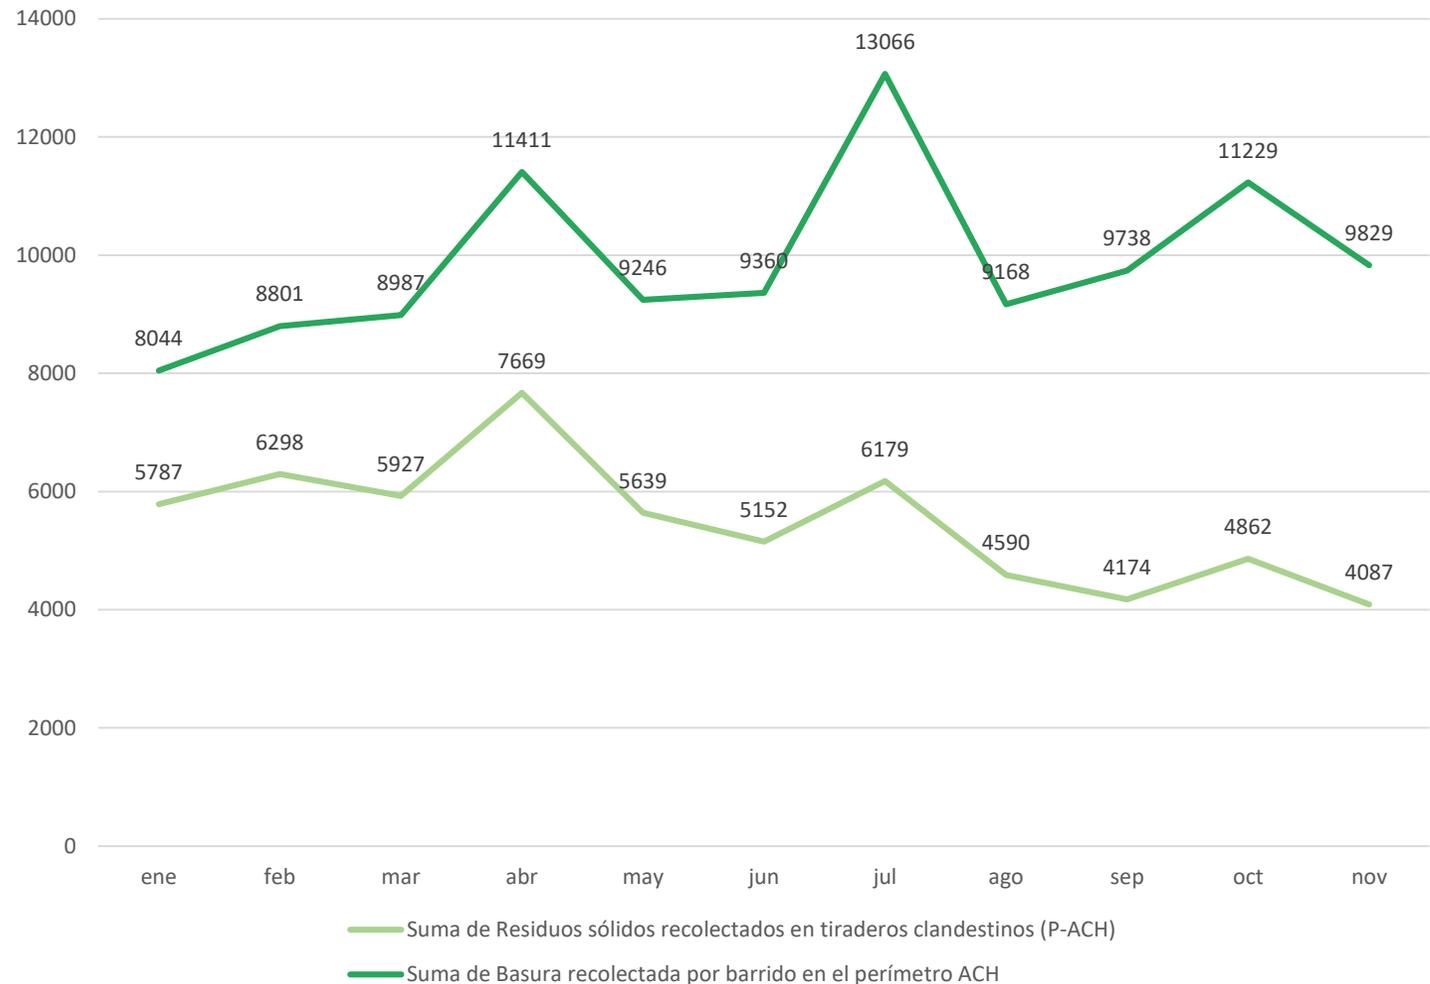




ACH | ene - dic

Incidencias atendidas

1, 273

Incidencias de daño en infraestructura del Perímetro de la ACH reparadas y atendidas*

(*) de una meta de 2,190 incidencias, representando un avance del 58%

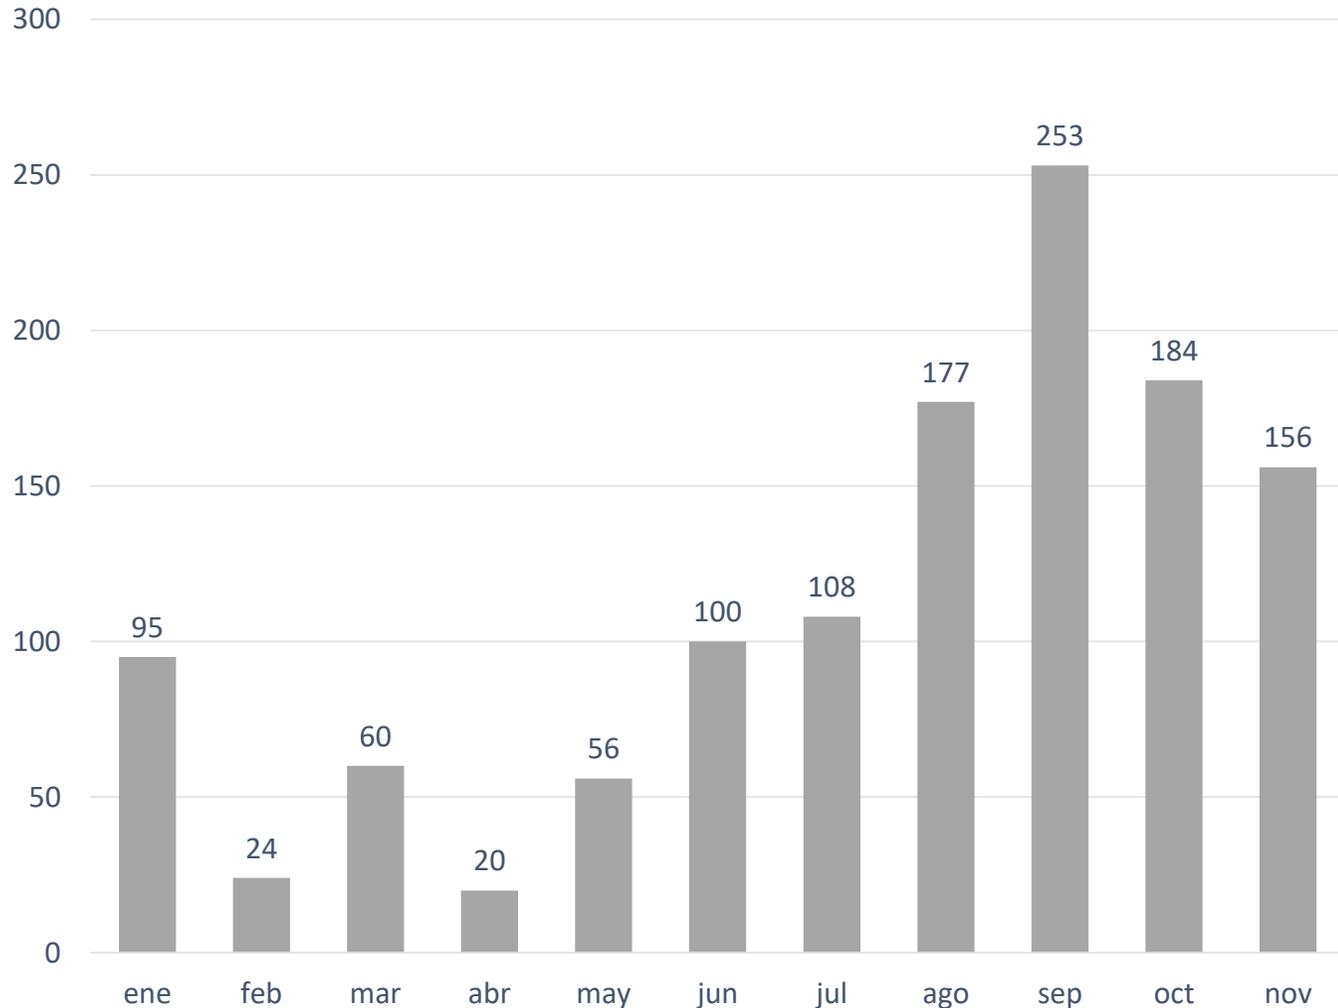



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

ACH | feb - nov


Eliminación de grafiti

27,808 m²

De cortinas limpias

13,157 m²

De fachadas limpias

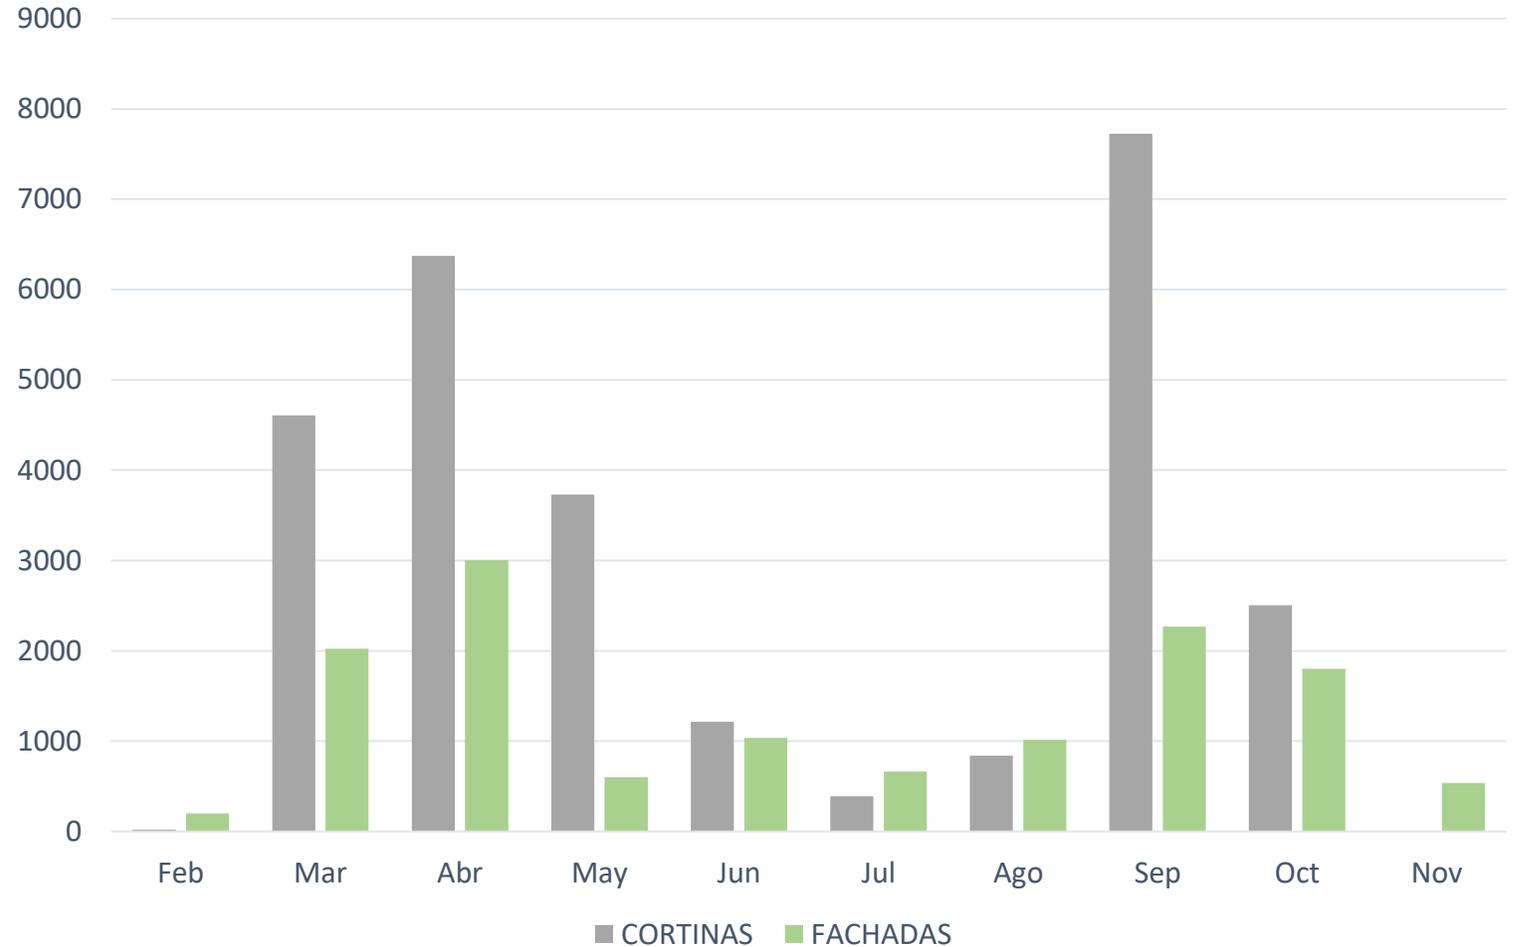



ACH | feb - dic

Eliminación de grafiti

817 m2


De antigrafiti utilizado

2,371 m2

De thinner utilizado

3,475 m2

De gel utilizado

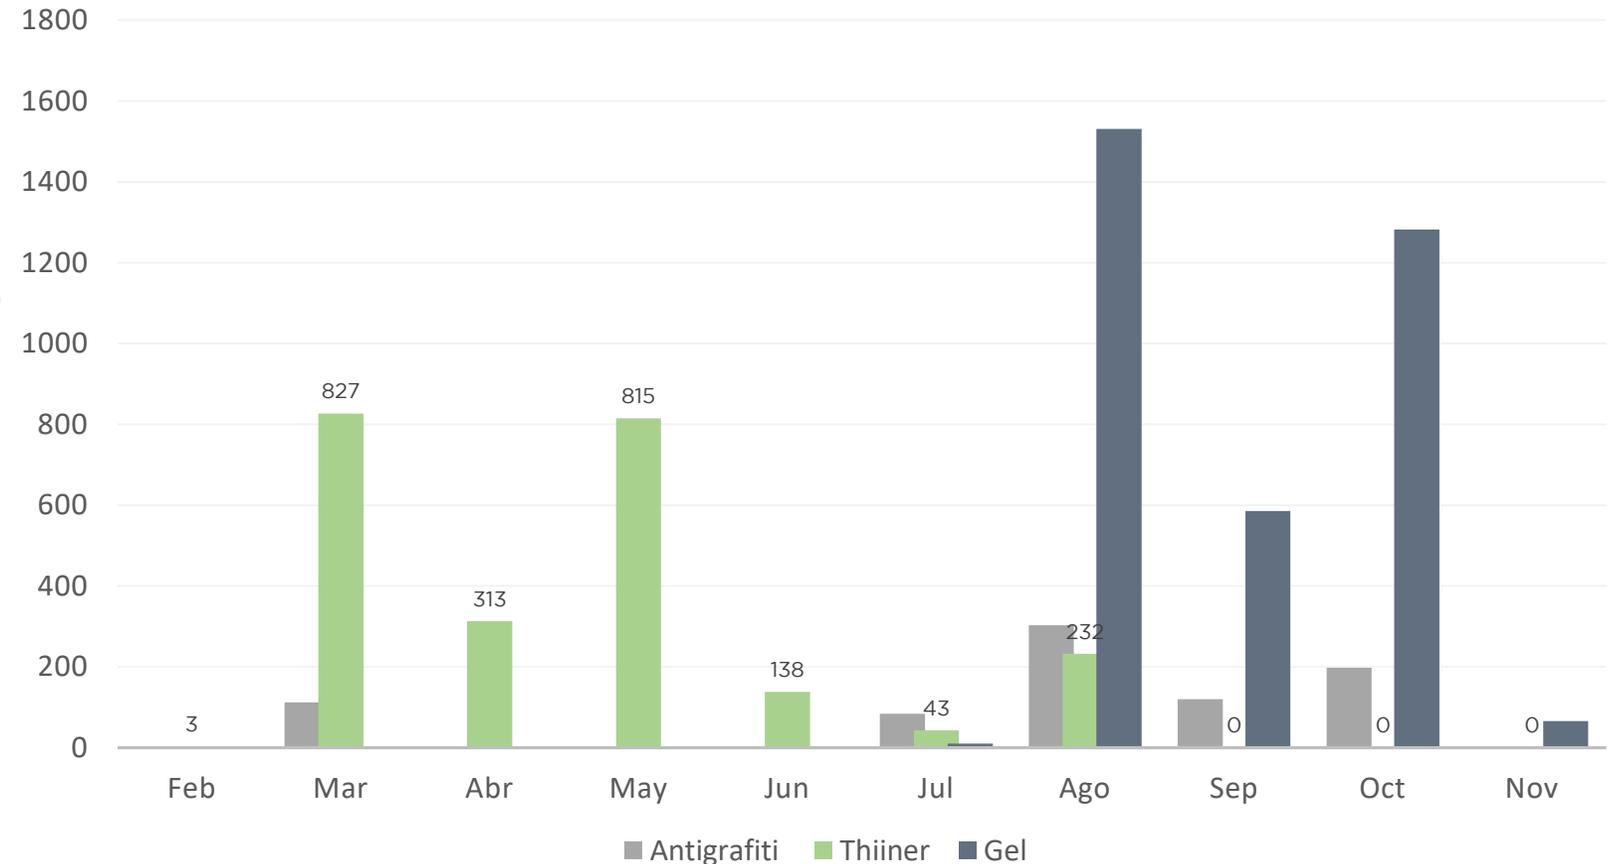




Al. Cuauhtémoc | ene - nov


3, 152

Luminarias Reparadas

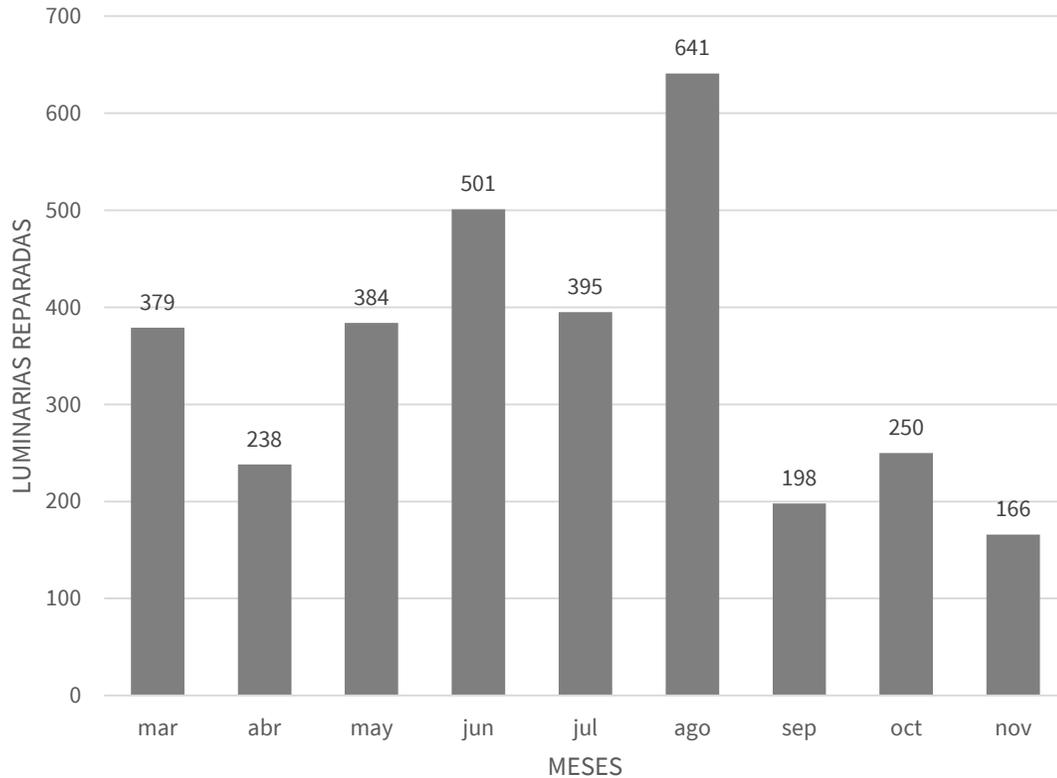

769

Sujetos Forestales Podados

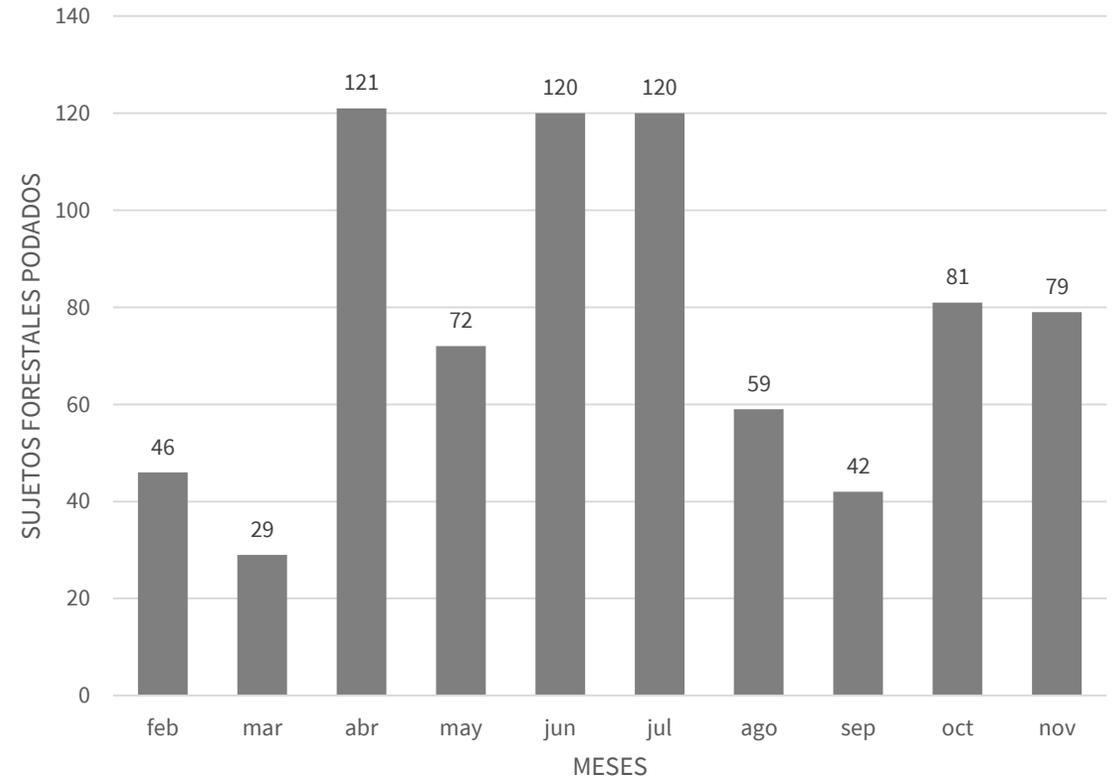




Al. Cuauhtémoc | ene - nov


5,920 m

Drenaje Desazolvado

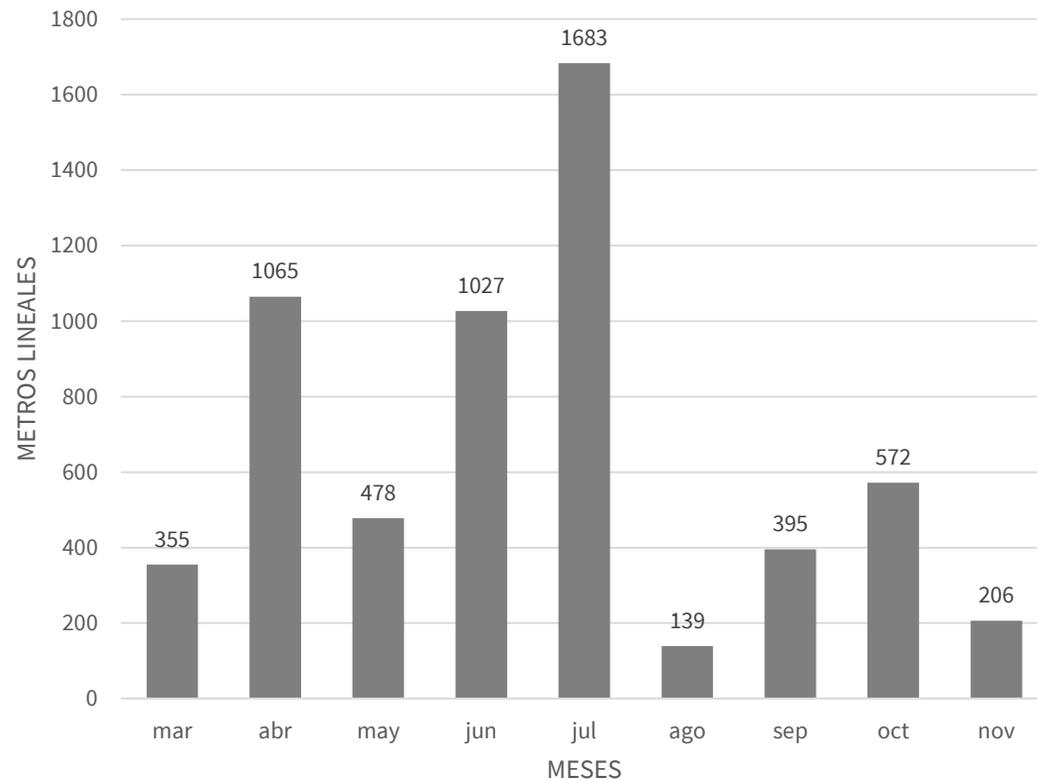

8,729 m³

Residuos Sólidos Recolectados

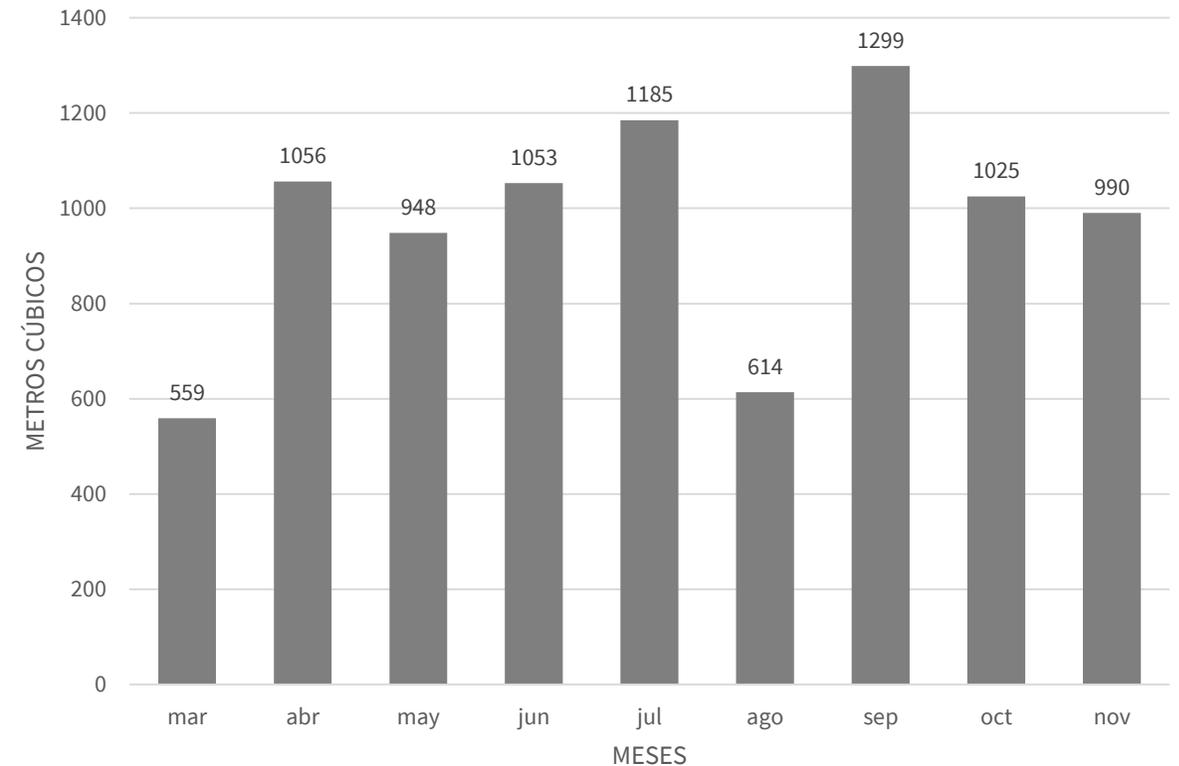



Alc. Venustiano Carranza

Tema	Indicador	Periodicidad	Semana al 26/11	Semana al 02/12	Próximo reporte	Observaciones
Luminarias	Número de Luminarias reparadas en vías secundarias	Semanal	0	4	10 de diciembre	Se detalla la ubicación y causa en el Anexo
Tiraderos clandestinos	Toneladas de residuos solidos recolectados de tiraderos clandestinos en el PB de VC (línea base: 26 tiraderos) m3	Semanal	462 m3	492.8 m3	10 de diciembre	Se recolectaron 32 toneladas diariamente de Residuos Sólidos



Alc. Venustiano Carranza

RELACION DE TIRADEROS CLANDESTINOS				
Nº. CONSECUTIVO	UBICACIÓN	TIPO DE RESIDUOS SÓLIDOS %	CANTIDAD TONS	SECTOR
01	MIGUEL DOMINGUEZ Y PENITENCIARIA COL. AMPLIACIÓN PENITENCIARIA	90% BASURA 10% CASCAJO	1.5	S-1
02	EJE 1 NORTE Y HORTELANOS COL. MORELOS	90% BASURA 10% CASCAJO	1.2	S-1
03	AV. CIRCUNVALACIÓN ENTRE HÉROES DE NACUZARI Y SAN ANTONIO TOMATLAN	85% BASURA 15% CASCAJO	0.6	S-2
04	ZAPATA ESQ. AV. CIRCUNVALACIÓN	85% BASURA 15% CASCAJO	1.6	S-2
05	NACIONAL ESQ. VIDAL ALCOCER	85% BASURA 15% CASCAJO	1.2	S-2
06	COSTA RICA ESQ. VIDAL ALCOCER	85% BASURA 15% CASCAJO	1.4	S-2
07	PEÑA Y PEÑA ESQ. VIDAL ALCOCER	85% BASURA 15% CASCAJO	1.6	S-2
08	VIDAL ALCOCER Y BERRIOZABAL COL. MORELOS	85% BASURA 15% CASCAJO	1.3	S-2
09	AV. CIRCUNVALACIÓN Y G. PEDRAZA (MERCADO DULCES I) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	1.6	S-9
10	AV. CIRCUNVALACIÓN Y CARRIZAL (MERCADO DE FLORES) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	1.3	S-9
11	AV. CIRCUNVALACIÓN Y CARRETONES (METRO MERCED) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	1	S-9
12	JUAN DE LA GRANJA Y CORREGIDORA (LAS CANCHAS) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.8	S-9
13	SANTA ESCUELA Y CUADRANTE DE LA SOLEDAD COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.5	S-9

RELACION DE TIRADEROS CLANDESTINOS				
Nº. CONSECUTIVO	UBICACIÓN	TIPO DE RESIDUOS SÓLIDOS %	CANTIDAD TONS	SECTOR
14	ROSARIO ESQ. PLAZA SAN LAZARO (ATRÁS DE LA IGLESIA) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	1.2	S-9
15	AV. CIRCUNVALACIÓN Y SOLEDAD COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	1.2	S-9
16	AV. CIRCUNVALACIÓN Y MANZANARES COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	1.6	S-9
17	JUAN PABLO ESQ. CORREGIDORA COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.5	S-9
18	CONGRESO DE LA UNIÓN ESQ. GENERAL ANAYA COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.5	S-9
19	GENERAL ANAYA ESQ. JUAN DE LA GRANJA COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.3	S-9
20	JUAN DE LA GRANJA ESQ. SAN CIPRIAN COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	1.5	S-9
21	CORREGIDORA Y SAN SIMÓN COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	1.2	S-9
22	PLAZA DE LA SOLEDAD, SAN SIMÓN Y SANTA ESCUELA COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	1.4	S-9
23	TOLVA 2 COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	1.5	S-9
24	TOLVA 3 COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	2.4	S-9
25	AV. CIRCUNVALACIÓN Y CARRETONES COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	1.5	S-9
26	JUAN DE LA GRANJA ESQ. SAN CIPRIAN COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	1.6	S-9



Alc. Venustiano Carranza


REPORTE DE LUMIARIAS REPARADAS EN EL PERÍMETRO B EN LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA					
DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		COLONIA	CANTIDAD	MOTIVO
JUAN DE LA GRANJA 74	GRAL ANAYA	CANDELARIA	CENTRO II	2	RECONEXIÓN DE LINEAS
JUAN DE LA GRANJA	CANDELARIA	GRAL. ANAYA	CENTRO II	2	RECONEXIÓN DE LINEAS
TOTAL				4	



Al. V. Carraza | ene - nov


1, 030


Luminarias Reparadas

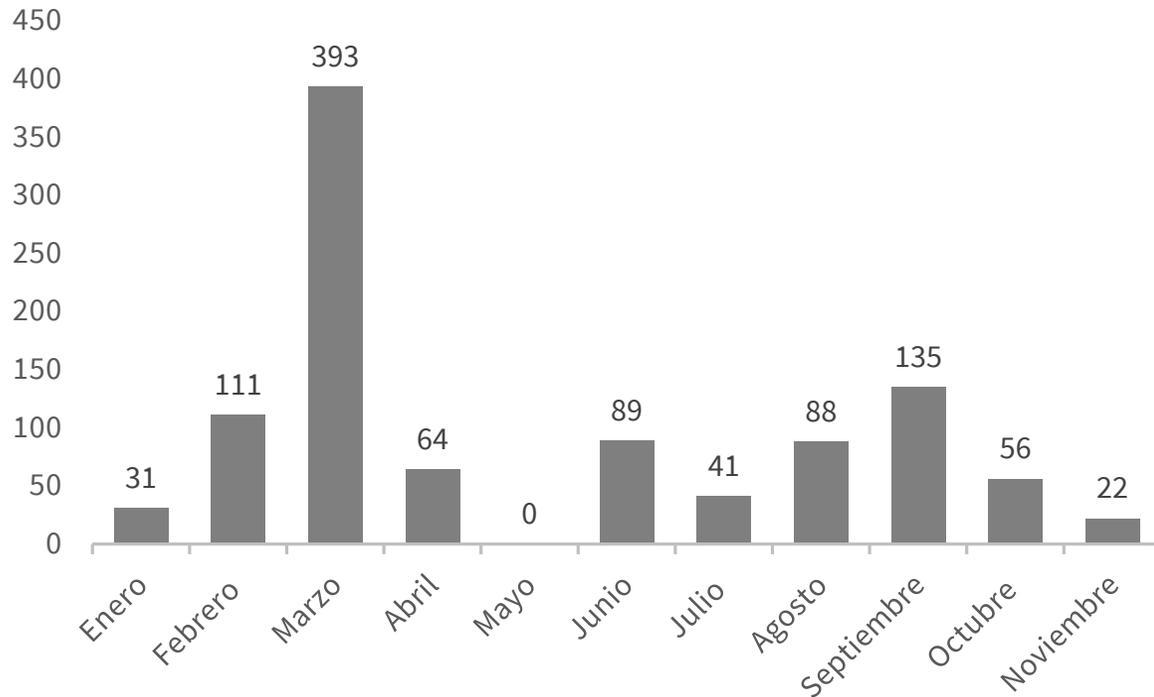

17, 736 m³

Residuos sólidos recolectados

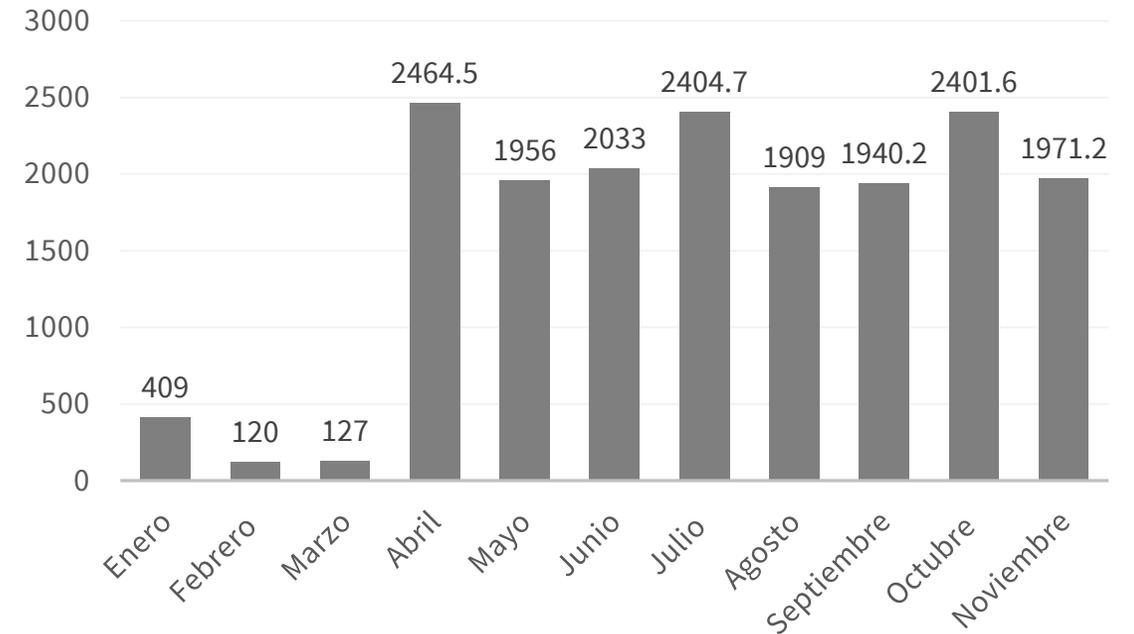

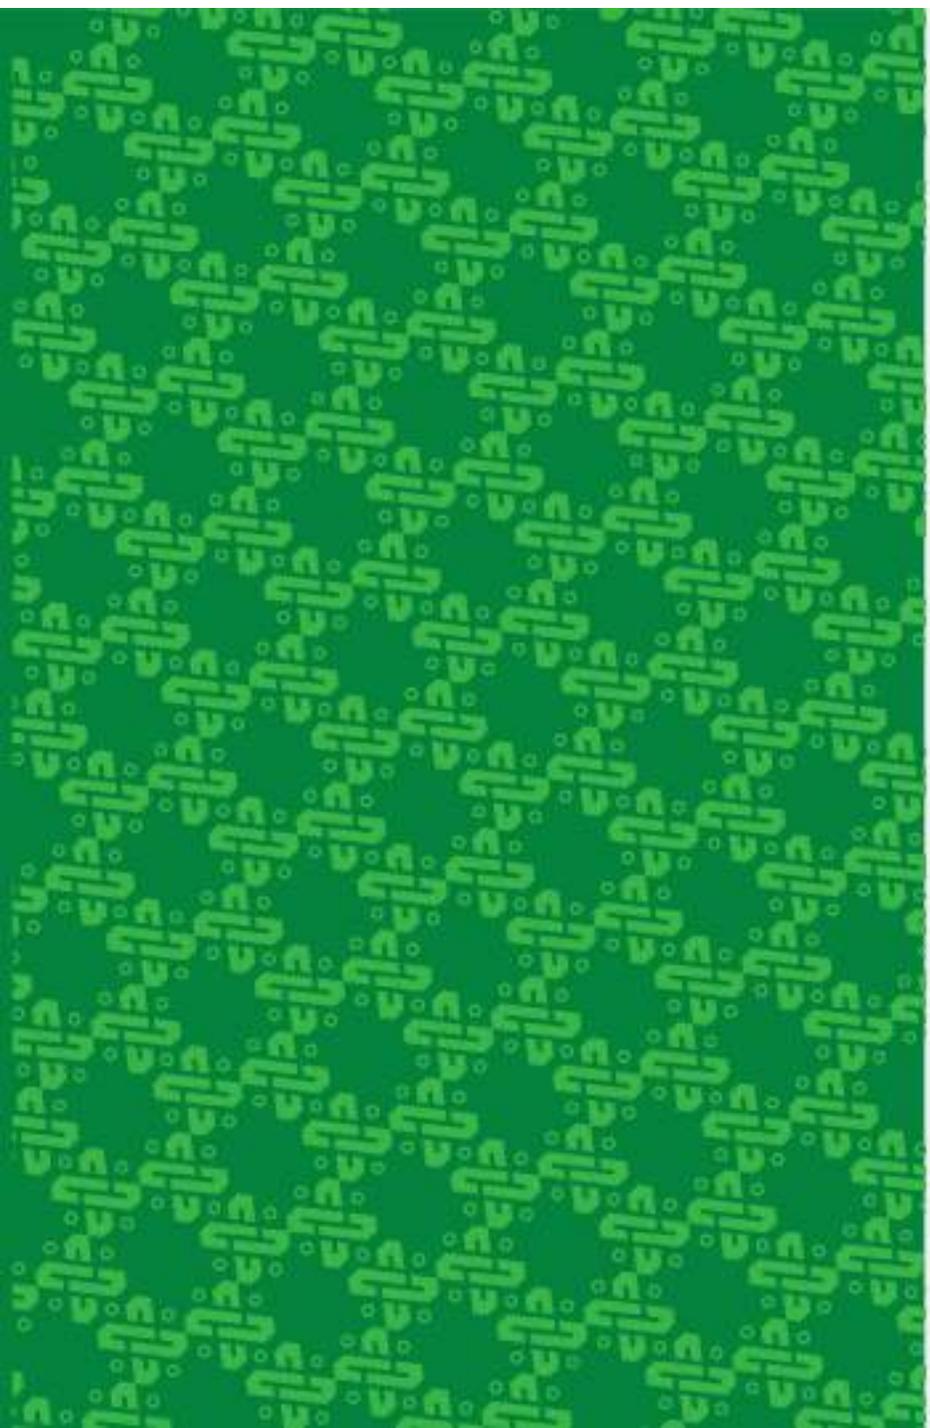

Trabajos de Intervención en Av. Hidalgo y Eje Central Lázaro Cárdenas



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



SACMEX

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



SACMEX

Tema	Indicador	Periodicidad	Semana al 26/11	Semana al 02/12	Próximo reporte
Proyectos de Intervención Urbana	Porcentaje de avance de proyectos de intervención urbana	Semanal	87.43 %	88.63 %	09 de diciembre

Sustitución de la Red de Agua Potable

Av. Hidalgo.



Red de Agua Potable
Longitud= 432 metros.
Diámetro= 6”
Material: Polietileno de alta densidad.

Tubería Existente	— — —	432.00 m.
Tubería Instalada	—	231.00 m.

Avance físico programado global: 78.54%
Avance físico real global: 65.90%

Sustitución de la Red de Drenaje

Av. Hidalgo, Eje Central y 2 de abril



Red de Drenaje
 Longitud= 688.00 metros.
 Diámetro= 0.30, 0.38m.
 Material: Polietileno corrugado de alta densidad.

Avance físico programado global: 78.54%
 Avance físico real global: 65.90%

Tubería Existente		688.00 m.
Tubería Instalada		518.00 m.
Eje Central Ø 30 = 129.94		
Av. Hidalgo Ø 30 = 188.06		
Av. Hidalgo Ø 38 = 200.00		



Sacmex | oct - dic


Porcentaje de avance de obra acumulado

88.63%

Santa María la Redonda y

La Antigua Merced

Restitución de infraestructura de agua potable y de drenaje

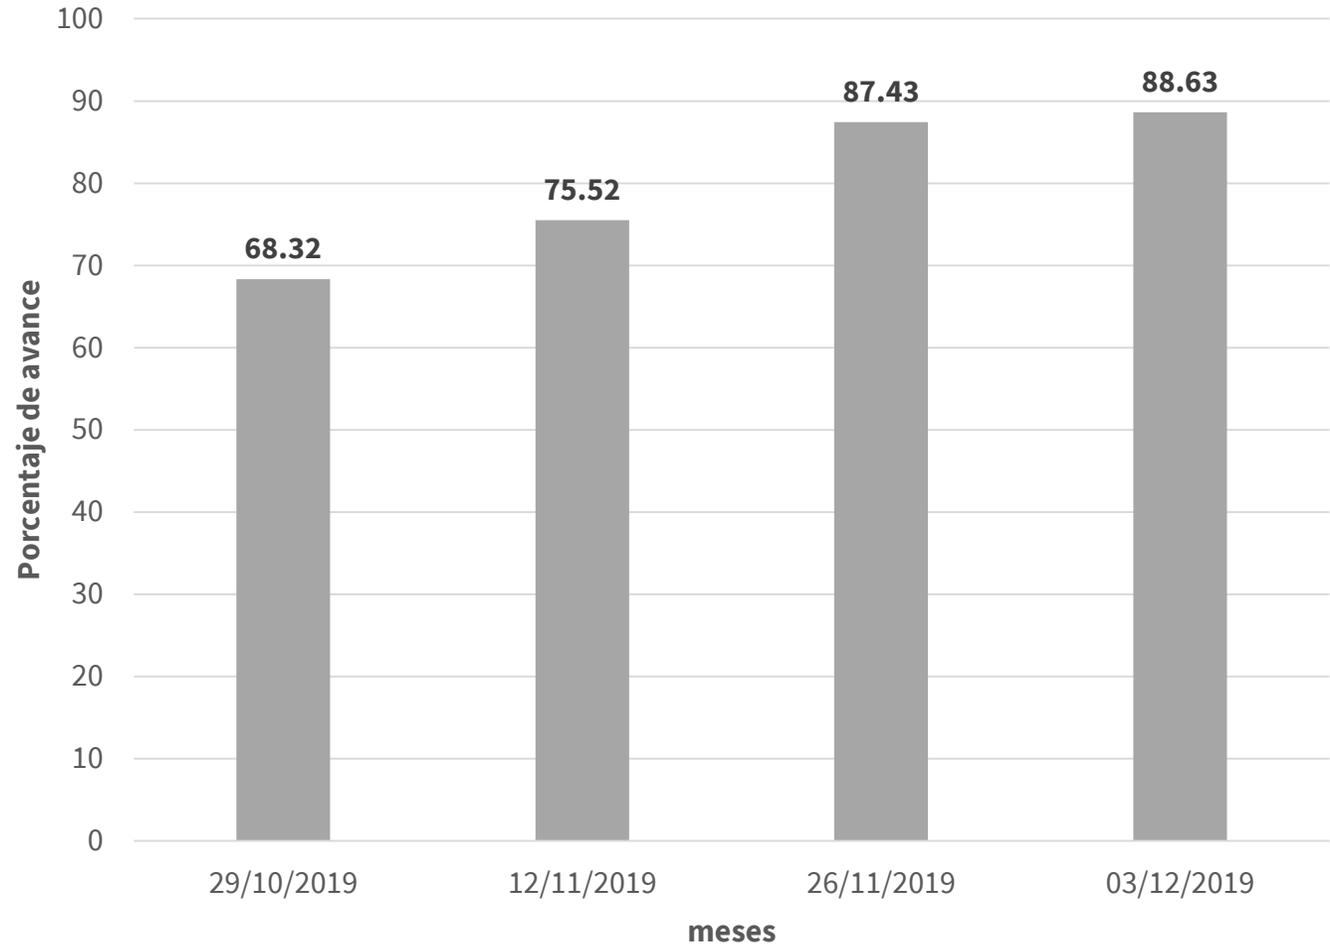



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



CENTRO HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Sacmex | ene - nov


Metraje de red secundaria de drenaje desazolvada

323,147 m

Atarjeas desazolvadas

27,669 m

Albañal desazolvado

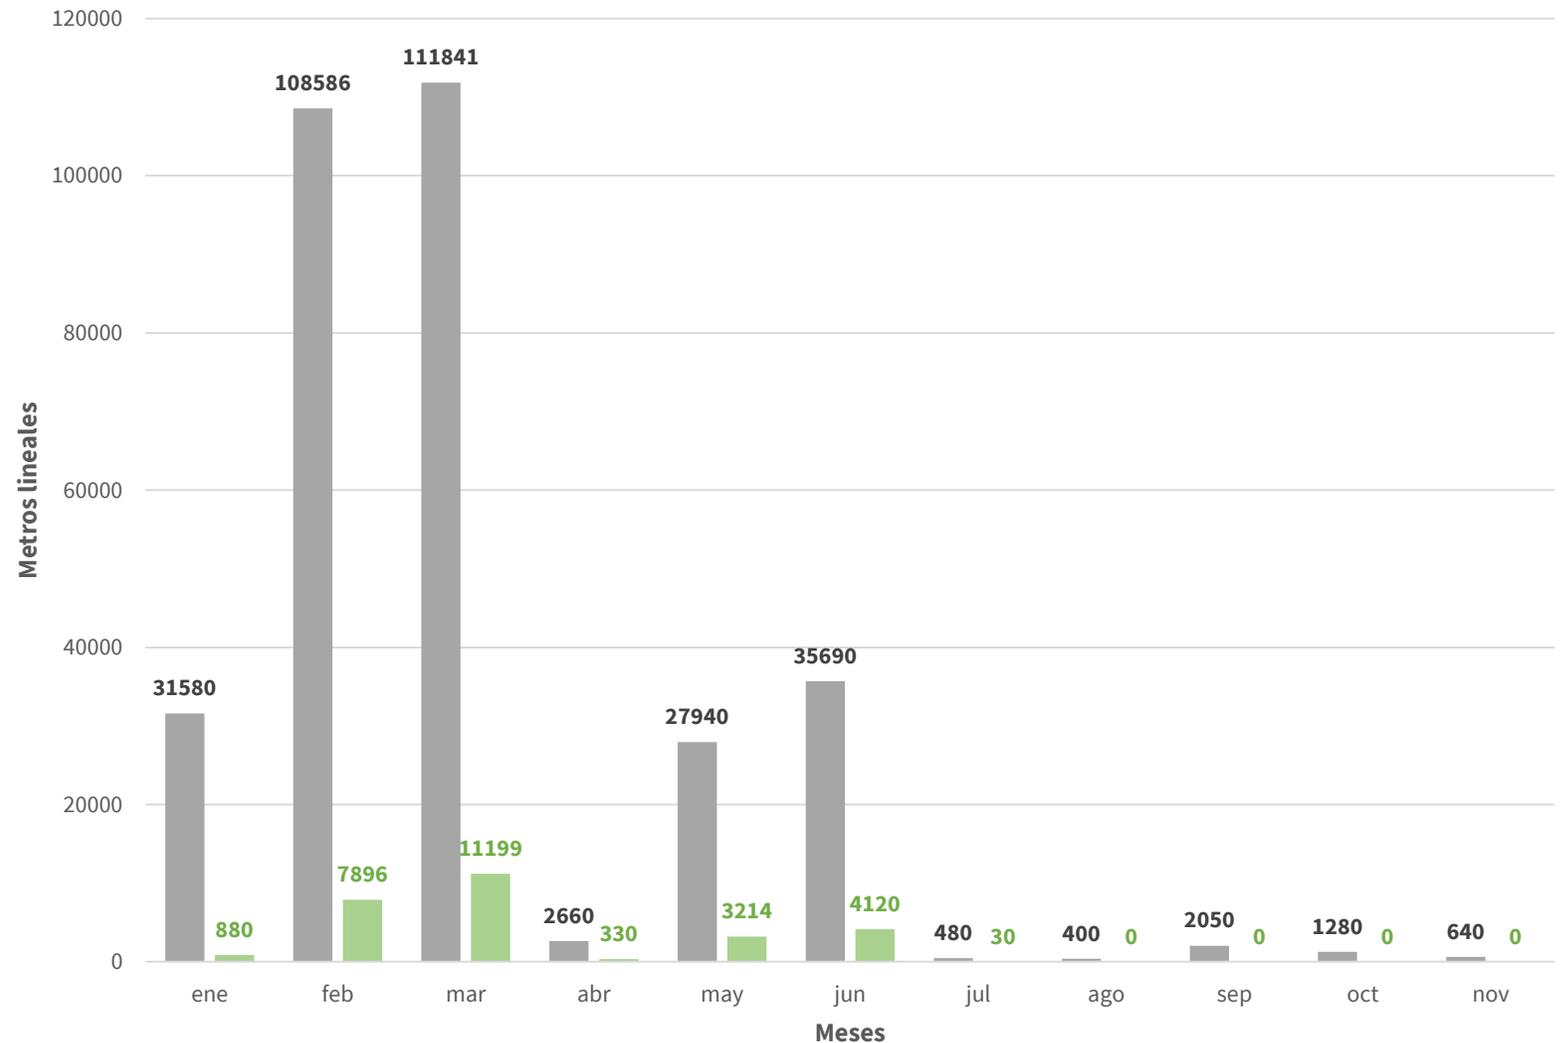




Sacmex | ene - nov


7,710

Coladeras pluviales

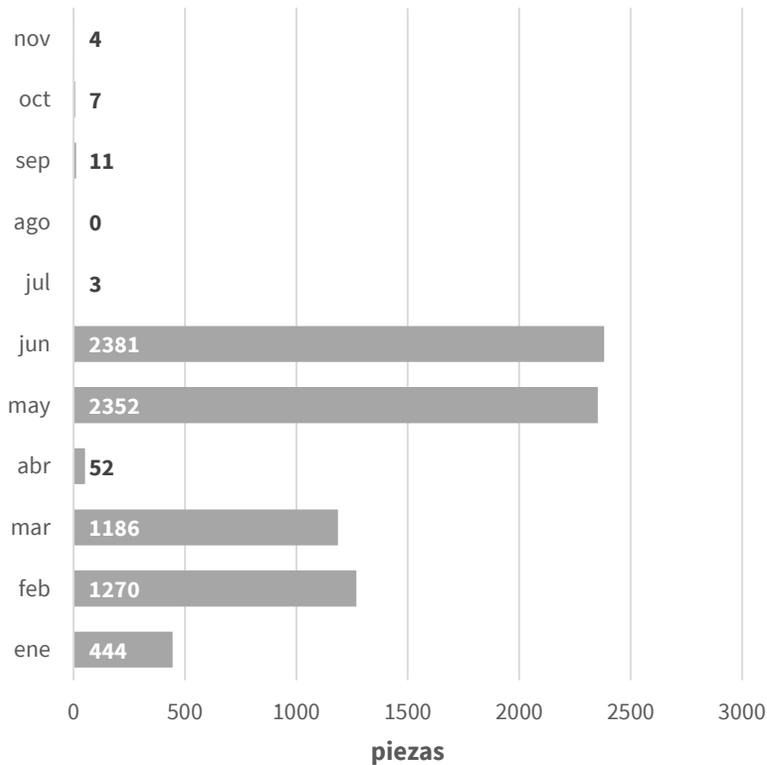


3,932

Rejillas de piso

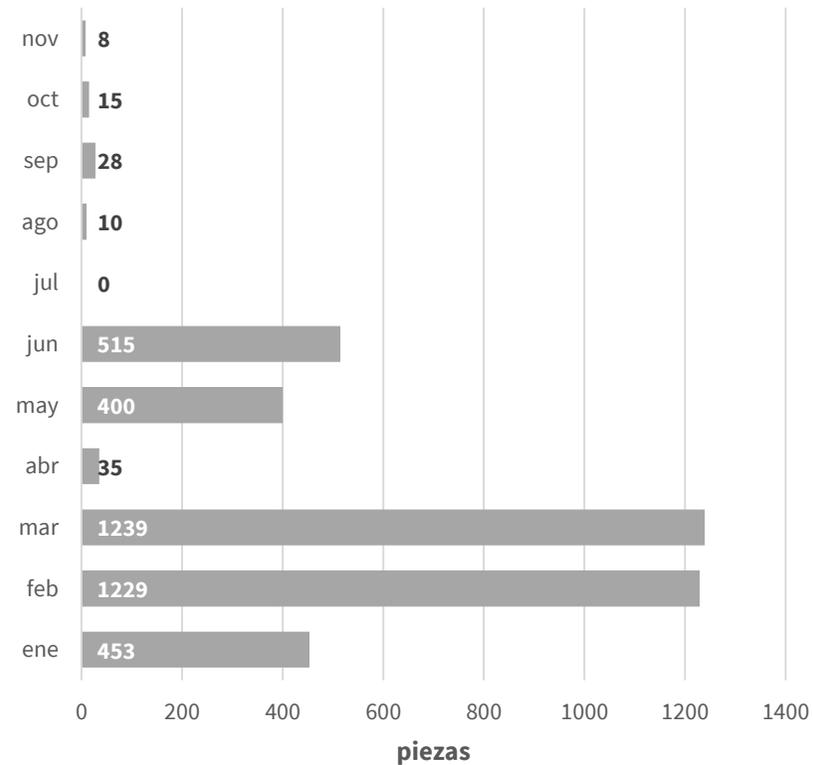

6,147

Pozos de visita

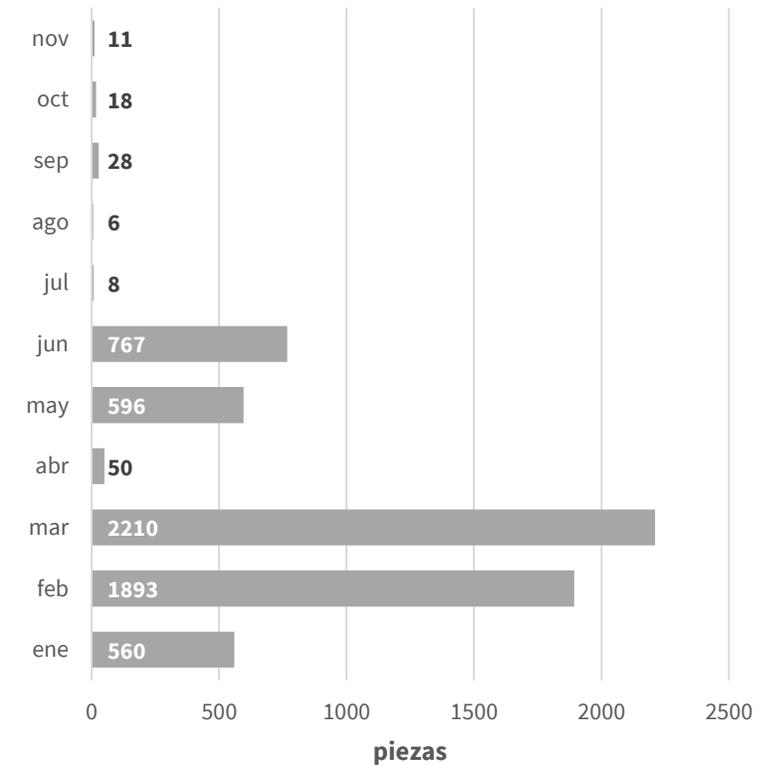

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL

2019




GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS



VIOLETA, GALEANA Y RIVA PALACIO

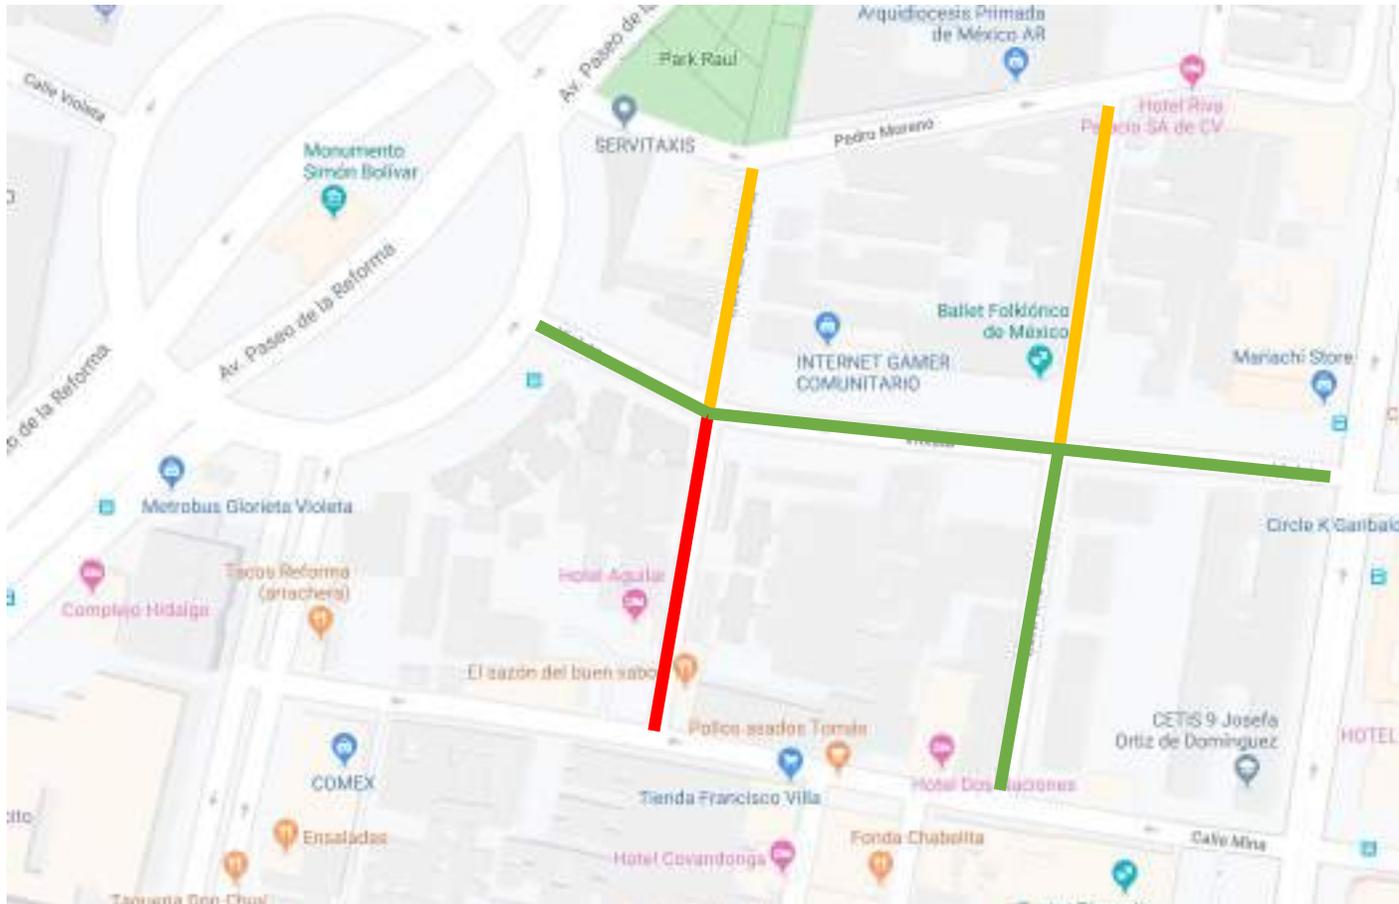

- **Calle Violeta avance de obra 80%**
Colado de guarnición, colado de rampas para accesos vehiculares, colocación de recinto y precolado terracota, colocación de luminarias y bolardos y acabado de trotapista.
- **Calle Riva Palacio Sur avance de obra 92%**
Colocación de bolardos y cableado para alumbrado
- **Calle Riva Palacio Norte avance de obra 35%**
Colado de relleno fluido y colocación de acabados.
- **Calle Galeana Norte avance del 35%**
Colado de Relleno fluido y colocación de acabados.
- **Calle Galeana Sur avance del 15%**
Trabajos de demolición y colocación de drenes



VIOLETA, GALEANA Y RIVA PALACIO



Avance de obra



Acceso vehicular habilitado



Rampa de Acceso Vehicular



Colocación de bolardos



VIOLETA, GALEANA Y RIVA PALACIO



Colocación de acabados



Avance de Obra




Avance de Obra



Avance de Obra



ANTIGUO BARRIO SAN PABLO DE ZOQUIAPAN

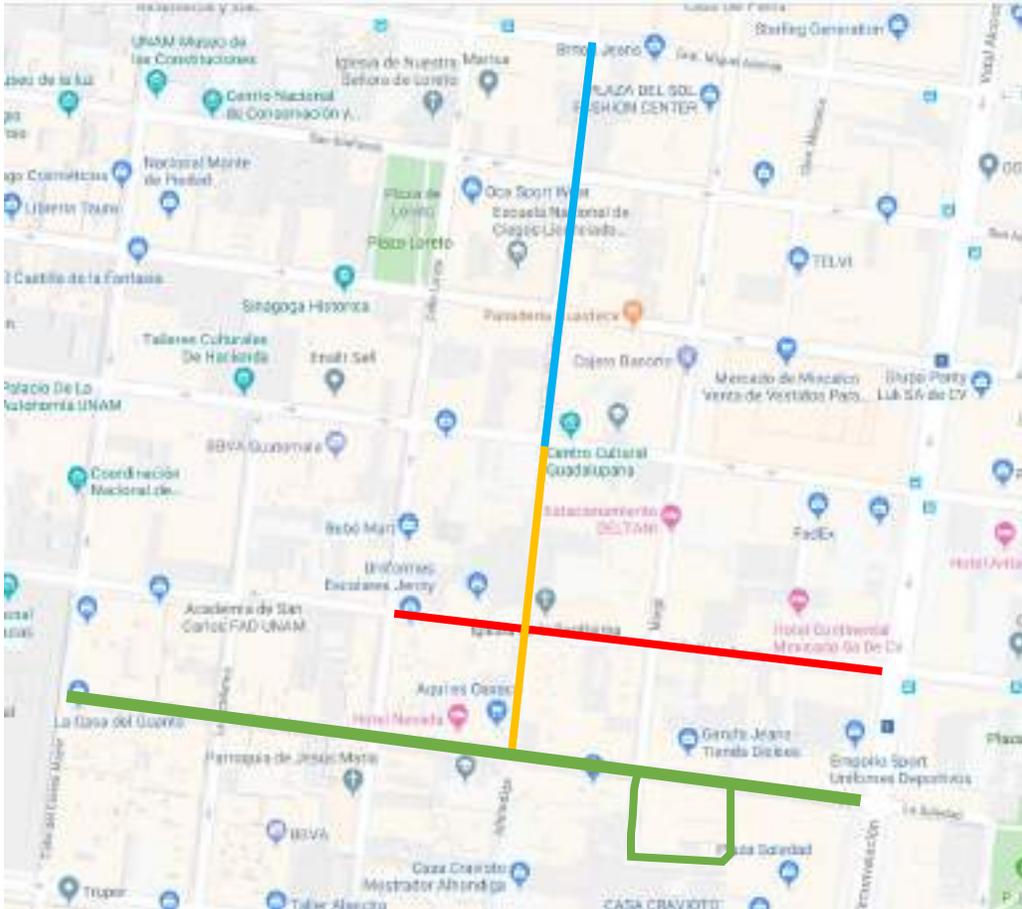

- **Calle Soledad avance de obra 81%**
-En el tramo de Jesús Maria- Academia Colocación de recinto en banquetas
-En el tramo de Academia- Correo Mayor Colado de MR-45. armado, cimbrado y colado de guarnición.



- **Callejón de Lecheras avance de obra 99.5%**
Detalles



- **Calle de la Santísima avance de obra 38%**
Colocación de recinto




- **Leona Vicario avance de obra 22%**
Colado de MR-45 en vialidad
Carga y acarreo de material producto de demolición
- **Emiliano Zapata avance de obra 0%**
Sin Intervención



ANTIGUO BARRIO SAN PABLO DE ZOQUIAPAN



Colado de guarnición

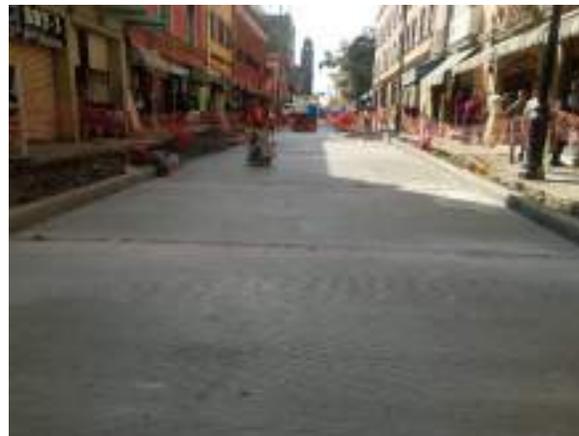

MR45 en vialidad



Colocación de recinto en Santísima



Colocación de luminarias



Colocación de luminarias



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

ANTIGUO BARRIO SAN PABLO DE ZOQUIAPAN



Colocación de bolardos en República de Guatemala



Preparación para colado de Revo



Colado de MR45 en República de Guatemala



Colado de MR45 en Soledad




PLAZA LORETO, JARDIN DEL OBISPO Y VALERIO TRUJANO



Plaza Loreto



Jardín del Obispo

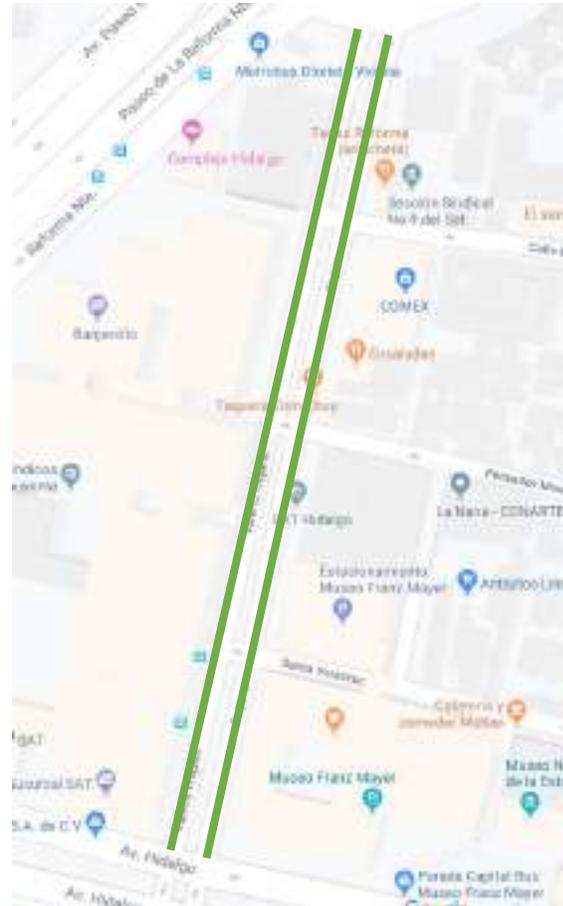

Calle Valerio Trujano



- **Calle Valerio Trujano Oriente avance de obra 92%**

Colocación de recinto en tramo de calle Javier Mina- Paseo de la Reforma y detalles

- **Calle Valerio Trujano acera Poniente avance de obra 67%**

Demolición de banquetas, colado de relleno fluido en banqueta, armado, cimbrado y colado de guarniciones, retiro de vegetación de ornato y retiro de vías de tranvía



- **Plaza Loreto avance de obra 17%**

Colocación de recinto y colocación de placas para jardineras



- **Jardín del Obispo avance de obra 52%**

Colocación de recinto y trabajos de obra de CFE.



PLAZA LORETO, JARDIN DEL OBISPO Y VALERIO TRUJANO



Colocación de recinto en Jardín del Obispo



Colocación de Recinto en Plaza Loreto



Colado de Guarnición en Valerio Trujano




Demolición de banqueta en Valerio Trujano



Colado de guarnición en Valerio Trujano



BARRIO DE SANTA MARÍA LA REDONDA

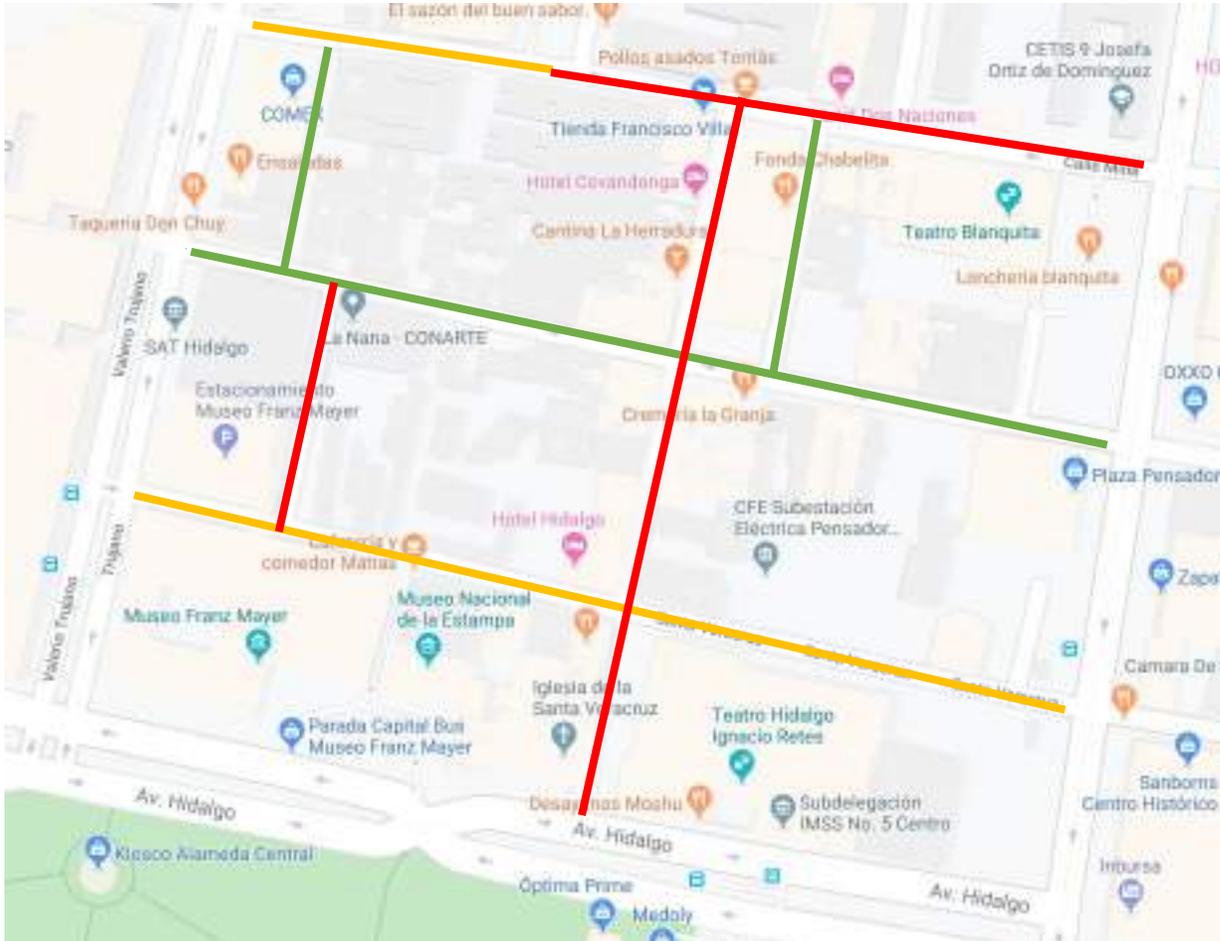

- **3er Callejón de San Juan de Dios avance de obra 50%**

Colocación de recinto en áreas peatonales

- **Plaza 2 de Abril avance de obra 65%**
Colado de relleno fluido, colocación de bases para postes

- **Calle Pensador Mexicano avance de obra 31%**

Armado de guarnición, colado de guarnición colocación de recinto, demolición de carpeta asfáltica.



- **Calle Mina avance de obra 14%**
Colado de guarnición y retiro de vías de tranvía

- **Calle Santa Veracruz avance de obra 38%**
Trabajos de demolición y colado de guarnición y retiro de vegetación de ornato, colocación de postes y registros para luminarias



- **Calle Mina**
Sin intervención del tramo de la calle Galeana a Eje Central

- **2do Callejón de San Juan de Dios 5%**
Demolición de Banquetas

- **Calle 2 de Abril**
Intervención de SACMEX



BARRIO DE SANTA MARÍA LA REDONDA




Demolición de banqueta Pensador Mexicano



Avance de obra 3er Callejón de San Juan de Dios




Avance de obra Pensador Mexicano

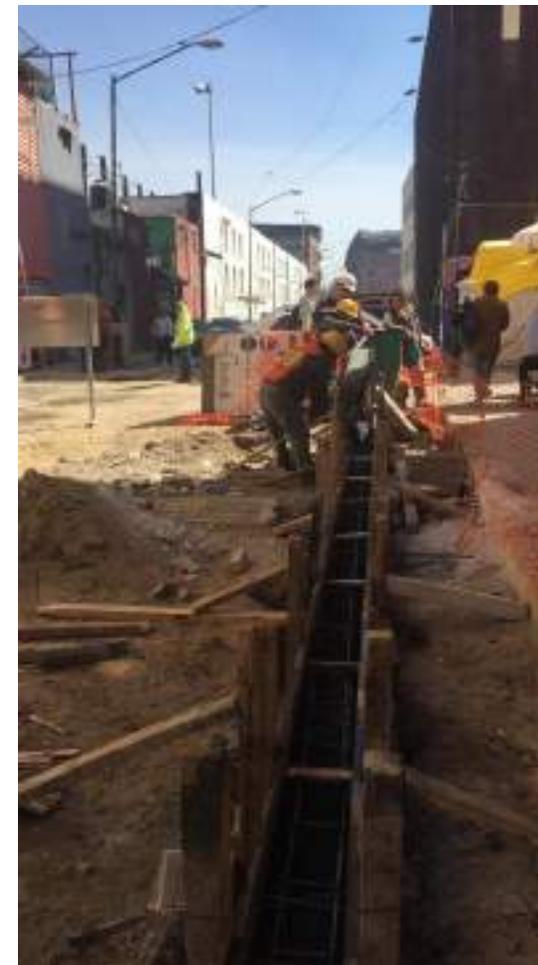

Santa Veracruz cimbrado de guarnición



EJE CENTRAL

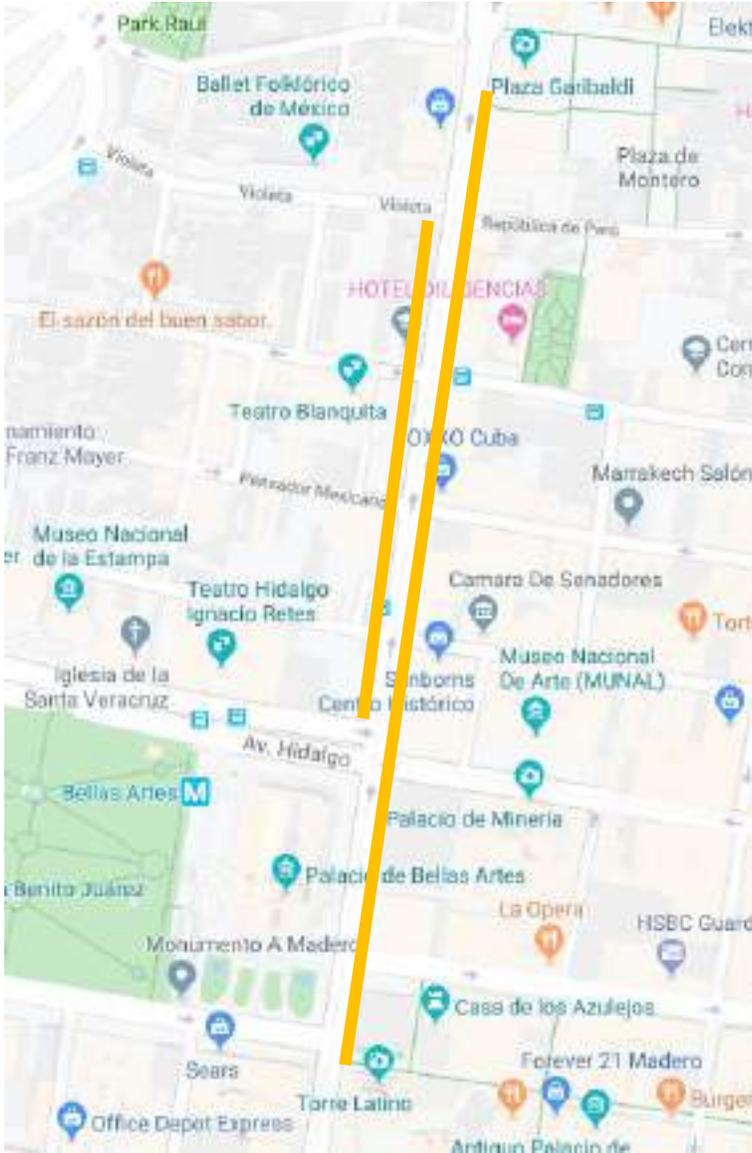

- **Eje Central acera Oriente avance de obra 8.5%**

- En el tramo Francisco I. Madero- 5 de mayo Demolición de muro del Banco de México
- En el tramo de Calle 5 de mayo – Tacuba Colado de relleno fluido, colocación de recinto, colocación de dren, colocación de mármol, colocación de bases y registros para luminarias
- En el Tramo Tacuba- Donceles demolición de banqueteta y guarnición y colado de relleno fluido
- En el tramo de República de Cuba-Belisario Domínguez demolición de banquetetas y guarnición y colocación de recinto
- En el tramo Belisario Dominguez- Republica de Perú trabajos de demolición de banqueteta y guarnición y colado de relleno fluido

- **Eje Central acera Poniente avance de obra 6.5%**

- En el tramo Calle Violeta- Javier Mina Trabajos de demolición, colado de relleno fluido y colocación de recinto
- En el tramo de Calle Javier Mina- Pensador Mexicano colado de relleno fluido y colocación de recinto
- En el tramo de Calle Santa Veracruz - Av. Hidalgo. trabajos de demolición de banquetetas y guarniciones



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

EJE CENTRAL



Demolición de muro del Banco de México

Demolición de banquetas

Colocación de recinto



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

EJE CENTRAL



Avance de obra acera Oriente




Avance de obra acera Poniente





AV. HIDALGO

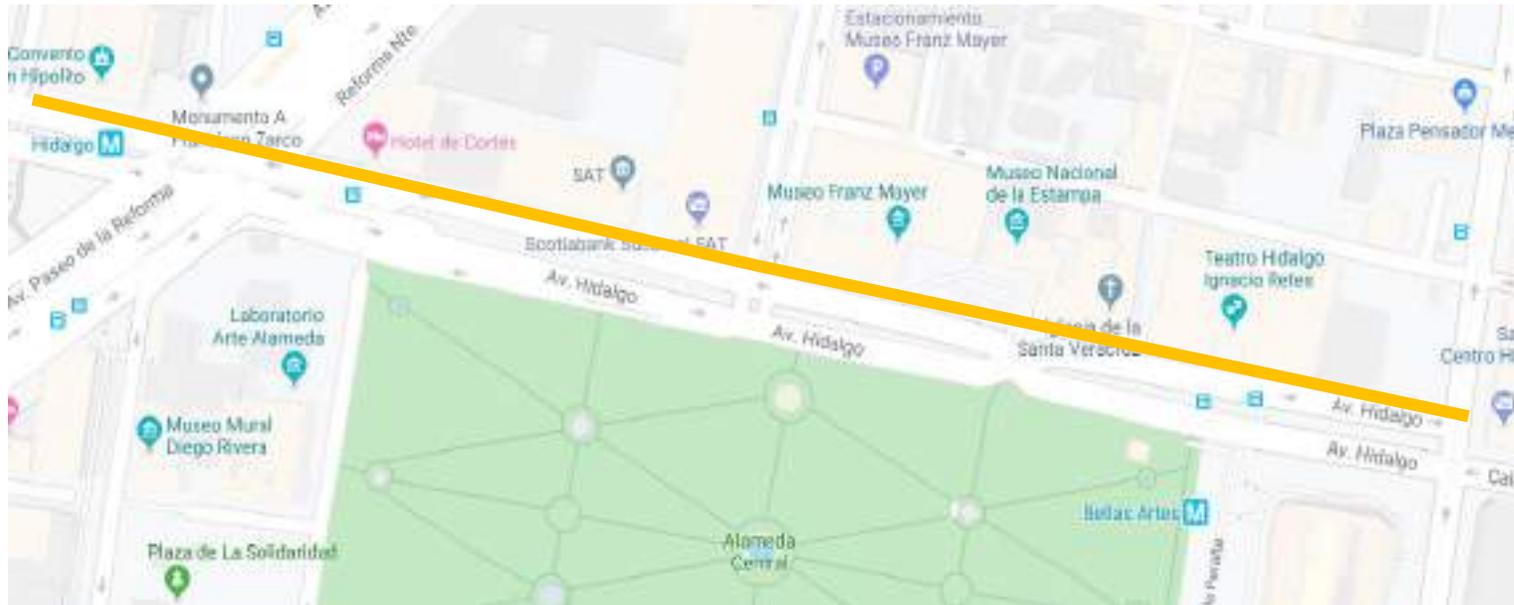

- **Av. Hidalgo avance de obra 23%**

- En el tramo de Calle Héroes- Paseo de la Reforma colado de relleno fluido
- En tramo Paseo de la Reforma- Valerio Trujano colado de relleno fluido y colocación de recinto.
- En el tramo Valerio Trujano a 2 de Abril colado de relleno fluido y colocación de recinto
- En el tramo 2 de Abril a Eje Central colado de relleno fluido, colocación de recinto, colado de MR45 en arroyo vehicular, renivelación de registros pluviales.



AV. HIDALGO



Colado de MR45 en Vialidad



Colado de Mr45 en Vialidad



Armado de guarnición



Colocación de recinto en áreas
peatonales



Colocación de bases para
luminarias



Renivelación de registros




SOS DGOIV | ene - nov

38%

Santa María la Redonda

53%

La Antigua Merced

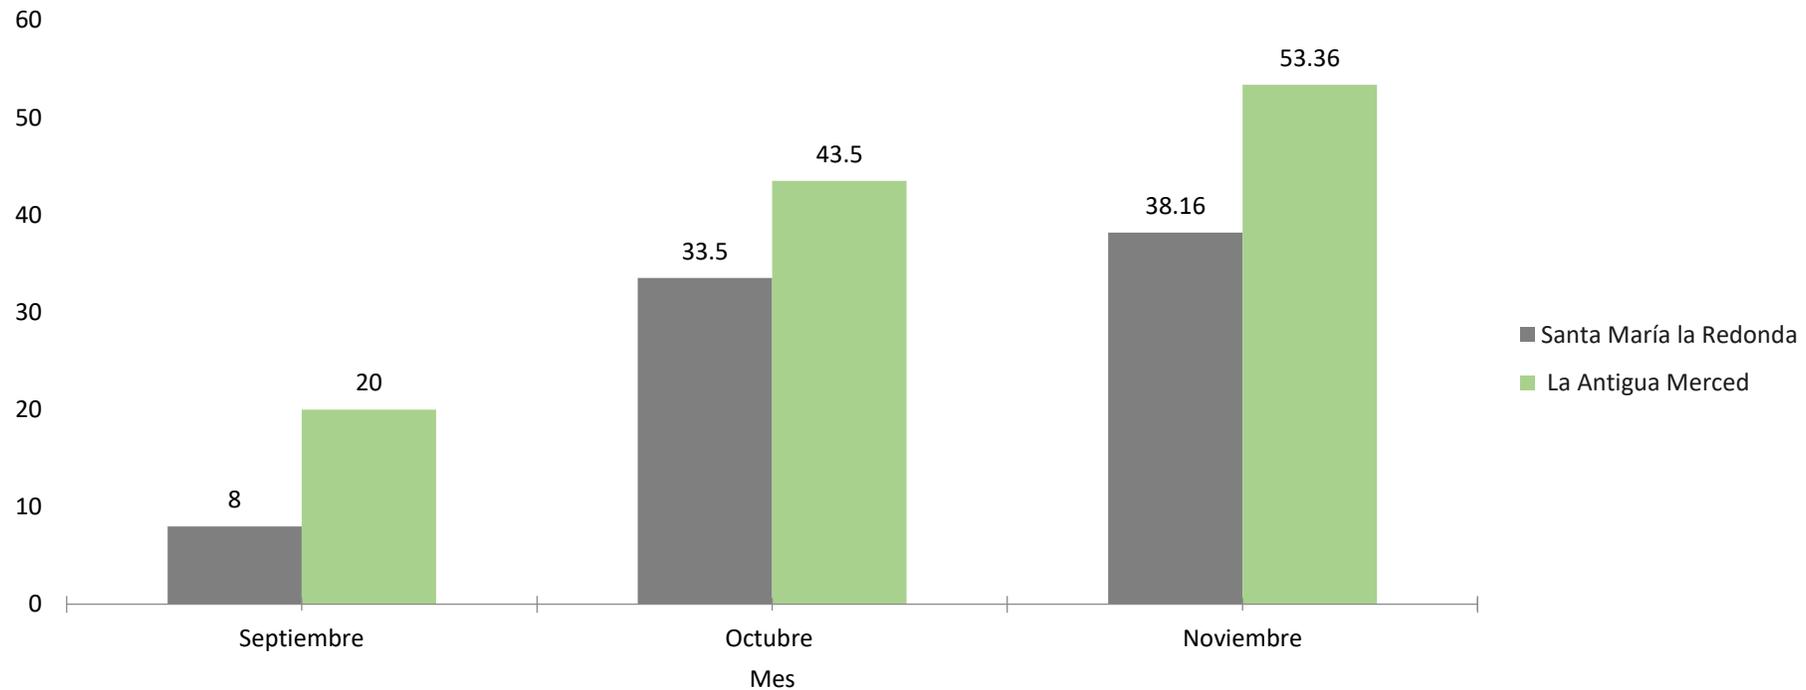



SOS – Alumbrado Público

Tema	Indicador	Periodicidad	Semana al 25/11	Semana al 02/12	Próximo reporte
Alumbrado Público	Número de luminarias reparadas en vías del PA del CH	Semanal	49	109	09 de diciembre
Alumbrado Público	Mantenimiento de iluminaciones artísticas	Semanal	25	21	09 de diciembre



SOS – Alumbrado Público | Anexo 1

Reporte de luminarias reparadas en el Centro Histórico Perímetro A

Dirección	Entre calles	Colonia	Cantidad	Motivo	Incidencia	
Allende	República de Cuba	Donceles	CENTRO	1	SE REALIZA CAMBIO DE LAMPARA	LUMINARIO APAGADO
20 de Noviembre	Regina	Mesones	CENTRO	1	SE REALIZA CAMBIO DE LAMPARA	LUMINARIO APAGADO
2o. Callejón Manzanares	Manzanares	Corregidora	CENTRO	1	SE REALIZA CAMBIO DE LAMPARA	LUMINARIO APAGADO
5 De Mayo	Condesa	Filomeno Mata	CENTRO	1	SE REALIZA CAMBIO DE BALASTRO Y LAMPARA	LUMINARIO APAGADO
5 de Mayo	Motolinía	Isabel la Católica	CENTRO	1	SE REALIZA RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN	LUMINARIO APAGADO
Allende	Belisario Domínguez	República de Cuba	CENTRO	1	SE REALIZA RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN	LUMINARIO APAGADO
Bolívar	República de Uruguay	República del Salvador	CENTRO	1	SE REALIZA CAMBIO DE LAMPARA	LUMINARIO APAGADO
Bolívar	5 de Mayo	Francisco. I. Madero	CENTRO	1	SE REALIZA CAMBIO DE LAMPARA	LUMINARIO APAGADO
Bolívar	República del Salvador	Mesones	CENTRO	1	SE REALIZA CAMBIO DE LAMPARA	LUMINARIO APAGADO
Callejón Esperanza	Callejón San Ignacio	Aldaco	CENTRO	1	SE REALIZA CAMBIO DE BALASTRO	LUMINARIO APAGADO
CALLEJÓN MESONES	Regina	Mesones	CENTRO	1	SE REALIZA CAMBIO DE LAMPARA	LUMINARIO APAGADO



SOS – Alumbrado Público | Anexo 1

Reporte de luminarias reparadas en el Centro Histórico Perímetro A

Dirección	Entre calles		Colonia	Cantidad	Motivo	Incidencia
Carmen	República de Bolivia	República de Colombia	CENTRO	15	SE REALIZA RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN	CIRCUITO APAGADO
Carmen	Apartado	República de Bolivia	CENTRO	1	SE REALIZA RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN	LUMINARIO APAGADO
Corregidora	Academia	Jesús María	CENTRO	1	SE REALIZA RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN	LUMINARIO APAGADO
Correo Mayor	Mesones	Regina	CENTRO	1	SE REALIZA CAMBIO DE LAMPARA	LUMINARIO APAGADO
Correo Mayor	Mesones	Regina	CENTRO	1	SE REALIZA NIVELACIÓN DE LUMINARIO	LUMINARIO APAGADO
Donceles	Allende	Xicotencatl	CENTRO	1	SE REALIZA RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN	LUMINARIO APAGADO
Emiliano Zapata	Margil	San Marcos	CENTRO	1	SE REALIZA RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN	LUMINARIO APAGADO
Filomeno Mata	Tacuba	5 De Mayo	CENTRO	1	SE REALIZA CAMBIO DE LAMPARA	LUMINARIO APAGADO
Fray Pedro de Gante	16 de Septiembre	Francisco I. Madero	CENTRO	4	SE REALIZA CAMBIO DE BALASTRO Y LAMPARA	LUMINARIO APAGADO
Fray Pedro de Gante	Venustiano Carranza	16 de Septiembre	CENTRO	1	SE REALIZA RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN	LUMINARIO APAGADO
Isabel la Católica	Mesones	Regina	CENTRO	11	SE REALIZA RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN	CIRCUITO APAGADO



SOS – Alumbrado Público | Anexo 1

Reporte de luminarias reparadas en el Centro Histórico Perímetro A

Dirección	Entre calles		Colonia	Cantidad	Motivo	Incidencia
Isabel la Católica	Mesones	República del Salvador	CENTRO	1	SE REALIZA RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN	LUMINARIO APAGADO
Las Cruces	Mesones	Regina	CENTRO	1	SE REALIZA RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN	LUMINARIO APAGADO
Las Cruces	Regina	San Pablo	CENTRO	1	SE REALIZA RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN	LUMINARIO APAGADO
Luis González Obregón	República d Brasil	República de Argentina	CENTRO	3	SE REALIZA CAMBIO DE LAMPARA	LUMINARIO APAGADO
Manzanares	Talavera	Jesús María	CENTRO	1	SE REALIZA RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN	LUMINARIO APAGADO
Mesones	Correo Mayor	José María Pino Suárez	CENTRO	1	SE REALIZA RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN	LUMINARIO APAGADO
Mesones	20 de Noviembre	5 de Febrero	CENTRO	1	SE REALIZA CAMBIO DE LAMPARA	LUMINARIO APAGADO
Motolinía	Tacuba	5 De Mayo	CENTRO	1	SE REALIZA CAMBIO DE LAMPARA	LUMINARIO APAGADO
Motolinía	Tacuba	5 de Mayo	CENTRO	1	SE REALIZA RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN	LUMINARIO APAGADO
Plaza de las Vizcaínas	Eje Central	Bolívar	CENTRO	1	SE REALIZA CAMBIO DE LAMPARA	LUMINARIO APAGADO
República de Bolivia	Del Carmen	República de Argentina	CENTRO	15	SE REALIZA RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN	CIRCUITO APAGADO



SOS – Alumbrado Público | Anexo 1

Reporte de luminarias reparadas en el Centro Histórico Perímetro A

Dirección	Entre calles	Colonia	Cantidad	Motivo	Incidencia	
República de Bolivia	República de Argentina	República d Brasil	CENTRO	1	SE REALIZA CAMBIO DE LAMPARA	LUMINARIO APAGADO
República de Chile	M. Rodríguez del Toro Lazarín	República de Perú	CENTRO	1	SE REALIZA RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN	LUMINARIO APAGADO
República de Colombia	Callejón de Girón	Rodríguez Puebla	CENTRO	2	SE REALIZA CAMBIO DE BALASTRO Y LAMPARA	LUMINARIO APAGADO
República de Cuba	Allende	República de Chile	CENTRO	1	SE REALIZA CAMBIO DE LAMPARA	LUMINARIO APAGADO
República de El Salvador	Talavera	Roldan	CENTRO	1	SE REALIZA CAMBIO DE LAMPARA	LUMINARIO APAGADO
República de El Salvador	Talavera	Roldán	CENTRO	3	SE REALIZA RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN	LUMINARIO APAGADO
República de El Salvador	Roldán	Santo Tomás	CENTRO	1	SE REALIZA RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN	LUMINARIO APAGADO
República de Guatemala	República de Brasil	República de Argentina	CENTRO	6	SE REALIZA CAMBIO DE BALASTRO Y LAMPARA	LUMINARIO APAGADO
República de Paraguay	República d Brasil	República de Argentina	CENTRO	1	SE REALIZA RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN	LUMINARIO APAGADO
República de Uruguay	Anillo de Circunvalación	Callejón de Manzanares	CENTRO	1	SE REALIZA CAMBIO DE LAMPARA	LUMINARIO APAGADO
República de Uruguay	Talavera	Jesús María	CENTRO	1	SE REALIZA CAMBIO DE LAMPARA	LUMINARIO APAGADO



SOS – Alumbrado Público | Anexo 1

Reporte de luminarias reparadas en el Centro Histórico Perímetro A

Dirección	Entre calles	Colonia	Cantidad	Motivo	Incidencia	
República de Uruguay	Isabel la Católica	5 de Febrero	CENTRO	1	SE REALIZA CAMBIO DE LAMPARA	LUMINARIO APAGADO
República de Uruguay	Anillo de Circunvalación	Callejón de Manzanares	CENTRO	1	SE REALIZA RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN	LUMINARIO APAGADO
República de Uruguay	Talavera	Jesús María	CENTRO	1	SE REALIZA RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN	LUMINARIO APAGADO
República de Uruguay	Talavera	Jesús María	CENTRO	1	SE REALIZA RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN	LUMINARIO APAGADO
República de Uruguay	Correo Mayor	Las Cruces	CENTRO	1	SE REALIZA RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN	LUMINARIO APAGADO
Rodríguez Puebla	República de Colombia	República de Bolivia	CENTRO	1	SE REALIZA RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN	LUMINARIO APAGADO
Santo Tomás	República del Salvador	Ramón Corona	CENTRO	1	SE REALIZA RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN	LUMINARIO APAGADO
Santo Tomás	Manzanares	República de Uruguay	CENTRO	1	SE REALIZA RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN	LUMINARIO APAGADO
Tacuba	Filomeno Mata	Bolívar	CENTRO	1	SE REALIZA CAMBIO DE LAMPARA	LUMINARIO APAGADO
Tacuba	Eje Central	Marconi	CENTRO	4	SE REALIZA RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN	LUMINARIO APAGADO
Venustiano Carranza	E. Castellanos	Correo Mayor	CENTRO	1	SE REALIZA CAMBIO DE LAMPARA	LUMINARIO APAGADO
			TOTAL	109		




SOS – Alumbrado Público | Anexo 2

Reporte de Mantenimiento de Iluminación Artística en el Centro Histórico Perímetro A

Dirección	Entre calles		Colonia	Cantidad	Motivo	Incidencia
Templo Santo Domingo	República d Brasil	Belisario Domínguez	CENTRO	11	SE REALIZA CAMBIO DE BALASTRO Y LAMPARA	LUMINARIOS APAGADOS
Museo José Luis Cuevas	La Acdemia	Moneda	CENTRO	1	SE REALIZA RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN	LUMINARIO APAGADO
Hospital Del Divino Salvador	Donceles	República De Chile	CENTRO	4	SE REALIZA CAMBIO DE LAMPARA	LUMINARIO APAGADO
Teatro de la ciudad	Donceles	Allende	CENTRO	5	SE REALIZA CAMBIO DE BALASTRO Y LAMPARA	LUMINARIO APAGADO
			TOTAL	21		



SOS-AP | ene - nov

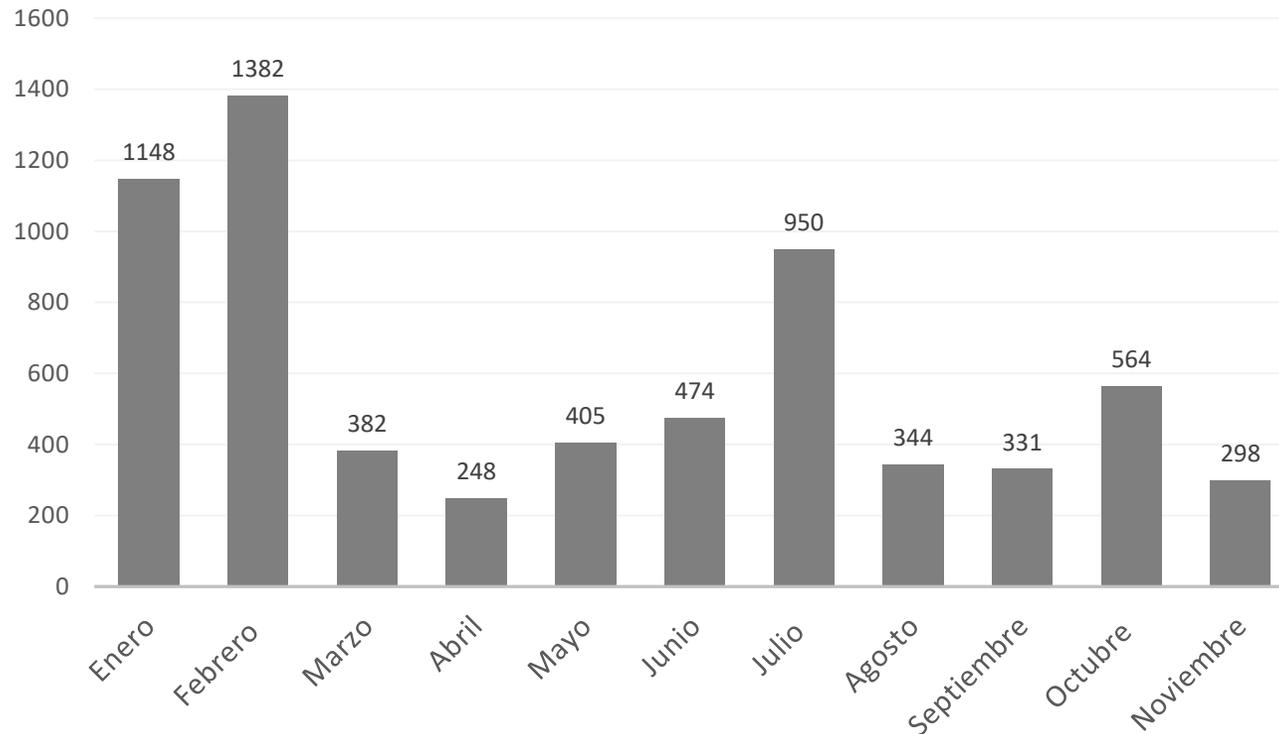


Perímetro A

6,154
Luminarias reparadas en PA



SOS-AP | ene - nov

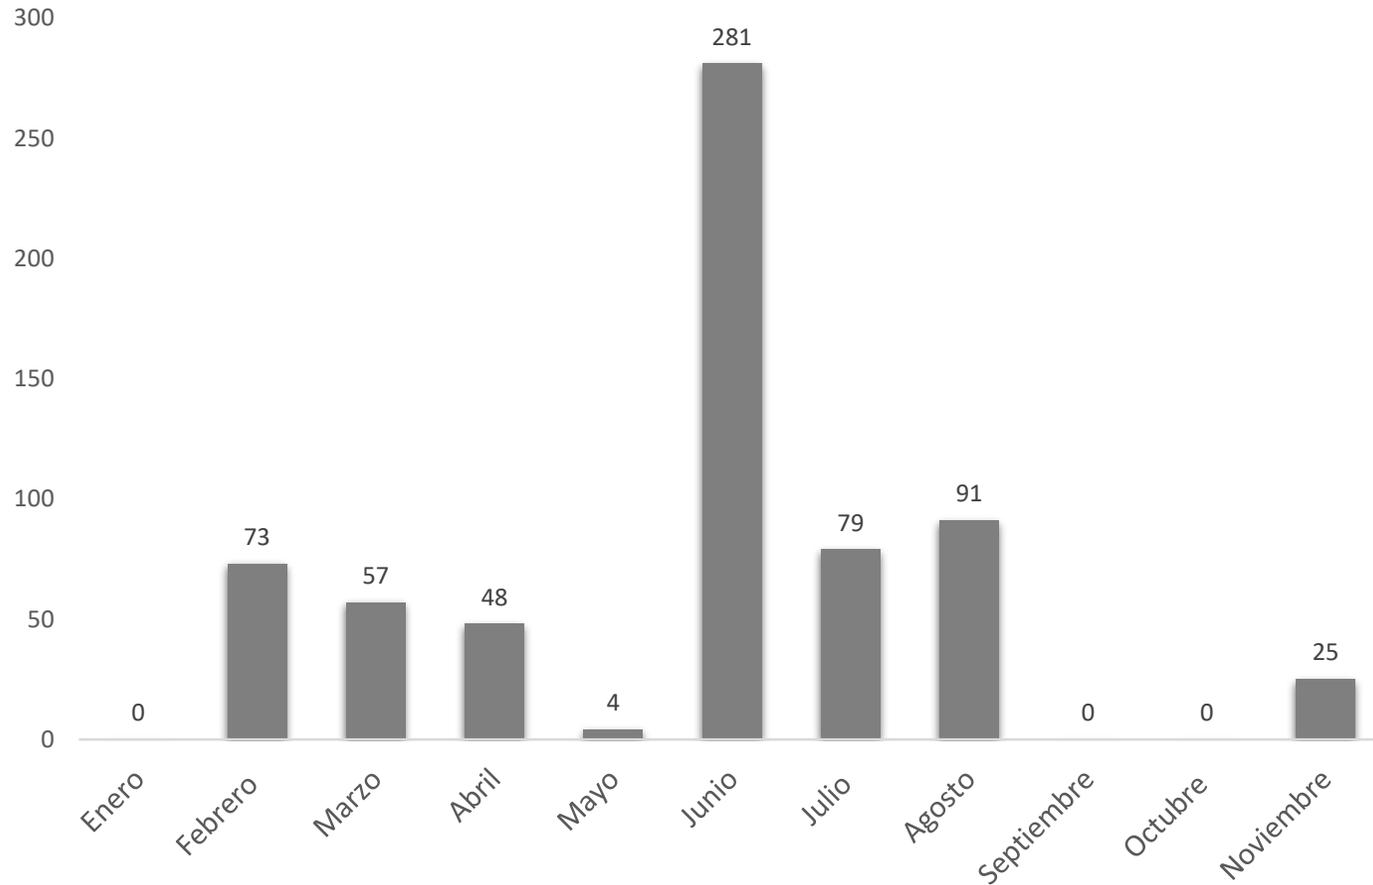

Perímetro B

658


Luminarias reparadas en PB



STC-METRO | feb - oct


119

Reparaciones en escaleras electromecánicas

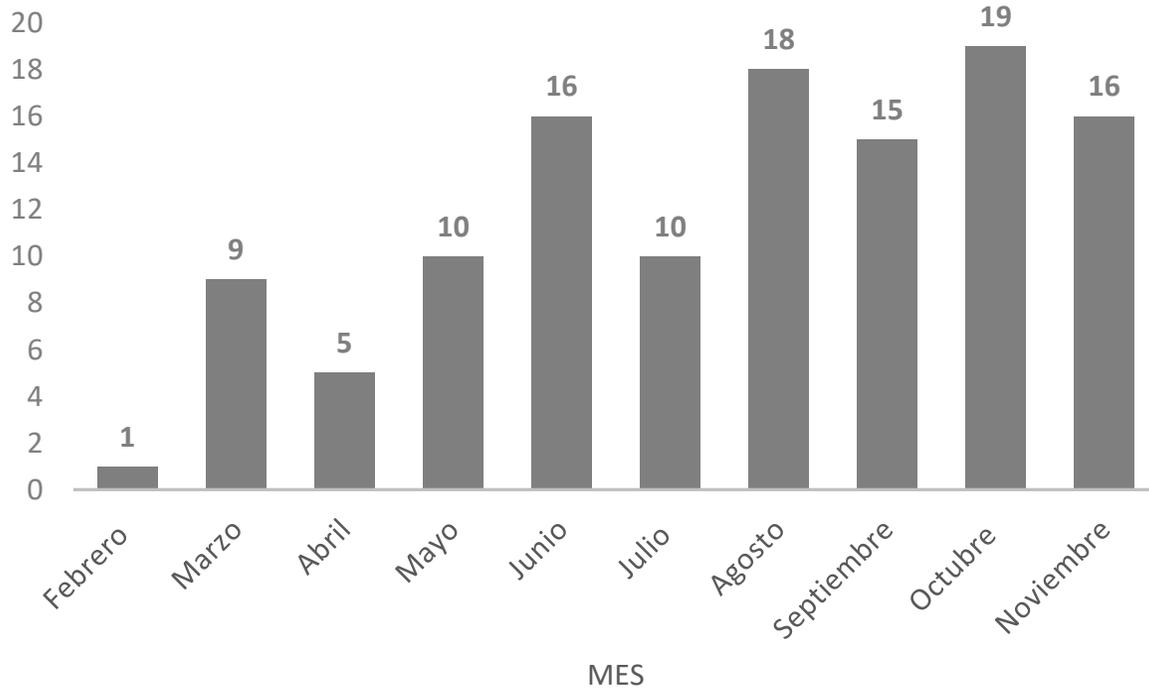

26

Reparaciones en elevadores

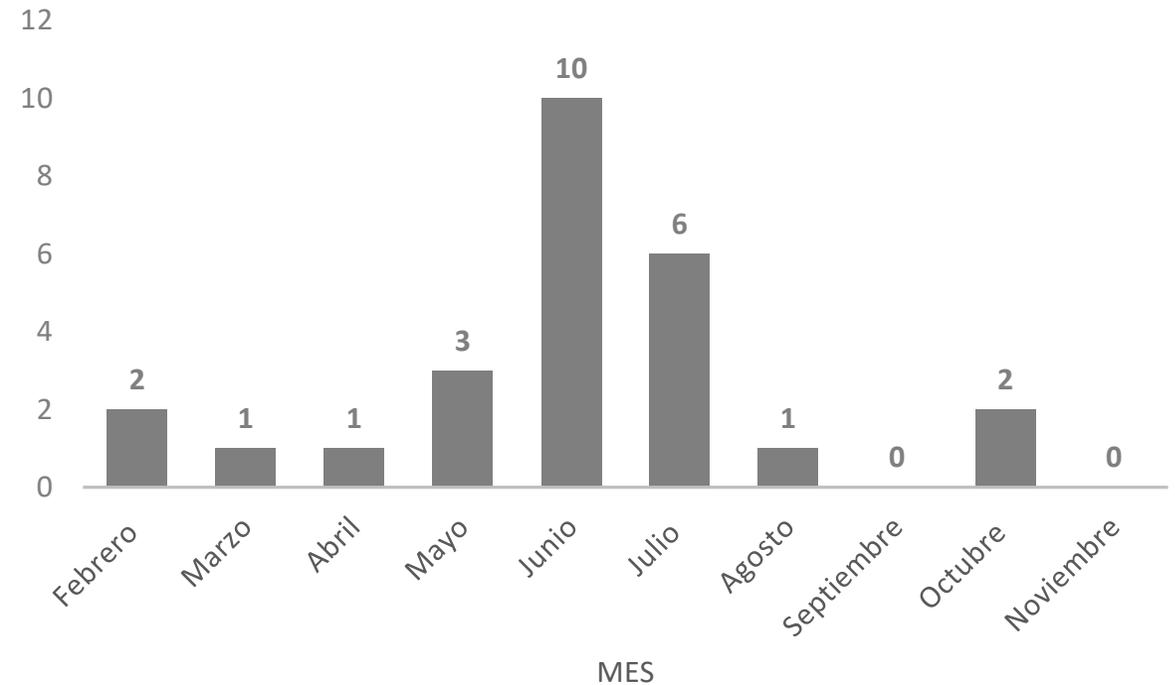



INVI

Tema	Indicador	Periodicidad	Al mes de Octubre	Al mes de Noviembre	Próximo reporte
Proyectos de Vivienda	Porcentaje de avance de proyectos de vivienda (línea base: 18)	Mensual	53.99	53.99%	07 de enero



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

INVI

No. PREDIO	COLONIA	ALCALDÍA	PROGRAMA COLUMNA MAESTRA	AVANCE DEL PROYECTO	AVISO DE OBRA	ESTATUS	PERÍMETRO	PORCENTAJE DE AVANCE
1 2 DE ABRIL No. 42	GUERRERO	CUAUHTÉMOC	EXPROPIADO	PROYECTO EJECUTIVO LIBERADO	A-039/DOUL/62/11	OBRA EN PROCESO	A	42.20 %
2 ACADEMIA No. 33	CENTRO	CUAUHTÉMOC	EXPROPIADO	PROYECTO EJECUTIVO LIBERADO	A-028/DOUL/62/14	OBRA EN PROCESO	A	48.46 %
3 ARCOS DE BELEN No. 49	CENTRO	CUAUHTÉMOC	EXPROPIADO	PROYECTO EJECUTIVO LIBERADO	A-038/DOUL/62/17	OBRA EN PROCESO	B	90.00 %
4 EJE 1 PONIENTE GUERRERO No. 164	GUERRERO	CUAUHTÉMOC	EXPROPIADO	PROYECTO EJECUTIVO LIBERADO	A-007/DIUL/62/10	OBRA EN PROCESO	B	86.92 %
5 EJE 1 PONIENTE GUERRERO No. 110	CENTRO	CUAUHTÉMOC	EXPROPIADO	PROYECTO EJECUTIVO LIBERADO	A-085/DOUL/62/11	OBRA EN PROCESO	B	90.81 %
6 MAGNOLIA No. 12 (ANTES No. 12 y 16)	GUERRERO	CUAUHTÉMOC	PROGRAMA NORMAL	PROYECTO EJECUTIVO LIBERADO	A-069/DOUL/62/14	OBRA EN PROCESO	B	76.80 %
7 REPÚBLICA DE ARGENTINA No. 58	CENTRO	CUAUHTÉMOC	EXPROPIADO	PROYECTO EJECUTIVO LIBERADO	A-012/DOUL/62/14	POR INICIAR	A	0.00 % 52



INVI

No. PREDIO	COLONIA	ALCALDÍA	PROGRAMA COLUMNA MAESTRA	AVANCE DEL PROYECTO	AVISO DE OBRA	ESTATUS	PERÍMETRO	PORCENTAJE DE AVANCE
8 REPÚBLICA DE ARGENTINA No. 87	CENTRO	CUAUHTÉMOC	EXPROPIADO	PROYECTO EJECUTIVO LIBERADO	A-079/DOUL/62/12	OBRA EN PROCESO	A	86.81 %
9 REPÚBLICA DE PERÚ No. 40	CENTRO	CUAUHTÉMOC	PROGRAMA NACIONAL	PROYECTO EJECUTIVO LIBERADO	A-009/DOUL/62/2017	OBRA EN PROCESO	B	93.20 %
10 ALLENDE No. 46	CENTRO	CUAUHTÉMOC	EXPROPIADO	PROYECTO EJECUTIVO LIBERADO	A-073/DOUL/62/12	OBRA EN PROCESO	A	100.00 %
11 LERDO No. 12	GUERRERO	CUAUHTÉMOC	EXPROPIADO	PROYECTO EJECUTIVO LIBERADO	A-006/DOUL62/13	POR INICIAR	B	0.00 %
12 PEDRO MORENO No. 154	GUERRERO	CUAUHTÉMOC	EXPROPIADO	PROYECTO EJECUTIVO LIBERADO	A-062/DOUL/62/11	POR INICIAR	B	0.00 %
13 TALAVERA No. 24	CENTRO	CUAUHTÉMOC	EXPROPIADO	PROYECTO EJECUTIVO LIBERADO	A-056/DOUL/62/16	POR INICIAR	A	0.00 %



INVI


No. PREDIO	COLONIA	ALCALDÍA	PROGRAMA COLUMNA MAESTRA	AVANCE DEL PROYECTO	AVISO DE OBRA	ESTATUS	PERÍMETRO	PORCENTAJE DE AVANCE
14 VIOLETA No. 15	GUERRERO	CUAUHTÉMOC	EXPROPIADO	PROYECTO EJECUTIVO LIBERADO	A-024/DOUL/62/12	POR INICIAR	B	0.00 %
15 PEDRO MORENO No. 156	GUERRERO	CUAUHTÉMOC	EXPROPIADO	PROYECTO EJECUTIVO LIBERADO	A-064/DIUL/62/10	POR INICIAR	B	0.00 %
16 LECUMBERRI No. 66	ZONA CENTRO	CUAUHTÉMOC	PROGRAMA NORMAL	PROYECTO EJECUTIVO LIBERADO	A-022/DOUL/62/17	OBRA EN PROCESO	B	100.00 %
17 BELISARIO DOMINGUEZ No. 78	CENTRO	CUAUHTÉMOC	EXPROPIADO	PROYECTO EJECUTIVO LIBERADO	A-059/DOUL/62/17	OBRA EN PROCESO	A	71.45 %
18 NACIONAL No. 57	MORELOS	VENUSTIANO CARRANZA	CDI- CONVENIO DE COORDINACIÓN N 2013	PROYECTO EJECUTIVO LIBERADO	A-022/DOUL/62/15	OBRA EN PROCESO	B	85.11 %



INVI | ene - nov

53.9%

Avance porcentual de obra en proceso*

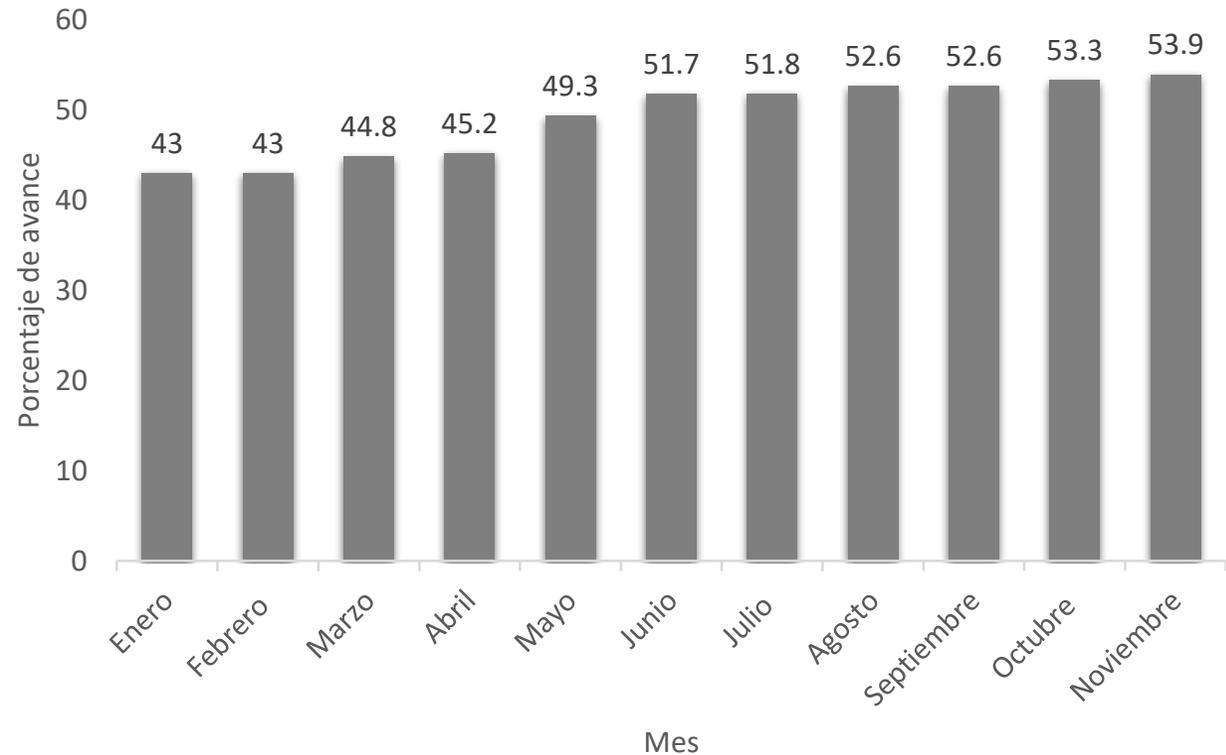

(*) de una meta de 18 predios ubicados en el Centro Histórico



PROSOC

Tema	Indicador	Periodicidad	Ubicación	Al mes de Octubre	Al mes de Noviembre	Próximo reporte	Observaciones
Unidades Habitacionales	Porcentaje de avance de proyectos de unidades habitacionales (línea base: 62)	Mensual	Alcaldía Cuauhtémoc (57 unidades habitacionales)	34.03%	56.28%	07 de enero	19 obras por iniciar 18 obras en proceso 20 obras terminadas
			Alcaldía Venustiano Carranza (5 unidades habitacionales)	48.00%	48.00%		1 obra por iniciar 2 obras en proceso 2 obras terminadas
			Total acumulado	41.02%	52.14%		



PROSOC

NO.	PREDIO	COLONIA	ALCALDIA	PROYECTO	ESTATUS	PORCENTAJE DE AVANCE	PERÍMETRO	CATALOGACIÓN
1	TIZAPAN 8	CENTRO	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA SANITARIA	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADO
2	SAN CAMILITO 25	CENTRO	CUAUHTEMOC	IMPERMEABILIZACION	EN PROCESO	95%	B	NO CATALOGADO
3	ROSARIO 32	CENTRO	VENUSTIANO CARRANZA	ESCALERAS	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADO
4	REPUBLICA DEL SALVADOR 206	CENTRO	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA SANITARIA	EN PROCESO	90%	A	CATALOGADO
5	REPUBLICA DE PERU 32	CENTRO	CUAUHTEMOC	IMPERMEABILIZACION	TERMINADA	100%	A	CATALOGADO
6	REPUBLICA DE PERU 28	CENTRO	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	POR INICIAR	0%	B	NO CATALOGADO



PROSOC

NO.	PREDIO	COLONIA	ALCALDIA	PROYECTO	ESTATUS	PORCENTAJE DE AVANCE	PERÍMETRO	CATALOGACIÓN
7	REPUBLICA DE COSTA RICA 129	CENTRO	CUAUHTEMOC	IMPERMEABILIZACION	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADO
8	REPUBLICA DE COSTA RICA 125	CENTRO	CUAUHTEMOC	HERRERIA	EN PROCESO	95%	A	NO CATALOGADO
9	REPUBLICA DE CHILE 49	CENTRO	CUAUHTEMOC	CALLES Y ANDADORES	EN PROCESO	55%	A	NO CATALOGADO
10	REPUBLICA DE CHILE 47	CENTRO	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	EN PROCESO	33%	A	CATALOGADO
11	PLAZA SAN LAZARO B-16	CENTRO	VENUSTIANO CARRANZA	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	POR INICIAR	0%	B	NO CATALOGADO
12	ORGANO 17	CENTRO	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	POR INICIAR	0%	B	NO CATALOGADO
13	ORGANO 16-18	CENTRO	CUAUHTEMOC	ESCALERAS	POR INICIAR	0%	B	NO CATALOGADO



PROSOC

NO.	PREDIO	COLONIA	ALCALDIA	PROYECTO	ESTATUS	PORCENTAJE DE AVANCE	PERÍMETRO	CATALOGACIÓN
14	NEZAHUALCOYOTL 136	CENTRO	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA SANITARIA	POR INICIAR	0%	B	NO CATALOGADO
15	MISIONEROS 9	CENTRO	CUAUHTEMOC	ALBAÑILERIA	TERMINADA	100%	A	CATALOGADO
16	MANUEL TOLSA 56	CENTRO	CUAUHTEMOC	ESTRUCTURA	POR INICIAR	0%	B	NO CATALOGADO
17	MANUEL DOBLADO 140	CENTRO	CUAUHTEMOC	HERRERIA	POR INICIAR	0%	B	NO CATALOGADO
18	LAZARIN DEL TORO 26	CENTRO	CUAUHTEMOC	HERRERIA	EN PROCESO	40%	A	CATALOGADO
19	JOSE JOAQUIN HERRERA 28-32	CENTRO	CUAUHTEMOC	ESCALERAS	EN PROCESO	900%	B	NO CATALOGADO
20	JOSE JOAQUIN HERRERA 2-4	CENTRO	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA SANITARIA	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADO



PROSOC

NO.	PREDIO	COLONIA	ALCALDIA	PROYECTO	ESTATUS	PORCENTAJE DE AVANCE	PERÍMETRO	CATALOGACIÓN
21	JOSE JOAQUIN HERRERA 17	CENTRO	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	EN PROCESO	90%	B	NO CATALOGADO
22	JOSE JOAQUIN HERRERA 10 Y 12	CENTRO	CUAUHTEMOC	ESCALERAS	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADO
23	ISABEL LA CATOLICA 134	CENTRO	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	POR INICIAR	0%	B	NO CATALOGADO
24	FRAY SERVANDO TERESA DE MIER 142	CENTRO	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA SANITARIA	POR INICIAR	0%	B	NO CATALOGADO
25	EJE CENTRAL LAZARO CARDENAS 17	CENTRO	CUAUHTEMOC	IMPERMEABILIZACION	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADO
26	ECUADOR 23 (ANTES ALLENDE 82 Y 86)	CENTRO	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	POR INICIAR	0%	B	NO CATALOGADO
27	CORREGIDORA 148	CENTRO	VENUSTIANO CARRANZA	ESCALERAS	EN PROCESO	20%	B	NO CATALOGADO



PROSOC

NO.	PREDIO	COLONIA	ALCALDIA	PROYECTO	ESTATUS	PORCENTAJE DE AVANCE	PERÍMETRO	CATALOGACIÓN
28	CORREGIDORA 140	CENTRO	VENUSTIANO CARRANZA	ESCALERAS	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADO
29	CERRADA FRAY SERVANDO 59	CENTRO	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	POR INICIAR	0%	B	NO CATALOGADO
30	CALLEJON MONTERO 7	CENTRO	CUAUHTEMOC	CALLES Y ANDADORES	POR INICIAR	0%	B	NO CATALOGADO
31	ANILLO DE CIRCUNVALACION 40	CENTRO	VENUSTIANO CARRANZA	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	EN PROCESO	20%	B	NO CATALOGADO
32	ALDACO 8	CENTRO	CUAUHTEMOC	IMPERMEABILIZACION	TERMINADA	100%	A	CATALOGADO
33	5 DE FEBRERO 93	CENTRO	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA SANITARIA	POR INICIAR	0%	B	NO CATALOGADO
34	1RA. CERRADA FRAY SERVANDO 57	CENTRO	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA SANITARIA	POR INICIAR	0%	B	NO CATALOGADO



PROSOC

NO.	PREDIO	COLONIA	ALCALDIA	PROYECTO	ESTATUS	PORCENTAJE DE AVANCE	PERÍMETRO	CATALOGACIÓN
35	CHIMALPOPOCA 51	OBRERA	CUAUHTEMOC	PINTURA	EN PROCESO	95%	B	NO CATALOGADA
36	FLORIDA 57	MORELOS	CUAUHTEMOC	CALLES Y ANDADORES	POR INICIAR	0%	B	NO CATALOGADA
37	FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS 29	MORELOS	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA SANITARIA (DRENAJE)	POR INICIAR	0%	B	NO CATALOGADA
38	JESUS CARRANZA 20	MORELOS	CUAUHTEMOC	ESCALERAS Y HERRERIA	POR INICIAR	0%	B	NO CATALOGADA
39	LIBERTAD 21 A1	MORELOS	CUAUHTEMOC	IMPERMEABILIZACION	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
40	LIBERTAD 21 B2	MORELOS	CUAUHTEMOC	HERRERIA (ESCALERAS)	EN PROCESO	5%	B	NO CATALOGADA
41	LIBERTAD 21 C3	MORELOS	CUAUHTEMOC	ESCALERAS	EN RPOCESO	40%	B	NO CATALOGADA
42	LIBERTAD 21 D4	MORELOS	CUAUHTEMOC	CALLES Y ANDADORES	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA



PROSOC

NO.	PREDIO	COLONIA	ALCALDIA	PROYECTO	ESTATUS	PORCENTAJE DE AVANCE	PERÍMETRO	CATALOGACIÓN
43	BOLIVAR 158	OBRERA	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	POR INICIAR	0%	B	NO CATALOGADA
44	SEGUNDA CERRADA DE CHIMALPOPOCANO.16	OBRERA	CUAUHTEMOC	BASE DE TINACOS	POR INICIAR	0%	B	NO CATALOGADA
45	CERRADA FRAY SERVANDO 42	TRANSITO	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA (CABLEADO)	EN PROCESO	75%	B	NO CATALOGADA
46	CHIMALPOPOCA 294	TRANSITO	CUAUHTEMOC	IMPERMEABILIZACION	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
47	MINA 167	BUENAVISTA	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
48	MOCTEZUMA 199	BUENAVISTA	CUAUHTEMOC	HERRERIA	POR INICIAR	0%	B	NO CATALOGADA
49	MOCTEZUMA 33	GUERRERO	CUAUHTEMOC	HERRERIA	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
50	VIOLETA 104	BUENAVISTA	CUAUHTEMOC	HERRERIA (ESCALERAS)	EN PROCESO	80%	B	NO CATALOGADA



PROSOC

NO.	PREDIO	COLONIA	ALCALDIA	PROYECTO	ESTATUS	PORCENTAJE DE AVANCE	PERÍMETRO	CATALOGACIÓN
51	AVENIDA NIÑOS HEROES 51	DOCTORES	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y HERRERIA (ESCALERA MARINA)	EN PROCESO	80%	B	NO CATALOGADA
52	DR. ANDRADE 14	DOCTORES	CUAUHTEMOC	IMPERMEABILIZACION, INFRAESTRUCTURA SANITARIA, INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
53	DR. ANDRADE 15	DOCTORES	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA SANITARIA	EN PROCESO	80%	B	NO CATALOGADA
54	CALZADA DE LA VIGA 16	ESPERANZA	CUAUHTEMOC	IMPERMEABILIZACION	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
55	CALZADA DE LA VIGA 18	ESPERANZA	CUAUHTEMOC	IMPERMEABILIZACION	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
56	CALZADA DE LA VIGA 30	ESPERANZA	CUAUHTEMOC	PINTURA	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
57	PENSADOR MEXICANO 47	GUERRERO	CUAUHTEMOC	IMPERMEABILIZACION	EN PROCESO	40%	B	NO CATALOGADA



PROSOC

NO.	PREDIO	COLONIA	ALCALDIA	PROYECTO	ESTATUS	PORCENTAJE DE AVANCE	PERÍMETRO	CATALOGACIÓN
58	SANTA VERACRUZ 47	GUERRERO	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
59	VIOLETA 58	GUERRERO	CUAUHTEMOC	HERRERIA (ESCALERAS)	EN PROCESO	30%	B	NO CATALOGADA
60	GALEANA_36	GUERRERO	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA (BOMBA)	EN PROCESO	95%	B	NO CATALOGADA
61	HEROES 54	GUERRERO	CUAUHTEMOC	ESTRUCTURAS	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
62	HEROES 68	GUERRERO	CUAUHTEMOC	ESCALERAS	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA




PROSOC | ene - nov

52.14%

Avance porcentual de obra en proceso*

(*) de una meta de 62 Unidades Habitacionales en el Centro Histórico

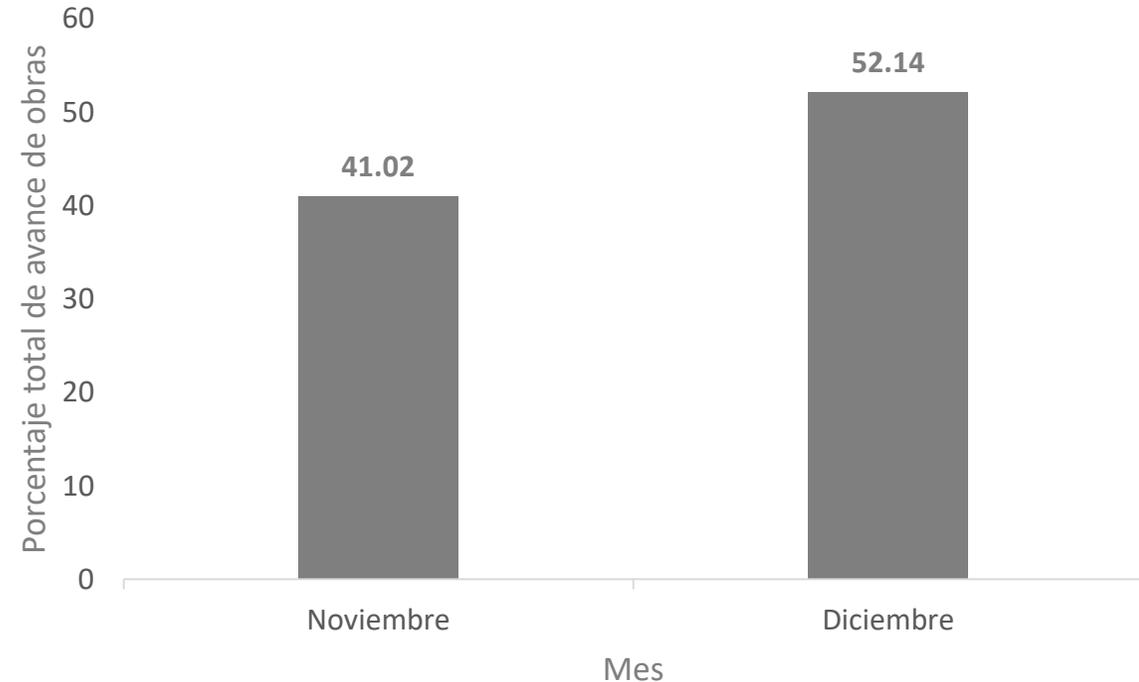



CFE

Actividad	Unidad	OCTUBRE	NOVIEMBRE	TOTAL	Próximo reporte
Limpieza de registros y/o desagües	Piezas	420	355	775	
Registros de robos		7	0	7	10 de diciembre
Atención a las fallas	Eventos	100	84	184	



ADIP

Tema	Indicador	Periodicidad	Reporte al 25/11	Reporte al 02/12	Próximo reporte
Conectividad e Infraestructura Tecnológica	Número de puntos de conexión wifi habilitados en postes de C5 (Línea base: 589)	Semanal	366	371	09/12/2019



589 registros.

Ubicación de puntos de acceso gratuito a internet WIFI vía infraestructura C5 (actuales y próximos)

Filtros activos [Borrar todo](#)

Área dibujada en el mapa
ESTATUS CONECTIVIDAD: WIFI GRATUITO_ACTIVO
ESTATUS CONECTIVIDAD: SIN WIFI

Filtros

Buscar registros...

COLONIA

- CENTRO 297
- GUERRERO 88
- ZONA CENTRO 47
- MORELOS 41
- DOCTORES 22
- EL PARQUE 17
- > Más

ALCALDIA

- CUAUHTEMOC 460
- VENUSTIANO CARRANZA 129

BOTON

- CON BOTON 435
- SIN BOTON 131
- N/A 29

ALTAVOZ

- CON ALTAVOZ 454
- SIN ALTAVOZ 112
- N/A 23

ESTATUS CONECTIVIDAD

- WIFI GRATUITO_ACTIVO 371
- SIN WIFI 218

Información Tabla Mapa Exportar API



Compartir Incluir Widget

[https://datos.cdmx.gob.mx/explore/embed/dataset/ubicacion-acceso-gratuito-internet-wifi-c5/map?ids=unclive:estatus_conectividad&geoFilter.polygon=\[19.446347259158413,-95.14805011354777\],\[19.43568380671](https://datos.cdmx.gob.mx/explore/embed/dataset/ubicacion-acceso-gratuito-internet-wifi-c5/map?ids=unclive:estatus_conectividad&geoFilter.polygon=[19.446347259158413,-95.14805011354777],[19.43568380671)




ADIP | ene - nov

Puntos de conexión WI-FI habilitados

371
Puntos de conexión
WI-FI
habilitados*

(*) de una meta de 589 puntos, representando un avance del 62%

Puntos Wifi

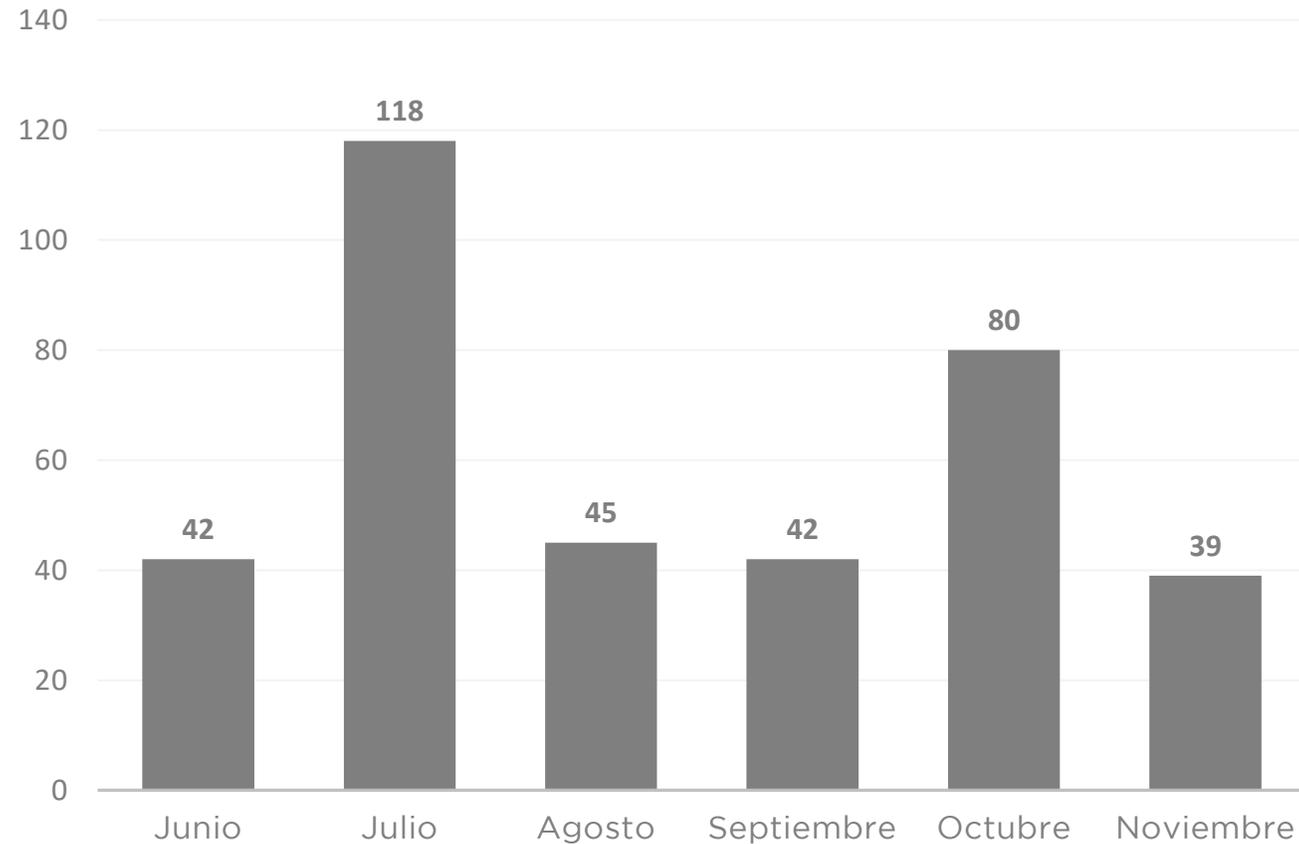



INAH

Tema	Indicador	Periodicidad	Reporte al 25/11	Reporte al 02/12	Próximo reporte	Observaciones
Obras en el Centro Histórico	Número de trámites de solicitud de autorización de obra en inmuebles ubicados en el Centro Histórico	Semanal	0	13	09/12/2019	Anexo 1
	Número de autorizaciones de obra en inmuebles ubicados en el Centro Histórico	Semanal	18	5	09/12/2019	Anexo 2



INAH

Anexo 1. Tramites de solicitudes de autorización de obra en inmuebles ubicados en el "Centro Histórico de la Ciudad de México" ingresados en la Ventanilla Única del 26 de noviembre al 2 de diciembre de 2019

Fecha de ingreso	Ubicación	Nº	Tipo de Obras
26-nov.-19	AYUNTAMIENTO	161	AMPLIACION / MODIFICACION
26-nov.-19	CHAPULTEPEC	67	PRORROGA LIC 602/18
26-nov.-19	SAN JERONIMO	21	MANTENIMIENTO
27-nov.-19	CORREGIDORA	72 B	TOLDO
27-nov.-19	VENUSTIANO CARRANZA	7	SUSTITUCION DE CORTINA METALICA
28-nov.-19	CORREGIDORA	52	TOLDO
28-nov.-19	REP SALVADOR	35	TOLDO
28-nov.-19	MESONES	34	TOLDO (4)
28-nov.-19	REP SALVADOR	62	TOLDO
28-nov.-19	REP BRASIL	33	TERMINACION LIC 342/19
28-nov.-19	REP CHILE	7	REMODELACION
29-nov.-19	REP BOLIVIA	25	PRORROGA DE LICENCIA
2-dic.-19	REP SALVADOR	30	ANUNCIO



INAH

Anexo 2. Autorizaciones de obra en inmuebles ubicados en el Centro Histórico del 26 de noviembre al 2 de diciembre de 2019

Ubicación	Nº	Tipo de obra	Autorización
BUCARELI	118	RESTAURACIÓN	544/19
JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	56	ADECUACIÓN	545/19
INDEPENDENCIA	40	REGULARIZACIÓN	549/19
LORETO	S/N	RESTAURACIÓN DE FUENTE	552/19
AZTECAS	40	DEMOLICIÓN	553/19



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



CENTRO HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

INAH | jul-nov


98

Trámites de autorización ingresados en ventanilla

109

Autorizaciones de Obra emitidas

Gestiones de Obra en Inmuebles del Centro Histórico

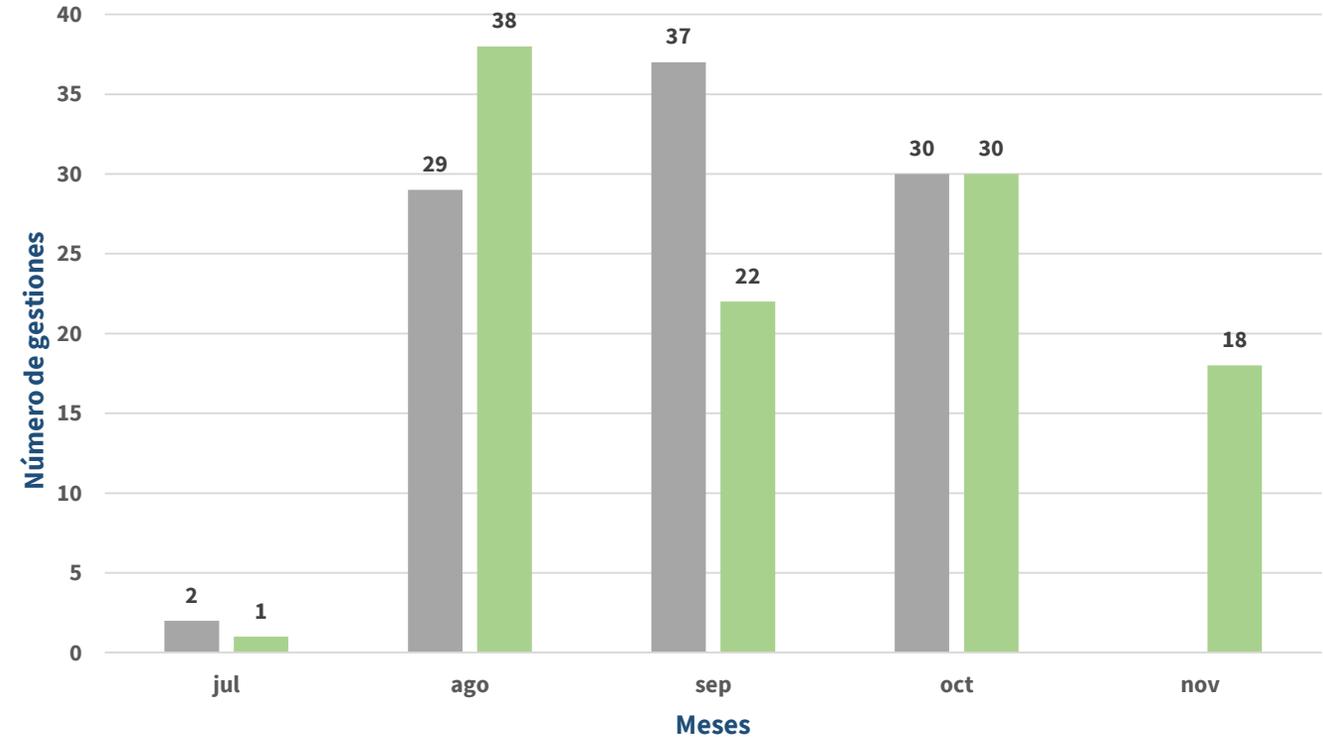

- Suma de Número de trámites de solicitud de autorización de obra en inmuebles ubicados en el Centro Histórico
- Suma de Número de autorizaciones de obra en inmuebles ubicados en el Centro Histórico



INBAL

Tema	Indicador	Periodicidad	Al mes de Octubre	Al mes de Noviembre	Próximo reporte	Observaciones
Obras en el Centro Histórico	Número de solicitudes ingresadas para intervenciones diversas en inmuebles ubicados en el Centro Histórico	Mensual	39	34	07/01/2020	18 solicitudes de información 16 solicitudes de obras menores 0 solicitudes de obras mayores 21 inmuebles catalogados



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



INBAL



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Nº.	CALLE	NÚMERO	COLUMNA	DELEGACIÓN	RESPUESTA	FOLIO	CONDICIÓN	TIPO	TRABAJOS	VIGENCIA	IMAGEN
1	LEANDRO VALLE	24,26,28	CENTRO	CUAUHTÉMOC	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	2397	NO INCLUIDO	INBA-02-003	NO APLICA	UN AÑO	
2	REGINA	385	CENTRO	CUAUHTÉMOC	TRABAJO AUTORIZADO	2398	CONDICIÓN	INBA-02-000	PINTURA EN EXTERIORES E INTERIORES, LIMPIEZA DE FACHADAS, INCLUYENDO ELEMENTOS DE CANTERA, TABIQUE O ALGÚN OTRO MATERIAL PÉTREO, ALBAÑILERÍA SUPERFICIAL EN GENERAL, REPOSICIÓN DE CANCELERÍAS EN PUERTAS Y VENTANAS EN EXTERIORES E INTERIORES, REPOSICIÓN DE PISOS ORIGINALES, ARREGLO Y REPOSICIÓN DE INSTALACIONES HIDRÁULICA, SANITARIA, AIRE ACONDICIONADO Y OTRAS ESPECIALES, COLOCACIÓN DE MURO DE TABLAROCA	UN AÑO	
3	JOSÉ MARÍA IZAZAGA	8	CENTRO	CUAUHTÉMOC	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	2399	INCLUIDO	INBA-02-003	NO APLICA	UN AÑO	
4	MANUEL DOBLADO	84	CENTRO	CUAUHTÉMOC	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	2415	NO INCLUIDO	INBA-02-003	NO APLICA	UN AÑO	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



INBAL



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Nº.	CALLE	NÚMERO	COLONIA	DELEGACIÓN	RESPUESTA	FODO	COLINDANTE	TIPO	TRABAJO	VIGENCIA	IMAGEN
5	EMILIO DONDE	88	CENTRO	CUAUHTÉMOC	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	2420	COLINDANTE	INBA 03-005	NO APLICA	UN AÑO	
6	SAL DEL PUERTO	80	CENTRO	CUAUHTÉMOC	TRABAJO AUTORIZADO	2436	INCLUIDO	INBA 02-006	ARREGLO Y REPOSICIÓN DE INSTALACIONES HIDRÁULICA, SANITARIA, AIRE ACONDICIONADO Y OTRAS ESPECIALES, SIN ALTERACIONES QUE AFECTEN LA ESTRUCTURA O EL DISEÑO DE FACHADAS EXTERIORES E INTERIORES EXISTENTES.	UN AÑO	
7	HIDALGO	35	CENTRO	CUAUHTÉMOC	TRABAJO AUTORIZADO	2437	INCLUIDO	INBA 02-006	ARREGLO Y REPOSICIÓN DE INSTALACIONES HIDRÁULICA, SANITARIA, AIRE ACONDICIONADO Y OTRAS ESPECIALES, SIN ALTERACIONES QUE AFECTEN LA ESTRUCTURA O EL DISEÑO DE FACHADAS EXTERIORES E INTERIORES EXISTENTES.	UN AÑO	
8	COLÓN	S/N	CENTRO	CUAUHTÉMOC	TRABAJO AUTORIZADO	2462	INCLUIDO	INBA 02-006	LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA DUCTERÍA DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, REFORZO A IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO CON TERRACOTA	UN AÑO	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
CULTURA
CENTRO
HISTÓRICO

INBAL



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Nº.	CALLE	NÚMERO	COLONIA	DELEGACIÓN	RESPUESTA	FOLIO	COORDINANTE	TIPO	TRABAJO	VIGENCIA	IMAGEN
9	REPÚBLICA DE HONDURAS	59-62	CENTRO	CUAUHTÉMOC	TRABAJO AUTORIZADO	2470	INCLUIDO	INSA 02-008	PINTURA EN EXTERIORES, REPOSICIÓN DE AFLANADOS EN EXTERIORES.	UN AÑO	
10	REPÚBLICA DE CUBA	68	CENTRO	CUAUHTÉMOC	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	2484	COORDINANTE	INSA 02-003	NO APLICA	UN AÑO	
11	ISABELLA CATÓLICA	36	CENTRO	CUAUHTÉMOC	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	2485	COORDINANTE	INSA 02-003	NO APLICA	UN AÑO	
12	FRANCISCO I. MADRERO	36	CENTRO	CUAUHTÉMOC	TRABAJO AUTORIZADO	2489	INCLUIDO	INSA 02-008	PINTURA EN EXTERIORES E INTERIORES, REPOSICIÓN DE CANCELERÍAS EN PUERTAS Y VENTANAS EN EXTERIORES E INTERIORES, REPOSICIÓN DE PISOS ORIGINALES, REPOSICIÓN TOTAL DE MATERIALES UTILIZADOS EN ACABADOS, AFREGLO Y REPOSICIÓN DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS, SANITARIA, AIRE ACONDICIONADO Y OTRAS ESPECIALES, MUROS DE TABLAFOCA	UN AÑO	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



INBAL



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Nº.	CALLE	NÚMERO	COLONIA	DELEGACIÓN	RESPUESTA	FOUD	COORDINANTE	TIPO	TRABAJO	VIGENCIA	IMAGEN
33	COLÓN	1	CENTRO	CUAUHTÉMOC	TRABAJO AUTORIZADO	2493	INCLUIDO	INBA 02-006	PINTURA EN EXTERIORES E INTERIORES, REPOSICIÓN DE APLAMADOS EN EXTERIORES E INTERIORES	UN AÑO	
34	DR. MORA	11	CENTRO	CUAUHTÉMOC	TRABAJO AUTORIZADO	2494	INCLUIDO	INBA 02-006	PINTURA EN EXTERIORES E INTERIORES, REPOSICIÓN DE APLAMADOS EN EXTERIORES E INTERIORES	UN AÑO	
35	BELISARIO DOMÍNGUEZ	60	CENTRO	CUAUHTÉMOC	TRABAJO AUTORIZADO	2498	INCLUIDO	INBA 02-006	ALBAÑILERÍA SUPERFICIAL EN GENERAL, RESANES, REPOSICIÓN DE ESTUCOS O FRISOS, INCLUYENDO ELEMENTOS DECORATIVOS EN EXTERIORES E INTERIORES	UN AÑO	
36	LECLUBERRI	20	CENTRO	CUAUHTÉMOC	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	2510	NO INCLUIDO	INBA 02-003	NO APLICA	UN AÑO	



INBAL



NÚM.	CALLE	NÚMERO	COLONIA	DELEGACIÓN	RESPUESTA	FOLIO	COLINDANTE	TIPO	TRABAJO	VIGENCIA	IMAGEN
17	MANUEL DOBLADO	28	CENTRO	CUAUHTÉMOC	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	2511	NO INCLUIDO	INBA 02-003	NO APLICA	UN AÑO	
18	ENRICO MARTÍNEZ	35	CENTRO	CUAUHTÉMOC	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	2512	INCLUIDO	INBA 02-003	NO APLICA	UN AÑO	
19	BUCARLI	128	CENTRO	CUAUHTÉMOC	TRABAJO AUTORIZADO	2518	INCLUIDO	INBA 02-006	REPOSICIÓN DE FISOS ORIGINALES, SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN EN AZOTEA CON MEMBRANA PROTEGIDA CON ENLADRILLADO ORIGINAL TIPO PETATILLO	UN AÑO	
20	VIZCAÍNAS	3	CENTRO	CUAUHTÉMOC	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	2519	INCLUIDO	INBA 02-003	NO APLICA	UN AÑO	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



INBAL



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

No.	CALLE	NÚMERO	CELEONIA	DELEGACIÓN	RESPUESTA	FOLIO	COLINDANTE	TPO	TRABAJO	VIDENCIA	IMAGEN
21	CINCO DE MAYO	19	CENTRO	CUALQUÉMOC	TRABAJO AUTORIZADO	2523	INCLUIDO	INBA 02-006	TRABAJO DE MANTENIMIENTO AL PORTÓN Y VENTAS, LIMPIEZA SUPERFICIAL Y RETIRO DE BARNIZ EXISTENTE, APLICACIÓN DE BARNIZ PROMPTENTE MATE	UN AÑO	
22	CINCO DE MAYO	19	CENTRO	CUALQUÉMOC	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	2524	INCLUIDO	INBA 02-008	NO APLICA	UN AÑO	
23	REPÚBLICA DE URUGUAY	25	CENTRO	CUALQUÉMOC	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	2529	INCLUIDO	INBA 02-008	NO APLICA	UN AÑO	
24	FRANCISCO I. MADERO	70	CENTRO	CUALQUÉMOC	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	2531	COLINDANTE	INBA 02-008	NO APLICA	UN AÑO	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
CULTURA
CENTRO
HISTÓRICO

INBAL



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

No.	CALLE	NÚMERO	COLONIA	DELEGACIÓN	RESPUESTA	FOLIO	COLINDANTE	TIPO	TRABAJOS	VIGENCIA	IMAGEN
25	FRANCISCO I. MADERO	70	CENTRO	CUAUHTÉMOC	TRABAJOS AUTORIZADOS	2532	COLINDANTE	INBA 02-006	REPOSICIÓN DE CANCELERÍA EN FUERTAS Y VENTANAS Y RETIRO DE POSTE CENTRAL DE CANCELERÍA EXISTENTE Y COLOCACIÓN DE CRISTALES COMPLETOS DE 12MM TEMPLADOS EN CANCELERÍA LATERALES EXISTENTES	UN AÑO	
26	REVILAGIGEDO	78	CENTRO	CUAUHTÉMOC	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	2535	INCLUIDO	INBA 02-005	NO APLICA	UN AÑO	
27	AV. JUÁREZ	4	CENTRO	CUAUHTÉMOC	TRABAJOS AUTORIZADOS	2541	INCLUIDO	INBA 02-008	LIMPIEZA DE PACHADAS, COLOCACIÓN DE PLACAS DE MARMOL NEGRO, COLOCACIÓN DE ADOSQUIN GRIS, COLOCACIÓN DE CINTA DE PROTECCIÓN,	UN AÑO	
28	MESONES	87	CENTRO	CUAUHTÉMOC	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	2546	COLINDANTE	INBA 02-005	NO APLICA	UN AÑO	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
CULTURA
CENTRO
HISTÓRICO

INBAL



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

No.	CALLE	NÚMERO	COLONIA	DELEGACIÓN	RESPUESTA	FOLIO	EDIFICANTE	TIPO	TRABAJO	VIGENCIA	IMAGEN
29	JOSÉ MARÍA ISAZAGA	34	CENTRO	CUAUHTÉMOC	SOLICITUD DE IMPROVACIÓN	2558	COLINDANTE	INBA 02-003	NO APLICA	UN AÑO	
30	ISABEL LA CATÓLICA	12	CENTRO	CUAUHTÉMOC	SOLICITUD DE IMPROVACIÓN	2573	COLINDANTE	INBA 02-003	NO APLICA	UN AÑO	
31	REPÚBLICA DE URUGUAY	25	CENTRO	CUAUHTÉMOC	SOLICITUD DE IMPROVACIÓN	2576	INCLUIDO	INBA 02-003	NO APLICA	UN AÑO	
32	REPÚBLICA DE URUGUAY	25	CENTRO	CUAUHTÉMOC	TRABAJO AUTORIZADO	2577	INCLUIDO	INBA 02-006	REPOSICIÓN DE APLANADOS EN EXTERIORES E INTERIORES, REPOSICIÓN DE CANCELERÍAS EN PUERTAS Y VENTANAS EN EXTERIORES E INTERIORES	UN AÑO	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
CULTURA
CENTRO
HISTÓRICO

INBAL



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

No.	CALLE	NÚMERO	COLONIA	DELEGACIÓN	RESPUESTA	FOLIO	CONDICIÓN	TIPO	TRABAJO	VIGENCIA	IMAGEN
33	PALMA	43	CENTRO	CUAUHTÉMOC	TRABAJO AUTORIZADO	2578	INCLUIDO	INBA 02-006	ÚNICAMENTE ARREGLO ELECTROMECÁNICA DE ELEVADORES	UN AÑO	
34	FRANCISCO I. MADERO	55	CENTRO	CUAUHTÉMOC	TRABAJO AUTORIZADO	2379	INCLUIDO	INBA 02-006	REPOSICIÓN DE APLANDOS EN INTERIORES, LIMPIEZA DE FACHAS, ALBAÑILERÍA SUPERFICIAL EN GENERAL, REPOSICIÓN DE CANCELERÍA EN PUERTAS Y VENTANAS EN INTERIORES, REPOSICIÓN DE PISOS ORIGINALES EN INTERIORES, ARREGLO Y REPOSICIÓN DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS, SANITARIA, AIRE ACONDICIONADO Y OTROS ESPECIALES	UN AÑO	



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



CENTRO HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

INBAL | feb-nov

162

Solicitudes de información


95

Solicitudes de obras menores

3

Solicitudes de obras mayores

Gestiones de Obra en Inmuebles del Centro Histórico

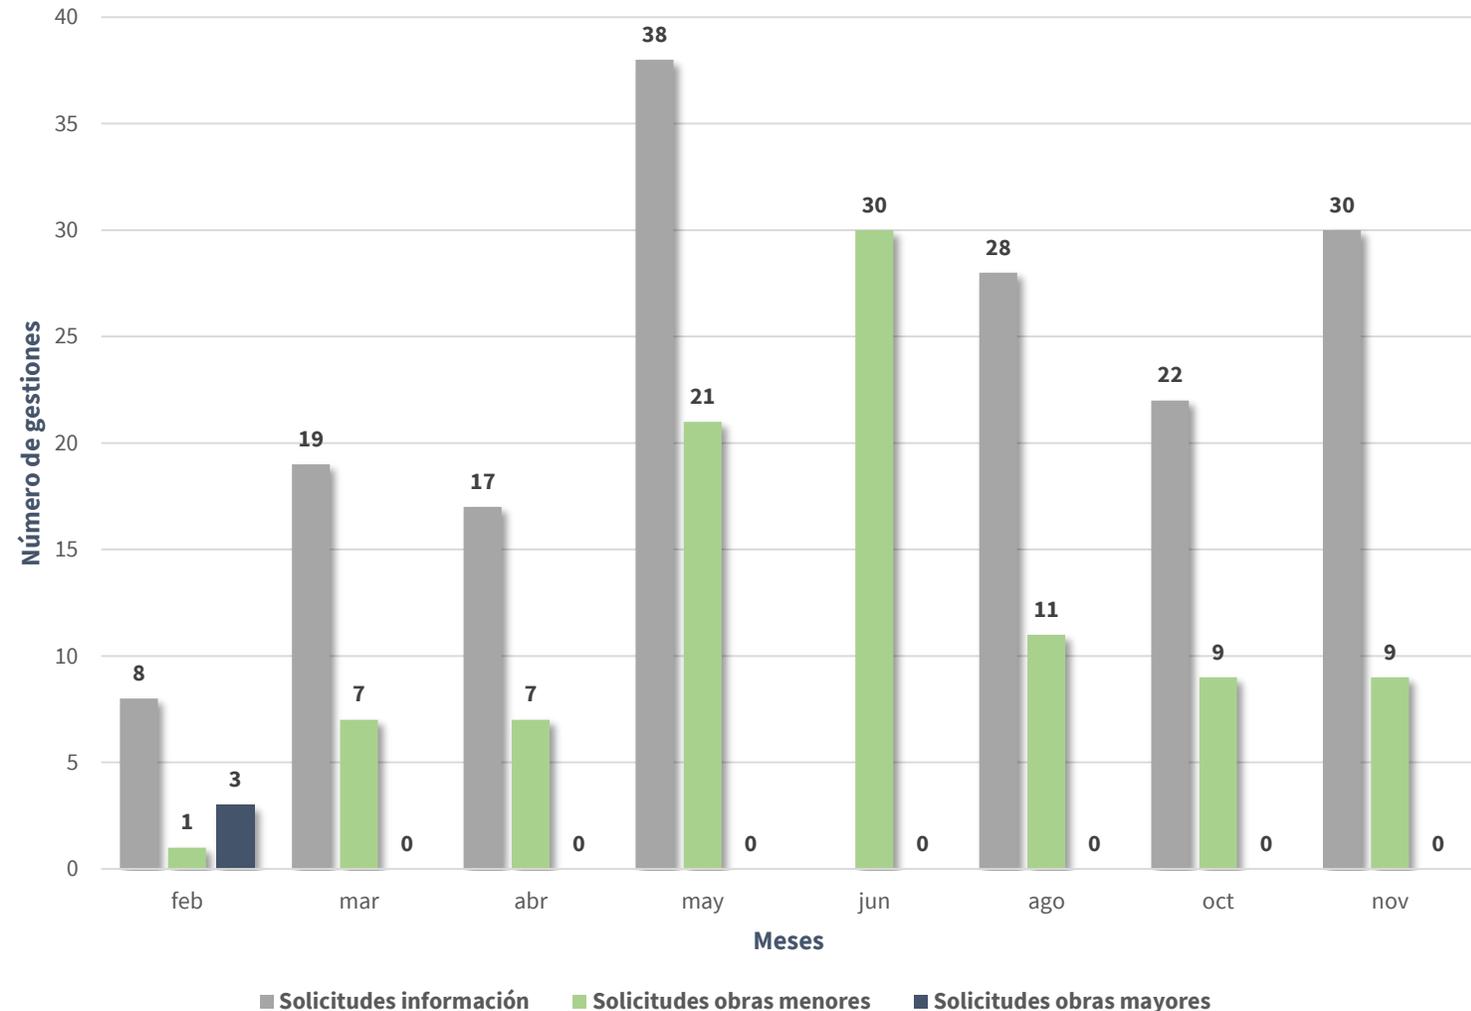



ILIFE

Tema	Indicador	Periodicidad	Al mes de Octubre	Al mes de Noviembre	Próximo reporte
Mantenimiento de escuelas	Porcentaje de avance de mantenimiento de escuelas (línea base: 23 escuelas)	Mensual	89.97%	90.21%	07/01/2020



ILIFE | Inmuebles escolares en proceso de atención 2018 -2019 en Centro Histórico

No.	Plantel	Porcentaje de avance	Observaciones
1	ESCUELA PRIMARIA MIGUEL SERRANO	100.00 %	ENTREGADA JUNIO
2	ESCUELA SECUNDARIA ADRIANA GARCIA CORRAL	42.08 %	
3	ESCUELA SECUNDARIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ SEC TEC No. 6	100.00 %	ENTREGADA ABRIL
4	ESCUELA PRIMARIA REPÚBLICA DE BOLIVIA	100.00 %	ENTREGADA ABRIL
5	ESCUELA PRIMARIA ALFREDO E. URUCHURTU	100.00 %	ENTREGADA ABRIL
6	ESCUELA PRIMARIA PABLO MORENO	100.00 %	ENTREGADA EN SEPTIEMBRE
7	ESCUELA PRIMARIA REPÚBLICA DE ARGENTINA	100.00 %	ENTREGADA ABRIL
8	ESCUELA NACIONAL PARA CIEGOS LIC. IGNACIO TRIGUEROS	100.00 %	ENTREGADA OCTUBRE
9	TELESECUNDARIA NO. 91	88.35 %	
10	ESCUELA PRIMARIA SARA MANZANO	100.00 %	ENTREGADA SEPTIEMBRE
11	ESCUELA PRIMARIA MARCELINO DÁVALOS	62.30 %	
12	ESCUELA PRIMARIA REPÚBLICA DE PANAMÁ	67.80 %	



ILIFE | Inmuebles escolares en proceso de atención 2018 -2019 en Centro Histórico

No.	Plantel	Porcentaje de avance	Observaciones
13	ESCUELA SECUNDARIA JOSÉ MANUEL RAMOS	100.00 %	ENTREGADA OCTUBRE
14	ESCUELA PRIMARIA ABRAHAM CASTELLANOS	100.00 %	ENTREGADA ABRIL
15	ESCUELA SECUNDARIA ÁNGEL TRÍAS ÁLVAREZ	86.50 %	
16	JARDÍN DE NIÑOS CADETES DE LA NAVAL	100.00 %	ENTREGADA OCTUBRE
17	ESCUELA SECUNDARIA NO. 1 CÉSAR A. RUÍZ	100.00 %	SE CONCLUYERON TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE BARDA EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019 POR PARTE DE LA FUNDACIÓN ROBERT BOSCH
18	JARDÍN DE NIÑOS ENRIQUE PESTALOZZI	100.00 %	ENTREGADA OCTUBRE
19	ESCUELA PRIMARIA FRAY PEDRO DE GANTE	100.00 %	ENTREGADA OCTUBRE
20	ESCUELA PRIMARIA JOAQUÍN GARCÍA ICAZBALCETA	28.00 %	
21	JARDÍN DE NIÑOS JUAN JACOBO ROUSSEAU	100.00 %	ENTREGADA OCTUBRE
22	ESCUELA PRIMARIA LIC. PONCIANO ARRIAGA	100.00 %	ENTREGADA OCTUBRE
23	ESCUELA PRIMARIA REPÚBLICA DE LÍBANO	100.00 %	ENTREGADA OCTUBRE




ILIFE | ene - nov

89.9%

Avance porcentual de obra en proceso*

(*) de una meta de 23 escuelas en el Centro Histórico

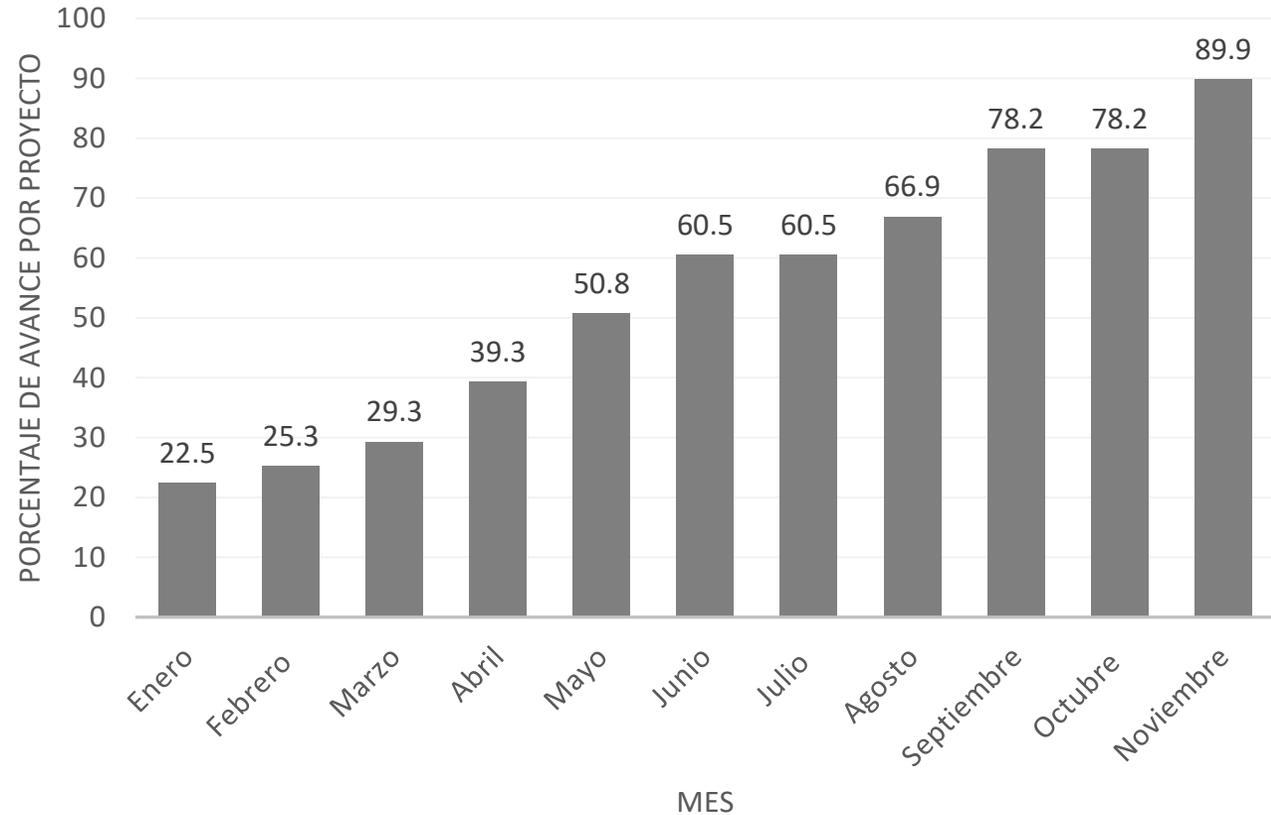



SEDEMA

Tema	Indicador	Periodicidad	Al mes de Octubre	Al mes de Noviembre	Próximo reporte	Observaciones
Obras en el Centro Histórico	Número de permisos de obra otorgados en el Centro Histórico	Mensual		1	07/01/2020	<p>Permiso: Declaratoria de cumplimiento ambiental</p> <p>Descripción: Construcción de la Ciclovía Centro 1</p> <p>Ubicación: Tramo Diagonal 20 de noviembre entre Eje Central a calle 20 de noviembre, tramo eje 2 norte entre Paseo de la Reforma a Camarones, varias colonias, alcaldías Cuauhtémoc y Azcapotzalco</p> <p>Promovente: Dirección General de Obras de Infraestructura Vial de la Secretaría de Obras y Servicios (sobse).</p>




SEDEMA | jun - oct

Sujetos forestales plantados

172

Sujetos forestales plantados

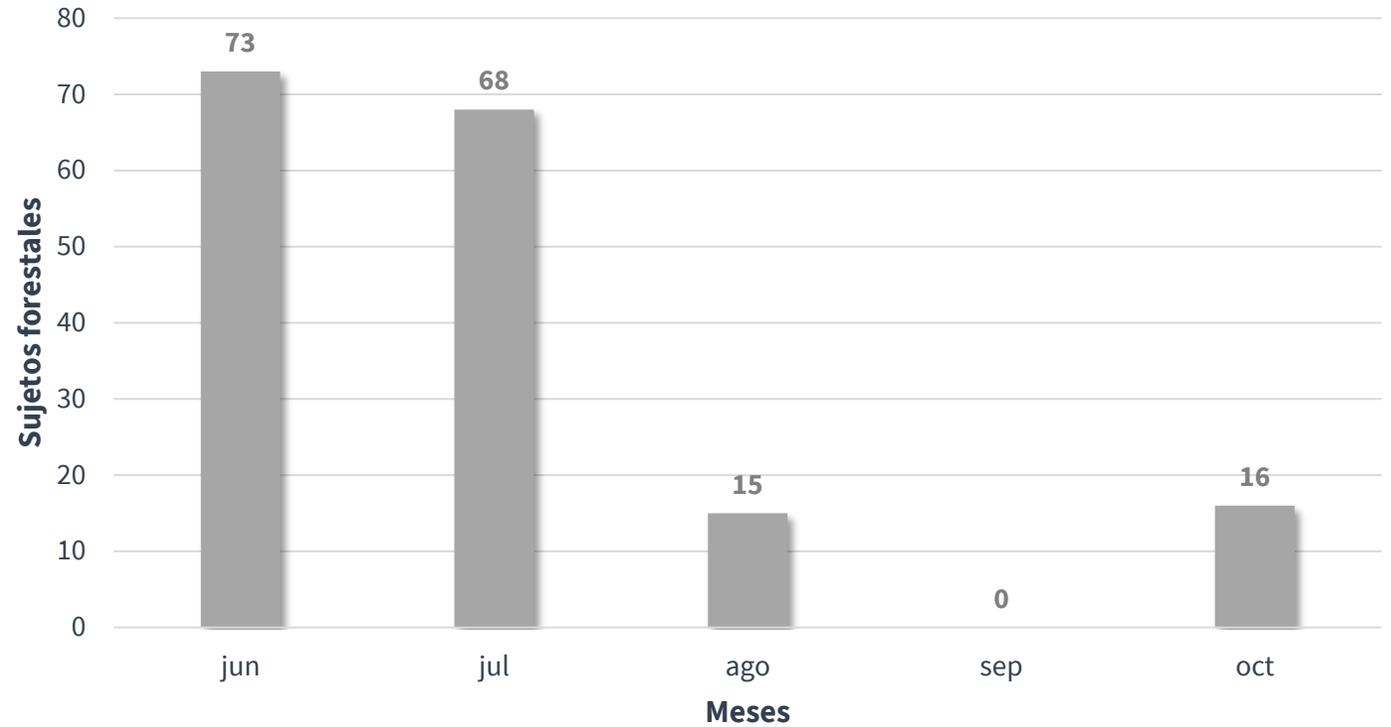

¿Dónde?

1. Tacuba
2. Venustiano Carranza
3. República de Uruguay
4. Mesones
5. Palma
6. Francisco I. Madero
7. 5 de mayo
8. Regina



SEDECO

MESAS DE TRABAJO DE LA AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO 2019 INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR SEDECO

Ciudad de México, a 3 de diciembre de 2019

USO Y APROVECHAMIENTO DE GRASAS Y ACEITES RESIDUALES DE ORIGEN ANIMAL Y VEGETAL, EN LOS MERCADOS PÚBLICOS:

La propuesta presentada para inclusión a los LINEAMIENTOS PARA LA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS MERCADOS PÚBLICOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, en revisión del Área jurídica de la SEDECO.

MEJORA DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN LOS 329 MERCADOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO:

Derivado de las supervisiones a la infraestructura por SEDECO, mediante oficios diversos se solicitó a las Alcaldías la atención de las instalaciones eléctricas entre otros. Se está desarrollando base de datos para identificar los mercados con mayor prioridad de atención en torno a sus instalaciones eléctricas (internas y externas).

Primera etapa: Se presentará análisis detallado de las necesidades de los 32 mercados públicos del C. H. en la Mesa de Trabajo de Infraestructura y Obras, el próximo 10 de diciembre del 2019. A la fecha se tiene identificado lo siguiente:

TOTALES	Internas	19
	Externas	2
	Ambas	6
	No requieren	5
Gran total de Mercados		32

Para el logro de esta mejora será indispensable la participación de las Alcaldías y CFE. Aunado a esto, se realizaría la REVISIÓN DEL CABLEADO ESTRUCTURADO (video, voz, datos y señal) con el apoyo de Teléfonos de México (TELMEX).



SEDECO

Programa para el Fomento y Mejoramiento de los Mercados Públicos de la Ciudad de México

Estatus al 3 de diciembre 2019

Alcaldía	Mercado	Obra y Servicio	Fecha de inicio	Fecha término	AVANCE			2da. visita
					Empresa	Importe del Contrato	Avance físico	
Cuauhtémoc	San Camilito	REHABILITACIÓN	01/08/2019	21/12/2019	COMERCIALIZADORA Y DESARROLLO INMOBILIARIO VILALVA, S.A. DE C.V.	6,669,870.46	62 %	30/10/19
Cuauhtémoc	Lagunilla Ropa y Telas	REHABILITACIÓN	01/08/2019	21/12/2019	PROYECCIÓN Y DISEÑO EN CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	13,307,986.69	65%	07/11/19
Cuauhtémoc	San Juan Curiosidades	REHABILITACIÓN	30/07/2019	21/12/2019	DESARROLLO E INGENIERÍA DE OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V.	32,346,718.04	30%	30/11/19

NOTA: El mercado San Juan Curiosidades, fue afectado por el sismo del 19 de septiembre de 2017.

Se atendió el LOCAL SINIESTRADO la semana pasada y el día se mañana se coloca. Se mueven DOS locales temporales sobre calle Aranda para mejorar las condiciones comerciales.,



SEDECO

MERCADO SAN JUAN CURIOSIDADES



La población vulnerable en situación de calle, se instala detrás de los locales de reubicación temporal del mercado, en las jardineras y en las canchas, de la Plaza de San Juan (buen tono) ubicados en las calles de Ayuntamiento y Ernesto Pugibet.



SEDECO

Obra de restitución y reconstrucción de mercados (siniestrados por incendio en febrero 2013)


Estatus al 3 de diciembre 2019

Alcaldía	Mercado	NO. OFICIAL	ACCIONES REALIZADAS		
			TEMA	PERÍODO	OBSERVACIONES
Venustiano Carranza	Merced Nave Mayor	102	- Reubicación de locatarios	Del 13 al 3 de diciembre del 2019	En coordinación con la Alcaldía, la Subsecretaría de Programas de Alcaldías de la Secretaría de Gobierno y SEDECO, se continúan realizando MESAS DE DIÁLOGO con representaciones y la comisión del mercado de la zona afectada para la distribución de locales en las carpas de la reubicación temporal.
					Estatus actual:
Venustiano Carranza	Merced Banquetón	109			Se arregló carpa para reubicar locatarios en cerrada de Rosario con una capacidad alrededor de 90. Se baliza y esta semana se comenzará con la instalación eléctrica.
					Se ha logrado reubicar a los locatarios del Mercado Banquetón de la puerta 17 a la 22 y los de Nava Mayor de las primeras islas cercanas al Banquetón. Toda esta zona se quedó tapiada y Obras está realizando demoliciones.



C5


Grafiti – robo de cable y/o tapas y coladeras enero a noviembre 24

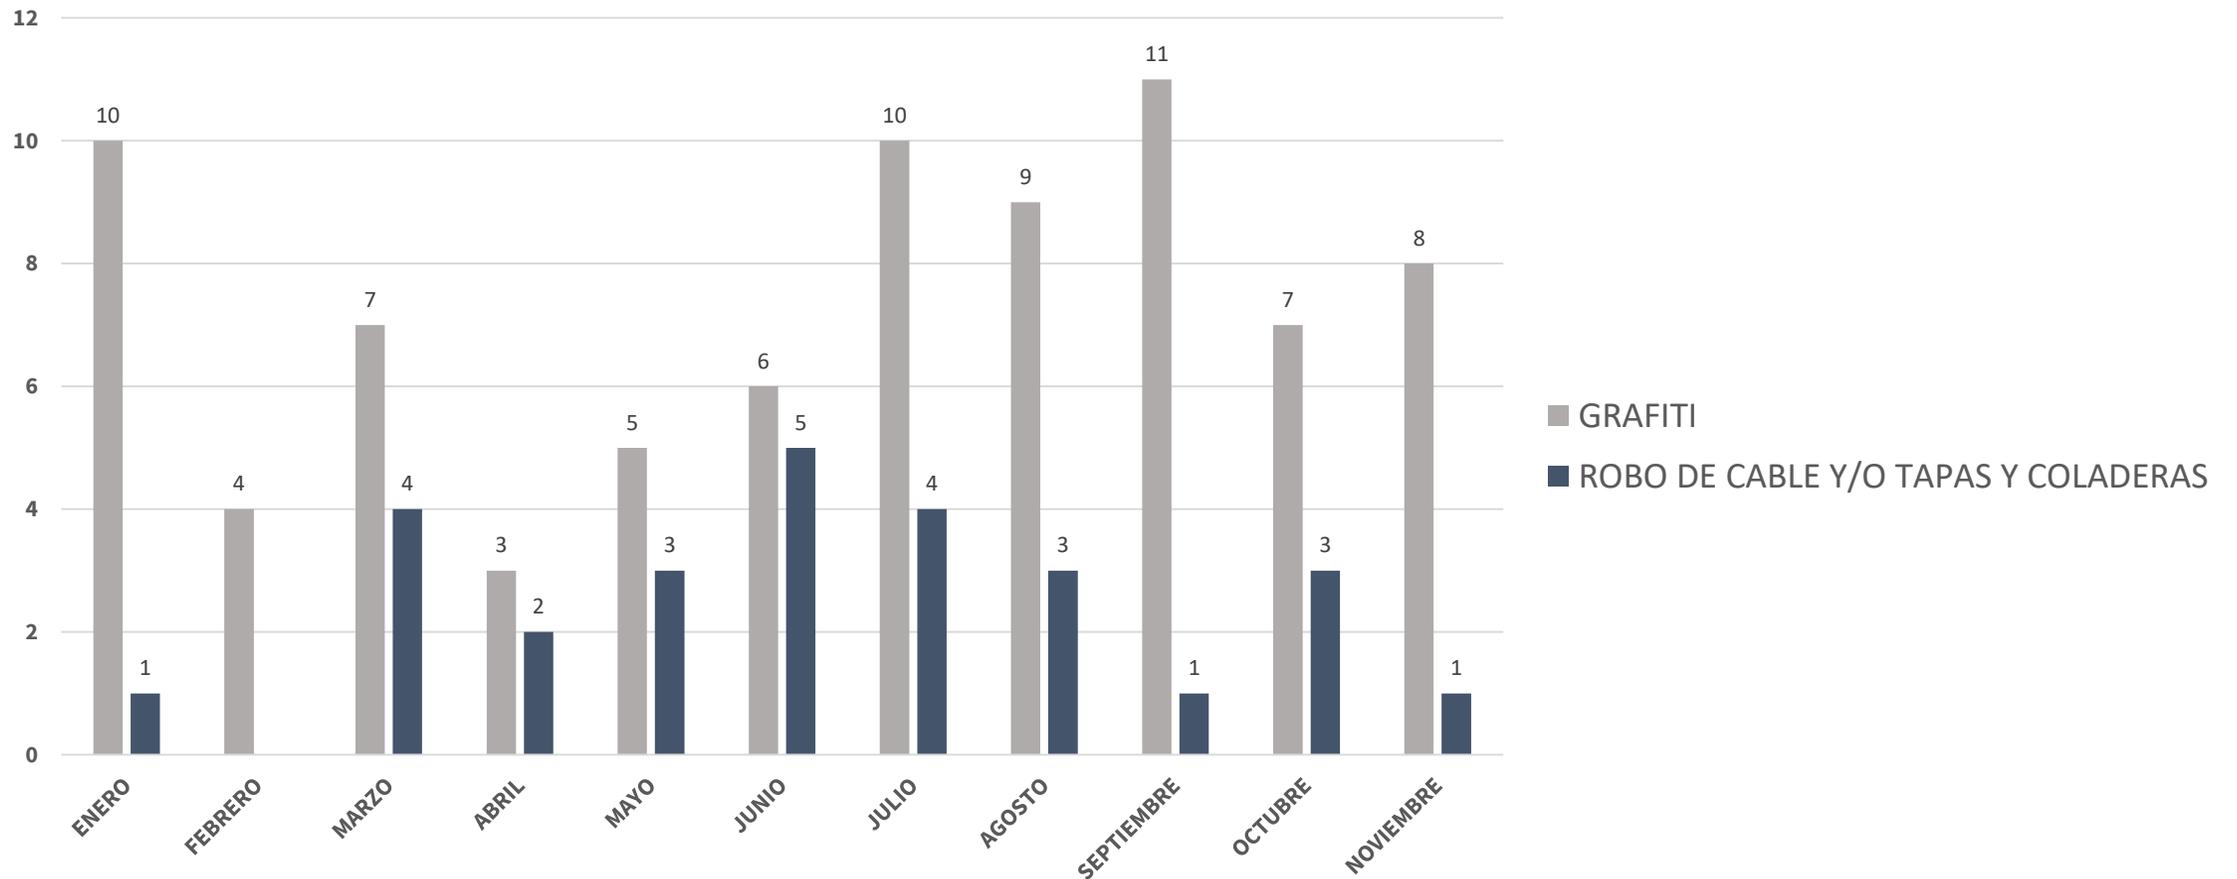




PGJ

Histórico de carpetas de investigación por robo de elementos de enero a noviembre

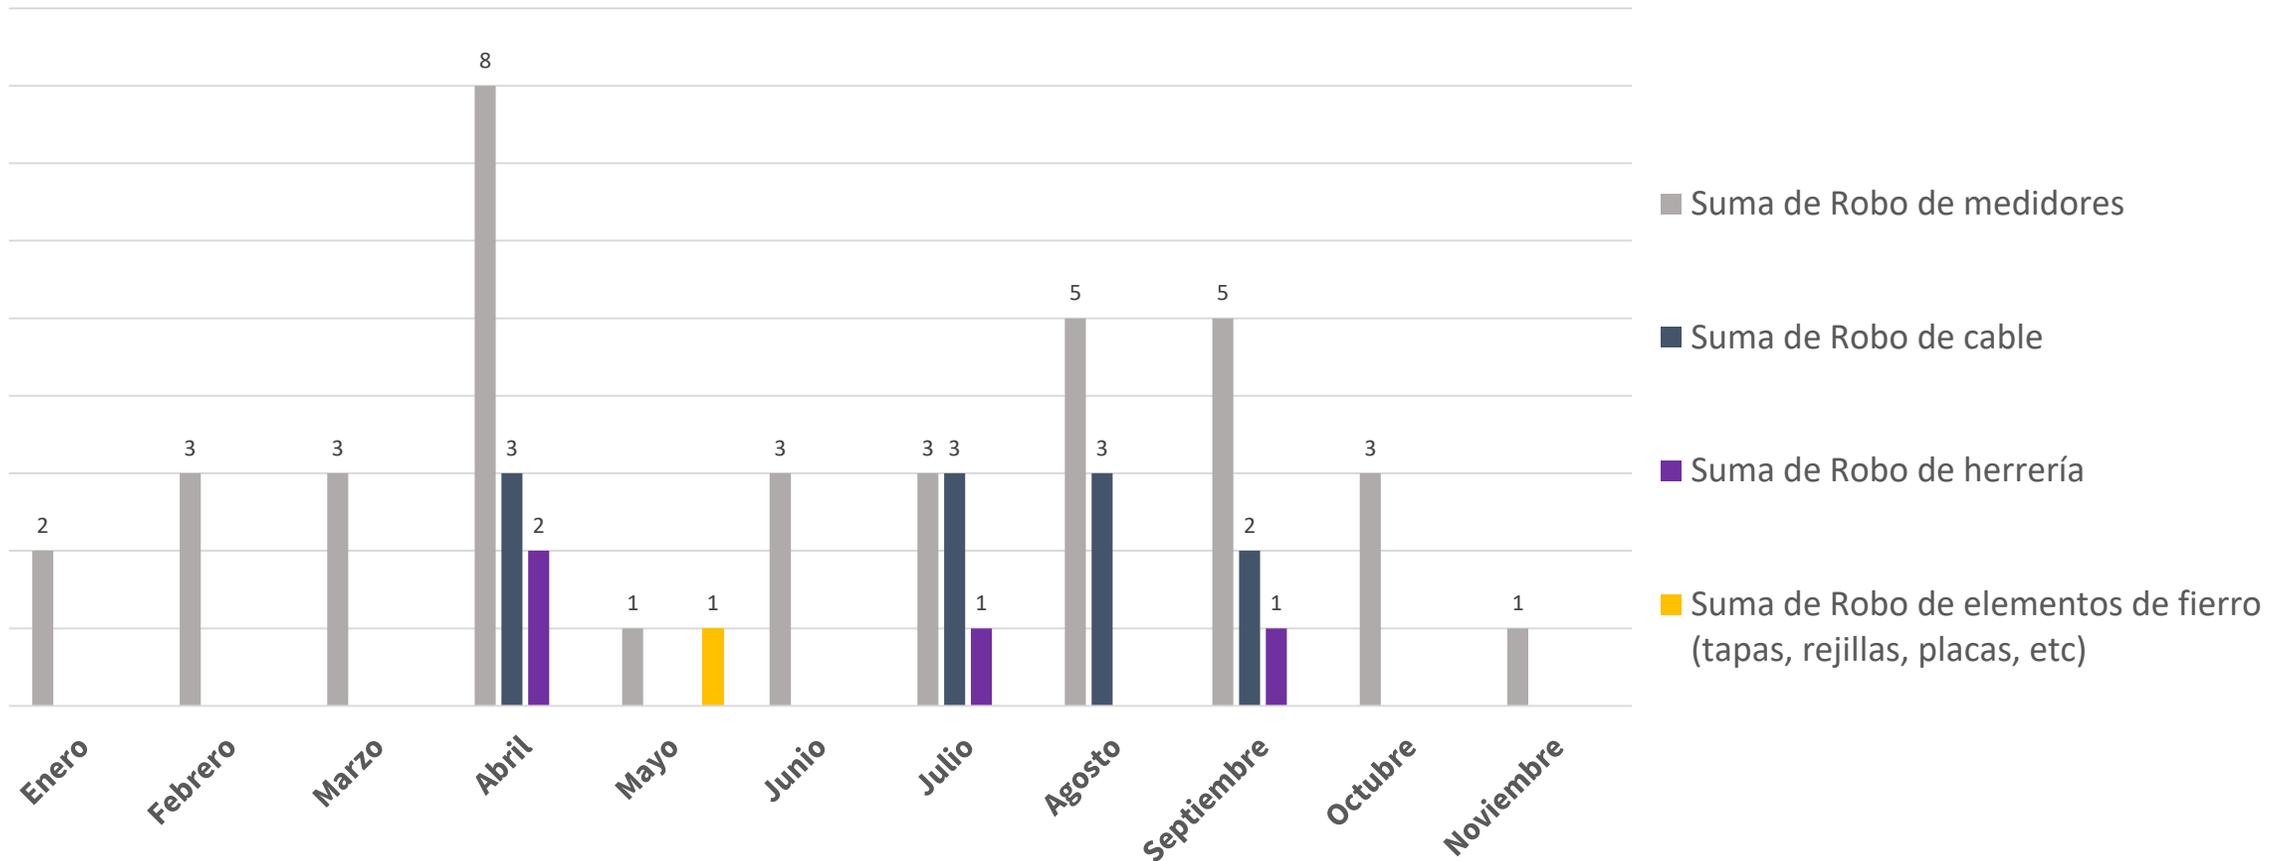



SSC – SCT – DSOT (Tránsito)

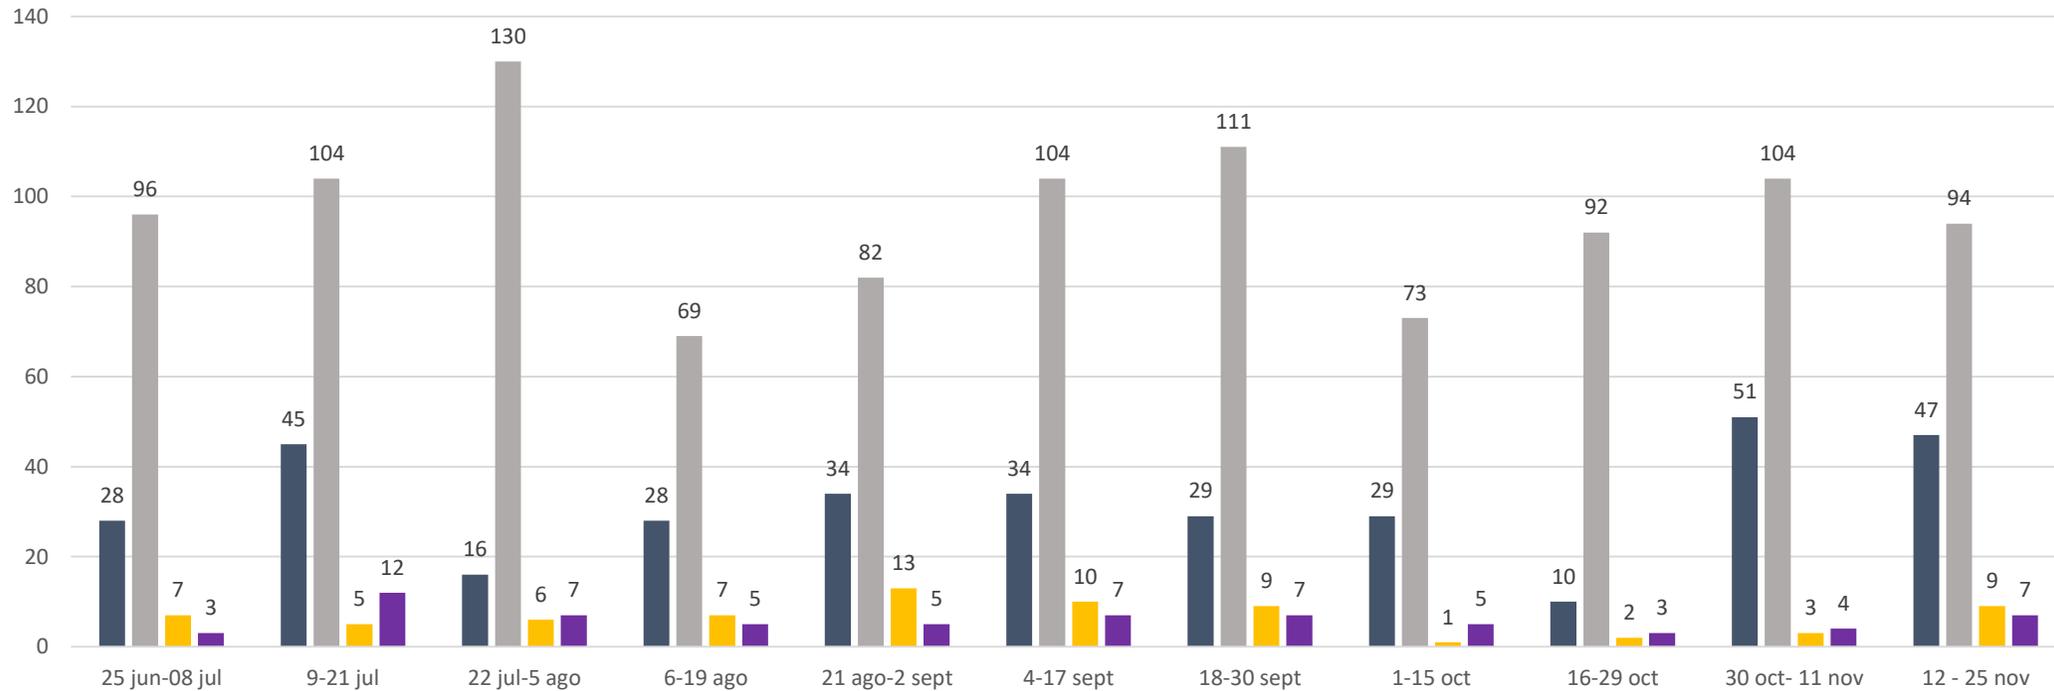

■ Número de semáforos con mantenimiento preventivo

■ Número de semáforos con mantenimiento correctivo por falla

■ Número de cámaras con mantenimiento preventivo

■ Número de cámaras con mantenimiento correctivo por falla



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
CULTURA
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Orden del día

Reportes

Turnos e incidencias urbanas

Mesas de trabajo

Asuntos generales

Acuerdos

Asistencia

Corte de transmisión



Matriz de seguimiento a turnos Enero a Noviembre



Dependencia	Atendido	Proceso	Pendiente	Total general
ACH	29	6		35
ADIP	1			1
Al. Cuauhtémoc	15	3		18
Al. Venustiano Carranza	5	1	1	7
C5	6	1		7
CFE	7	2		9
ILIFE	1			1
INAH	3			3
Metrobús	1			1
PGJ	3			3
SACMEX	9	1		10
SEDEMA	6	3		9
SEMOVI	1			1
SGIRPC	1			1
SOS-AP	4	1		5
SOS-DGOIV	7	1		8
SOS-DGSUS	2			2
SSC	8			8
STC-METRO	1			1
TELMEX	3			3
Tránsito	6	1		7
Total general	119	20	1	140



TURNOS ATENDIDOS

Del 26 de noviembre al 02 de diciembre

CLAVE	FECHA DE REPORTE	SOLICITANTE	SOLICITUD	ATIENDE	ESTATUS	FECHA DE ATENCIÓN	OBSERVACIONES
TCH-147	26/11/2019	Al. Cuauhtémoc	Repare el semáforo de Comonfort y Eje 1, que lleva tres días sin funcionar	Tránsito	Atendido	27/11/2019	Revisión general instala 110 metros de cable 6 x 16 subterráneos, revisa 9 registros y conexión de cables queda trabajando .
TCH-152	26/11/2019	SOS-DGOIV	Realice cierre de circulación de Guatemala y Leona Vicario a partir de mañana 27 de noviembre al lunes 1 de diciembre para realizar trabajos.	Tránsito	Atendido	26/11/2019	Mesa de Reordenamiento



TURNOS EN PROCESO

Del 26 de noviembre al 02 de diciembre



CLAVE	FECHA DE REPORTE	SOLICITANTE	SOLICITUD	ATIENDE	ESTATUS	FECHA DE ATENCIÓN	OBSERVACIONES
TCH-142	26/11/2019	ACH	Checar la coladera que se acaba de instalar que tiene olores fétidos en Soledad y Margil.	SACMEX	Proceso		
TCH-144	26/11/2019	CFE	Gestionar apoyo de SSC, Vía Pública para que puedan realizar mantenimiento de su infraestructura bloqueada por puestos de comercio y garanticen la seguridad de los trabajadores en Correo Mayor, Venezuela y Cuba	ACH	Proceso		
TCH-145	26/11/2019	Tránsito	Gestionar apoyo de SSC, Vía Pública para que puedan realizar mantenimiento de su infraestructura bloqueada por puestos de comercio y garanticen la seguridad de los trabajadores en Carretones	ACH	Proceso		
TCH-146	26/11/2019	ACH	Se verifique la zona de Soledad y Margil que desde el sismo tiene muchos desfases y fallas de luz	CFE	Proceso		
TCH-148	26/11/2019	ACH	Realice un análisis y lo comparta en la próxima Mesa sobre si en las zonas donde se da la variación de voltaje que provoca fallas se debe a los diablitos que se conectan en la temporada navideña para poder contar con su ubicación y canalizarlos a Secretaría de Gobierno para su atención	CFE	Proceso		
TCH-149	26/11/2019	FCH	Para reponer los bolardos que se quitaron de Santo Domingo para la filmación de la película	ACH	Proceso		
TCH-150	26/11/2019	SOS-DGOIV	Gestionar reunión con la Alcaldía Cuauhtémoc para ver todos los temas pendientes de reforestación y poda en las zonas de obras.	ACH	Proceso		



Matriz de seguimiento a Incidencias del 01 de enero al 02 de diciembre



Dependencia	Atendido	Pendiente	Proceso	Total general
ACH	1,273	23	2	1,298
Al. Cuauhtémoc	27	29	2	58
Al. Venustiano Carranza	4			4
C-5	2	1		3
CFE	95	86	9	156
CUS		2		2
IUSACELL		2		2
MCM TELECOM		1		1
SACMEX	116	30	3	149
SEDEMA		1	2	3
SGIRyPC	1			1
SOS-AP	113	20	1	100
SOS-DGOIV	11	20		28
SOS-DGOP		1		1
SOS-DGSUS		7		6
STC-METRO	3			3
TELMEX	48	10	1	47
TOTAL PLAY			1	1
Tránsito	34	2		27
Total general	1,727	235	21	1,983



Atención VIPPSC



VIPP 2. PLAZA DE LA CONCEPCIÓN CALLEJÓN DEL 57

Peticiones atendidas vía chat del 26 de noviembre al 02 de diciembre



TOTAL	TEMA	UBICACIÓN	CALLE	Y CALLE	ATENDIÓ
1	Reparación de semáforo	Eje 1 Norte	Comonfort		Tránsito



Atención VIPPSC



VIPP 3. SANTO DOMINGO

Peticiones atendidas vía chat del 26 de noviembre al 02 de diciembre



TOTAL	TEMA	UBICACIÓN	CALLE	Y CALLE	ATENDIÓ
1	Reparación de alumbrado público	República de Bolivia	Del Carmen	República de Argentina	SOS-AP



VIPP 4. ALAMEDA SECTOR FINANCIERO

Peticiones atendidas vía chat del 26 de noviembre al 02 de diciembre



TOTAL	TEMA	UBICACIÓN	CALLE	Y CALLE	ATENDIÓ
1	Reparación de alumbrado público	Av. Juárez	Paseo de la Reforma	Dolores	SOS-AP



VIPP 7. VIZCAÍNAS CORREDOR CULTURAL REGINA

Peticiones atendidas vía chat del 26 de noviembre al 02 de diciembre



TOTAL	TEMA	UBICACIÓN	CALLE	Y CALLE	ATENDIÓ
1	Recolocación de tapa de registro	Isabel la Católica	Regina	San Jerónimo	CFE



INCIDENCIAS PENDIENTES

Del 26 de noviembre al 02 de diciembre



FECHA DE REPORTE	IDENTIFICA	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	REFERENCIA	FOTOGRAFIA ANTES	FOTOGRAFIA DESPUES	ATIENDE	ESTATUS
26/11/2019	VIPPS Antigua Merced Nizaco	Roda de árboles	MARGL		SOLEDAD	Esquina			AL Cuauhtémoc	Pendiente
27/11/2019	UOP 3 Santo Domingo	Falla en suministro de energía eléctrica	REPUBLICA DE ECUADOR						DRE	Pendiente
27/11/2019	UOP 3 Santo Domingo	Falla en alumbrado público	REPUBLICA DE ECUADOR						SCS-AP	Pendiente
27/11/2019	VIPPS Antigua Merced Nizaco	Fuga de agua potable	LEONA VICARIO		REPUBLICA DE GUATEMALA	Esquina			SACMEX	Pendiente



INCIDENCIAS PENDIENTES

Del 26 de noviembre al 02 de diciembre



FECHA DE REPORTE	IDENTIFICA	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS
27/11/2019	VIPP 6 Antigua Merced Mixcalco	Tapa de caja de válvulas en mal estado	MANZANARES		EJE 1 ORIENTE (ANILLO DE CIRCUNVALACION)	Esquina			SACMEX	Pendiente
27/11/2019	Al. Cuauhtémoc	Tapa de boveda rota	INDEPENDENCIA	EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	LÓPEZ	Frente al No. 10			CFE	Pendiente
28/11/2019	VIPP 3 Santo Domingo	Falta en suministro de energía eléctrica	REPÚBLICA DE HONDURAS	ALLENDE	REPUBLICA DE CHILE				CFE	Pendiente
28/11/2019	VIPP 1 Santa María la Redonda	Falta en suministro de agua potable	VIOLETA	ZARCO	HEROES	No. 35			SACMEX	Pendiente
28/11/2019	VIPP 3 Santo Domingo	Desazolve por colector principal saturado	COMONFORT	REPÚBLICA DE HONDURAS	REPUBLICA DE PARAGUAY				SACMEX	Pendiente
28/11/2019	VIPP 2 Callejón del 57 Plaza de la Concepción	Falta en alumbrado público	REPÚBLICA DE HONDURAS	COMONFORT	INCAS	Frente al deportivo Guelatoo			Al. Cuauhtémoc	Pendiente



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



INCIDENCIAS PENDIENTES

Del 26 de noviembre al 02 de diciembre



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

FECHA DE REPORTE	IDENTIFICACION	SOLICITUD	UBICACION	ENTRE CALLE	Y CALLE	REFERENCIA	FOTOGRAFIA ANTES	FOTOGRAFIA DESPUES	ATIENDE	ESTATUS
29/11/2019	VIPP 5 Zocalo	Tapa de registro desnivelada	MONEDA		CORREO MAYOR	Esquina			TELMEX	Pendiente
29/11/2019	VIPP 5 Zocalo	Tapa de registro desatornillada	20 DE NOVIEMBRE	VENUSTIANO CARRANZA	PLAZA DE LA CONSTITUCION				CFE	Pendiente
29/11/2019	VIPP 2 Callejón del 57 Plaza de la Concepción	Falla en alumbrado público	REPÚBLICA DE PERÚ	EJE CENTRAL LAZARO CÁRDENAS	ALLENDE				SOS-AP	Pendiente



INCIDENCIAS PENDIENTES

Del 26 de noviembre al 02 de diciembre



FECHA DE REPORTE	IDENTIFICA	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS
29/11/2019	VIPP 1 Santa María la Redonda	Falla en caja de luz	OBRAJE			No. 5			CFE	Pendiente
30/11/2019	VIPP 6 Antigua Merced Mixcalco	Fuga de agua potable	JESÚS MARÍA		REPÚBLICA DE GUATEMALA				SACMEX	Pendiente
30/11/2019	VIPP 1 Santa María la Redonda	Falla en suministro de energía eléctrica	OBRAJE			No. 3, 11 y 15			CFE	Pendiente
01/12/2019	VIPP 3 Santo Domingo	Falla en suministro de energía eléctrica	REPÚBLICA DE COLOMBIA		RODRÍGUEZ PUEBLA	Esquina			CFE	Pendiente



INCIDENCIAS PENDIENTES

Del 26 de noviembre al 02 de diciembre



FECHA DE REPORTE	IDENTIFICA	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS
02/12/2019	Al Cuauhtémoc	Bóveda colapsada	LUIS MOYA		DELICIAS	Esquina			TELMEX	Pendiente
02/12/2019	VIPP 3 Santo Domingo	Falta tapa de registro	REPÚBLICA DE PERÚ		REPÚBLICA DE CHILE	Esquina			TELMEX	Pendiente
02/12/2019	VIPP 3 Santo Domingo	Falla en alumbrado público	REPÚBLICA DE CHILE	BELISARIO DOMÍNGUEZ	REPÚBLICA DE PERÚ				SOS-AP	Pendiente



INCIDENCIAS PENDIENTES

Del 26 de noviembre al 02 de diciembre



FECHA DE REPORTE	IDENTIFICA	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS
02/12/2019	VIPP 3 Santo Domingo	Falla en alumbrado público	REPÚBLICA DE PERÚ		REPÚBLICA DE CHILE	Esquina			SOS-AP	Pendiente
02/12/2019	VIPP 2 Callejón del 37 Plaza de la Concepción	Falla en alumbrado público	MARIANA DEL TORO DE LAZARIN	ALLENDE	REPÚBLICA DE CHILE				SOS-AP	Pendiente



Orden del día

Reportes

Turnos e incidencias urbanas

Mesas de trabajo

Asuntos generales

Acuerdos

Asistencia

Corte de transmisión



Orden del día

Reportes

Turnos e incidencias urbanas

Mesas de trabajo

Asuntos generales

Acuerdos

Asistencia

Corte de transmisión



¡BIENVENIDOS!

radical mestizo

FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA DEL MUNDO


PARA FACILITAR TU INGRESO LOS DÍAS 7 Y 8 DE DICIEMBRE, ENLISTAMOS LOS OBJETOS **NO PERMITIDOS** EN LA PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN:

- VIDRIO, LATAS Y HIELERAS
- ARMAS DE FUEGO O PUNZOCORTANTES
- RAYOS LÁSER, CORNETAS Y PIROTECNIA
- PARAGUAS
- AEROSOLES Y DESODORANTES
- BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y ESTUPEFACIENTES
- CADENAS LARGAS O JOYERÍA CON PICOS
- MASCOTAS

SÁBADO 7, 12 HORAS
GOGOL BORDELLO
ORISHAS FEMI KUTI 47 SOUL
RED BARAAT MICHELLE BLADES
KUMBIA QUEERS LOS COGELONES

DOMINGO 8, 17 HORAS
RESIDENTE
ALEMÁN XIMBO
 SIEMPRE ENTRADA LIBRE



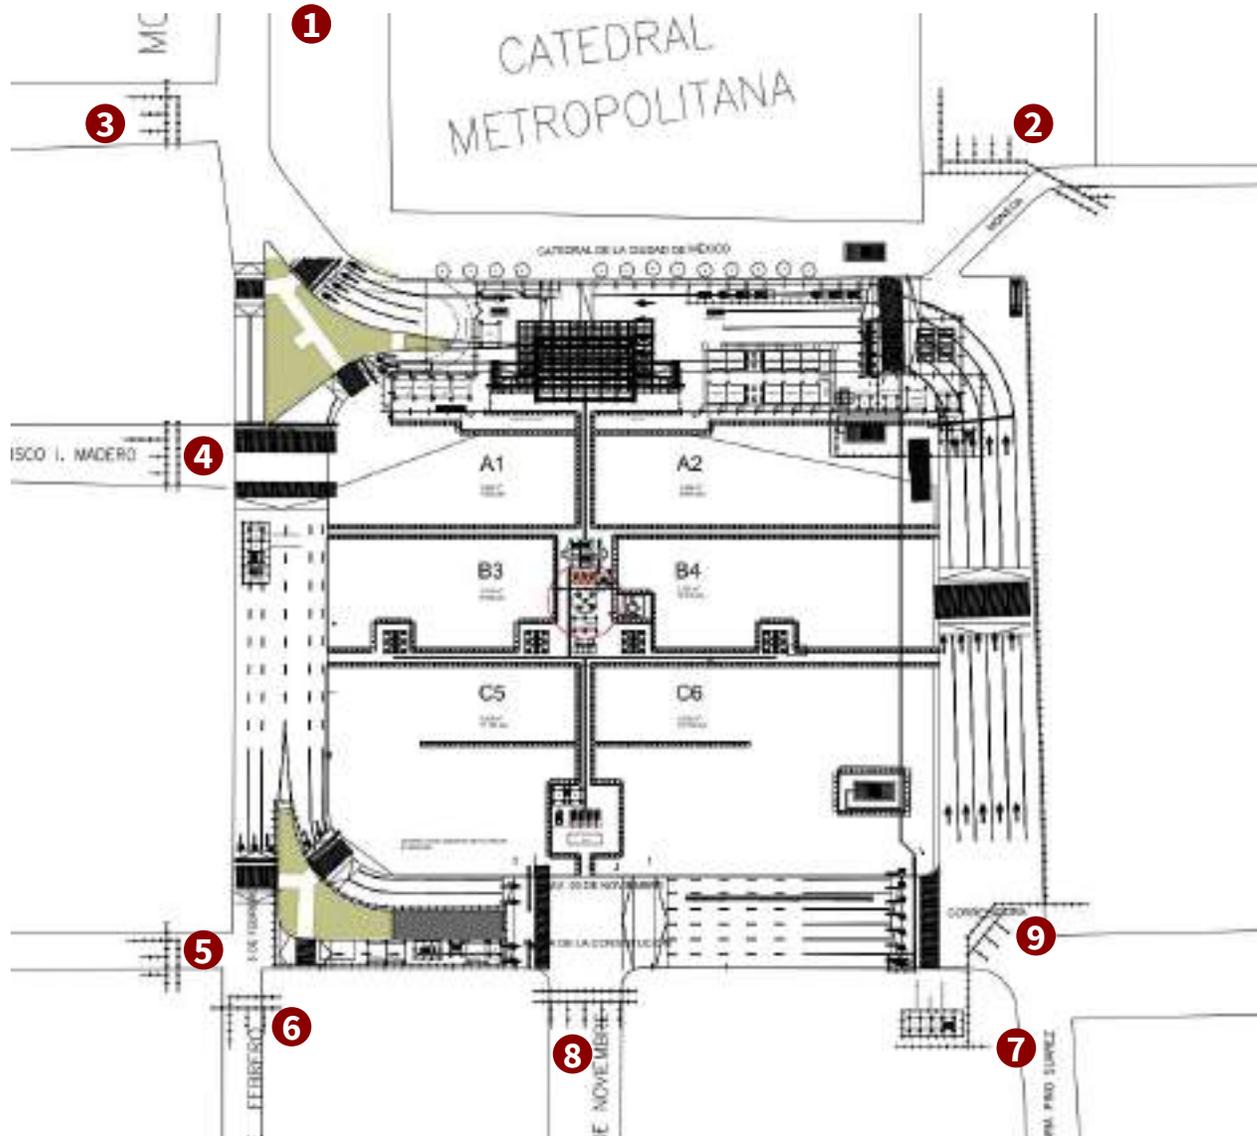

Los accesos para el público serán:

1. Brasil y Tacuba
2. Moneda y plaza Seminario al paño del arroyo vehicular del zócalo
3. 5 de Mayo
4. Madero
5. 16 de septiembre (a la altura de Palma)
6. 5 de febrero
7. Pino Suarez
8. 20 de Noviembre (a la altura de Venustiano Carranza) y
9. Corregidora



Orden del día

Reportes

Turnos e incidencias urbanas

Mesas de trabajo

Asuntos generales

Acuerdos

Asistencia

Transmisión en vivo



Orden del día

Reportes

Turnos e incidencias urbanas

Mesas de trabajo

Asuntos generales

Acuerdos

Asistencia

Transmisión en vivo



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



SECRETARÍA DE
CULTURA
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

PRÓXIMA SESIÓN

17 de diciembre de 2019

A las 10:30 horas

Transmisión en vivo
