



MESA INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA

XVII SESIÓN

24 de agosto de 2021



Orden del día

Reportes institucionales

Turnos

Incidencias urbanas

Asuntos generales


Acuerdos

Asistencia





Reportes Institucionales



Autoridad del Centro Histórico

Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

Tema	Indicador	Periodicidad	Quincena al 20/08/2021	Próximo reporte
Mantenimiento a infraestructura	Número de Incidencias de daño en infraestructura del Perímetro de la ACH reparadas y atendidas	Quincenal	172	3 de septiembre
Mantenimiento a infraestructura	Retiro de M2 de grafiti vandálico	Quincenal	1,225	3 de septiembre
Mantenimiento a infraestructura con apoyo de Justicia Cívica	Número de atenciones en parques, plazas o áreas verdes del perímetro del Centro Histórico	Quincenal	2	3 de septiembre

Autoridad del Centro Histórico | Obras menores

Donceles
República de
Argentina
República de
Guatemala
Regina
Rivapalacio
Mina
Pedro Moreno
Galeana
Plaza 2 de Abril
Paseo de la Reforma
Jardín Allende
Obraje
Eje Central
Talavera
Plaza del
Empedradillo
Plaza de la Conchita
Madero
Tacuba

Los trabajos realizados consistieron en **reparación de arroyo vehicular, guarnición, y banquetta** en Donceles, entre República de Argentina y República de Brasil, **reparación de piso con recinto y renivelación de 3 tapas de registro** en República de Argentina entre Donceles y República de Guatemala, **se colocaron 3 piezas de recinto** en República de Argentina entre Donceles y Justo Sierra, **se renivelarán 5 tapas de registro** en República de Argentina entre Donceles y González Obregón, **se repararon 3 macetones** en República de Guatemala entre República de Argentina y República de Brasil, **se realizó desazolve en fuente** de Regina entre Isabel la Católica y Bolívar, **se retiraron 1,225 m2 de grafiti vandálico** en Santa María la Redonda, **se repusieron 11 piezas de tapas de dren** en Talavera entre República de Uruguay y República del Salvador, **se repusieron 10 tapas de dren** en Plaza del Empedradillo, **se repusieron 4 tapas de dren y se repararon 2 tapas de registro** en Plaza de la Conchita, **se colocaron 5 tótems informativos y se colocaron 612 ml. de cinta adherible** en el Corredor Peatonal Madero, **se repararon 3 m2 de banquetta** en República de Argentina entre República de Perú y República de Bolivia, **se repuso una tapa de registro** en 2 de Abril y Mina, **se repararon 10 huecos de banquetta** en Tacuba entre Callejón de la Condesa y Filomeno Mata.



Autoridad del Centro Histórico | Gráficos de obras menores



TALAVERA



REPÚBLICA DE ARGENTINA



JUSTO SIERRA

Autoridad del Centro Histórico | Gráficos de retiro de grafiti



SANTA MARÍA LA REDONDA


Autoridad del Centro Histórico | Mantenimiento con apoyo de infractores de justicia cívica



**Leona Vicario con apoyo de 3
infractores**



**Motolinía con apoyo de 6
infractores**



Alcaldía Cuauhtémoc

Alcaldía Cuauhtémoc | Indicadores

Tema	Indicador	Periodicidad	Quincena Al 20/08	Próximo reporte
Luminarias	Número de luminarias reparadas en vías secundarias	Quincenal	85	3 de septiembre
Poda de árboles	Número de sujetos forestales podados en vías secundarias y/o plazas	Quincenal	30	3 de septiembre
Drenaje	Número de metros lineales de la red de drenaje desazolvados	Quincenal	90	3 de septiembre
Drenaje	Número de rejillas de piso desazolvadas	Quincenal	12	3 de septiembre
Drenaje	Número de coladeras de banqueta desazolvadas	Quincenal	45	3 de septiembre

Alcaldía Cuauhtémoc | Gráficas de indicadores



Se realizó desazolve en Misioneros entre Santo Tomás y Roldán, se limpian 4 coladeras, 1 rejilla y se sondean 12 mts. de drenaje.



Se realizó desazolve en Roldán No. 131, Se limpian 3 coladeras y se sondean 12 mts. de drenaje



Se realizó poda en Comonfort, entre Juan Álvarez y República de Ecuador, 3 árboles y 1.5 m3 de poda




Se repara 1 circuito en República de Costa Rica entre República de Argentina y Aztecas, quedan funcionando 8 luminarias



Se realizó poda en Apartado entre República de Argentina y Aztecas, 3 árboles y 1.5 m3 de poda



Se repara 1 circuito en Candelaria y Márquez Sterling, quedan funcionando 10 luminarias.



Alcaldía Venustiano Carranza

Alcaldía Venustiano Carranza | Indicadores

Tema	Indicador	Periodicidad	Quincena al 25/06	Próximo reporte	Observaciones
Luminarias	Número de luminarias reparadas en vías secundarias	Quincenal	41	3 de septiembre	Se detalla la ubicación y causa en el anexo.
Tiraderos Clandestinos	Toneladas de residuos sólidos recolectados de tiraderos clandestinos en el PB de VC (línea base 26 tiraderos)	Quincenal	459	3 de septiembre	Se recolectaron 30.6 toneladas diariamente de Residuos Sólidos
Poda de árboles	Número de sujetos forestales podados en vías secundarias y/o plazas	Quincenal	15	3 de septiembre	Se detalla la ubicación y causa en el anexo
Desazolve	Metros lineales de drenaje desazolvados	Quincenal	252	3 de septiembre	Se realizaron 252 metros lineales de desazolve

Alcaldía Venustiano Carranza | Anexo de indicadores

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN EL PERÍMETRO B DE LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		COLONIA	CANTIDAD	MOTIVO
PARQUE ANFORA	ALBAÑILES	ANFORA	7 DE JULIO	30	REPARACIÓN DE CIRCUITOS
SANTA ESCUELA			CENTRO I	1	RETIRO DE POSTE EN PELIGRO DE CAER
JUAN CUAMATZIN			CENTRO II	10	REPARACIÓN DE CIRCUITO DE LUMINARIA
ALARCÓN	FFCC DE CINTURA		CENTRO I	4	REPARACIÓN DE LUMINARIAS
PLAZA TELMEX	AV. H. CONGRESO DE LA UNIÓN	HERREROS	MORELOS II	6	REPARACIÓN DE CIRCUITOS
PARQUE GUADALUPE VICTORIA	AV. H. CONGRESO DE LA UNIÓN		CENTRO I	30	REPARACIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN
CORREGIDORA			CENTRO I	20	REPARACIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN
JUAN PABLOS			CENTRO I	10	REPARACIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN
U. H. EMILIANO ZAPATA	AV. H. CONGRESO DE LA UNIÓN	FFCC DE CINTURA	10 DE MAYO	3	REPARACIÓN DE LUMINARIAS
			TOTAL	114	

Alcaldía Venustiano Carranza | Anexo de indicadores

PODAS EN EL PERÍMETRO B DE LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		COLONIA	CANTIDAD	MOTIVO
SAN ANTONIO TOMATLAN 196	3RA. CERRADA DE SAN ANTONIO TOMATLAN	5TA. CERRADA DE SAN ANTONIO TOMATLAN	7 DE JULIO	1	PODA DE ÁRBOLES
SAN ANTONIO TOMATLAN 216	5TA. CERRADA DE SAN ANTONIO TOMATLAN	2DA. CERRADA DE HEROES DE NACUZARI	7 DE JULIO	4	PODA DE ÁRBOLES
2DA. CERRADA DE SAN ANTONIO TOMATLAN 3	HEROES DE NACUZARI	SAN ANTONIO TOMATLAN	7 DE JULIO	1	PODA DE ÁRBOL
2DA. CERRADA DE HEROES DE NACUZARI 4	HEROES DE NACUZARI	SAN ANTONIO TOMATLAN	7 DE JULIO	1	PODA DE ÁRBOL
2DA. CERRADA DE HEROES DE NACUZARI 6	HEROES DE NACUZARI	SAN ANTONIO TOMATLAN	7 DE JULIO	1	PODA DE ÁRBOL
SAN ANTONIO TOMATLAN 260	5TA. CERRADA DE SAN ANTONIO TOMATLAN		7 DE JULIO	1	PODA DE ÁRBOL
2DA. CERRADA DE SAN ANTONIO TOMATLAN 5	2DA. CERRADA DE SAN ANTONIO TOMATLAN	HEROES DE NACUZARI	7 DE JULIO	1	PODA DE ÁRBOL
GRAL. EMILIANO ZAPATA 107	CIRCUNVALACIÓN	BRAVO	CENTRO	3	PODA DE ÁRBOLES
SASTRERÍA 26			10 DE MAYO	1	PODA DE ÁRBOL
2DA. CERRADA DE SAN ANTONIO TOMATLAN 3	2DA. CERRADA DE HEROES DE NACUZARI	SAN ANTONIO TOMATLAN	7 DE JULIO	1	PODA DE ÁRBOL
			TOTAL	15	


REPORTE DE DESAZOLVE AL DRENAJE EN EL PERÍMETRO B DE LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	MOTIVO	
UNIÓN 25	ESTEBAN MARTÍ	AV. H. CONGRESO DE LA UNIÓN	CENTRO II	14	ALBAÑAL DOMICILIARIO
FRAY SERVANDO TERESA DE MIER 480	ESQUINA	CABAÑAS	CENTRO II	12	ALBAÑAL DOMICILIARIO
NACIONAL 47	VIDAL ALCOCER	BRAVO	MORELOS I	8	COLADERA PLUVIAL
BRAVO 80	NACIONAL	J.J. HERRERA	MORELOS I	8	COLADERA PLUVIAL
BRAVO 61	LECUMBERRI	J.J. HERRERA	MORELOS I	12	ALBAÑAL DOMICILIARIO
J. J. HERRERA 60	BRAVO	VIDAL ALCOCER	MORELOS I	60	ATARJEA DE 0.30 DE DIÁMETRO
MIGUEL DOMÍNGUEZ 39	PENITENCIARÍA	J.J. HERRERA	AMPL. PENITENCIARÍA	18	ALBAÑAL DOMICILIARIO
ROSARIO S/N	GRAL ANAYA	ABRAHAM OLVERA	CENTRO II	120	ATARJEA DE 0.30 DE DIÁMETRO
			TOTAL	252	

Alcaldía Venustiano Carranza | Gráficas de residuos sólidos



MIGUEL DOMÍNGUEZ Y PENITENCIARÍA
COL. AMPL. PENITENCIARÍA

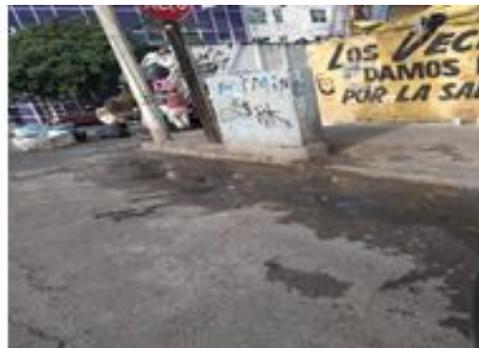

NACIONAL ESQUINA
VIDAL ALCOCER



JUAN DE LA GRANJA
ESQUINA SAN CIPRIAN



CIRCUNVALACIÓN Y CARRETONES
COL. MERCED ZONA CENTRO



TOLVA 2 COL. MERCED ZONA
CENTRO




Alcaldía Venustiano Carranza | Gráficas de luminarias y podas





SACMEX

Dirección de Detección de Fallas y Rehabilitación de Drenaje




SACMEX Drenaje | Ejecución del programa

Desazolve de la red de drenaje y accesorios hidráulicos

77%
DE AVANCE

	PROGRAMADO	ANTERIOR	EJECUTADO	AVANCE
ATARJEA (METROS)	21,000	14,780	1,400	16,180
POZOS DE VISITA	370	263	18	281
REJILLAS DE PISO	150	144	9	153
COLADERA PLUVIAL	160	172	15	187
ALBAÑAL (METROS)	1,500	1,233	67	1,300



SACMEX Drenaje | Reporte Fotográfico



REPÚBLICA DE PERÚ

(ENTRE EJE CENTRAL Y REPÚBLICA DE ARGENTINA)

AVANCE DE TRABAJO LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE 900 ML DE ATARJEA, 13 PV, 9 CP, 6 RP, 45 ML DE ALBAÑAL.

SACMEX Drenaje | Reporte Fotográfico



VENUSTIANO CARRANZA (ENTRE EJE CENTRAL E ISABEL LA CATOLICA)

AVANCE DE TRABAJO LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE 500 ML DE ATARJEA, 5 PV, 3 RP, 6 CP, 22 ML DE ALBAÑAL.



SACMEX

Dirección de Construcción

*SUSTITUCIÓN DE LÍNEAS Y REDES DE AGUA POTABLE
Y DRENAJE EN EL CENTRO HISTÓRICO.*



SACMEX Obras | Indicadores

República de Chile

FECHA DE EJECUCIÓN mayo - julio 2021

INVERSIÓN TOTAL \$ 15,664,599.26 **AVANCE** 100%

AGUA POTABLE



INSTALADO: 588.00 metros

DIÁMETRO: 12 pulgadas
MATERIAL: Polietileno de Alta densidad
PROCESO CONSTRUCTIVO: Cielo Abierto

DRENAJE



INSTALADO: 588.00 metros

DIÁMETRO: 0.38 y 0.45 metros
MATERIAL: Polietileno de Alta densidad Corrugado
PROCESO CONSTRUCTIVO: Cielo Abierto

SACMEX Obras | Indicadores

Polígono de San Hipólito

FECHA DE EJECUCIÓN mayo - julio 2021

INVERSIÓN TOTAL \$ 22,969,562.08 **AVANCE** 100%

AGUA POTABLE



INSTALADO: 2, 145.00 metros

DIÁMETRO: 6 y 12 pulgadas
MATERIAL: Polietileno de Alta densidad
PROCESO CONSTRUCTIVO: Cielo Abierto y Perforación Direccional

DRENAJE



INSTALADO: 1, 740.00 metros

DIÁMETRO: 0.38 y 0.45 metros
MATERIAL: Polietileno de Alta densidad Corrugado
PROCESO CONSTRUCTIVO: Cielo Abierto y Tubería Curada en Sitio


SACMEX Obras | Indicadores

Calzada México-Tacuba (Tramo 3)

FECHA DE EJECUCIÓN mayo - agosto 2021

INVERSIÓN TOTAL \$ 16,084,344.58

AVANCE 100%



AGUA POTABLE

- **INSTALADO:** 694.00 metros
- **DIÁMETRO:** 6 y 12 pulgadas
- **MATERIAL:** Polietileno de Alta densidad
- **PROCESO CONSTRUCTIVO:** Perforación direccional

DRENAJE

- **INSTALADO:** 1,552.00 metros
- **DIÁMETRO:** 0.30, 0.38 y 0.45 metros
- **MATERIAL:** Polietileno de Alta densidad Corrugado
- **PROCESO CONSTRUCTIVO:** Cielo Abierto y Tubería Curada en Sitio

AGUA TRATADA


- **INSTALADO:** 770.00 metros
- **DIÁMETRO:** 4 pulgadas
- **MATERIAL:** Polietileno de Alta densidad
- **PROCESO CONSTRUCTIVO:** Cielo abierto




Secretaría de Obras y Servicios



Dirección General de Obras de Infraestructura Vial



SOS-DGOIV | Indicadores - Rescate Urbano del Centro Histórico

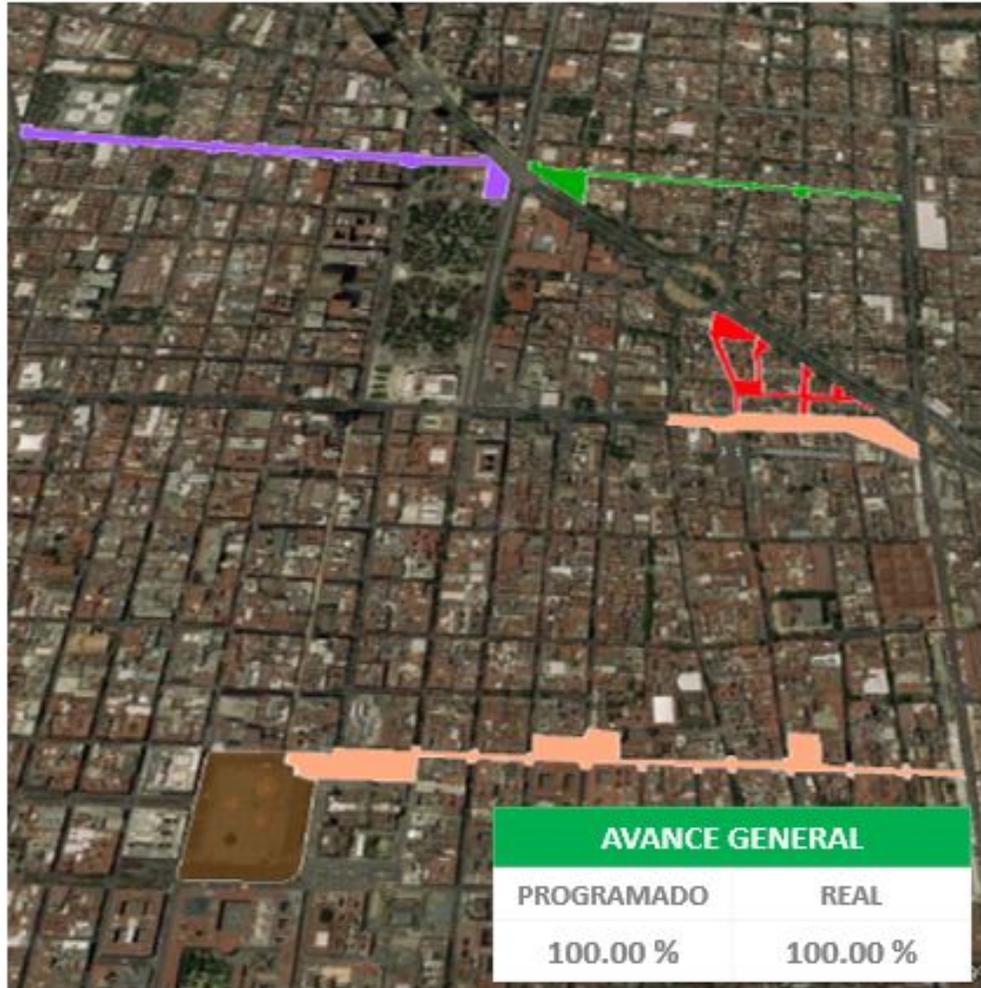




INVERSIÓN 2020-2021
270 MDP

ÁREA A INTERVENIR
83,500 M²

OBRA	PROGRAMADO	REAL	ACTIVIDADES
EJE CENTRAL	100.00%	100.00%	CONCLUIDO
REPÚBLICA DE BRASIL	100.00%	100.00%	CONCLUIDO
STA. MA. LA REDONDA	100.00%	100.00%	CONCLUIDO
CALLE FCO. ZARCO	100.00%	100.00%	CONCLUIDO
AV. BALDERAS	100.00%	100.00%	CONCLUIDO



SOS-DGOIV | Gráficos - Rescate Urbano del Centro Histórico

SANTA MARÍA LA REDONDA (REFORMA - EJE CENTRAL - PEDRO MORENO)

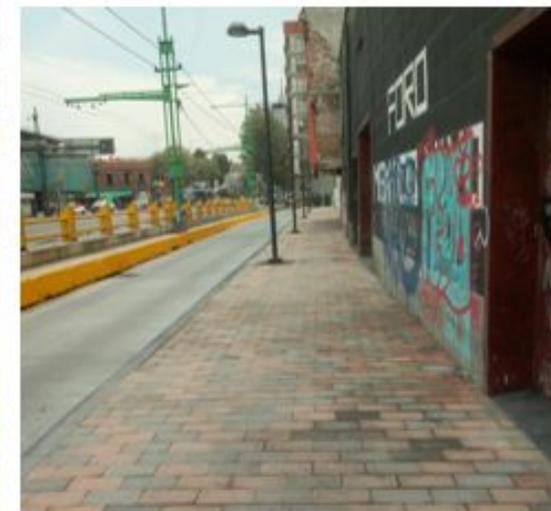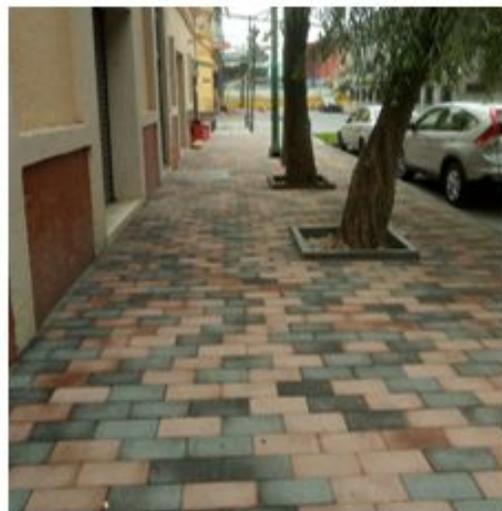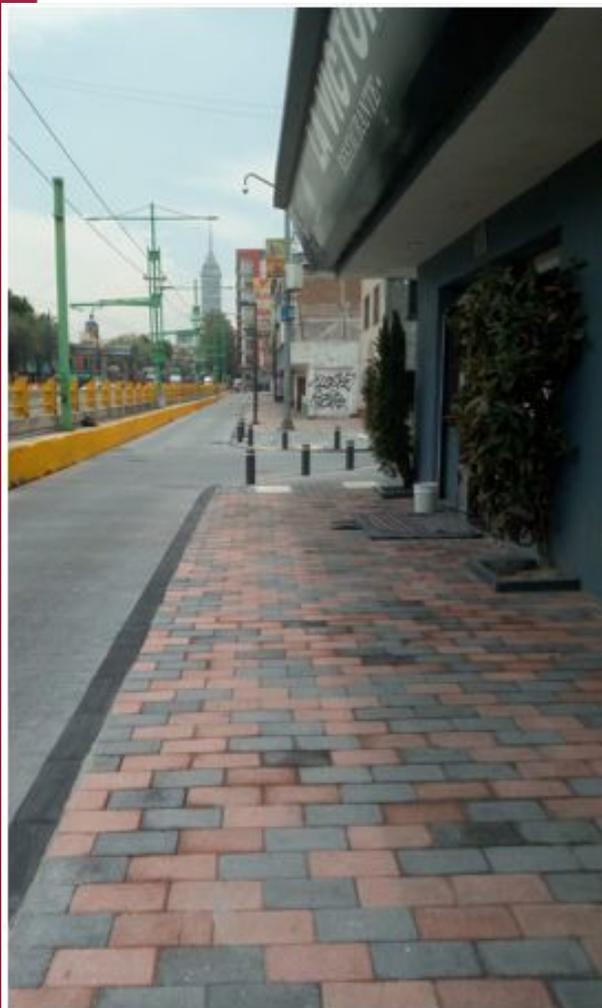

SOS-DGOIV | Gráficos - Rescate Urbano del Centro Histórico

AV. BALDERAS (ARCOS DE BELEM – AV. HIDALGO)

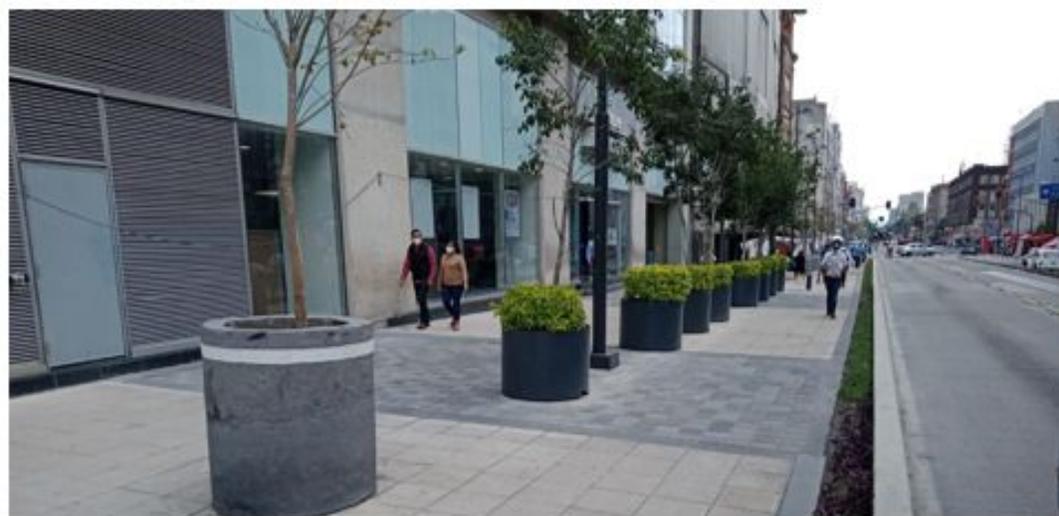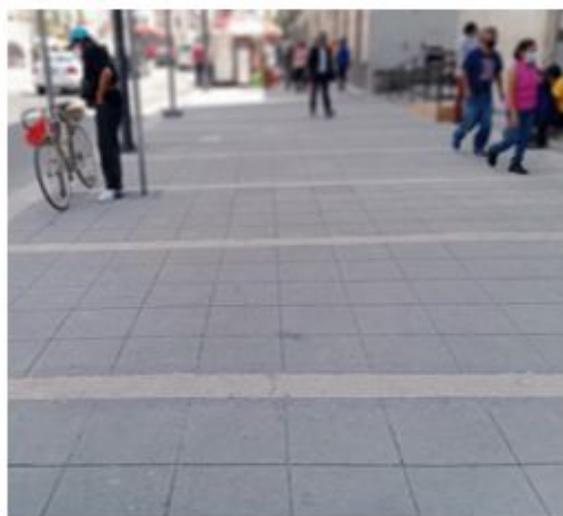

SOS-DGOIV | Gráficos - Rescate Urbano del Centro Histórico

CALLE 5 DE MAYO

EN PROCESO:

- SE REALIZAN TRABAJOS DE DEMOLICIÓN, CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN, COLADO DE GUARNICIONES, COLOCACIÓN DE ADOCRETO, COLOCACIÓN DE TIERRA VEGETAL Y COLOCACIÓN DE ARBOLES Y ARBUSTOS.

ESTADO ACTUAL



		PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE OBRA, AVENIDA 5 DE MAYO																																
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	AVANCE	MAYO					JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE							
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
																		23-ago-21																
REHABILITACIÓN DE LA AVENIDA 5 DE MAYO	PROGRAMADO						07/06/2021				30.00%								04/10/2021															
	REAL						28/06/2021				21.70%																							



SOS-DGOIV | Gráficos - Rescate Urbano del Centro Histórico

CALLE TACUBA

EN PROCESO:

- SE REALIZA REPROGRAMACIÓN DEL PROGRAMA DE OBRA DE ACUERDO A LA ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO, SE REALIZA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO, COLADO DE GUARNICIONES Y COLOCACIÓN DE TIERRA VEGETAL EN JARDINERAS.

ESTADO ACTUAL



PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE OBRA, CALLE DE TACUBA

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	AVANZÓ	PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE OBRA, CALLE DE TACUBA																																
		MAYO					JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE							
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
REHABILITACIÓN DE LA CALLE DE TACUBA	PROGRAMADO																																	
	REAL																																	




SOS-DGOIV | Gráficos - Rescate Urbano del Centro Histórico

CALLE REPÚBLICA DE CHILE

EN PROCESO:

- Se realizan recorridos de tramos con SACMEX, INAH, DCOIV, SSC, Semáforos y CFE

ESTADO ACTUAL

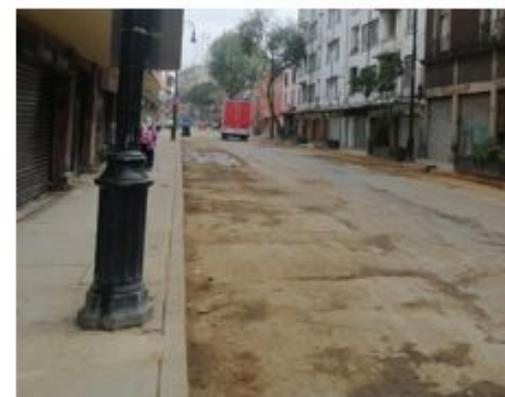


SOS-DGOIV | Gráficos - Rescate Urbano del Centro Histórico


PLAZA DEL EMPEDRADILLO

EN PROCESO DE LICITACIÓN:

- La licitación se declara desierta 19/07/2021

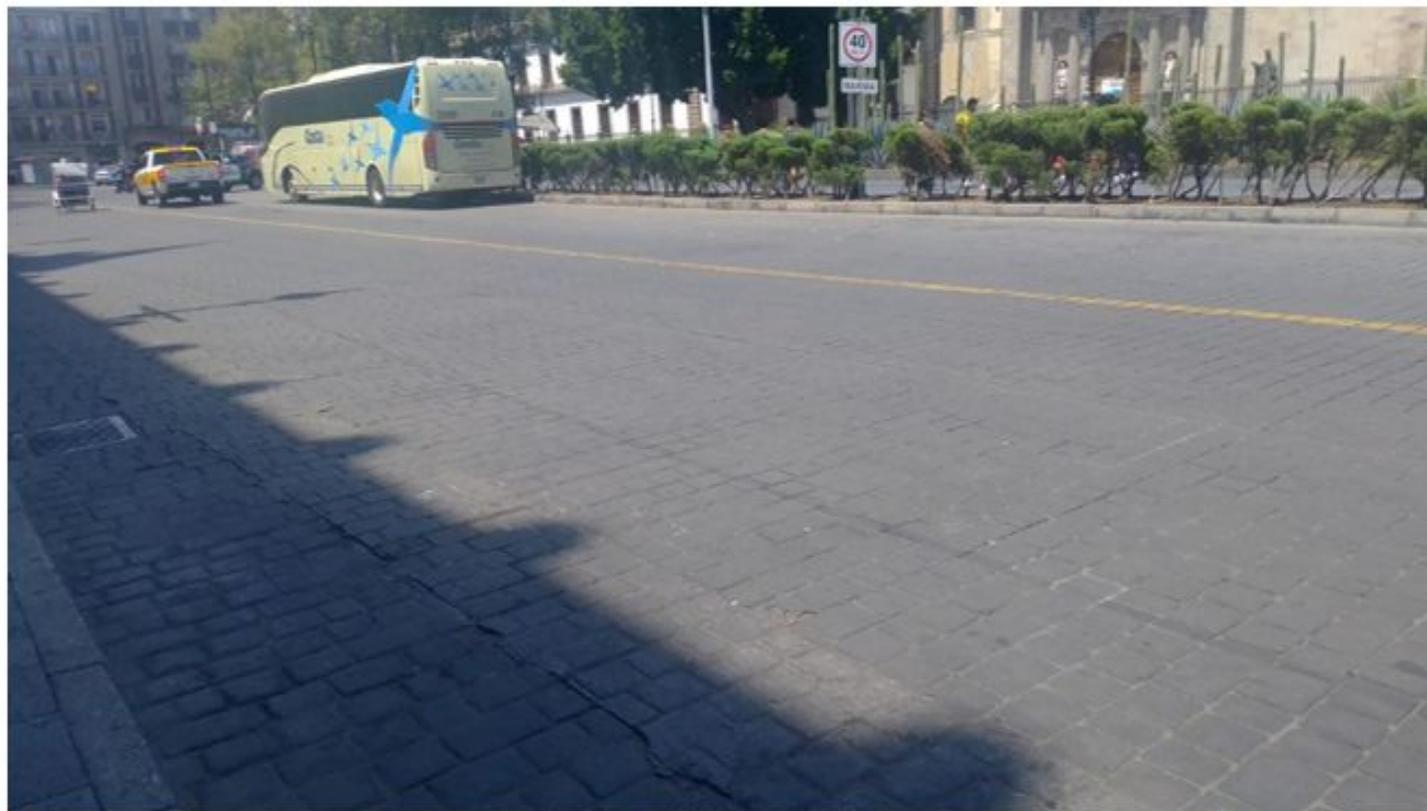

ESTADO ACTUAL

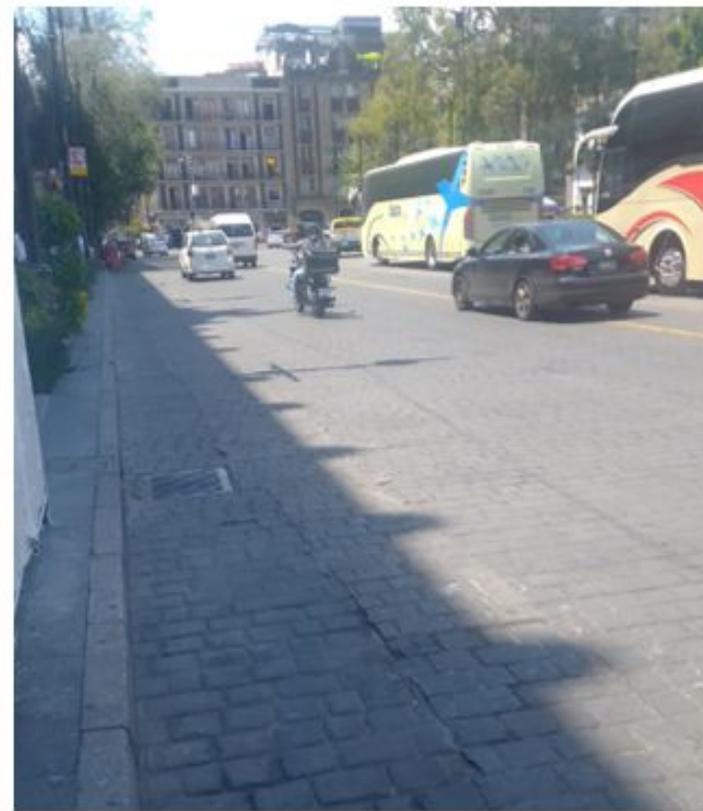


SOS-DGOIV | Gráficos - Rescate Urbano del Centro Histórico

POLÍGONO SAN HIPÓLITO - CALLE SAN FERNANDO

POR INICIAR:

- SE REALIZA RECORRIDO DE VERIFICACIÓN DE ÁREAS A INTERVENIR PARA INICIO DE TRABAJOS

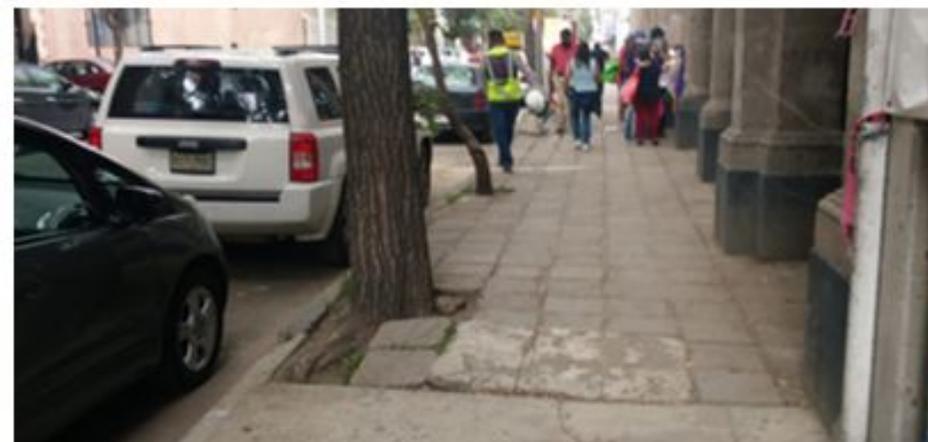

SOS-DGOIV | Gráficos - Rescate Urbano del Centro Histórico

POLÍGONO SAN HIPÓLITO - CALLE SAN FERNANDO

POR INICIAR:

- SE REALIZA RECORRIDO DE VERIFICACIÓN DE ÁREAS A INTERVENIR PARA INICIO DE TRABAJOS



PROGRAMA DE ACTIVIDADES

PRESUPUESTO DE OBRA	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
PARTIDAS					
CLAVE CONCEPTO					
A PRELIMINARES	[Orange bar from start to end of August]				
B DEMOLICIONES Y RETIROS	[Blue bar from start of August to end of October]				
C EXCAVACIONES	[Green bar from start of August to end of October]				
D ALBAÑILERIA		[Purple bar from start of September to end of October]			
E INSTALACIÓN HIDROSANITARIA		[Light blue bar from start of September to end of October]			
F ACABADOS		[Red bar from start of October to end of November]			
G MOBILIARIO URBANO				[Green bar from start of November to end of December]	
H VEGETACIÓN				[Light blue bar from start of November to end of December]	
I INSTALACIÓN ELÉCTRICA			[Dark blue bar from start of October to end of November]		
J SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL			[Grey bar from start of October to end of November]		
OBRA CIVIL SUBTERRANEA		[Yellow bar from start of September to end of November]			




SOS-DGOIV | Gráficos - Rescate Urbano del Centro Histórico

POLÍGONO SAN HIPÓLITO - CALLE VIOLETA

POR INICIAR:

- SE REALIZA RECORRIDO DE VERIFICACIÓN DE ÁREAS A INTERVENIR PARA INICIO DE TRABAJOS

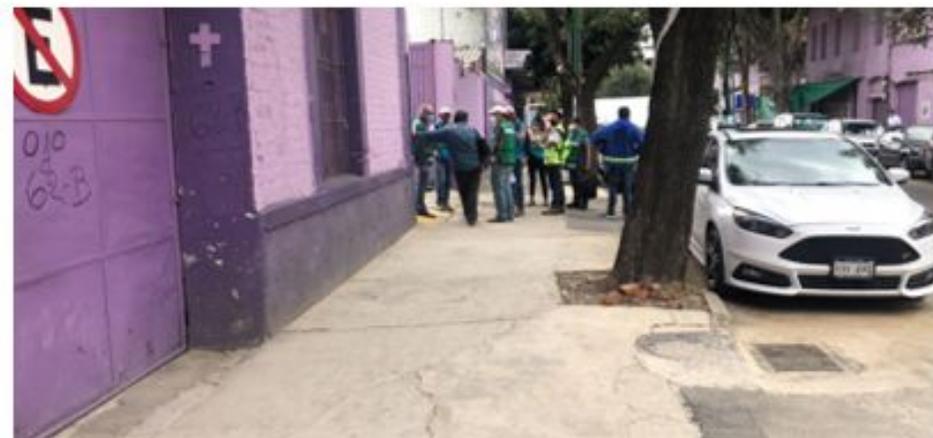


SOS-DGOIV | Gráficos - Rescate Urbano del Centro Histórico

POLÍGONO SAN HIPÓLITO - CALLE SOTO

POR INICIAR:

- SE REALIZA RECORRIDO DE VERIFICACIÓN DE ÁREAS A INTERVENIR PARA INICIO DE TRABAJOS

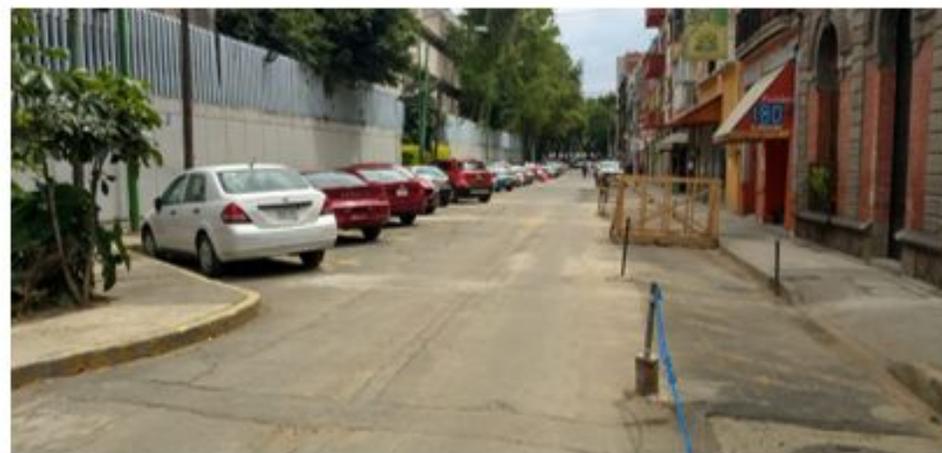

SOS-DGOIV | Gráficos - Rescate Urbano del Centro Histórico

POLÍGONO SAN HIPÓLITO - CALLE HÉROES

POR INICIAR:

- SE REALIZA RECORRIDO DE VERIFICACIÓN DE ÁREAS A INTERVENIR PARA INICIO DE TRABAJOS




SOS-DGOIV | Gráficos - Rescate Urbano del Centro Histórico

POLÍGONO SAN HIPÓLITO



SOS-DGOIV | Gráficos - Rescate Urbano del Centro Histórico

POLÍGONO SAN HIPÓLITO

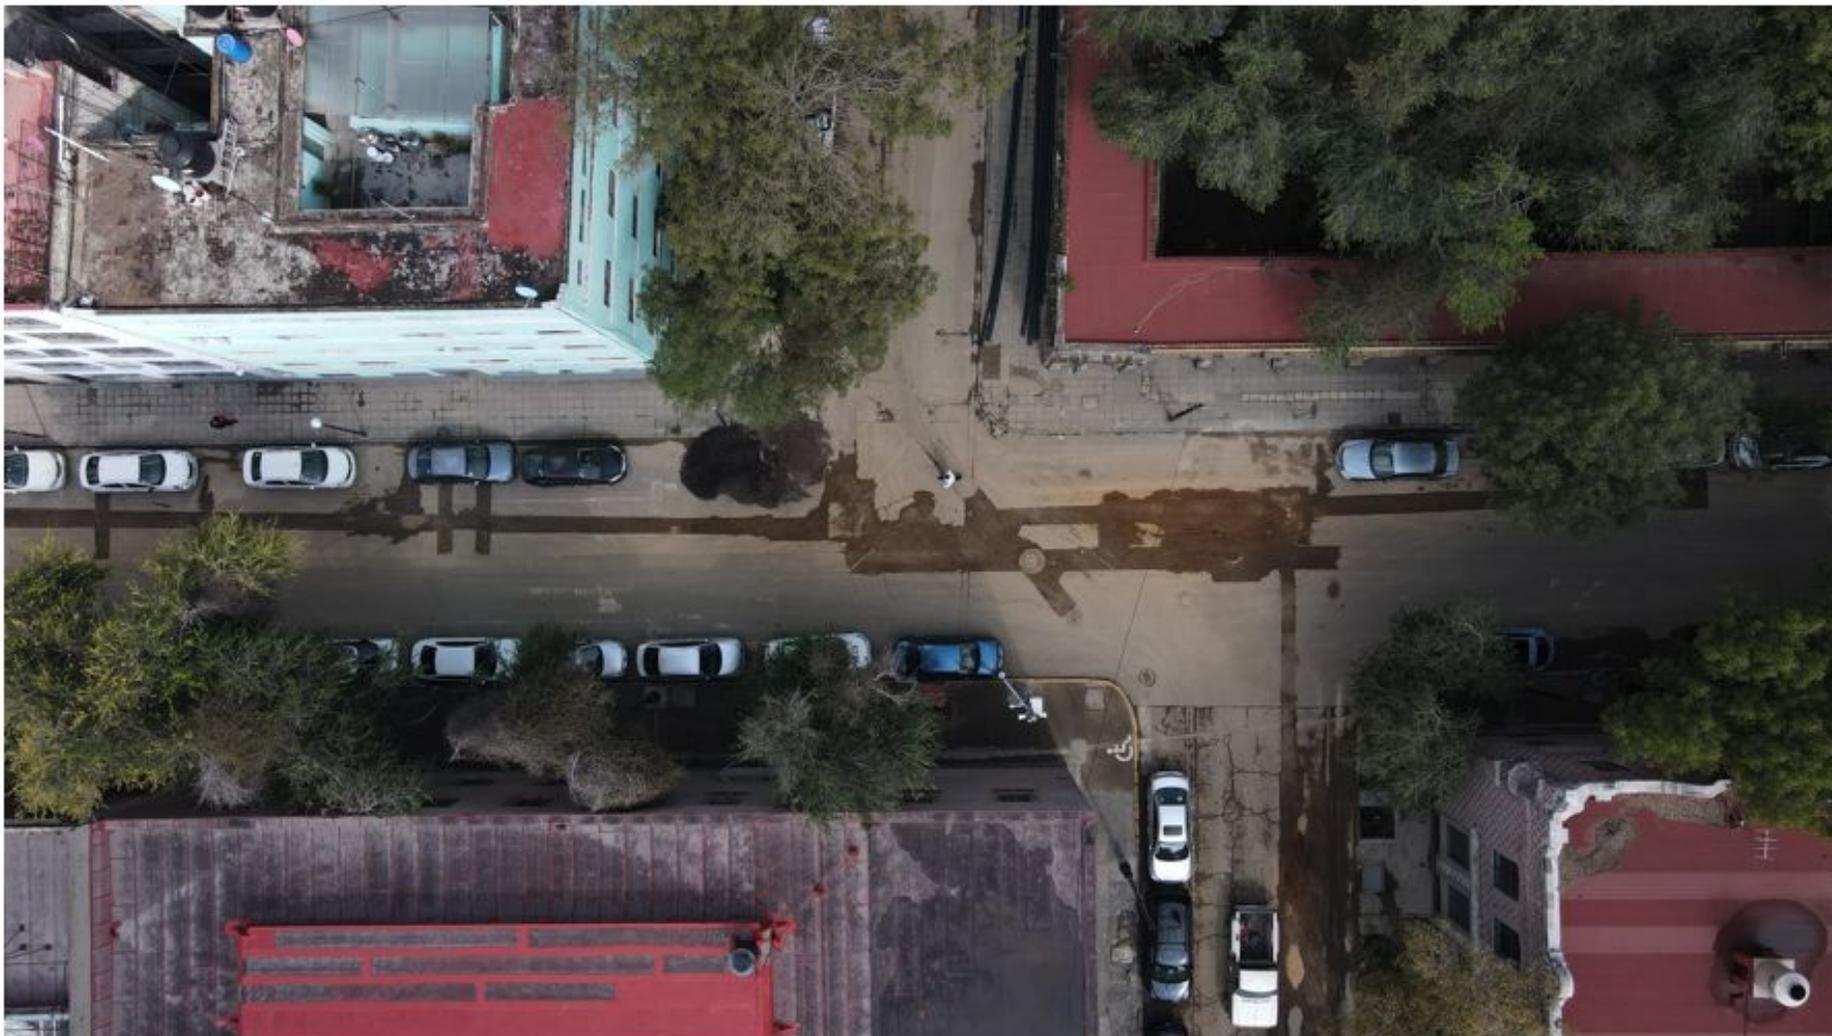




Secretaría de Obras y Servicios



Dirección General de Construcción de Obras Públicas



SOS-DCOP | Indicadores - Construcción de PILARES “La Pulga”

DATOS GENERALES CONTRATISTA

No. CONTRATO	DGCOP LPN-L 1.275-20
CONTRATISTA	INNOVACION Y PROMOCION DE LA CONSTRUCCION, S.A. D.E.C.V.
PLAZO DE EJECUCIÓN	149 DIAS CALENDARIO
FECHA DE INICIO	02/10/2020
FECHA DE TERMINACIÓN	27/02/2021
SUPERFICIE DEL TERRENO	3,076.31
AREA DE CONSTRUCCIÓN TOTAL	2,214.00 M2
AREAS EXTERIORES	3,625.00 M2

ESTADO FINANCIERO

IMPORTE DEL CONTRATO S/IVA	\$	19,989,459.25
IMPORTE ESTIMADO (PAGADO) S/IVA		\$8,027,891.43
IMPORTE POR ESTIMAR S/IVA	\$	11,961,567.82

ANTICIPO

ANTICIPO OTORGADO		SIN ANTICIPO
ANTICIPO AMORTIZADO	\$.
ANTICIPO POR AMORTIZAR	\$.




PERSPECTIVA DEL PROYECTO

RESIDENTE:
ARQ. GRACIELA DUARTE CALIXTO
J.U.D. DE SUPERVISION DE CONSTRUCCION C2

SOS-DCOP | Indicadores - Construcción de PILARES “La Pulga”

**GRÁFICA DE AVANCES DE LA OBRA AL 22 DE AGOSTO DE 2021
CONTRATO DGCOP-LPN-L-1-275-20**



REPORTE FOTOGRÁFICO



**ARMADO CON ACERO DE REFUERZO, COLOCACION DE CIMBRA DE MADERA
Y COLADO CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250KG/CM2 PARA PRETILES EN AZOTEA (1-6/B-C)**

REPORTE FOTOGRÁFICO



APLICACIÓN DE PRIMARIO FESTER PARA IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA (EJES 1-6/B-C)

REPORTE FOTOGRÁFICO



ARMADO CON ACERO DE REFUERZO, COLOCACION DE CIMBRA DE MADERA Y COLADO CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250KG/CM2 PARA PATIO DE RECREO (EJE C-D/1-6)



REPORTE FOTOGRÁFICO



**TRAZO Y NIVELACION PARA PARQUE
(EJES 7-8/E-F)**



**EXCAVACION EN TERRENO NATURAL
PARA DESPLANTE DE CIMENTACION DEL PARQUE
(EJES 7-E)**

REPORTE FOTOGRÁFICO



VISTA PANORAMICA NORESTE



VISTA PANORAMICA NOROESTE


REPORTE FOTOGRÁFICO



VISTA PANORAMICA SURESTE



VISTA PANORAMICA SUROESTE



Secretaría de Obras y Servicios



Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad
Alumbrado Público



SOS-DGSUS Alumbrado Público | Indicadores

Tema	Indicador	Periodicidad	Semana 33 Al 13 de agosto	Semana 34 Al 20 de agosto	Próximo reporte
Alumbrado Público	Número de luminarias reparadas en vías del PA del CH	Semanal	403	109	7 de septiembre

Total 512

SOS-DGSUS Alumbrado Público | Anexo de indicadores


REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA 33

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Av. Jose Maria Pino Suárez	Plaza de la Constitución y Venustiano Carranza	CENTRO	2	Instalación de poste, brazos y luminarias	Falta Poste
Av. Hidalgo	Dr. Mora y Ángela Peralta	CENTRO	1	Cambio de lámpara y balastro	Luminaria apagada
Av. Juárez	Iturbide y Humboldt	CENTRO	1	Reconexión de líneas sulfatadas y cambió de balastro	Luminaria apagada
Av. Juárez	Balderas y Azueta	CENTRO	1	Reconexión de líneas sulfatadas	Luminaria apagada
Ángela Peralta (Alameda Central)	Av. Hidalgo y Av. Juárez	CENTRO	1	Reconexión de líneas sulfatadas	Luminaria apagada
Av. Juárez (Alameda Central)	Dr. Mora y Angela Peralta	CENTRO	39	Reprogramación de reloj	Circuito apagado
AV. José María Pino Suárez	Venustiano Carranza y República de Uruguay	CENTRO	3	Reconexión de líneas sulfatadas	Luminaria apagada
Av. Juárez	Dolores y López	CENTRO	19	Restablecimiento de control	Circuito apagado
Plaza de la Constitución (Edif. de Gobierno)	AV. José María Pino Suárez y 20 de Noviembre	CENTRO	332	Empalme dañado	Reprogramación de Color
Av. Jose Maria Pino Suarez	Mesones y Regina	CENTRO	1	Cambio de lámpara y balastro	Luminaria apagada
Ángela Peralta (Alameda Central)	Av. Hidalgo y Av. Juárez	CENTRO	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
Av. José María Izazaga	Callejón Igualdad y Eje Central Lázaro Cárdenas	CENTRO	1	Reconexión de líneas sulfatadas	Luminaria apagada
Av. Juárez (Alameda Central)	Dr. Mora y Ángela Peralta	CENTRO	1	Reposición de luminária.	Luminaria Colgando
		TOTAL	403		

SOS-DGSUS Alumbrado Público | Anexo de indicadores

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA 34

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Alameda Central	Dr. Mora y Ángela Peralta	CENTRO	1	Reposición de luminaria tipo Urban	Falta Luminaria
Av Juárez	Calle Dolores y Calle López	CENTRO	2	Reconexión en líneas de alimentación	Luminaria apagada
Av. José María Izazaga	Isabel la Católica y 5 de Febrero	CENTRO	1	Reconexión en líneas de alimentación	Luminaria apagada
Av. Juárez	Calle Humboldt y Balderas	CENTRO	4	Reconexión en líneas de alimentación	Luminaria apagada
Av. Juárez	Balderas y Azueta	CENTRO	41	Reconexión en líneas de alimentación	Circuito apagado
Av. Juárez	Balderas y Azueta	CENTRO	40	Reconexión en líneas de alimentación	Circuito apagado
Av. Juárez	Calle Dolores y Calle López	CENTRO	19	Reconexión en líneas de alimentación	Circuito apagado
Plaza de la Constitución	Monte de Piedad y Moneda	CENTRO	1	Cambio lámpara y balastro	Luminaria apagada
		TOTAL	109		



Secretaría de Obras y Servicios



Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad
Recolección Zona I



SOS-DGSUS Recolección Zona I | Indicadores

Tema	Indicador	Periodicidad	26/07 al 08/08	09 al 22/08	Próximo reporte
Limpieza	Kilómetros de Barrido Mecánico en el perímetro "A" del Centro Histórico	Quincenal	1,279.040 km	1,279.040 km	7 de septiembre
Limpieza	Metros cúbicos de residuos sólidos levantados en tiraderos clandestinos y recolección de residuos producto del barrido en el perímetro "A" del Centro Histórico	Quincenal	7,117 m3	7,098 m3	
Recolección de tierra	Metros cúbicos de tierra recolectada en el perímetro "A" del Centro Histórico	Quincenal	114.75 m3	113.50 m3	

SOS-DGSUS Recolección Zona I | Indicadores

Tema	Indicador	Periodicidad	26/07 al 08/08	09 al 22/08	Próximo reporte
Lavado de papeleras	Piezas de papeleras lavadas en el perímetro "A" del Centro Histórico	Quincenal	1,120 piezas	1,120 piezas	7 de septiembre
Lavado	Metros cuadrados lavados en Plazas, Calles, Corredores peatonales y semipeatonales en el perímetro "A" del Centro Histórico	Quincenal	633,263 m2	657,629 m2	
Lavado de sitios críticos	Sitios críticos lavados en el perímetro "A" del Centro Histórico	Quincenal	18 Sitios (257 promedio en la quincena)	18 Sitios (254 promedio en la quincena)	

SOS-DGSUS Recolección Zona I | Indicadores

Tema	Indicador	Periodicidad	26/07 al 08/08	09 al 22/08	Próximo reporte
Recolección tiraderos clandestinos	Recolección diaria de 25 tiraderos clandestinos en el Perímetro "A" del Centro Histórico	Quincenal	25 Tiraderos (350 promedio en la quincena)	25 Tiraderos (350 promedio en la quincena)	7 de septiembre
Retiro de chicles	Piezas de Chicles retiradas en el Corredor Madero	Quincenal	4,342 piezas	4,991 piezas	
Eliminación de grafiti	Metros Cuadrados de grafiti eliminado en el Perímetro "A" el Centro Histórico	Quincenal	1,225.50 m2	433.50 m2	




SOS-DGSUS Recolección Zona I | Indicadores

Tema	Indicador	Periodicidad	26/07 al 08/08	09 al 22/08	Próximo reporte
Desratización	Desratización en el Perímetro "A" y "B" del Centro Histórico		Colocación 2,364 cebos B y 1,392 cebos cereal B mini block en una superficie de 131,930 m ²	Colocación 3,062 cebos B, 50 Racumín Pasta y 514 larinat block en una superficie de 130,570 m ²	7 de septiembre
Retiro de propaganda	Piezas retiradas de propaganda en el Perímetro "A" el Centro Histórico		1,069 piezas	1,860 piezas	
Atención en Retiro de Plantón	Atención en Retiro de Plantón el Perímetro "A" del Centro Histórico			01 atención	

SOS-DGSUS Recolección Zona I | Gráficas - Acciones preventivas con el personal por COVID-19

- Toma la temperatura todos los días en los tres turnos.
- Entrega de caretas, cubrebocas y guantes a toda la gente para su protección.

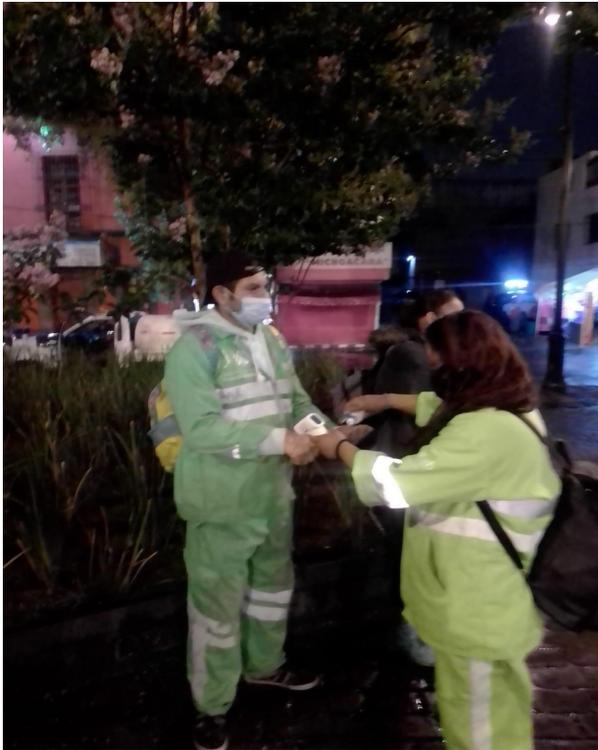


SOS-DGSUS Recolección Zona I | Anexo de indicadores

ELIMINACIÓN DE GRAFITI

VIALIDAD	Cantidad	U.M.
PLAZA VIZCAÍNAS DE EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS A ALDACO	25	m2
AV. JUÁREZ DE AV. PASEO DE LA REFORMA A EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	16	m2
AV. JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ DE PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN A AV. JOSÉ MARÍA IZAZAGA	21	m2
DONCELES ESQUINA ALLENDE (PROTESTA)	133	m2
TACUBA DE MONTE DE PIEDAD A EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	22	m2
REPÚBLICA DE CHILE DE BELISARIO DOMÍNGUEZ A TACUBA	17	m2
DONCELES DE EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS A PALMA	11	m2
SIMÓN BOLÍVAR DE TACUBA A AV. JOSÉ MARÍA IZAZAGA	13.50	m2
REPÚBLICA DE CHILE DE BELISARIO DOMÍNGUEZ A TACUBA	47	m2
REGINA DE SIMÓN BOLÍVAR A JESÚS MARÍA	36	m2
REPÚBLICA DEL SALVADOR DE EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS A JESÚS MARÍA	25	m2
VENUSTIANO CARRANZA DE EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS A JESÚS MARÍA	33	m2
DONCELES DE EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS A REPÚBLICA DE BRASIL	11	m2
TACUBA DE MONTE DE PIEDAD A EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	23	m2
TOTAL	433.50	m2

SOS-DGSUS Recolección Zona I | Anexo de indicadores

ELIMINACIÓN DE 133 M2 DE GRAFITI DE PROTESTA Y 300.50 M2 DE GRAFITI VANDÁLICO

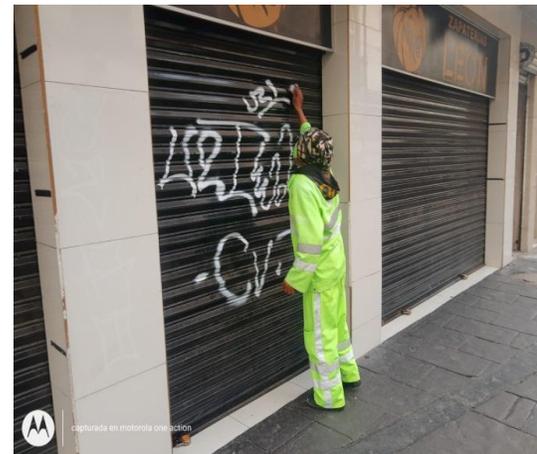

SOS-DGSUS Recolección Zona I | Gráficas de indicadores

ELIMINACIÓN DE GRAFITI



SOS-DGSUS Recolección Zona I | Gráficas de indicadores




SOS-DGSUS Recolección Zona I | Gráficas de indicadores

RETIRO DE PLANTÓN DE DOCENTES DEL ESTADO DE GUERRERO EN PLAZA SEMINARIO



SOS-DGSUS Recolección Zona I | Gráficas de indicadores

Atención Fauna Nociva

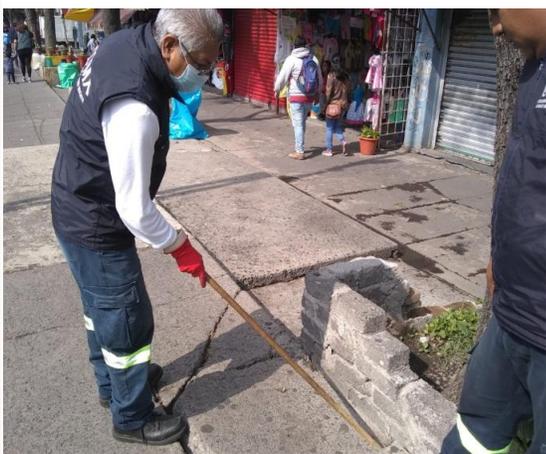

SOS-DGSUS Recolección Zona I | Anexo de indicadores

Atención Fauna Nociva

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Vialidad Av. Del Trabajo	B	De Gorostiza a Panaderos, Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 54 Cereal B en 680 m2
Vialidad Congreso de la Unión	B	De Canal del Norte a Aluminio, Col. Felipe Ángeles, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 36 Cereal B en 380 m2
Vialidad Congreso de la Unión	B	De Circunvalación a Eje 2 Norte, Col. Michoacana, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 51 Cereal B en 350 m2
Vialidad Congreso de la Unión	B	De Herreros a Hortelanos (Tiradero Clandestino), Col. Morelos, alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 30 Cereal B en 100 m2
Vialidad Congreso de la Unión	B	Esquina Hortelanos (Tiradero Clandestino), Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 24 Cereal B en 100 m2
Vialidad Congreso de la Unión	B	De Plomeros a Eje 2 Oriente (Canal del Norte), Col. Michoacana, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 15 Cereal B en 1,750 m2
Canal del Norte	B	De Bonanza a Eje 2 Oriente Congreso de la Unión, Col. Ampliación Michoacán, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 27 Cereal B en 350 m2
Vialidad Congreso de la Unión Camellón	B	De Aluminio a Estaño, Col. Felipe Ángeles, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 21 Cereal B en 380 m2
Vialidad Aluminio	B	De Congreso de la Unión a Pabellón, Col. Felipe Ángeles, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 18 Cereal B en 760 m2

SOS-DGSUS Recolección Zona I | Anexo de indicadores

Atención Fauna Nociva

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Exterior del Mercado del Rastro	B	Ing. Eduardo Molina Aluminio, Sorpresa y Estaño, Exterior del Mercado el Rastro Col. Felipe Ángeles, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 24 Cereal B en 2,150 m ²
Vialidad Av. Del Trabajo	B	De Panaderos a Mecánicos, Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 36 Cereal B en 850 m ²
Parque S/N	B	Manuel Doblado y Obreros, Col. Morelos, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 66 cereal B en 220 m ²
Vialidad Eje 2 Norte	B	Esquina Eje Central Lázaro Cárdenas, lado norte, Col. Peralvillo, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 27 cereal B en 350 m ²
Tiradero Clandestino No. 62	B	Eje 1 Oriente esquina Constancia, Col. Morelos, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 15 cereal B en 100 m ²
Vialidad Eje 1 Oriente	B	Esquina Caridad, Col. Morelos, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 39 cereal B en 250 m ²
Tiradero Clandestino No. 64	B	Eje 1 Oriente Manuel Doblado, Col. Morelos, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 27 cereal B en 100 m ²
Tiradero Clandestino	B	Plutarco Elías Calles y Congreso de la Unión, Col. Barrio Zapotla, Alcaldía Iztacalco	Desratización y fumigación 56 Cebos Cereal B y 50 Racumin pasta, en 380 m ²
Vialidad Eje 1 Oriente Anillo de Circunvalación	B	Eje 1 Norte a República de Guatemala, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 210 cereal B en 1,600 m ²
Vialidad Eje 1 Oriente Anillo de Circunvalación	A	De San Pablo a Fray Servando, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 459 cereal B en 800 m ²

SOS-DGSUS Recolección Zona I | Anexo de indicadores

Atención Fauna Nociva

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Eje 1 Oriente Circunvalación	B	De República de Guatemala a San Pablo, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 366 cereal B en 2,200 m ²
Exterior Mercado San Lucas	B	Escuela Médico Militar Callejón del Hormiguero, Callejón San Miguel, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 57 cereal B en 1,800 m ²
Parque Área Verde	B	Balderas, Tolsa y Enrico Martínez, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 66 cereal B en 800 m ²
Vialidad Plaza de la Ciudadela	B	Av. Balderas, Enrico Martínez y José María Morelos, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 87 cereal B en 850 m ²
Plaza de la Soledad	B	Limón, San Simón y Cuadrante de la Soledad, Col. Merced Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 93 Cebos Cereal B y 48 larinat block en 560 m ² .
Vialidad General Anaya	B	De Eje 1 Oriente a San Ciprian, Col. Merced Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 72 Cebos Cereal B y 54 lanirat block en 1,200 m ²
Vialidad San Ciprian	B	De General Anaya a Fray Servando Teresa de Mier, Col Merced Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 45 Cebos Cereal B y 36 lanirat block en 1,200 m ² .
Exterior del Mercado Candelaria	B	Corregidora, Congreso de la Unión, San Ciprian y General Anaya, Col. Merced Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 42 Cebos Cereal B y 30 lanirat block en 1,140 m ² .

SOS-DGSUS Recolección Zona I | Anexo de indicadores

Atención Fauna Nociva

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Plaza de la Solidaridad	A	Av. Juárez esquina Balderas, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 30 Cebos Cereal B y 24 Lanirat block en 860 m ² .
Plaza San Fernando	B	Eje 1 Poniente Guerrero, San Fernando, Puente de Alvarado, Col. Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 30 Cebos Cereal B y 16 lanirat block en 2,500 m ² .
Vialidad Puente de Alvarado	B	De Av. Paseo de la Reforma a callejón Sombrereros, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 42 Cebos Cereal B y 16 lanirat block en 750 m ² .
Vialidad Eje 1 Poniente Rosales	B	De Puente de Alvarado a Av. Paseo de la Reforma, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 42 Cebos Cereal B y 20 lanirat block en 900 m ² .
Vialidad Balderas	B	De Av. Paseo de la Reforma a Av. Juárez, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 42 Cebos Cereal y 42 lanirat block en 1,200 m ² .
Alameda Central	A	Av. Juárez, Av. Hidalgo, Dr. Mora, Ángela Peralta, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 42 Cebos Cereal y 56 lanirat block en 33,000 m ² .
Bodega de Limpieza Urbana Av. Juárez No. 20	A	Av. Juárez, Av. Hidalgo, Dr. Mora, Ángela Peralta, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 45 Cebos Cereal B y 30 Lanirat block en 200 m ² .
Vialidad	A	San Pablo, Eje 1 Oriente, a José María Pino Suárez, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc.	Desratización 39 Cereal B, Pasta, en 2,100 m ²

SOS-DGSUS Recolección Zona I | Anexo de indicadores

Atención Fauna Nociva

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Eje 1 Norte-Mosqueta	A	Eje 1 Poniente Guerrero a Paseo de la Reforma, Lado Sur y Norte, Col. Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc.	Desratización 54 Cereal B, Pasta, en 800 m ²
Vialidad Roldán	B	De Fray Servando Teresa de Miér a Puente de Santo Tomás, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc.	Desratización 45 Cereal B, Pasta, en 450 m ²
Anillo de Circunvalación (Eje 1 Oriente)	B	Fray Servando y Calz. De la Viga, Col. Esperanza, Alcaldía Venustiano Carranza.	Desratización 48 Cereal B, Pasta, en 650 m ²
Plaza de la Constitución Zócalo	A	20 de Noviembre, Pino Suárez, 5 de Mayo, 16 de Septiembre, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc.	Desratización 18 Cereal B, Pasta, en 46,800 m ²
Plaza Teatro Blanquita	A	Eje Central Lázaro Cárdenas, Pensador Mexicano y Mina, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc.	Desratización 42 Cereal B, Pasta, en 1,800 m ²
Av. Morelos	B	De Congreso de la Unión a Calz. de la Viga (Tramo), Col. Jamaica, Alcaldía Venustiano Carranza.	Desratización 51 Cereal B, Pasta, en 850 m ²
Congreso de la Unión	B	De Emiliano Zapata a Herreros, (de Oriente a Poniente), Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza.	Desratización 33 Cereal B, Pasta, en 800 m ²
Congreso de la Unión	B	De Fray Servando a Sidar y Rovirosa, Col. Merced Balbuena Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 39 Cereal B, Pasta, en 1,200 m ²
Ext. Del Metro Jamaica	B	Congreso de la Unión, lado Oriente, Calz. Mixiuhca y Melchor Ocampo, Col. Magdalena Mixiuhca, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 24 Cereal B, Pasta, en 650 m ²
Exterior Metro Moctezuma	B	Calz. Zaragoza y Troncoso, Col. Unidad Kennedy, Alcaldía Venustiano Carranza.	Desratización 66 Cereal B, Pasta, en 260 m ²

SOS-DGSUS Recolección Zona I | Anexo de indicadores

Atención Fauna Nociva

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Vialidad	A	José María Izazaga, Isabel la Católica a Bolívar, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc.	Desratización 27 Cereal B, Pasta, en 1,400 m ²
Mercado de la Merced	B	Fray Servando Teresa de Mier, Eje 1 Ote. Circunvalación, General Anaya y San Ciprian, Merced Balbuena, Venustiano Carranza.	Desratización 84 Cebos Cereal B y 50 lanirat block en 8,200 m ² .
Vialidad Eje 1 Oriente Anillo de Circunvalación	B	Eje 1 Norte a San Pablo Col. Morelos, Venustiano Carranza	Desratización 156 Cebos Cereal B y 92 lanirat block en 3,800 m ² .


SOS-DGSUS Recolección Zona I | Gráficas de indicadores

LAVADO




SOS-DGSUS Recolección Zona I | Gráficas de indicadores

BARRIDO MANUAL

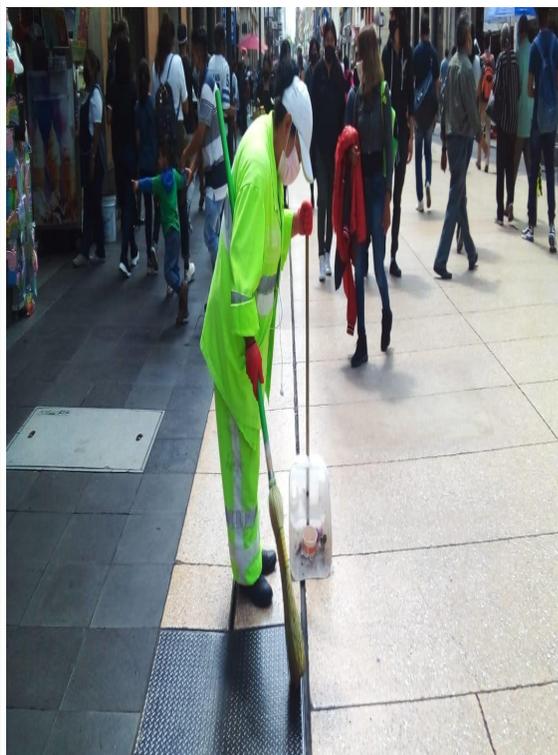

SOS-DGSUS Recolección Zona I | Gráficas de indicadores

RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

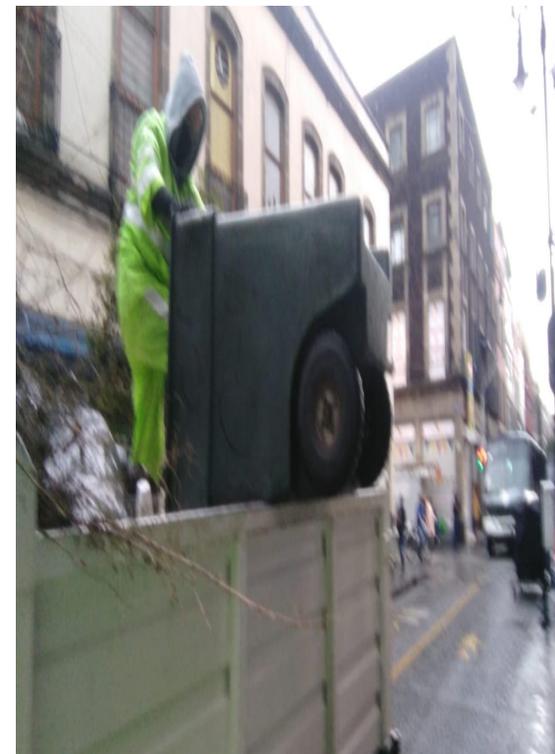

SOS-DGSUS Recolección Zona I | Gráficas de indicadores

RECOLECCIÓN DE TIRADEROS CLANDESTINOS



SOS-DGSUS Recolección Zona I | Gráficas de indicadores

LAVADO DE PAPELERAS






RETIRO DE PROPAGANDA



SOS-DGSUS Recolección Zona I | Gráficas de indicadores

RETIRO DE CHICLES

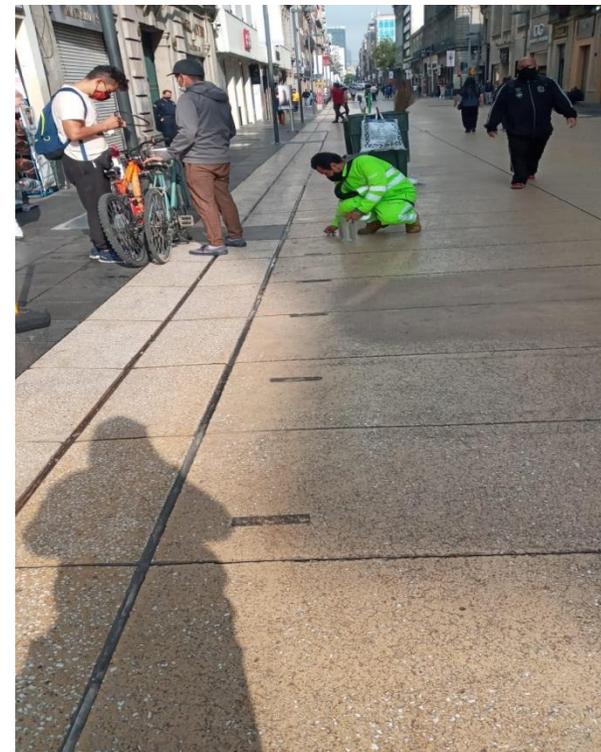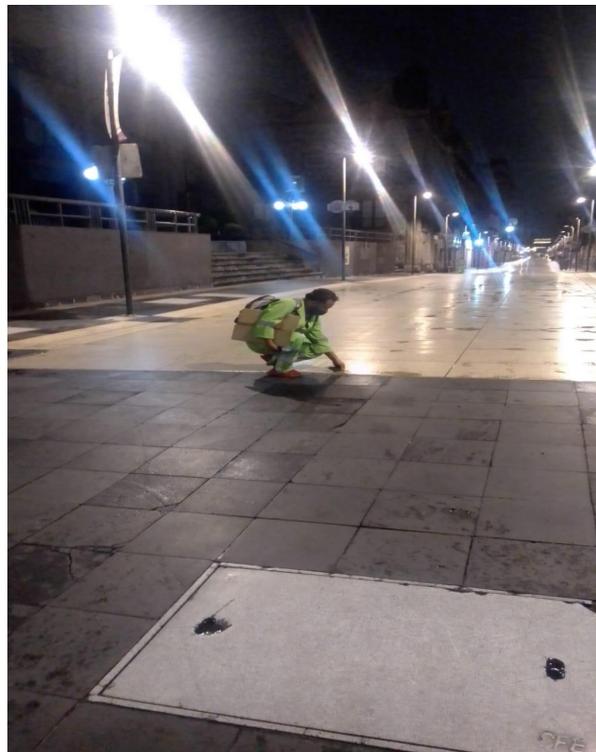




Sistema de Transporte Colectivo

Metro

STC Metro | Indicadores

Indicador	Periodicidad	07/08 al 20/08	Próximo reporte
75 Escaleras eléctricas en las 29 estaciones del Centro Histórico	Quincenal	1 escalera detenida (en mantenimiento)	7 de septiembre
19 Elevadores en estaciones del Centro Histórico		1 elevador detenido	



Metrobús

Metrobús | Corredor Centro Histórico Inaugurada el 1 de abril del 2012

CUENTA CON 62 PARABUSES Y 3 TERMINALES

CONCEPTO	PENDIENTES	REALIZADOS
Rehabilitación de Guarnición y Recinto en para bus	18 ESTACIONES	29%
Rehabilitación de Estelas informativas	57 PIEZAS	2 piezas
Suministro de Estelas informativas	6 PIEZAS	0%
Colocación de Bolardos	49 PIEZAS	0%
Colocación de Elementos de Confinamiento	5880 PIEZAS	1489 PIEZAS
Balizamiento general	73,795.15 ml	37%


Metrobús | Para bus Delegación Cuauhtémoc.



Metrobús | Para bus México Tenochtitlán.




Metrobús | Para bus Museo de San Carlos.

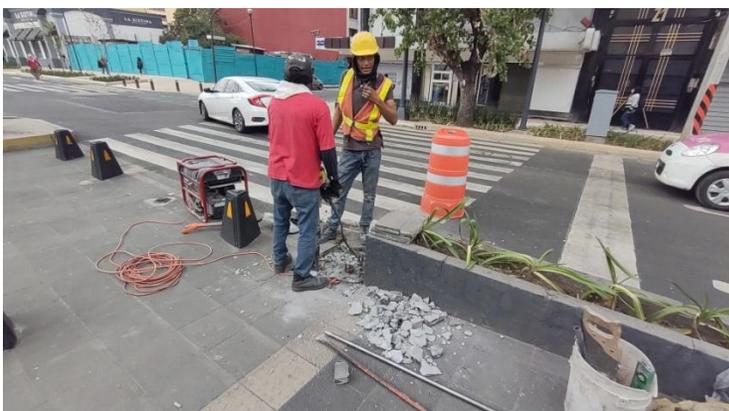


Metrobús | Para bus Plaza de la República.



Metrobús | Para bus Glorieta de Colón.

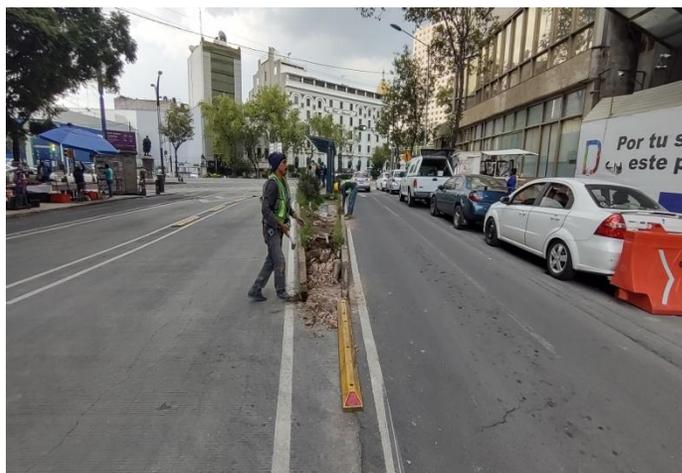

Metrobús | Para bus Expo Reforma.

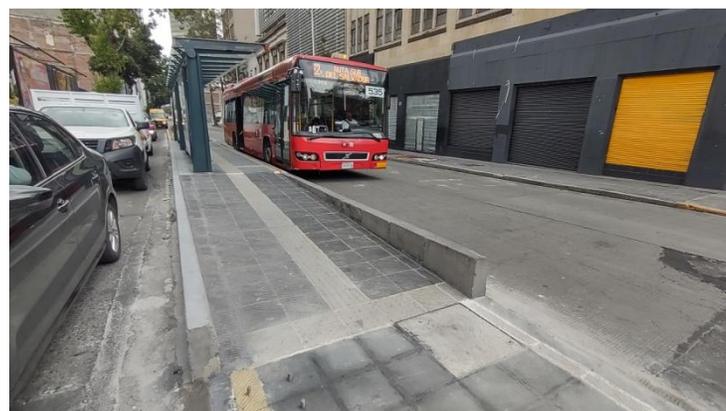


Metrobús | Para bus Vocacional 5.



Metrobús | Para bus Juárez.



Metrobús | Para bus Eje Central.

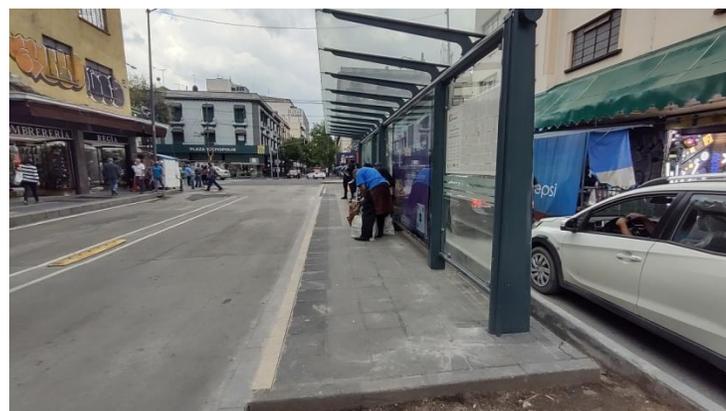


Metrobús | Balizamiento





Comisión Federal de Electricidad



Comisión Federal de Electricidad | Indicadores

Tema	Indicador	Periodicidad	Quincena del 9 al 24 de agosto de 2021	Próximo reporte
Mantenimiento a infraestructura	Número de robos registrados de elementos de infraestructura	Quincenal	0	
	Número de bóvedas atendidas con acciones de desagüe	Quincenal	62	
	Número de atenciones a fallas en el suministro de energía eléctrica	Quincenal	12	7 de septiembre 2021
	Número de tapas de registros y/o bóvedas reparadas	Quincenal	1	
	Número de obras de mantenimiento que impliquen rompimiento en vía pública	Quincenal	12	

Comisión Federal de Electricidad | Anexo de indicadores

Anexo 2. Detalle de ubicaciones Número de bóvedas atendidas con acciones de desagüe

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	Anexo	
VENUSTIANO CARRANZA	EJE CENTRAL	CORREO MAYOR	SIN DATO	COL. CENTRO	15	INSPECCIÓN DESAGÜE Y LIMPIEZA DE BÓVEDAS
5 DE MAYO	EJE CENTRAL	MONTE DE PIEDAD	SIN DATO	COL. CENTRO	16	INSPECCIÓN DESAGÜE Y LIMPIEZA DE BÓVEDAS
TACUBA	EJE CENTRAL	CORREO MAYOR	SIN DATO	COL. CENTRO	11	INSPECCIÓN DESAGÜE Y LIMPIEZA DE BÓVEDAS
DONCELES	EJE CENTRAL	CIRCUNVALACIÓN	SIN DATO	COL. CENTRO	10	INSPECCIÓN DESAGÜE Y LIMPIEZA DE BÓVEDAS
				TOTAL	62	

Comisión Federal de Electricidad | Anexo de indicadores

Anexo 3. Detalle de ubicaciones

Número de atenciones de fallas en el suministro de energía eléctrica

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	Anexo
REP. DE ARGENTINA 62, 64, 66 Y 68	REP. DE PERÚ	REP. DE BOLIVIA	SIN DATO	COL. CENTRO	4	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
REP. CHILE 55	REP. DE PERÚ	BELISARIO DOMÍNGUEZ	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
RODRÍGUEZ PUEBLA 25	LECUMBERRI	REP. DE VENEZUELA	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
REP. DE URUGUAY 78	REP. DE PERÚ	REP. DE NICARAGUA	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
MIXCALCO 11	LEONA VICARIO	MANUEL DOBLADO	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
REP. DE ARGENTINA 34	REP. DE VENEZUELA	REP. DE COLOMBIA	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
LEANDRO VALLE 11	BELISARIO DOMÍNGUEZ	REP. DE PERÚ	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
HÉROES DE GRANADITAS 135	CIRCUNVALACIÓN	MANUEL DOBLADO	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
VIDAL ALCOCER 48	NACIONAL	J. JOAQUÍN HERRERA	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
				TOTAL	12	

Comisión Federal de Electricidad | Anexo de indicadores

Anexo 4. Detalle de ubicaciones Número de tapas de registros y/o bóvedas reparadas

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	Anexo
SAN ANTONIO TOMATLAN 46	VIDAL ALCOCER	CALLEJÓN MIXCALCO	SIN DATO	COL. CENTRO	1	REPARACIÓN DE TAPA EN BÓVEDA
				TOTAL	1	



Comisión Federal de Electricidad | Anexo de indicadores


Anexo 5. Detalle de ubicaciones

Número de obras de mantenimiento que impliquen rompimiento en vía pública

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	Anexo
REP. DE ARGENTINA 62, 64, 66 Y 68	REP. DE PERÚ	REP. DE BOLIVIA	SIN DATO	COL. CENTRO	4	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
APARTADO 12	REP. DE ARGENTINA	AZTECAS	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
LEANDRO VALLE 19	ESQUINA	REP. DE PERÚ	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
REP. DE BOLIVIA	ESQUINA	REP. DE ARGENTINA	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
ROLDÁN 100	CARRETONES	SANTO TOMÁS	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
REP. DE URUGUAY	PINO SUÁREZ	CORREO MAYOR	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
ISABEL LA CATÓLICA 83	MESONES	REGINA	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
CORREGIDORA 84	MANZANARES	CIRCUNVALACIÓN	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
REP. DE ECUADOR 87	PALMA NORTE	REP. DE BRASIL	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
				TOTAL	12	

Instituto Nacional de Antropología e Historia | Indicadores

Tema	Indicador	Quincena del 07/08 al 20/08	Próximo reporte
Obras	Número de trámites de solicitud de autorización de obra en inmuebles	8	
Programa Ciudad al Aire Libre	Número de trámites de solicitud de autorización de colocación de enseres	2	
Obras	Número de autorizaciones de obras emitidas en inmuebles	21	07 de septiembre
Programa Ciudad al Aire Libre	Número de autorizaciones emitidas para la colocación de enseres	16	



Instituto Nacional de Antropología e Historia | Anexo de indicadores

Solicitudes de autorización de obra

Fecha de Ingreso	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Tipo de Obra	Dictámen
10/08/2021	AVENIDA HIDALGO	120	CENTRO HISTÓRICO	ADECUACION DE INMUEBLE PARA LOCAL COMERCIAL	ATENTIDO
10/08/2021	DONCELES	57	CENTRO HISTÓRICO	RETIRO DE PISO EXISTENTE DE MANERA MANUAL, COLOCACION DE NUEVO PISO DE PORCELANATO, COLOCACION Y RETIRO DE MURO DE TABLAROCA, SIN AFECTAR ELEMENTOS ESTRUCTURALES. PINTURA INTERIOR EN MUROS NUEVOS DE TABLAROCA.	ATENTIDO
11/08/2021	LIC. PRIMO VERDAD	2	CENTRO HISTÓRICO	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A EFECTUARSE EN TODO EL INMUEBLE. APLICACION DE PINTURA EN MUROS Y PLAFONES, EXCEPTO DONDE HAYA PINTURA MURAL O SOBRE LAS MOLDURAS DE YESO.	ATENDIDO
12/08/2021	FRANCISCO I. MADERO	20	CENTRO HISTÓRICO	REMODELACION INTERIOR DEL LOCAL COMERCIAL, CAMBIO DE PISOS, LAMPARAS, COLOCACION DE PLAFONES DE TABLA ROCA Y PINTURA.	

Instituto Nacional de Antropología e Historia | Anexo de indicadores

Solicitudes de autorización de obra

Fecha de Ingreso	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Tipo de Obra	Dictamen
13/08/2021	TOPACIO	5	CENTRO HISTÓRICO	DEMOLER LA FACHADA Y LOS MUROS INTERIORES, SE LLEVARÁ A CABO EL PROCEDIMIENTO GENERAL DE DEMOLICION QUE SE PRESENTA A CONTINUACIÓN Y MAS ADELANTE SE REALIZA UNA DESCRIPCIÓN DE CADA ETAPA.	
16/08/2021	MESONES	60	CENTRO HISTÓRICO	MANTENIMIENTO EN FACHADA.	
17/08/2021	EMILIANO ZAPATA	37	CENTRO HISTÓRICO	LIBERACION DE APLANADOS Y ELEMENTOS AJENOS AL INMUBLE, PARA REALIZAR EL LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO MEDIANTE ESCANER 3D Y FORMAR UNA NUBE DE PUNTOS DE LOS ESPACIOS LIBERADOS, ASI GENERAR EL DIAGNOSTICO DE FABRICAS Y DETERIOROS.	
18/08/2021	IZAZAGA	11	CENTRO HISTÓRICO	REVALIDACION DE AUTORIZACION PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO DENOMINADO, BARRIO LETRAN.	



Instituto Nacional de Antropología e Historia | Anexo de indicadores

Solicitudes de autorización de enseres PROGRAMA CIUDAD AL AIRE LIBRE

Fecha de Ingreso	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Tipo de Obra	Dictámen
11/08/2021	ISABEL LA CATOLICA	88	CENTRO HISTÓRICO	COLOCACION DE ENCERES DESMONTABLES SOBRE ACERA CONTIGUA EN VIA PUBLICA.	ATENDIDO
17/08/2021	SANTÍSIMA	23B	CENTRO HISTÓRICO	COLOCACION DE ENCERES EN VIA PUBLICA. SE COLOCARAN 2 MESAS CUADRADAS CON 3 SILLAS CADA UNA EN LOS COSTADOS DE LA ENTRADA.	

Instituto Nacional de Antropología e Historia | Anexo de indicadores

Autorizaciones de obra

AUTORIZACIÓN	DOMICILIO	MOTIVO	TIPO
AUT. 298/21	AV. HIDALGO 51	RECUPERACIÓN, RESTAURACIÓN, RESARCIMIENTO DE DAÑOS EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES	Obra menor
AUT. 300/21	REPÚBLICA DE SALVADOR 47	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO	Obra menor
AUT. 312/21	EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS 10	CONSTRUCCIÓN DE TIENDA COMERCIAL COPPEL	Obra menor
AUT. 313/21	REPÚBLICA DE VENEZUELA 47	TRABAJOS DE DEMOLICIÓN DE CUBIERTA	Obra menor
AUT. 314/21	FRAY SERVANDO TERESA DE MIER 278	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA FACHADA	Obra menor
AUT. 315/21	LEANDRO VALLE 24	AMPLIACIÓN DE ÁREA DE TRABAJOS EN CRUJIAS, COLINDANCIA PONIENTE	Obra menor
AUT. 317/21	AV. JUÁREZ 84	DEMOLICIÓN TOTAL DE INMUEBLE	Obra menor

Instituto Nacional de Antropología e Historia | Anexo de indicadores

Autorizaciones de obra

AUTORIZACIÓN	DOMICILIO	MOTIVO	TIPO
AUT. 318/21	VARIAS CALLES	INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN EN DIVERSAS CALLES DEL PERÍMETRO "B"	Obra menor
AUT. 319/21	TACUBA 1	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y RESTAURACIÓN EN LAS COLUMNAS DEL INMUEBLE	Obra menor
AUT. 320/21	PALMA 13	TRABAJOS DE RESTAURACIÓN	Obra menor
AUT. 321/21	FRAY SERVANDO TERESA DE MIER 107	CONSTRUCCIÓN DE CONDOMINIO	Obra menor
AUT. 322/21	FLORESTA 72	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA FACHADA	Obra menor
AUT. 323/21	GUAYMAS 43	REGULARIZACIÓN DE TRABAJOS ESTRUCTURALES	Obra menor
AUT. 324/21	GUAYMAS 43	TRABAJOS DE REESTRUTURACIÓN COMPLEMENTARIOS	Obra menor

Instituto Nacional de Antropología e Historia | Anexo de indicadores

Autorizaciones de obra

AUTORIZACIÓN	DOMICILIO	MOTIVO	TIPO
AUT. 330/21	EMILIANO ZAPATA 37	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN AULAS	Obra menor
AUT. 331/21	LIC. PRIMO VERDAD 2	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO	Obra menor
AUT. 332/21	MANUEL DOBLADO 40	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA PLAZA COMERCIAL-PLAZA DEL SOL	Obra menor
AUT. 333/21	MOCTEZUMA 116	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS	Obra menor
AUT. 334/21	REPÚBLICA DE CUBA 69	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN CANTERA DE FACHADA	Obra menor
AUT. 335/21	TACUBA 66	TRABAJOS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO	Obra menor
AUT. 336/21	LEANDRO VALLE-BELISARIO DOMÍNGUEZ	TRABAJOS DE RESTAURACIÓN Y ADECUACIÓN	Obra menor

Instituto Nacional de Antropología e Historia | Anexo de indicadores

Autorizaciones de enseres PROGRAMA CIUDAD AL AIRE LIBRE

AUTORIZACIÓN	DOMICILIO	MOTIVO
AUT. 301/21	EJE CENTRAL 130	COLOCACIÓN DE ENSERES
AUT. 302/21	REGINA 39-101	COLOCACIÓN DE ENSERES
AUT. 303/21	PINO SUÁREZ 18-C	COLOCACIÓN DE ENSERES
AUT. 304/21	AV. JUÁREZ 26	COLOCACIÓN DE ENSERES
AUT. 305/21	TACUBA 85	COLOCACIÓN DE ENSERES
AUT. 306/21	INDEPENDENCIA 68-2	COLOCACIÓN DE ENSERES
AUT. -307/21	PALMA 32-B	COLOCACIÓN DE ENSERES
AUT. 308/21	REGINA 31-A	COLOCACIÓN DE ENSERES
AUT. 309/21	REGINA 7-B	COLOCACIÓN DE ENSERES
AUT. 310/21	REVILLAGIGEDO 18-1	COLOCACIÓN DE ENSERES
AUT. 311/21	INDEPENDENCIA 30-9	COLOCACIÓN DE ENSERES

Instituto Nacional de Antropología e Historia | Anexo de indicadores

Autorizaciones de enseres PROGRAMA CIUDAD AL AIRE LIBRE

AUTORIZACIÓN	DOMICILIO	MOTIVO
AUT. 325/21	JUÁREZ 64-B	COLOCACIÓN DE ENSERES
AUT. 326/21	CRISTÓBAL COLÓN 1-E	COLOCACIÓN DE ENSERES
AUT. 327/21	GANTE 8-1,2	COLOCACIÓN DE ENSERES
AUT. 328/21	PALMA 9-4	COLOCACIÓN DE ENSERES
AUT. 329/21	ISABEL LA CATÓLICA 88-1	COLOCACIÓN DE ENSERES



Fideicomiso Centro Histórico



FCH | Gráficas de obras en proceso.

EJERCICIO 2020 – 2021.

CONVENIO DE COORDINACIÓN INAH - FCHCM	AVANCE FISICO ANTERIOR (%)	AVANCE FÍSICO ACTUAL (%)	TERMINACIÓN PROGRAMADA
PROYECTO INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN, RECUPERACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL MONUMENTO INMUEBLE CONOCIDO COMO TEMPLO SAN JUAN DE DIOS	63	65	SEPTIEMBRE 2021
PROYECTO INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN, RECUPERACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL MONUMENTO INMUEBLE CONOCIDO COMO TEMPLO DE SANTA CATARINA	47	50	DICIEMBRE 2021

FCH | Obras en Proceso. Convenio de Coordinación INAH - FCHCM.



Aplanado fino al interior de la torre campanario.



Colocación de apuntalamiento en dovelas centrales de arco.



Consolidación de grietas en muro de fachada oriente.

TEMPLO DE SAN JUAN DE DIOS

FCH | Obras en Proceso. Convenio de Coordinación INAH - FCHCM.



Liberación de aplanado en muros.



Liberación de aplanado en muro de acceso sur.



Avance en desarrollo de proyecto integral: pruebas de resistencia de materiales extraídos de bóvedas, muros y columnas.



Liberación de enladrillado en bóvedas de nave central.

TEMPLO DE SANTA CATARINA

FCH | Gráficas de obras en proceso.

EJERCICIO 2020 – 2021.

CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA FIDEICOMISO F/54 Y EL FCHCM	AVANCE FISICO ANTERIOR (%)	AVANCE FÍSICO ACTUAL (%)	TERMINACIÓN PROGRAMADA
REHABILITACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL ESPACIO PÚBLICO Y CULTURAL ' JARDÍN REGINA '. REGINA No. 40, CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	95	95	JULIO 2021
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO Y CULTURAL ' CORREDOR SAN JERÓNIMO '.	100	100	JULIO 2021
SEÑALÉTICA PARA EL CENTRO HISTÓRICO, PERÍMETRO B.	15	15	ENERO 2022


FCH | Obras en Proceso. Convenio de Participación Conjunta Fideicomiso F/54 - FCHCM.



Mantenimiento de estructura metálica de cubierta.



Terminación de firmes para asentamiento de piso de caucho reciclado.



Mantenimiento de Mobiliario Urbano fijo .



Fabricación de portón corredizo de barras, para sustitución del existente.

REHABILITACIÓN DEL JARDÍN REGINA

FCH | Obras en Proceso. Convenio de Participación Conjunta Fideicomiso F/54 - FCHCM.



Trabajos de mantenimiento y conservación terminados.

CORREDOR SAN JERÓNIMO

FCH | Obras en Proceso. Convenio de Participación Conjunta Fideicomiso F/54 - FCHCM.



Colocación de elementos de señalética fabricados, directamente en los sitios designados.


SEÑALÉTICA PARA EL CENTRO HISTÓRICO, PERÍMETRO B

FCH | Gráficas de obras en proceso.

EJERCICIO 2020 – 2021.

REHABILITACIÓN DE ESPACIOS ARQUEOLÓGICOS FCHCM - AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO	AVANCE FISICO ANTERIOR (%)	AVANCE FÍSICO ACTUAL (%)	TERMINACIÓN PROGRAMADA
CONSTRUCCIÓN DE ESCALERA DE ACCESO AL TEMPLO DE EHECATL.	80	100	JULIO 2021
CONSTRUCCIÓN DE NUEVA REJA PERIMETRAL EN EL TEMPLO MAYOR.	12	15	SEPTIEMBRE 2021
MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN A VENTANAS ARQUEOLÓGICAS UBICADAS EN LA CALLE REPÚBLICA DE ARGENTINA.	80	100	AGOSTO 2021



FCH | Obras en Proceso. Rehabilitación de Espacios Arqueológicos.

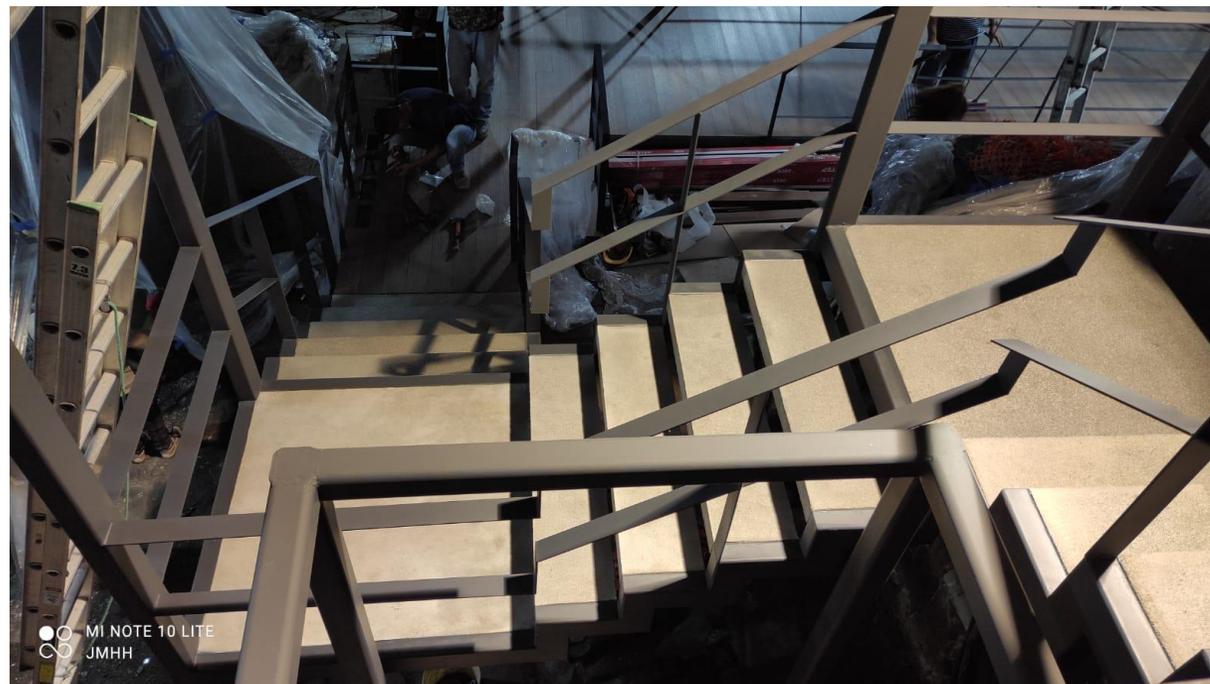

Escaleras terminadas.

ESCALERAS DE ACCESO AL TEMPLO DE EHÉCATL

FCH | Obras en Proceso. Rehabilitación de Espacios Arqueológicos.

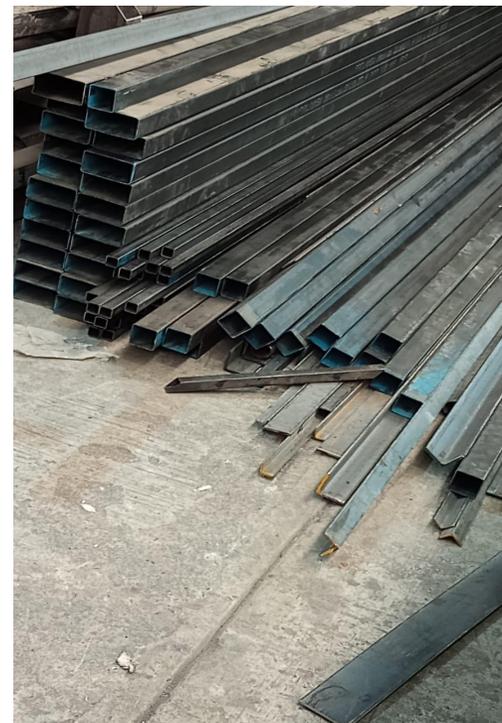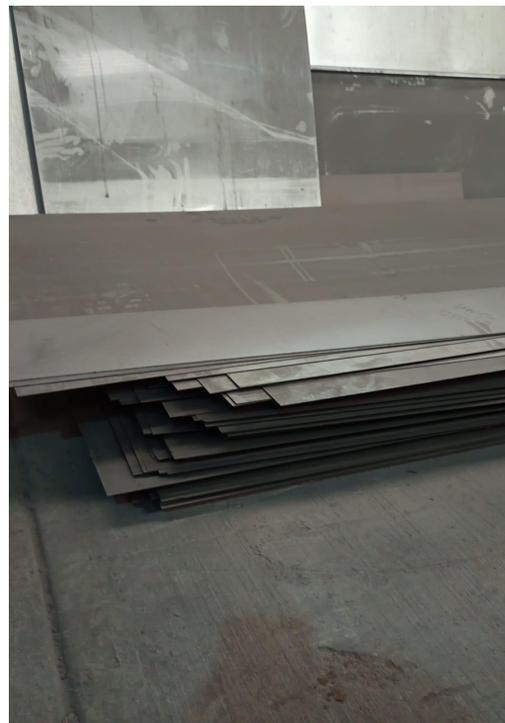

Habilitado en taller de elementos para conformación de reja.

REJA PERIMETRAL EN EL TEMPLO MAYOR

FCH | Obras en Proceso. Rehabilitación de Espacios Arqueológicos.



Trabajos de mantenimiento y rehabilitación terminados.

VENTANAS ARQUEOLÓGICAS



Agencia Digital de Innovación Pública



ADIP | Indicadores

Tema	Indicador	Periodicidad	Reporte del 11/06	Reporte al 25/06	Próximo reporte
Conectividad e Infraestructura de Telecomunicaciones	Ducto Maestro Santa María la Redonda	Quincenal	94%	95%	13 de julio
Conectividad e Infraestructura de Telecomunicaciones	Ducto Maestro Balderas	Quincenal	70%	72%	

ADIP | Gráficas de Indicadores



INFRAESTRUCTURA INMERSIONADA EN LA VIALIDAD



META

TRAYECTORIA	ML
RED TRONCAL	12416
RED DISTRIBUCION	156
RADIALES Y ACOMETIDAS	5096

95%

DE AVANCE

ADIP | Gráficas de Indicadores

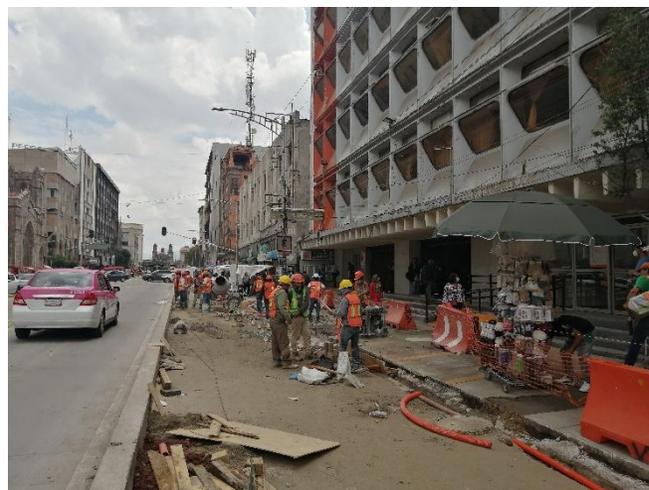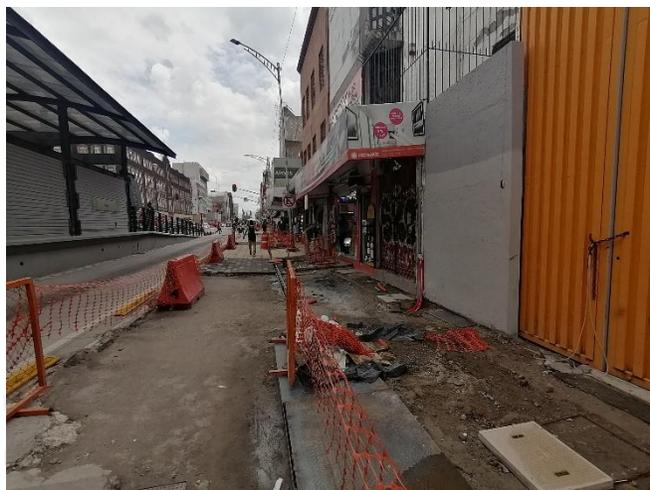


INFRAESTRUCTURA INMERSIONADA EN LA VIALIDAD

META

TRAYECTORIA	ML
RED TRONCAL	10.016
RED DISTRIBUCION	4176
RADIALES Y ACOMETIDAS	4250

72 % DE AVANCE




Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5)

C5 | Indicadores

Indicador	Periodicidad	06/08 al 20/08	Próximo reporte
No. cámaras con falla o intermitencia		1 cámara	
	Quincenal		7 de septiembre
Número de obras de mantenimiento y/o reparación de atención a la infraestructura		02 cámaras	

NOTA: Los datos proporcionados son extraídos de los Reportes de mesa de ayuda de C5



SSC Tránsito

SSC Tránsito | Indicadores

Tema	Unidad de medida	Periodicidad	10 al 23/08	Próximo reporte
Semáforos	Número de semáforos con mantenimiento preventivo	Quincenal	3	7 de septiembre
	Número de semáforos con mantenimiento correctivo		99	
Cámaras	Número de cámaras con mantenimiento preventivo		0	
	Número de cámaras con mantenimiento correctivo		0	



SSC Tránsito | Anexo de Indicadores


CORRECTIVO

ACOMETIDA	3
APAGADO	7
BASE NUEVA	6
CABLES EXPUESTOS	1
CAMBIO DE COMPONENTE	1
CORTO	8
DESCOORDINADO	1
DESINSTALACION	3
DESORIENTADO	9
FOCO FUNDIDO	1
FY-CINTILANTE	9
INSTALACION DE SEMAFORO	5
INSTALACION POSTE	2
MEMORIA DAÑADA	6
OBRA CIVIL	11
PEATON APAGADO	1
PEATON DAÑADO	2
PEGADO	1
REGISTRO NUEVO	1
REINSTALACION	3
REUBICACION	4
SINIESTRO	2
ST-DESCONECTADO / FUERA DE COMUNICACIÓN	10
VISERA ROTA	2

PREVENTIVO

LIMPIEZA DE COMPONENTES	3
TOTAL GENERAL	102

MANTENIMIENTO SEMAFORICO

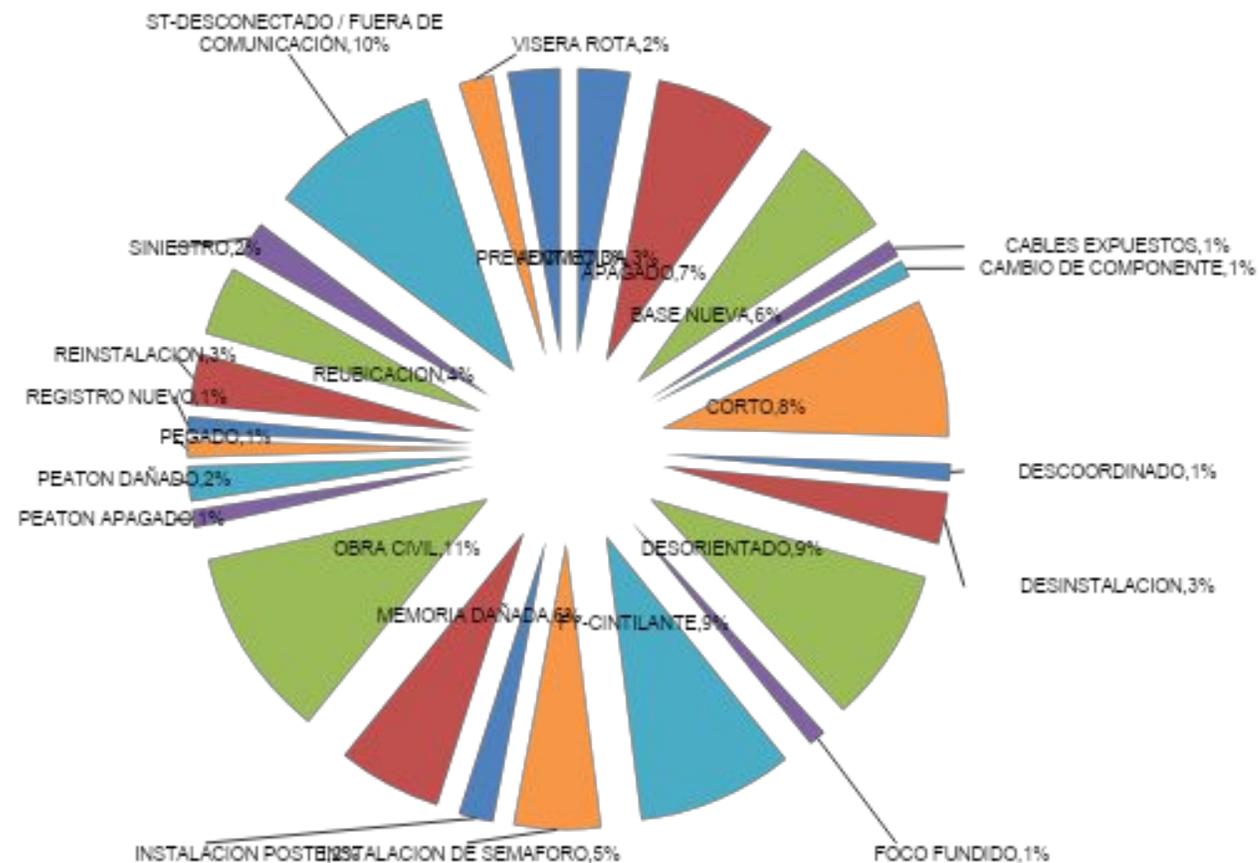

Reportes

Turnos e incidencias urbanas

Asuntos generales

Acuerdos

Asistencia


ACH | Matriz de seguimiento a turnos

**98.52 %
atención**

ATIENDE	Atendido	Proceso	Suma total
ACH	18	1	19
Al. Cuauhtémoc	4		4
C5	2		2
CFE	4		4
CONAVI	1		1
FCH	1		1
INBAL	1		1
SACMEX	9		9
SACMEX- CONSTRUCCCIÓN	3		3
SEDEMA	1		1
SEDUVI	2		2
SOBSE	1		1
SOS-AP	1		1
SOS-DGCOP	2		2
SOS-DGOIV	10		10
SOS-DGSUS	5		5
Telmex	1		1
Tránsito	1		1
Suma total	67	1	68

ACH | Seguimiento a turnos **EN PROCESO**

CLAVE	FECHA DE MESA	SOLICITANTE	SOLICITUD	ATIENDE	ESTATUS	OBSERVACIONES
TCH-068	10/08/2021	Tránsito	Enviaré listado de requisitos para la peatonalización de Honduras entre Allende y Argentina, para que ACH apoye con las gestiones	ACH	Proceso	



ACH | Matriz de seguimiento a incidencias urbanas

83.22 %
atención

Matriz de Incidencias <i>Dependencia</i>	ESTATUS			Suma total
	Atendido	En proceso	Pendiente	
ACH	50		11	61
ADIP	1			1
Al. Cuauhtémoc	79	1	18	98
C5	3			3
CFE	188		49	237
SACMEX	142	4	13	159
SEDEMA	1			1
SGIRyPC	1		1	2
SOS-AP	69	1	3	73
SOS-DGOIV	30	1	12	43
SOS-DGSUS	40		1	41
STC-Metro	2			2
TELMEX	17		8	25
Tránsito	37	2	8	47
Suma total	660	9	124	793

Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 10 al 23 de agosto 2021

CLAVE	VIPPSC	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ESTATUS
IUCH-736	VIPP 6. Antigua Merced-Mixcalco	Retiro de tablero en poste de C2	Rodríguez Puebla	Lecumberri	José Joaquín Herrera	CFE			Atendido
IUCH-740	VIPP 3. Santo Domingo	Desazolve	República de Perú	República de Brasil		SACMEX			Atendido
IUCH-750	VIPP 5. Zócalo	Tapa en mal estado	República de Uruguay	Pino Suárez		TELMEX			Atendido


Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 10 al 23 de agosto 2021

CLAVE	VIPPSC	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ESTATUS
IUCH-751	VIPP 6. Antigua Merced-Mixcalco	Acumulación de basura	Vidal Alcocer	Lecumberri		SOS-DGSUS			Atendido
IUCH-756	VIPP 1. Santa María la Redonda	Poda	Violeta	Eje Central		Al. Cuauhtémoc			Atendido
IUCH-757	VIPP 1. Santa María la Redonda	Poda	Riva palacio	Pedro Moreno	Violeta	Al. Cuauhtémoc			Atendido
IUCH-759	VIPP 6. Antigua Merced-Mixcalco	Falla en suministro de energía	San Pablo	Circunvalación	Santo Tomas	CFE			Atendido

Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 10 al 23 de agosto 2021

CLAVE	VIPPSC	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ESTATUS
IUCH-760	VIPP 8. San Pablo	Desazolve	Izazaga			SACMEX			Atendido
IUCH-763	VIPP 6. Antigua Merced-Mixcalco	Falla en alumbrado público	Moneda	Emiliano Zapata		SOS-AP			Atendido
IUCH-767	VIPP 4. Alameda - Sector Financiero	Tapa en mal estado	Humbolt	Av. Juárez	Art. 123	SACMEX			Atendido
IUCH-778	VIPP 1. Santa María la Redonda	Falla en alumbrado público	Zarco			SOS-DGOIV			Atendido

Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 10 al 23 de agosto 2021

CLAVE	VIPPSC	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ESTATUS
IUCH-785	VIPP 4. Alameda - Sector Financiero	Falla en alumbrado público	Filomento Mata	Tacuba	Francisco I. Madero	SOS-AP			Atendido
IUCH-786	VIPP 4. Alameda - Sector Financiero	Falla en alumbrado público	5 de Mayo	Condesa	Bolívar	SOS-AP			Atendido
IUCH-787	VIPP 5. Zócalo	Reparación inconclusa en banqueta	República de Uruguay	José María Pino Suárez		CFE			Atendido

Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 10 al 23 de agosto 2021

CLAVE	VIPPSC	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ESTATUS
IUCH-787	VIPP 5. Zócalo	Reparación inconclusa en banqueta	República de Uruguay	José María Pino Suárez		CFE			Atendido
IUCH-791	VIPP 3. Santo Domingo	Tapa en mal estado	República de Brasil	República de Perú	Belisario Domínguez	Tránsito			Atendido
IUCH-795	VIPP 3. Santo Domingo	Falla en semáforo	República de Colombia	República de Paraguay		Tránsito			Atendido
IUCH-799	VIPP 3. Santo Domingo	Falla en alumbrado público	República de Argentina	República de Venezuela		SOS-AP			Atendido
IUCH-801	VIPP 7. Vizcainas-Corredor Cultural Regina	Falla en alumbrado público	San Jerónimo	Isabel la Católica		SOS-AP			Atendido

Atención VIPPSC | Incidencias **PENDIENTES** - del 10 al 23 de agosto 2021

CLAVE	VIPPSC	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	ESTATUS
IUCH-737 BIS		Robo de energía eléctrica	Plaza Manuel Tolsá	Emilio Dondé	Av. Chapultepec	CFE		Pendiente
IUCH-737	VIPP 3. Santo Domingo	Desazolve	República de Ecuador	República de Brasil	República de Argentina	SACMEX		Pendiente
IUCH-739	VIPP 4. Alameda - Sector Fianciero	Falta de tapa	Bolívar			SACMEX		Pendiente
IUCH-741	VIPP 1. Santa María la Redonda	Falla en suministro de energía	Puente de Alvarado			CFE		Pendiente
IUCH-742	VIPP 4. Alameda - Sector Fianciero	Tapa en mal estado	Ayuntamiento	Marroquí		ACH		Pendiente

Atención VIPPSC | Incidencias **PENDIENTES** - del 10 al 23 de agosto 2021

VIPPSC	FECHA DE REPORTE	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	FOTOGRAFÍA ANTES	ATIENDE	ESTATUS
VIPP 2. Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	16/6/2021	Tapa en mal estado	Donceles				CFE	Pendiente
VIPP 3. Santo Domingo	17/6/2021	Falta de Rejilla	Donceles	República de Brasil			DGOIV	Pendiente
VIPP 3. Santo Domingo	17/6/2021	Falta de tapa	República de Perú	Leandro Valle			SOS-AP	Pendiente

Atención VIPPSC | Incidencias **PENDIENTES** - del 10 al 23 de agosto 2021

VIPPSC	FECHA DE REPORTE	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	FOTOGRAFÍA ANTES	ATIENDE	ESTATUS
VIPP 2. Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	16/6/2021	Tapa en mal estado	Donceles				CFE	Pendiente
VIPP 3. Santo Domingo	17/6/2021	Falta de Rejilla	Donceles	República de Brasil			DGOIV	Pendiente
VIPP 3. Santo Domingo	17/6/2021	Falta de tapa	República de Perú	Leandro Valle			SOS-AP	Pendiente

Atención VIPPSC | Incidencias **PENDIENTES** - del 10 al 23 de agosto 2021

VIPPSC	FECHA DE REPORTE	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	FOTOGRAFÍA ANTES	ATIENDE	ESTATUS
VIPP 3. Santo Domingo	17/6/2021	Tapa de registro en mal estado	Allende	Belisario Domínguez			CFE	Pendiente
VIPP 6. Antigua Merced-Mixcalco	18/6/2021	Tapa en mal estado	Jesús María	Emiliano Zapata			Sacmex	Pendiente
VIPP 3. Santo Domingo	18/6/2021	Falta tapa de coladera	Joaquín Herrera	Gregorio Torres Quintero	Plaza Torres Quintero		Sacmex	Pendiente

Atención VIPPSC | Incidencias **PENDIENTES** - del 10 al 23 de agosto 2021

VIPPSC	FECHA DE REPORTE	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	FOTOGRAFÍA ANTES	ATIENDE	ESTATUS
VIPP 7. Vizcaínas-Corredor Cultural Regina	19/6/2021	Pavimento en mal estado	Calle Rinconada de Jesús	República del Salvador			ACH	Pendiente
VIPP 2. Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	22/6/2021	Tapa de registro en mal estado	Allende	Tacuba		sin imagen	CFE	Pendiente
VIPP 3. Santo Domingo	23/6/2021	Falta tapa de registro	República de Ecuador	República de Argentina	República de Brasil		ACH	Pendiente
VIPP 2. Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	24/6/2021	Tapa en mal estado	Héroes del 57	Belisario Dominguez			CFE	Pendiente

Reportes

Turnos e incidencias urbanas

Mesas de trabajo

Asuntos generales

Acuerdos

Asistencia

Reportes

Turnos e incidencias urbanas

Mesas de trabajo

Asuntos generales

Acuerdos

Asistencia
