



UNIVERSIDAD DEL  
CENTRO  
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

# Mesa de Infraestructura y Obras

## 22da. Sesión

**EVALUACIÓN OCTUBRE**  
**Inicio de la transmisión en vivo**  
**03 de noviembre 2020**

CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS

“2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”



## Orden del día

Reportes

Turnos e incidencias urbanas

Asuntos generales

Acuerdos

Asistencia

**\*Transmisión en vivo\***



# Reportes de indicadores

**\*Transmisión en vivo\***



# ACH

Tema	Indicador	Periodicidad	Quincena al 19/10/2020	Quincena al 02/11/2020	Próximo reporte
Mantenimiento a infraestructura	Número de Incidencias de daño en infraestructura del Perímetro de la ACH reparadas y atendidas	Quincenal	82	71	16 de noviembre



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



SECRETARÍA DE  
CULTURA  
CENTRO  
HISTÓRICO

# ACH | obras menores

Se realizaron trabajos en:

Madero  
Mina  
Jardín del  
Obispo  
Motolinia  
Isabel la  
Católica  
República de  
Chile  
Apartado  
República de  
Guatemala  
República de  
Argentina  
República de  
Bolivia  
Echeveste

Los trabajos realizados consistieron en **colocar 24 flechas de señalización en forma de flecha, 11 vallas de popotillo, reparar un tótem informativo y colocar 4 mantas** en el Corredor Peatonal Madero, **se retiró base de mobiliario urbano** en Mina esquina 2 de Abril, **se repararon 3 secciones de malla** en el Jardín del Obispo, **se reparó registro** en Motolinia entre Madero y 16 de Septiembre, **se repararon 2 registros** en Isabel la Católica esquina 16 de Septiembre, **se reparó registro** en República de Chile entre Tacuba y Donceles, **se repararon 3 vallas de popotillo** para el filtro de Apartado, **se acomodaron 10 bancos de concreto** en República de Guatemala entre República de Brasil y República de Argentina, **se cambiaron 3 lámparas** en República de Argentina 8, **se repararon 4 registros** en República de Bolivia esquina República de Argentina, **se retiraron 2 bolardos impactados y se colocaron 2 bolardos quitapon** en Echeveste y Aldaco.



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS





GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



CENTRO HISTÓRICO


# ACH | obras menores

Se realizaron trabajos en:

- Madero
- Mina
- Jardín del Obispo
- Motolinia
- Isabel la Católica
- República de Chile
- Apartado
- República de Guatemala
- República de Argentina
- República de Bolivia
- Echeveste



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

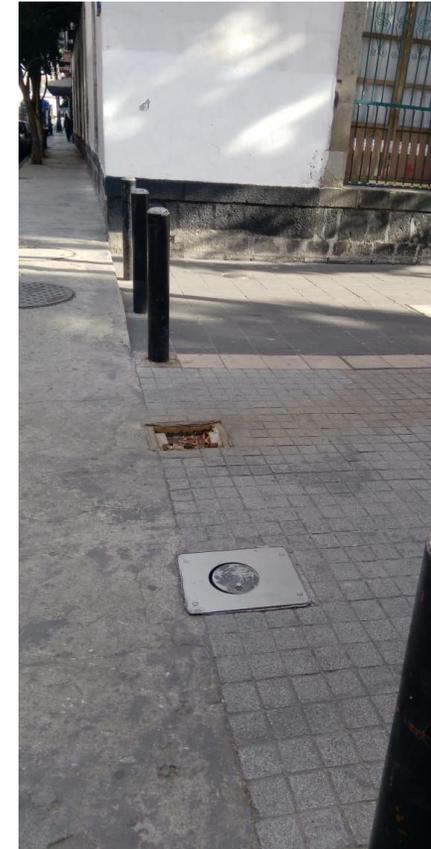



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



CENTRO  
HISTÓRICO




MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

ACH | ene - oct

Incidencias atendidas

2,879

Incidencias de daño en  
infraestructura del  
Perímetro de la ACH  
reparadas y atendidas

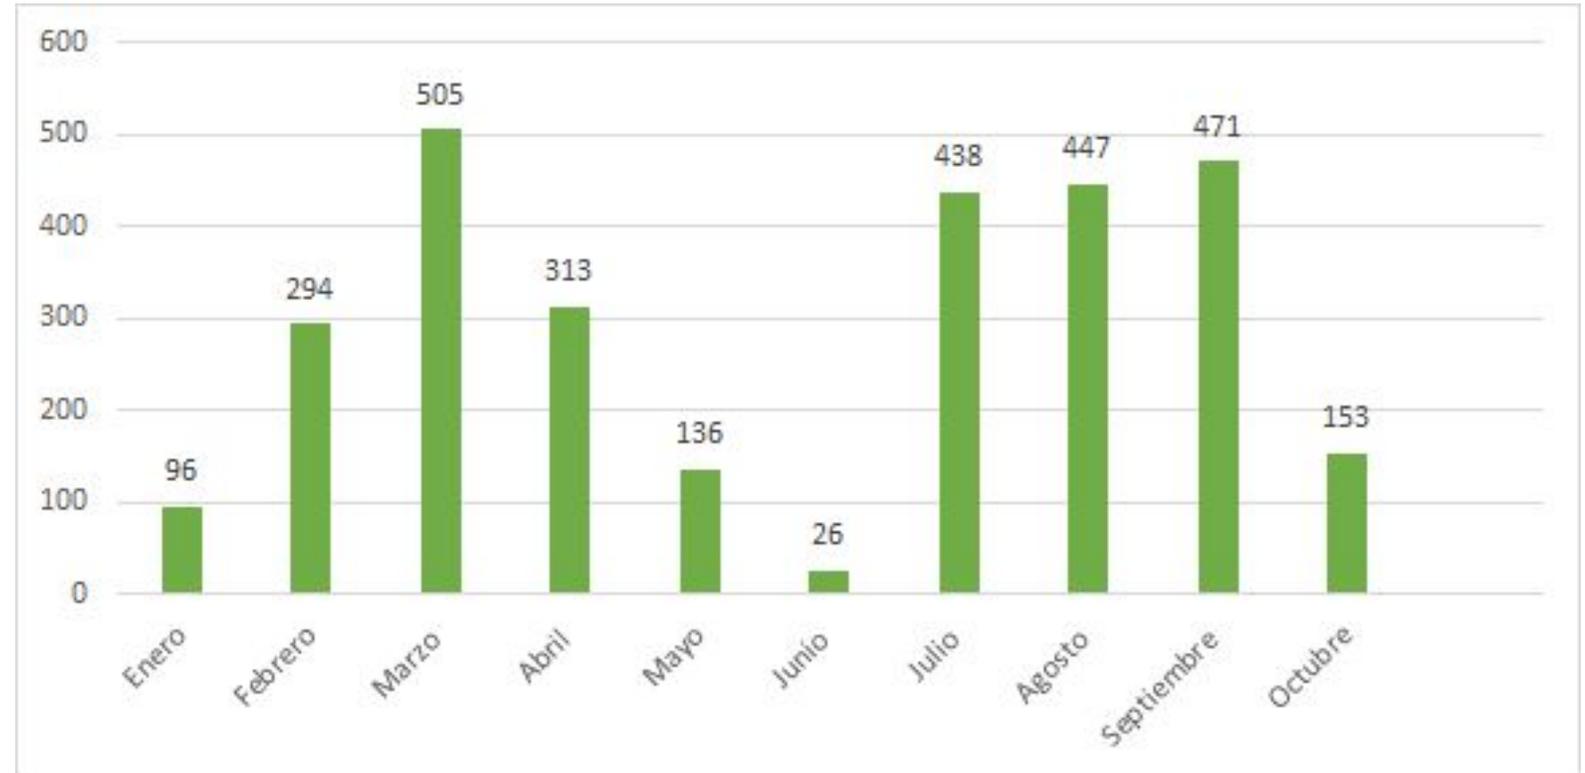

# ALC. CUAUHTEMOC

Tema	Indicador	Periodicidad	Quincena AI 19/10	Quincena AI 02/11	Próximo reporte
Luminarias	Número de luminarias reparadas en vías secundarias	Quincenal	28	42	16 de noviembre
Desazolve de drenaje	Número de metros lineales de la red de drenaje desazolvados	Quincenal	145	204	16 de noviembre
Poda de árboles	Número de sujetos forestales podados en vías secundarias y/o plazas	Quincenal	16	12	16 de noviembre

# ALC. CUAUHTEMOC

Tema	Indicador	Periodicidad	Quincena AI 19/10	Quincena AI 02/11	Próximo reporte
Rejillas desazolvadas	Número de rejillas de piso desazolvadas	Quincenal	12	26	16 de noviembre
Coladeras Desazolvadas	Número de coladeras de banqueta desazolvadas	Quincenal	18	16	16 de noviembre




GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO  
CENTRO HISTÓRICO

# Al. Cuauhtémoc | ene - oct

## 1,135


Número de reparaciones de luminarias

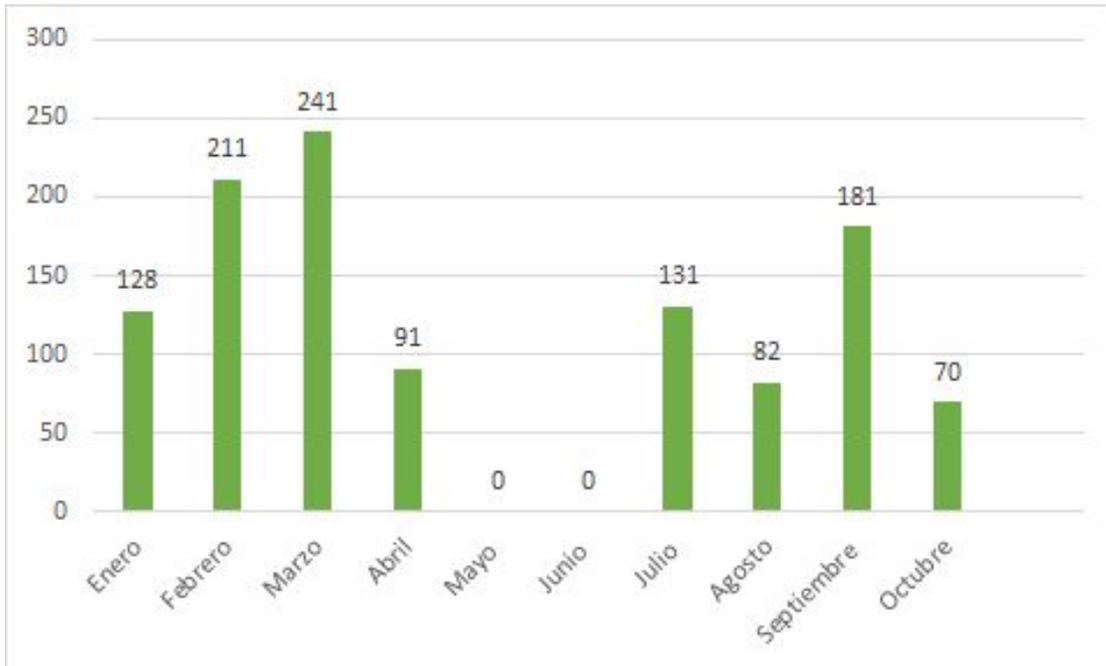

MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

## 3,359

Número de metros lineales de la red de drenaje desazolvados

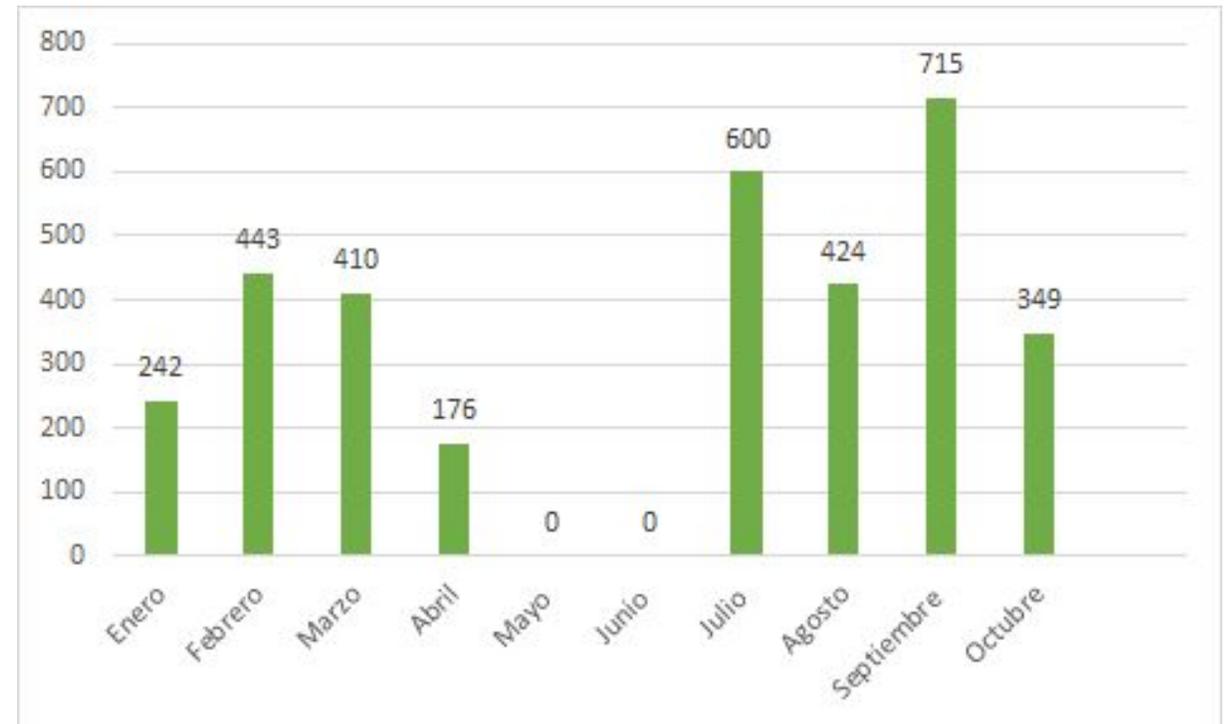



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO




CENTRO HISTÓRICO

# Al. Cuauhtémoc | ene - oct

## 255


Número sujetos forestales podados en vías secundarias y/o plazas

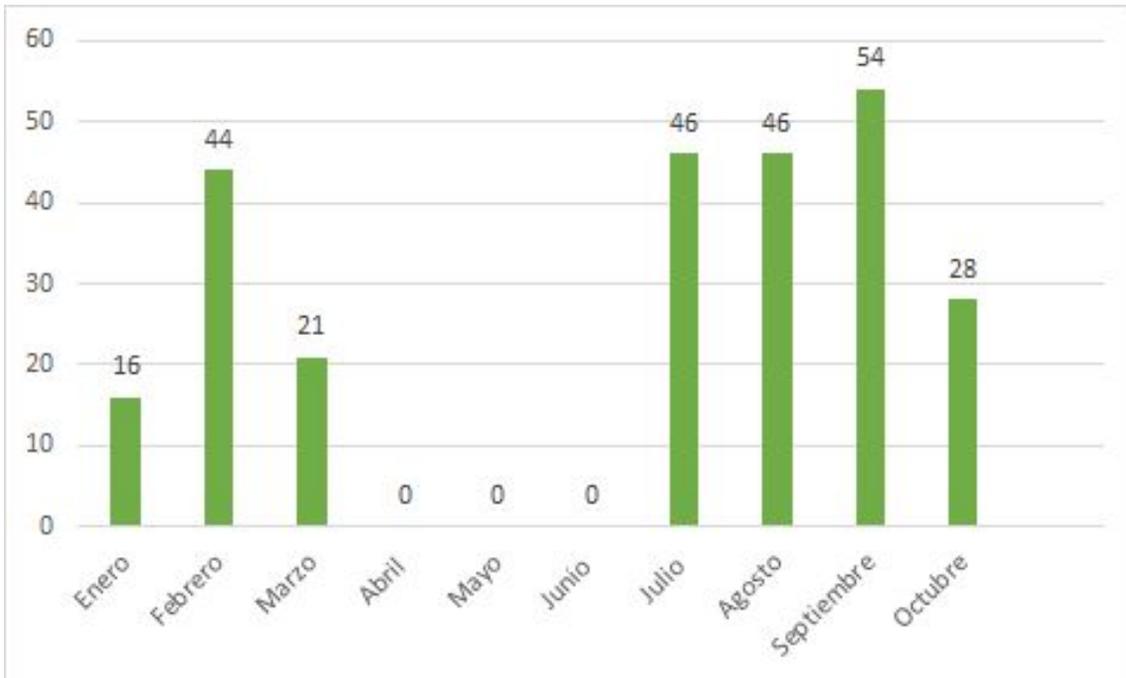

MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

## 146

Número de rejillas de piso desazolvadas

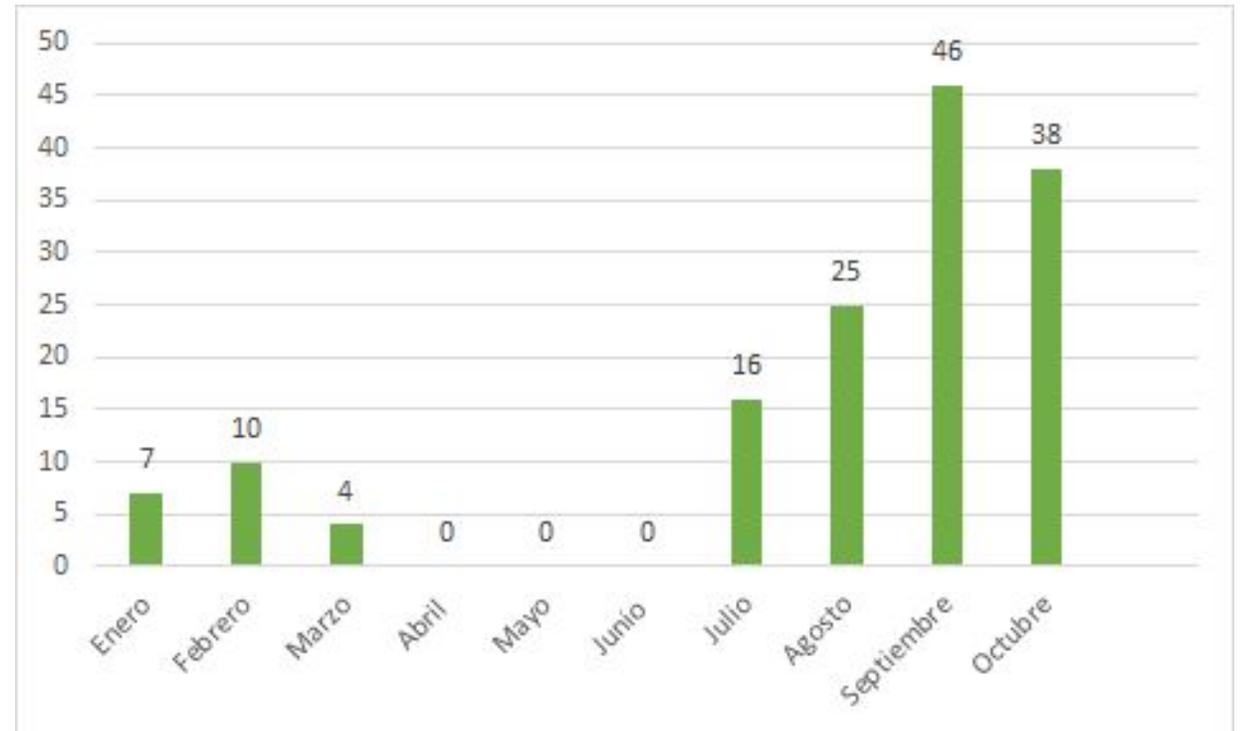



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

AUTORIZADO POR  
CENTRO  
HISTÓRICO


# Al. Cuauhtémoc | ene - oct



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

## 188

Número de Coladeras de  
banqueta desazolvadas

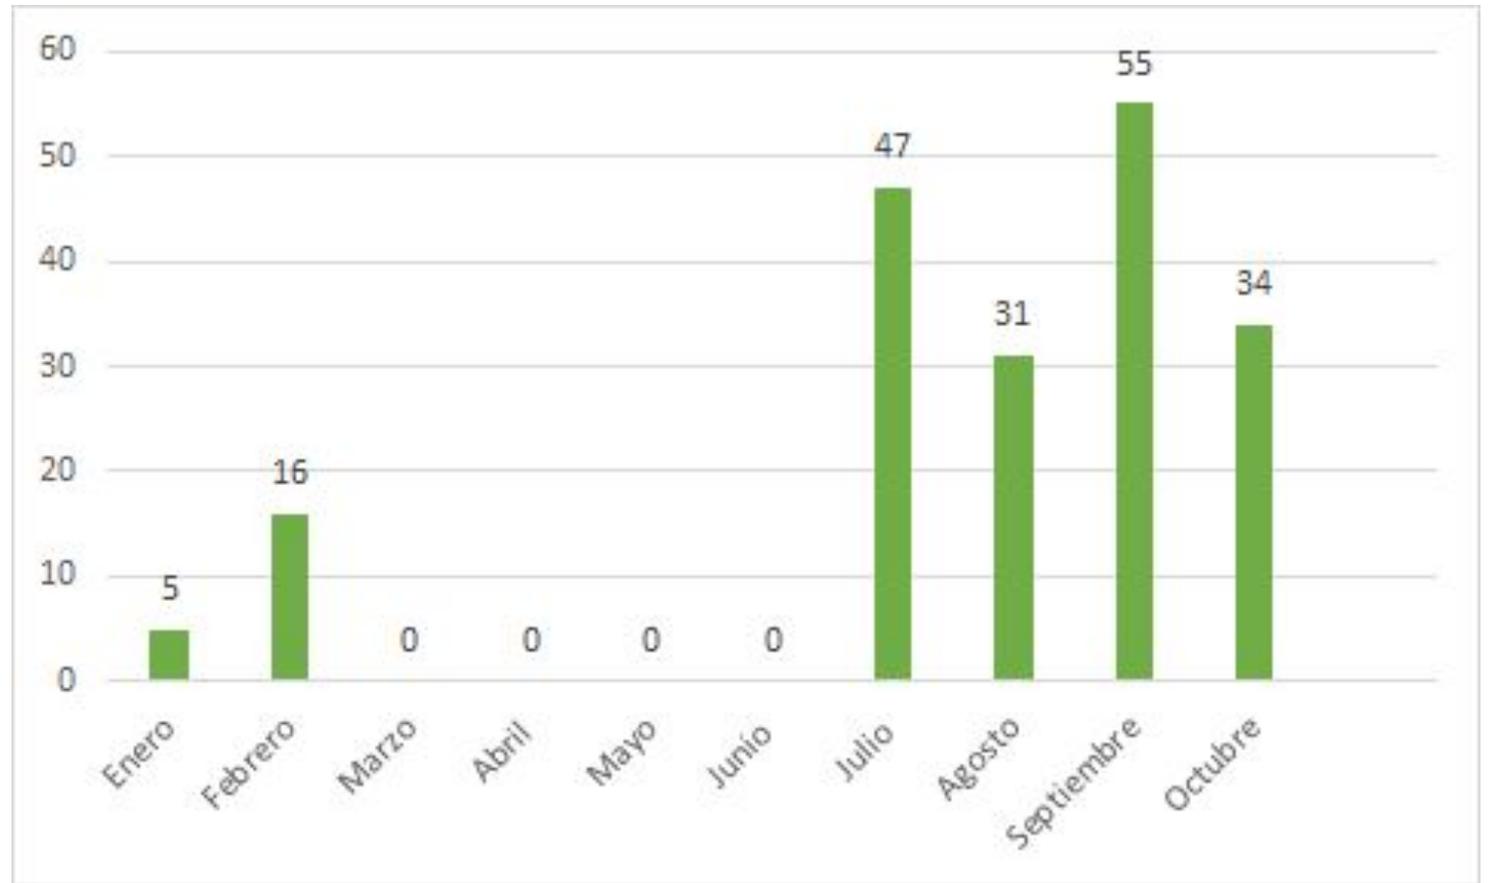

# ALC. VENUSTIANO CARRANZA

Tema	Indicador	Periodicidad	Quincena Al 18/11	Quincena Al 02/11	Próximo reporte	Observaciones
Luminarias	Número de luminarias reparadas en vías secundarias	Quincenal	24	0	16 de noviembre	La Coordinación territorial Morelos no reporta trabajos de reparación de luminarias.
Tiraderos Clandestinos	Toneladas de residuos sólidos recolectados de tiraderos clandestinos en el PB de VC (línea base 26 tiraderos)	Quincenal	893.2	954.8	16 de noviembre	Se recolectaron 31 toneladas diariamente de Residuos Sólidos
Poda de árboles	Número de sujetos forestales podados en vías secundarias y/o plazas	Quincenal	0	28	16 de noviembre	Se detalla la ubicación y causa en el Anexo
Desazolve de drenaje	Metros lineales de la red de drenaje desazolvados	Quincenal	460	114	16 de noviembre	Se desazolvaron 574 metros lineales en el periodo mencionado
Mantenimiento de vialidades	Se realizó mantenimiento (bacheo) en distintas vialidades de esta Alcaldía	Quincenal	145	145	16 de noviembre	

# ALC. VENUSTIANO CARRANZA

REPORTE DE PODAS REALIZADAS EN EL PERIMETRO B EN LA ALCALDIA VENUSTIANO CARRANZA					
DIRECCION	ENTRE CALLES		COLONIA	CANTIDAD	MOTIVO
3ra. cerrada de San Antonio Tomatlán n° 2	Héroe de Nacoziari	San Antonio Tomatlán	7 de julio	2	Reducción de Copa
4ta. cerrada de San Antonio Tomatlán n° 4	Héroe de Nacoziari	San Antonio Tomatlán	7 de julio	1	Reducción de Copa
2da. cerrada de San Antonio Tomatlán n° 20	San Antonio Tomatlán	Héroe de Nacoziari	7 de julio	2	Reducción de Copa
San Antonio Tomatlán n° 185	San Antonio Tomatlán	Ing. Eduardo Molina	7 de julio	2	Reducción de Copa
San Antonio Tomatlán n° 200	1ra. cerrada de San Antonio Tomatlán	2da. cerrada de San Antonio Tomatlán	7 de julio	1	Reducción de Copa
San Antonio Tomatlán n° 218	2da. cerrada de San Antonio Tomatlán	3ra. cerrada de San Antonio Tomatlán	7 de julio	1	Reducción de Copa
San Antonio Tomatlán N° 218	2da. Cerrada de Héroe de Nacoziari		7 de julio	6	Reducción de Copa
San Antonio Tomatlán N° 216 - 218	5ta. Cerrada de San Antonio Tomatlán	2da. Cerrada de Héroe de Nacoziari	7 de julio	1	Reducción de Copa

REPORTE DE PODAS REALIZADAS EN EL PERIMETRO B EN LA ALCALDIA VENUSTIANO CARRANZA					
DIRECCION	ENTRE CALLES		COLONIA	CANTIDAD	MOTIVO
San Antonio Tomatlán N° 218 Bis	5ta. Cerrada de San Antonio Tomatlán	2da. Cerrada de Héroe de Nacoziari	7 de julio	1	Reducción de Copa
San Antonio Tomatlán N° 228	2da. Cerrada de Héroe de Nacoziari	3ra. Cerrada de Héroe de Nacoziari	7 de julio	1	Reducción de Copa
San Antonio Tomatlán N° 256 -502	4ta. Cerrada de San Antonio Tomatlán	5ta. Cerrada de San Antonio Tomatlán	7 de julio	3	Reducción de Copa
4ta. Cerrada de San Antonio Tomatlán N° 12	San Antonio Tomatlán	Héroe de Nacoziari	Penitenciaría	1	Reducción de Copa
2da. Cerrada de Héroe de Nacoziari N° 13	San Antonio Tomatlán	Héroe de Nacoziari	7 de julio	2	Reducción de Copa
2da. Cerrada de Héroe de Nacoziari N° 10	San Antonio Tomatlán	Héroe de Nacoziari	7 de julio	1	Reducción de Copa
San Antonio Tomatlán	esquina Ferrocarril de Cintura		10 de mayo	1	Reducción de Copa
San Antonio Tomatlán N° 139 bis	Sastreía	Encuademadores	10 de mayo	1	Reducción de Copa
San Antonio Tomatlán N° 159 entre	Tajiclería	2da cerrada de San Antonio Tomatlán	10 de mayo	1	Reducción de Copa
<b>TOTAL</b>				<b>28</b>	

Sujetos forestales podados en vías secundarias


# ALC. VENUSTIANO CARRANZA

RELACION DE TIRADEROS CLANDESTINOS				
Nº. CONSECUTIVO	UBICACIÓN	TIPO DE RESIDUOS SÓLIDOS %	CANTIDAD TONS	SECTOR
01	MIGUEL DOMINGUEZ Y PENITENCIARIA COL. AMPLIACIÓN PENITENCIARIA	90% BASURA 10% CASCAJO	1.8	S-1
02	EJE 1 NORTE Y HORTELANOS COL. MORELOS	90% BASURA 10% CASCAJO	1.5	S-1
03	AV. CIRCUNVALACIÓN ENTRE HÉROES DE NACUZARI Y SAN ANTONIO TOMATLAN	85% BASURA 15% CASCAJO	1.2	S-2
04	ZAPATA ESQ. AV. CIRCUNVALACIÓN	85% BASURA 15% CASCAJO	1	S-2
05	NACIONAL ESQ. VIDAL ALCOECER	85% BASURA 15% CASCAJO	0.5	S-2
06	COSTA RICA ESQ. VIDAL ALCOECER	85% BASURA 15% CASCAJO	2	S-2
07	PEÑA Y PEÑA ESQ. VIDAL ALCOECER	85% BASURA 15% CASCAJO	0.7	S-2
08	VIDAL ALCOECER Y BERRIOZABAL COL. MORELOS	85% BASURA 15% CASCAJO	2.8	S-2
09	AV. CIRCUNVALACIÓN Y G. PEDRAZA (MERCADO DULCES I) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	1.9	S-9
10	AV. CIRCUNVALACIÓN Y CARRIZAL (MERCADO DE FLORES) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.6	S-9
11	AV. CIRCUNVALACIÓN Y CARRETONES (METRO MERCED) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.4	S-9
12	JUAN DE LA GRANJA Y CORREGIDORA (LAS CANCHAS) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.5	S-9
13	SANTA ESCUELA Y CUADRANTE DE LA SOLEDAD COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.4	S-9

Relación tiraderos clandestinos

RELACION DE TIRADEROS CLANDESTINOS				
Nº. CONSECUTIVO	UBICACIÓN	TIPO DE RESIDUOS SÓLIDOS %	CANTIDAD TONS	SECTOR
14	ROSARIO ESQ. PLAZA SAN LAZARO (ATRÁS DE LA IGLESIA) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.6	S-9
15	AV. CIRCUNVALACIÓN Y SOLEDAD COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	2	S-9
16	AV. CIRCUNVALACIÓN Y MANZANARES COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	2.6	S-9
17	JUAN PABLO ESQ. CORREGIDORA COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.4	S-9
18	CONGRESO DE LA UNIÓN ESQ. GENERAL ANAYA COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.6	S-9
19	GENERAL ANAYA ESQ. JUAN DE LA GRANJA COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.5	S-9
20	JUAN DE LA GRANJA ESQ. SAN CIPRIAN COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	3	S-9
21	CORREGIDORA Y SAN SIMÓN COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	0.3	S-9
22	PLAZA DE LA SOLEDAD, SAN SIMÓN Y SANTA ESCUELA COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	0.4	S-9
23	TOLVA 2 COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	2.8	S-9
24	TOLVA 3 COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	1.8	S-9
25	AV. CIRCUNVALACIÓN Y CARRETONES COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	0.3	S-9
26	JUAN DE LA GRANJA ESQ. SAN CIPRIAN COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	0.4	S-9

# ALC. VENUSTIANO CARRANZA

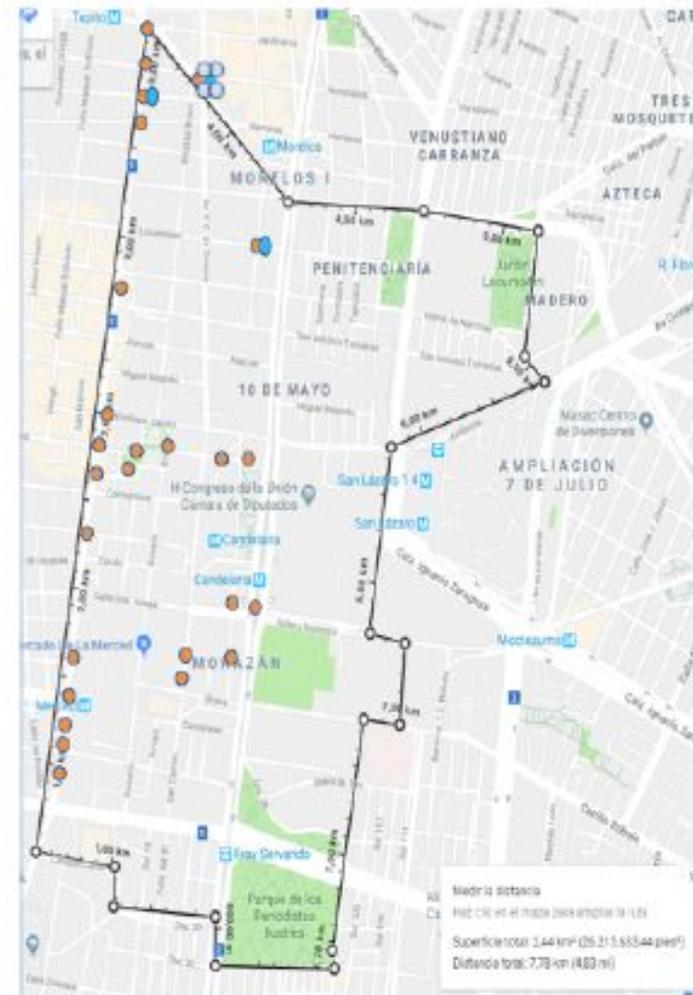

Relación tiraderos clandestinos

Montón Tradicional

Recolección de cascajo

CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS


“2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”

# ALC. VENUSTIANO CARRANZA

**INFORME DEL PERIMETRO "B"  
DEL 16 AL 22 DE OCTUBRE**

METROS LINEALES DE LA RED DE DRENAJE DESAZOLVADOS					
DIRECCION	ENTRE CALLES		COLONIA	CANTIDADMML	MOTIVO
VENEGAS ARROYO S/N	CARRETONES	ADOLFO GURRIION	CENTRO II	88	COLADERA PLUVIAL ALBAÑAL DOMICILIARIO Y ATARJEA DE 0.30 φ
SAN CIPRIAN S/N	CANDELARIA	CORREGIDORA	U.H CANDELARIA DE LOS PATOS	138	REJILLA DE PISO Y ATARJEA DE 0.30 φ
SAN A. TOMATLAN N° 87	F.C DE CINTURA	BRAVO	CENTRO I	72	ALBAÑAL DOMICILIARIO Y ATARJEA DE 0.30 φ
F.C DE CINTURA N° 40	ALARCON	SAN A. TOMATLAN	CENTRO I	18	ALBAÑAL DOMICILIARIO
MANZANARES N°56	CIRCUNVALACION	LIMON	CENTRO I	120	ATARJEA DE 0.30 φ
JARDINEROS N° 43	F.C DE CINTURA	HOJALATERIA	MORELOS II	12	ALBAÑAL DOMICILIARIO
LABRADORES N° 45	F.C DE CINTURA	HOJALATERIA	MORELOS II	12	ALBAÑAL DOMICILIARIO
<b>TOTAL:</b>				<b>460</b>	

Mapa del Perímetro B  
Alcaldía Venustiano Carranza

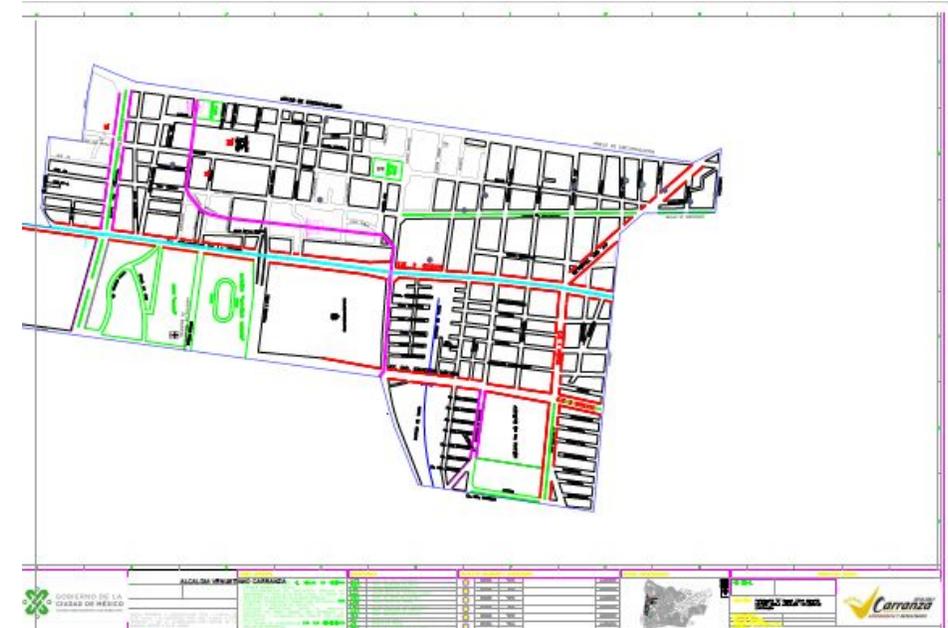

Metros lineales de la red de drenaje  
desazolvados

CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS

“2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”

# ALC. VENUSTIANO CARRANZA

**INFORME DEL PERIMETRO "B"  
DEL 23 AL 29 DE MARZO**

METROS LINEALES DE LA RED DE DRENAJE DESAZOLVADOS					
DIRECCION	ENTRE CALLES		COLONIA	CANTIDADML	MOTIVO
CORREGIDORA N° 148	ROSARIO	SAN CIPRIAN	CENTRO I	10	ALBAÑAL DOMICILIARIO
F.C DE CINTURA No. 48	HEROE DE NACUZARI	SAN A. TOMATLÁN	CENTRO I	18	ALBAÑAL DOMICILIARIO
BRAVO No. 50	HEROE DE NACUZARI	LECUMBERRI	CENTRO I	12	ALBAÑAL DOMICILIARIO
FERROCARRIL DE CINTURA No. 50	HEROE DE NACUZARI	SAN A. TOMATLÁN	CENTRO I	14	ALBAÑAL DOMICILIARIO
SAN CIPRIAN S/N	ESTEBAN MARTI	ABRAHAM OLVERA	CENTRO II	16	ALBAÑAL DOMICILIARIO
PRADERA N° 22	GRAL. ANAYA	ZAVALA	CENTRO II	12	ALBAÑAL DOMICILIARIO
PROLONGACION CURTIDURÍA No. 25	EMILIANO ZAAPATA	MIGUEL NEGRETE	10 DE MAYO	12	ALBAÑAL DOMICILIARIO
PROLONGACION CURTIDURÍA S/N	MIGUEL NEGRETE	EMILIANO ZAPATA	10 DE MAYO	8	COLADERA PLUVIAL
PROLONGACION SASTRERÍA No. 40	ESQ. MIGUEL NEGRETE		10 DE MAYO	12	ALBAÑAL DOMICILIARIO

TOTAL: 114

Metros lineales de la red de drenaje desazolvados

Mapa del Perímetro B  
Alcaldía Venustiano Carranza



CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS

“2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”

# ALC. VENUSTIANO CARRANZA

MANTENIMIENTO EN VIALIDADES (BACHEO)				
DIRECCION	ENTRE CALLES		COLONIA	CANTIDADM2
BERRIOZAVAL S/N	VIDAL ALCOCER	F.C DE CINTURA	MORELOS I	225
PEÑA Y PEÑA S/N	VIDAL ALCOCER	BRAVO	MORELOS I	65
			<b>TOTAL</b>	<b>290</b>



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



CENTRO HISTÓRICO




MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Al. V. Carranza | ene - oct


368

Reparaciones de luminarias

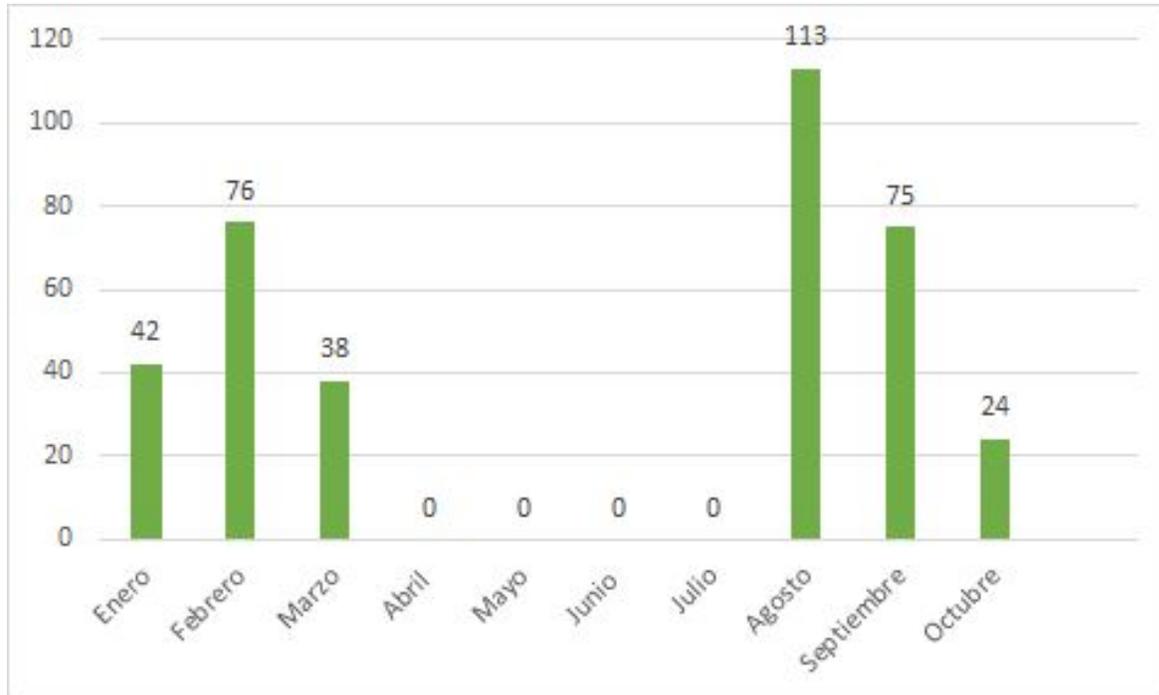

18,730.2 m<sup>3</sup>

Residuos sólidos recolectados

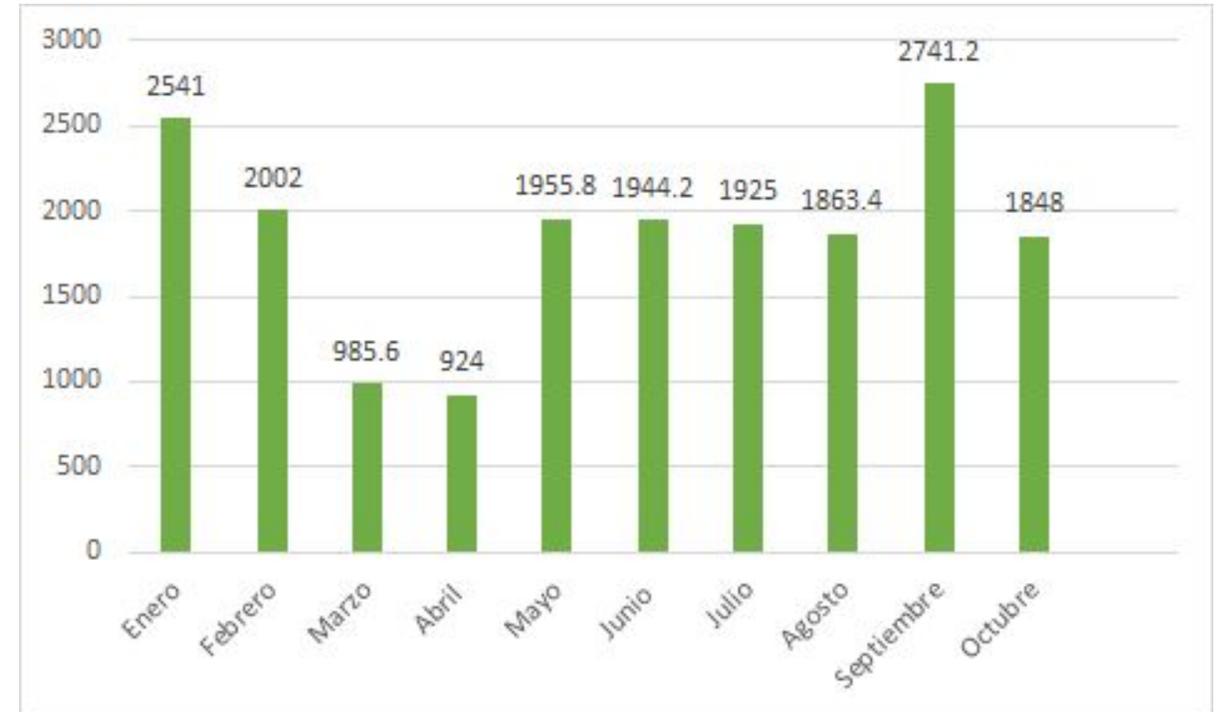



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



SECRETARÍA DE  
CULTURA  
CENTRO  
HISTÓRICO




MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Al. V. Carranza | ene - oct


741

Número de sujetos forestales podados en vías secundarias y plazas

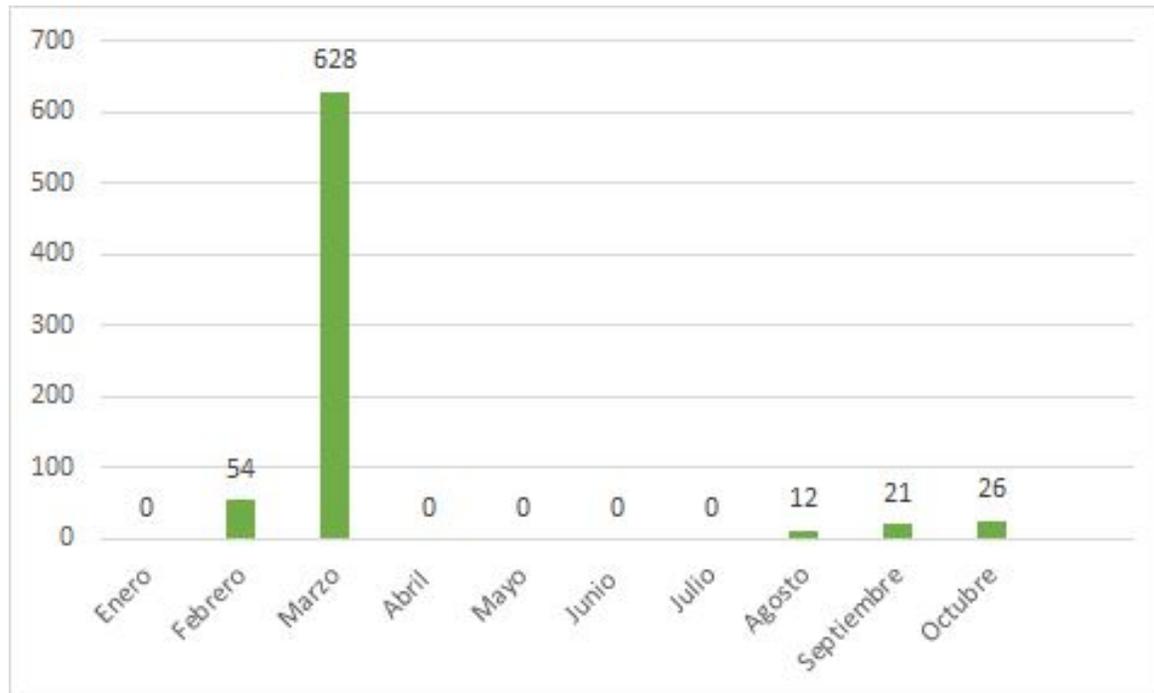

2,426

metros de la red de drenaje desazolvados en PB

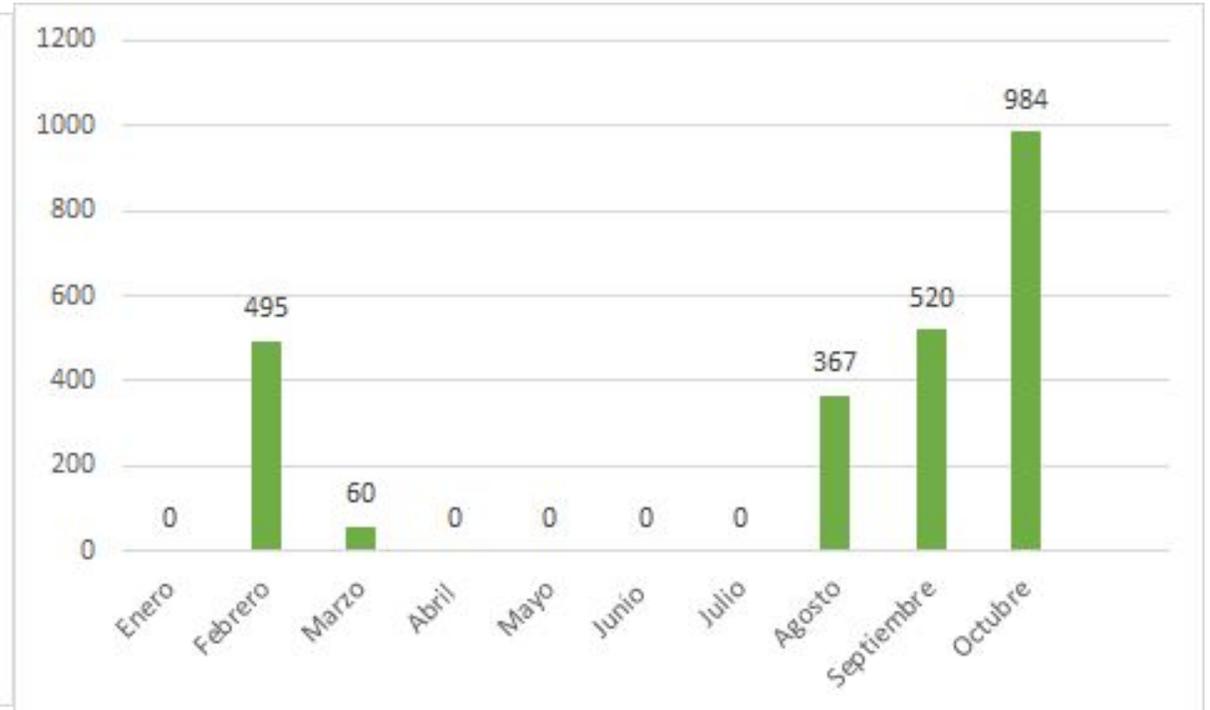

# DESAZOLVE DE LA RED DE DRENAJE Y ACCESORIOS HIDRÁULICOS DEL CENTRO HISTÓRICO



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



SACMEX

CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL  
CENTRO  
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

# METAS DEL PROGRAMA

**12,000** metros de atarjea

**250** pozos de visita

**100** rejillas de piso

**100** coladeras pluviales

**900** metros de albañal




AUTORIZADO POR  
CENTRO  
HISTORICO

# EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

20 % DE AVANCE

	PROGRAMADO	AVANCE
ATARJEA (METROS)	12,000	2,400
POZOS DE VISITA	250	50
REJILLAS DE PISO	100	20
COLADERAS PLUVIALES	100	25
ALBAÑAL (METROS)	900	180

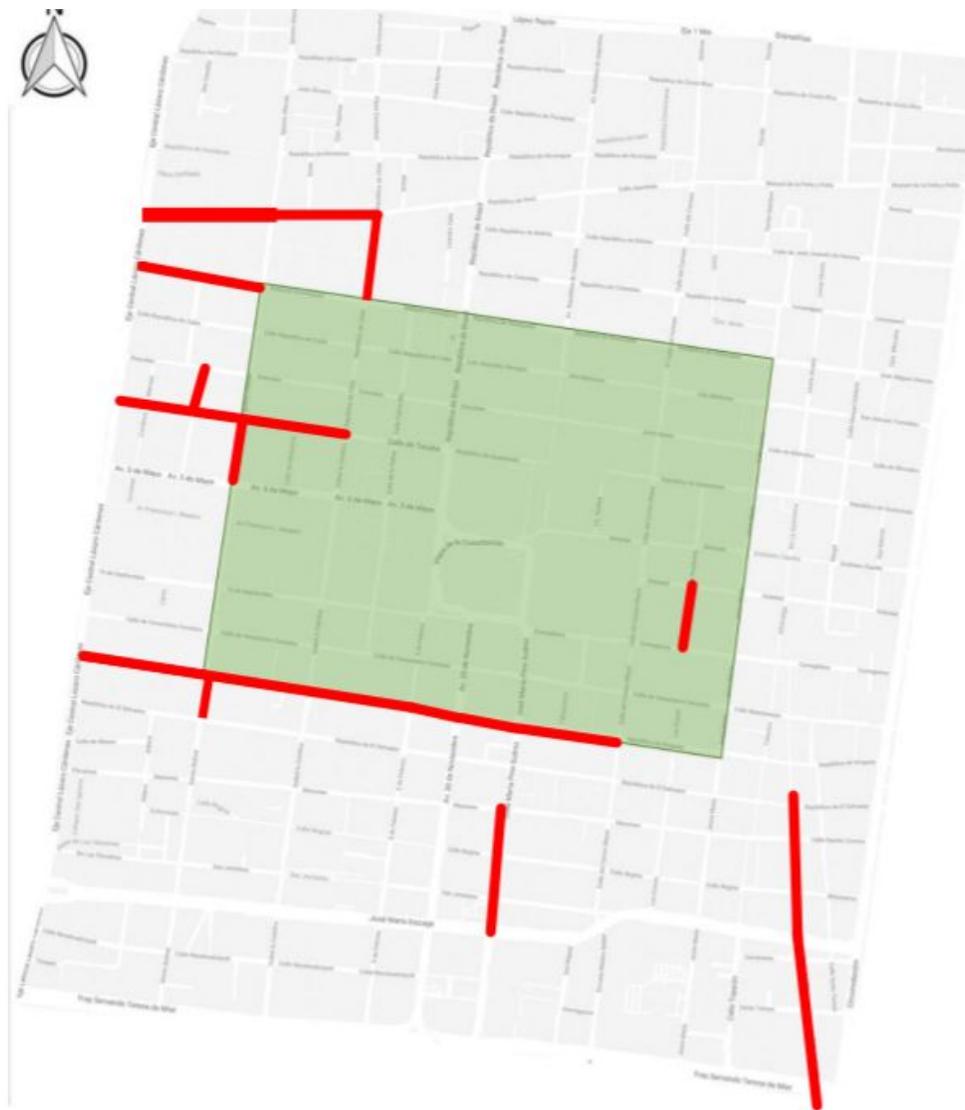



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

AUTORIDAD DEL  
CENTRO  
HISTÓRICO

# REPORTE FOTOGRÁFICO



**REPÚBLICA DE URUGUAY**  
ENTRE 5 DE FEBRERO Y CORREO MAYOR



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

AUTORIDAD DEL  
CENTRO  
HISTÓRICO

# REPORTE FOTOGRÁFICO



**CALLE DE TACUBA**

ENTRE EJE CENTRAL LAZARO CÁRDENAS E ISABEL LA CATÓLICA



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL  
CENTRO  
HISTÓRICO

# REPORTE FOTOGRÁFICO



**CALLE DE XICOTENCATL**  
ENTRE CALLE DONCELES Y CALLE TACUBA



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

AUTORIDAD DEL  
CENTRO  
HISTÓRICO

# REPORTE FOTOGRÁFICO



**SIMÓN BOLIVAR**

ENTRE REPÚBLICA DEL SALVADOR Y MESONES



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO




AUTORIDAD DEL  
CENTRO  
HISTÓRICO


Sacmex | sep - oct

2da

etapa de  
desalzaolve

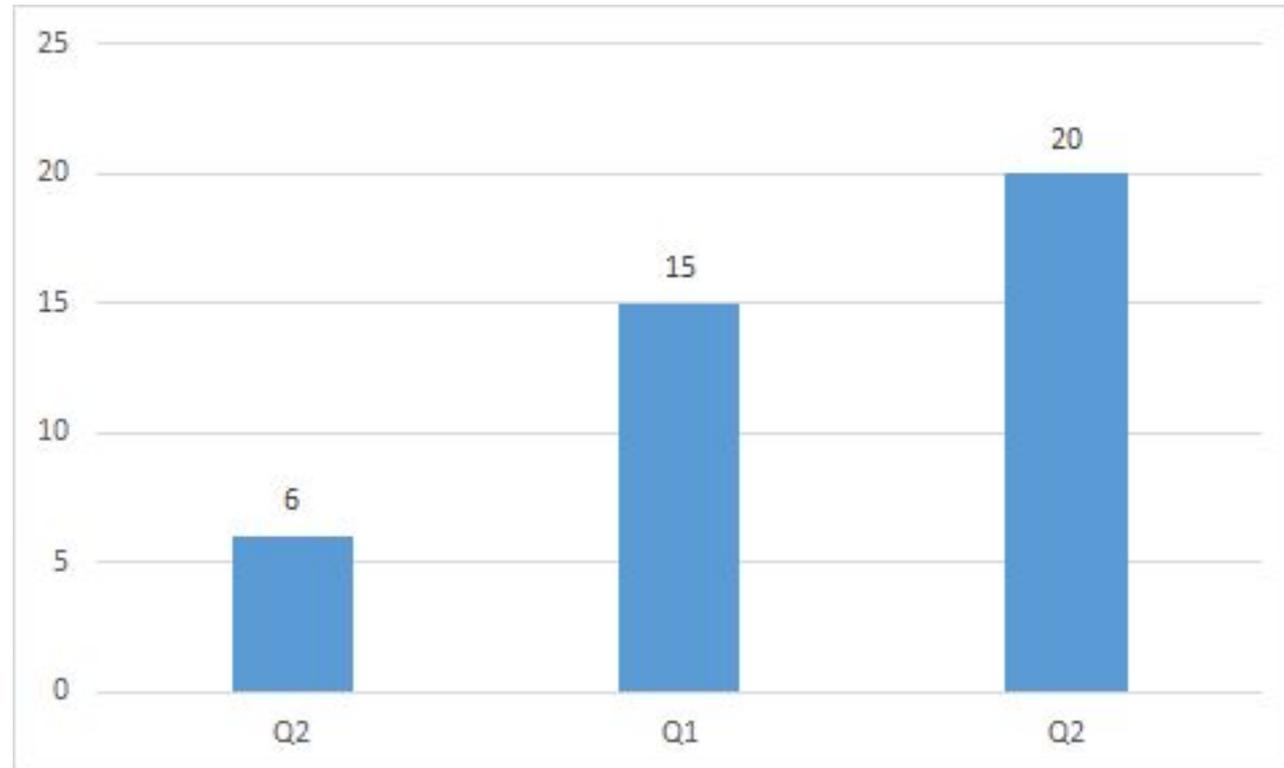

porcentaje de avance en el desalzaolve de la red de drenaje  
del CH



# Sustitución de líneas y redes de Agua Potable y Drenaje en el Centro Histórico

28 de octubre 2020



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



SACMEX



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



# Paseo de la Reforma

PERIODO DE EJECUCIÓN: mayo - octubre

Avance físico real: 87.96 %

Monto de Inversión C/IVA: \$ 42,145,361.70

**TURNOS DE TRABAJO:** Diurno

**PROBLEMÁTICA:** Interferencias subterráneas, lluvias intensas, presencia de puestos ambulantes, excavaciones a mano por procedimiento del INAH e interrupciones por localización de esqueletos y cráneos humanos debido a que la zona fue lugar de panteones..

AVANCE REAL: 70.36 %

## AGUA POTABLE



AGUA POTABLE			
Zona	Longitud (m)	Avance (m)	Avance %
Poniente	1100.00	694.00	51
Oriente	1000.00	874.00	87

### SIMBOLOGÍA

- Tubería existente
- Tubería instalada
- Cajas
- Cajas terminadas

**META:** 2, 200.00 metros

**INSTALADO:** 1, 438.00 metros

**DIÁMETRO:** 4, 6 y 12 pulgadas

**MATERIAL:** Polietileno de Alta densidad

**PROCESO CONSTRUCTIVO:** Cielo Abierto y Perforación Direccional

AVANCE REAL: 99.50 %

## DRENAJE



DRENAJE			
Zona	Longitud (m)	Avance (m)	Avance %
Poniente	1062.00	1062.00	100
Oriente	1018.00	1018.00	100

### SIMBOLOGÍA

- Tubería existente
- Tubería instalada

**META:** 2, 080.00 metros

**INSTALADO:** 2, 080.00 metros

**DIÁMETRO:** 0.38, 0.60 metros

**MATERIAL:** Polietileno de Alta densidad Corrugado

**PROCESO CONSTRUCTIVO:** Cielo Abierto



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



SACMEX

# Balderas

PERIODO DE EJECUCIÓN: mayo - octubre

Avance físico real: 33.51 %

Monto de Inversión C/IVA: \$ 27,838,717.52

**TURNOS DE TRABAJO:** Diurno

**PROBLEMÁTICA:** Interferencias (CFE, TELMEX IZZI, METRO, METROBUS, SEMAFOROS), presencia de puestos ambulantes, lluvias intensas, excavaciones a mano por procedimiento del INAH. **Se presenta muro arqueológico sobre Av. Balderas entre la calle de Independencia y Av. Juárez lado oriente en el tramo de drenaje.**

## AGUA POTABLE

AVANCE REAL: 68.89 %



AGUA POTABLE			
Zona	Longitud (m)	Avance (m)	Avance %
Poniente	1259.00	1003.00	80
Oriente	1110.00	228.00	21

### SIMBOLOGÍA


- Tubería existente
- Tubería instalada
- Cajas
- Cajas terminadas

**META:** 2, 369.00 metros  
**INSTALADO:** 1, 231.00 metros

**DIÁMETRO:** 6 Y 12 pulgadas  
**MATERIAL:** Polietileno de Alta densidad  
**PROCESO CONSTRUCTIVO:** Cielo Abierto

## DRENAJE

AVANCE REAL: 75.66 %

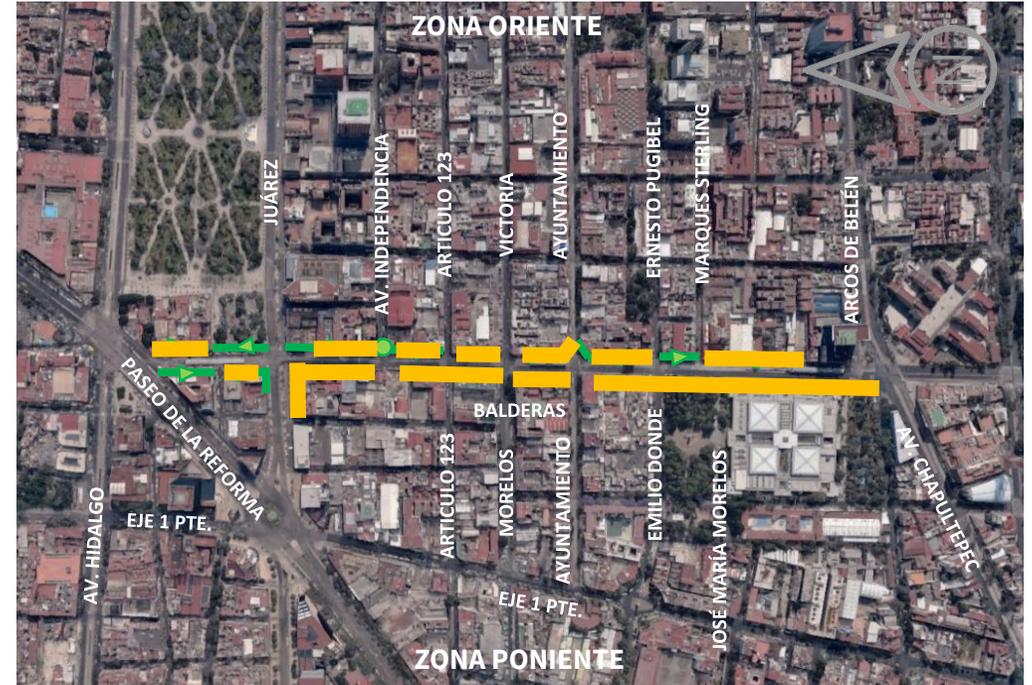

DRENAJE			
Zona	Longitud (m)	Avance (m)	Avance %
Poniente	1028.00	862.00	80
Oriente	907.00	608.00	46

### SIMBOLOGÍA

- Tubería existente
- Tubería instalada

**META:** 1, 935.00 metros  
**INSTALADO:** 1, 470.00 metros

**DIÁMETRO:** 0.30, 0.38 y 0.45 metros  
**MATERIAL:** Polietileno de Alta densidad Corrugado  
**PROCESO CONSTRUCTIVO:** Cielo Abierto y Tubería Polimérica Curada en Sitio



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



# Avenida Chapultepec

PERIODO DE EJECUCIÓN: mayo- octubre

Avance físico real global: 92.34 %

Monto de Inversión C/IVA \$ 31,137,921.81

**PROBLEMÁTICA:** Interferencias (CFE ,TELMEX IZZI, METRO, METROBUS, SEMAFOROS,); lluvias intensas, presencia de puestos ambulantes, excavaciones a mano por procedimiento del INAH.

**TURNOS DE TRABAJO:** Diurno y Nocturno dependiendo de las condiciones climatológicas

## AGUA POTABLE

Zona Norte concluido

AVANCE REAL: 100 %



**META:** 1, 320.00 metros  
**INSTALADO:** 1, 320.00 metros

**DIÁMETRO:** 6 Y 12 pulgadas  
**MATERIAL:** Polietileno de Alta densidad  
**PROCESO CONSTRUCTIVO:** Cielo Abierto y Perforación Direccional

### SIMBOLOGÍA

- Tubería existente
- Tubería instalada
- Frentes de trabajo
- Cajas
- Cajas terminadas

## DRENAJE

Zona Norte concluido

AVANCE REAL: 100 %



**META:** 933.70 metros  
**INSTALADO:** 933.70 metros

**DIÁMETRO:** 0.38 metros  
**MATERIAL:** Polietileno de Alta densidad Corrugado  
**PROCESO CONSTRUCTIVO:** Cielo Abierto y Tubería Polimérica Curada en Sitio

### SIMBOLOGÍA

- Tubería existente
- Tubería instalada
- Frentes de trabajo



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



# Avenida Chapultepec

PERIODO DE EJECUCIÓN: mayo- octubre

**PROBLEMÁTICA:** Interferencias (CFE ,TELMEX IZZI, METRO, METROBUS, SEMÁFOROS,); lluvias intensas, presencia de puestos ambulantes, excavaciones a mano por procedimiento del INAH.

**TURNOS DE TRABAJO:** Diurno y Nocturno dependiendo de las condiciones climatológicas

## AGUA POTABLE

AVANCE REAL: 100 %

Zona Sur en proceso de



Agua Potable		Long. (m)	Avance ( m )	Avance %
F1	Glorieta de Insurgentes a Frontera	433	433	100
F2	Frontera a Eje 1 Pte.	381	381	100
F3	Eje 1 Pte. a Rafael Lucio	185	185	100

### SIMBOLOGÍA

- Tubería existente
- Tubería instalada
- Frentes de trabajo
- Cajas
- Cajas terminadas

**META:** 999.00 metros  
**INSTALADO:** 999.00 metros

**DIÁMETRO:** 6 Y 12 pulgadas  
**MATERIAL:** Polietileno de Alta densidad  
**PROCESO CONSTRUCTIVO:** Cielo Abierto y Perforación Direccional

## DRENAJE

AVANCE REAL: 100 %

Zona Sur en proceso de



Drenaje		Long. (m)	Avance ( m )	Avance %
F1	Glorieta de Insurgentes a Frontera	368	368	100
F2	Frontera a Eje 1 Pte.	600	600	88
F3	Eje 1 Pte. a Rafael Lucio	180	180	100

### SIMBOLOGÍA

- Tubería existente
- Tubería instalada
- Frentes de trabajo

**META:** 1, 148.00 metros  
**INSTALADO:** 1, 148.00 metros

**DIÁMETRO:** 0.38 metros  
**MATERIAL:** Polietileno de Alta densidad Corrugado  
**PROCESO CONSTRUCTIVO:** Cielo Abierto y Tubería Polimérica Curada en Sitio



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



CENTRO HISTÓRICO




MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

SACMEX jun - oct

90.5 %  
de avance

% DE OBRA

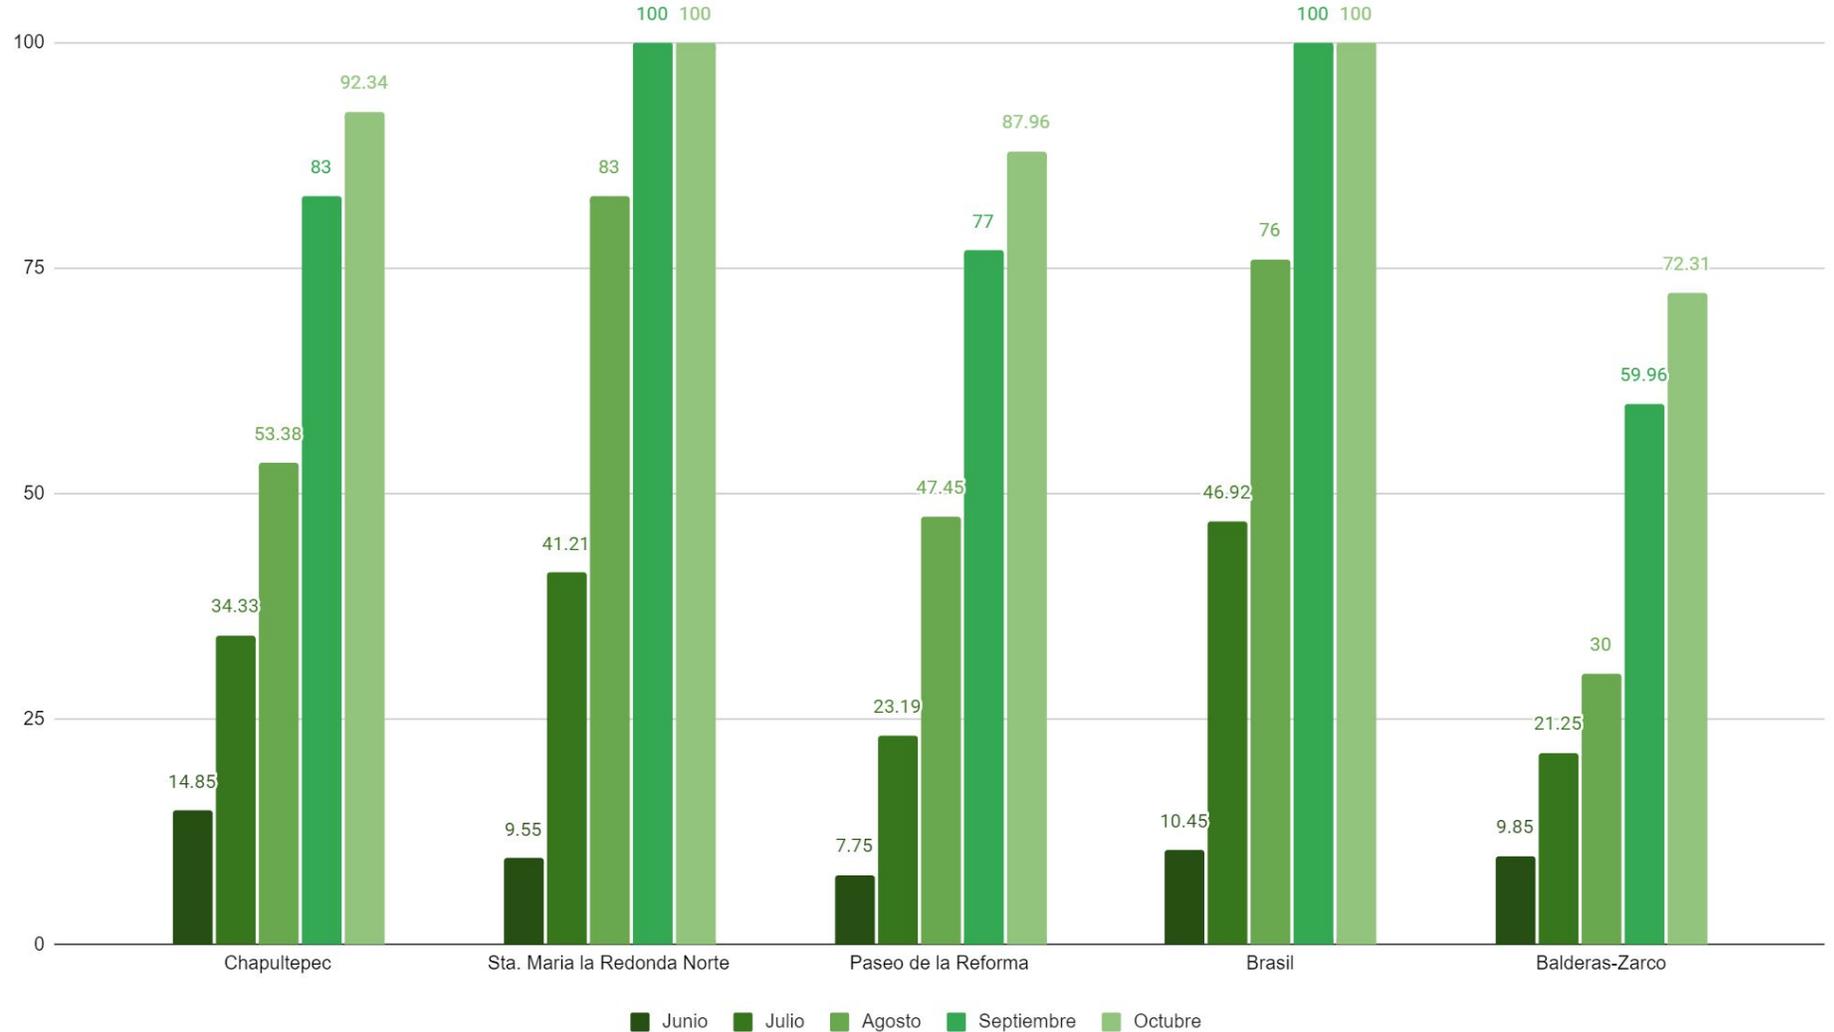



# **Dirección General de Obras de Infraestructura Vial**

**“Proyecto Rescate Urbano del  
Centro Histórico”**

**3-nov-2020**

# RESCATE URBANO DEL CENTRO HISTÓRICO



**INVERSIÓN 2020-2021**  
**270 MDP**

**ÁREA A INTERVENIR**  
**83,500 M<sup>2</sup>**


OBRA	PROGRAMADO	REAL
EJE CENTRAL	43.09%	40.39%
BRASIL PERÚ-EJE 1	27.78%	31.20%
BRASIL TACUBA-PERÚ	29.62%	15.62%
AV. BALDERAS	EN LICITACIÓN FALLO: 26 DE OCTUBRE	
ZARCO	INICIO DE OBRA	
SANTA MA. LA REDONDA	12.99 %	8.21%

# RESCATE URBANO DEL CENTRO HISTÓRICO

		PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE OBRA CENTRO HISTORICO 2020-2021																																				
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	AVANCE	JULIO 2020				AGOSTO 2020				SEPTIEMBRE 2020				OCTUBRE 2020				NOVIEMBRE 2020				DICIEMBRE 2020					ENERO 2021				FEBRERO 2021				MARZO 2021			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
EJE CENTRAL LAZARO CARDENAS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE PLAZA GARIBALDI A EJE 1 NORTE	PROGRAMADO	10/08/20																43.09%				100%					22/12/20											
	REAL					10/08/20												40.39%																				
REPUBLICA DE BRASIL TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE REPÚBLICA DE PERU A EJE 1 NORTE	PROGRAMADO																	27.78%				100%					30/12/20											
	REAL	01/07/20																31.20%																				
REPUBLICA DE BRASIL TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE TACUBA A REPÚBLICA DE PERU	PROGRAMADO																	29.62%				100%					30/12/20											
	REAL					20/07/20												15.62%																				
EJE CENTRAL LAZARO CARDENAS TRABAJOS DE BAJA Y MEDIA TENSIÓN DE PLAZA GARIBALDI A EJE 1 NORTE	PROGRAMADO					04/09/2020								02/11/2020				93.89%																				
	REAL									07/09/20								91.80%																				
REPUBLICA DE BRASIL TRABAJOS DE BAJA Y MEDIA TENSIÓN DE REPÚBLICA DE PERU A EJE 1 NORTE	PROGRAMADO					03/09/2020												69.15%				100%					31/12/20											
	REAL									17/09/20								64.85%																				
REPUBLICA DE BRASIL TRABAJOS DE DUCTO MAESTRO	PROGRAMADO									17/09/2020								31/10/2020				100.00%																
	REAL									17/09/20								66.00%																				
SANTA MARIA LA REDONDA NORTE TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y RECONFIGURACIÓN	PROGRAMADO									09/10/20								12.99%									100%				04/03/21							
	REAL																	8.21%																				
CALLE ZARCO TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y RECONFIGURACIÓN	PROGRAMADO									05/10/20								0.00%									100%				05/02/21							
	REAL																	0.00%																				
AV. BALDERAS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y RECONFIGURACIÓN	PROGRAMADO																	0.00%									100%											
	REAL																	0.00%																				
AV. BALDERAS TRABAJOS DE OBRA CIVIL EN BAJA Y MEDIA TENSIÓN	PROGRAMADO									08/10/20								0.00%				100%					21/11/20											
	REAL																	0.00%																				




# EJE CENTRAL – CENTRO HISTÓRICO

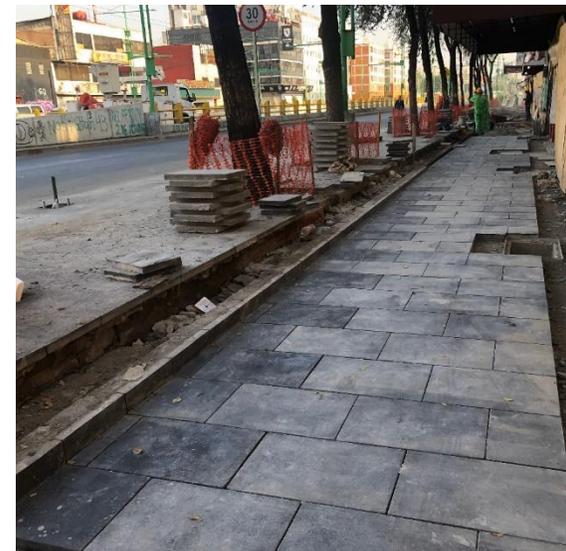

# REPÚBLICA DE BRASIL (REP. DE PERÚ – EJE 1 NORTE)



# REPÚBLICA DE BRASIL (CALLE DE TACUBA - REP. DE PERÚ)

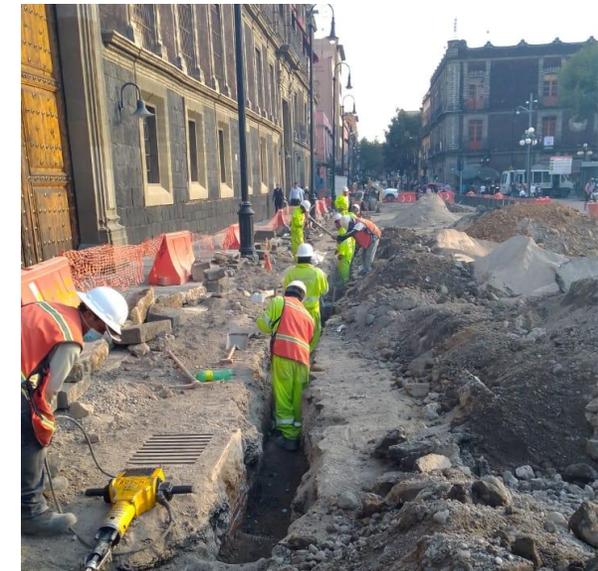



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO




MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

# SOS-DGOIV

agos-oct

## Proyecto Rescate Urbano del Centro Histórico

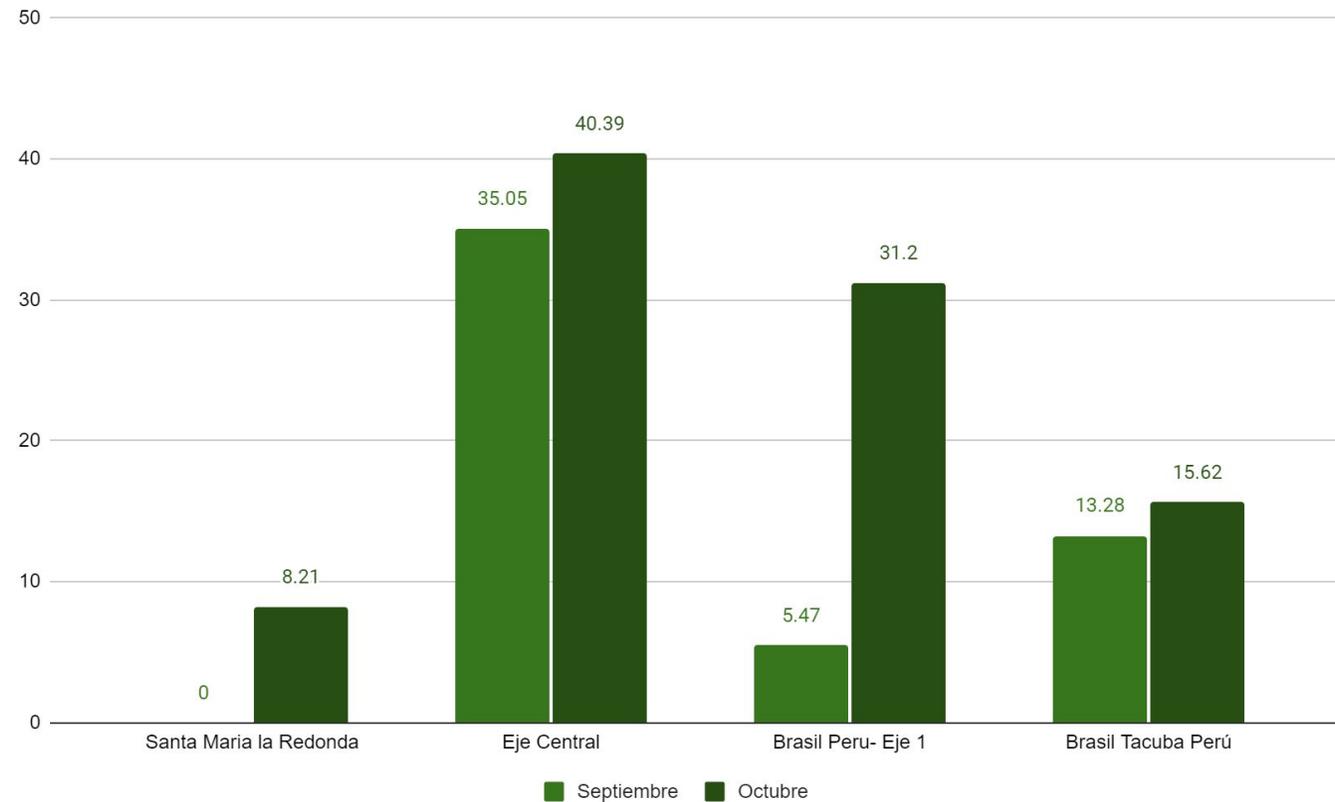



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

CENTRO  
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

## SOS – Alumbrado Público

Semana 44

Tema	Indicador	Periodicidad	Semana 43	Semana 44	Próximo reporte
Alumbrado Público	Número de luminarias reparadas en vías del PA del CH	Semanal	26-oct-20 32	02-NOV-20 956	16-nov-20



# SOS – Alumbrado Público | Anexo 1

Semana 43

## REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A

DIRECCION	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	MOTIVO	INCIDENCIA
FRANCISCO I. MADERO	PALMA Y EJE CENTRAL	CENTRO	25	RECONEXIÓN DE LÍNEAS	LUMINARIAS APAGADAS
ALAMEDA CENTRAL	AV. HIDALGO Y AV. JUÁREZ	CENTRO	7	RECONEXIÓN DE LÍNEAS	LUMINARIAS APAGADAS
		TOTAL	32		



# SOS – Alumbrado Público | Anexo 1

Semana 44

## REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A


DIRECCION	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	MOTIVO	INCIDENCIA
FRANCISCO I. MADERO	PALMA A EJE CENTRAL	CENTRO	5	CAMBIO DE BALASTRO	LUMINARIAS APAGADAS
ALAMEDA CENTRAL	AV. HIDALGO Y AV. JUÁREZ	CENTRO	1	RECONEXION DE LINEAS	LUMINARIA APAGADA
AV. JUÁREZ	AZUETA Y REVILLAGIGEDO	CENTRO	21	RECONEXION DE LINEAS	CIRCUITOS APAGADOS
ALAMEDA CENTRAL	AV. HIDALGO Y AV. JUÁREZ	CENTRO	1	CAMBIO BALASTRO	LUMINARIA APAGADA
EDIFICIO DE MEDIO AMBIENTE	AV 20 DE NOVIEMBRE Y JOSÉ MARÍA PINO SUAREZ	CENTRO	331	CAMBIO DE COLOR	CAMBIO DE COLOR EN NARANJA , ENCONMEMORACIÓN DE DÍA DE MUERTOS
EDIFICIO VIRREINAL	20 DE NOVIEMBRE Y 5 DE FEBRERO	CENTRO	268	SE CAMBIA DE COLOR EDIFICIO	CAMBIO DE COLOR EN NARANJA, EN CONMEMORACIÓN DE DÍA DE MUERTOS
ASAMBLEA LEGISLATIVA	FRANCISCO I. MADERO Y 16 DE SEPTIEMBRE	CENTRO	329	SE CAMBIA DE COLOR EDIFICIO	CAMBIO DE COLOR EN NARANJA , EN CONMEMORACIÓN DE DÍA DE MUERTOS
		TOTAL	956		



## SOS – Alumbrado Público



### Acumulado enero - octubre

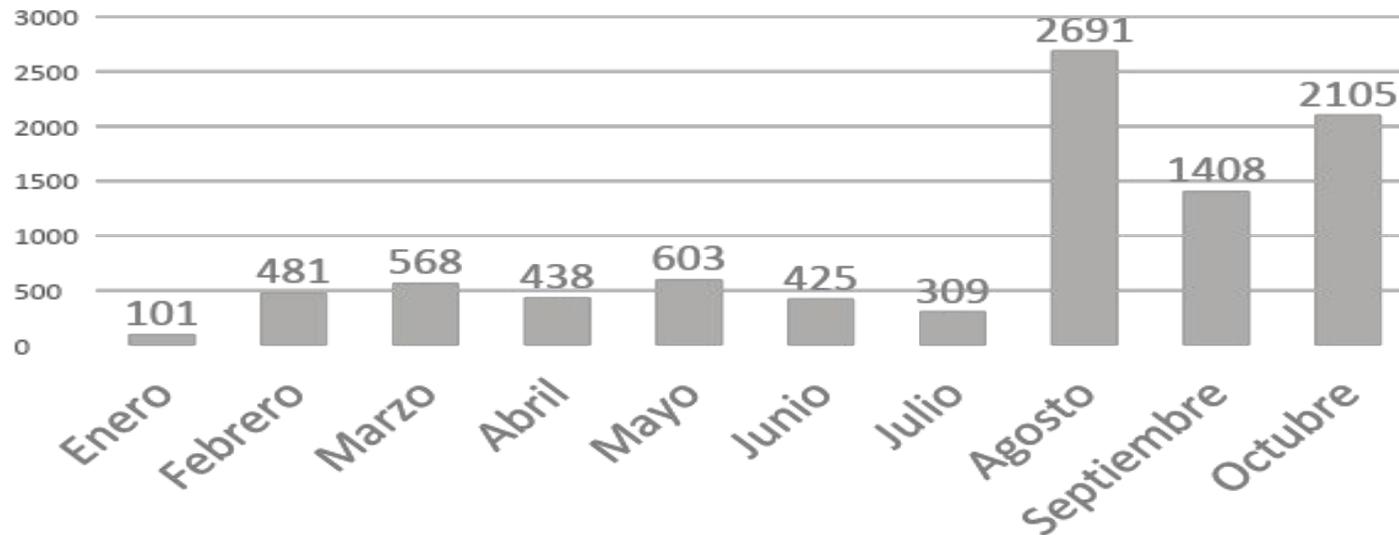

**9129**

**Luminarias reparadas en Perímetro A del Centro Histórico**



# DGSUyS

Tema	Indicador	Periodicidad	Quincenal del 05 al 18 de octubre de 2020	Quincenal del 19 de octubre al 01 de noviembre de 2020	Próximo reporte 15 de noviembre de 2020
Limpieza	Kilómetros Barridos de guarnición en el perímetro "A" del Centro Histórico	Quincenal	8,618.512 km.	8,618.512 Km.	
Limpieza	Metros cuadrados Barridos de Banquetas en el perímetro "A" del Centro Histórico	Quincenal	16,768,780 m2	16,768,780 m2	
Limpieza	Metros Cuadrados Barridos de Plazas y Corredores en el perímetro "A" del Centro Histórico	Quincenal	8,474,312 m2.	8,474,312 m2	



# DGSUyS

TemaIndicador		Periodicidad	Quincenal del 05 al 18 de octubre de 2020	Quincenal del 19 de octubre al 01 de noviembre de 2020	Próximo reporte de noviembre 2020	15 de
Limpieza	Kilómetros de Barrido Mecánico en el perímetro "A" del Centro Histórico	Quincenal	1,279.040 km	1,279.040 km		
	Tiraderos clandestinos Metros cúbicos de residuos sólidos levantados en tiraderos clandestino en el perímetro "A" del Centro Histórico	Quincenal	2,539 m3	2,379 m3		
Limpieza	Metros cúbicos de basura recolectada (Producto de Barrido) en el perímetro "A" del Centro Histórico	Quincenal	2,720 m3	2,548 m3		
Lavado	Metros cuadrados lavados en plazas, calles, corredores peatonales y semipeatonales en El perímetro "A" del Centro Histórico	Quincenal	872,218m2	726,921 m2		



# DGSUyS

Tema Indicador	Periodicidad	Quincenal del 05 al 18 de octubre de 2020	Quincenal del 19 de octubre al 01 de noviembre de 2020	Próximo reporte de noviembre 15 de 2020
Lavado equipamiento Urbano Metros Cuadrados de Lavado de equipamiento urbano En el Perímetro "A" del Centro Histórico	Quincenal	33,814 m2	33,342 m2	
Riego de áreas verdes Metros Cuadrados de Riego en Av. 20 de Noviembre y Espigas de Plaza de la Constitución	Quincenal	26,664 m2	26,664 m2	
Eliminación de grafiti Metros Cuadrados de grafiti eliminado en el Perímetro "A" el Centro Histórico	Quincenal	1,120 m2	745.50 m2	



# DGSUyS

Tema	Indicador	Periodicidad	Quincenal del 05 al 18 de octubre de 2020	Quincenal del 19 de octubre al 01 de noviembre de 2020	Próximo reporte 15 de noviembre de 2020
Aplicación de Pintura	Aplicación de pintura	Quincenal	1,605 m2	50 m2	
Desratización	Desratización en el Perimetro "A" y "B" del Centro Histórico	Quincenal	Colocación de 1,129 cebos block y 350 cebos cereal en 232,910 m2	Colocación de 800 cebos block, en 129,340 m2	




GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Acciones tomadas por la DGSUyS con el personal que realiza la Limpieza Integral del Centro Histórico en relación al COVID-19

- Se toma la temperatura todos los días en los tres turnos.
- Se les entrego caretas, cubrebocas y guantes a toda la gente para su protección.





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

## Acciones tomadas por la DGSUyS con el personal que realiza la Limpieza Integral del Centro Histórico en relación al COVID-19

Se realiza lavado en forma programada en 45 puntos de las plazas, corredores y sitios donde la gente se sienta regularmente, los que se atienden diario son;

- Parque de Bolsillo
- Accesos del Metro Zócalo
- Banqueta de Palacio Nacional
- Banqueta y escaleras de edificio de Gobierno
- Escaleras de la Suprema Corte de Justicia

Las demás bancas y arriates se lavan tres veces por semana

- Se realiza un lavado programado en todas las calles, plazas, corredores peatonales y semipeatonales del Perímetro "A" del Centro Histórico.





## Actividades de Limpieza Integral del Centro Histórico por parte de la DGSUyS

### SE REALIZO LA ELIMINACIÓN DE GRAFITI EN LAS SIGUENTES VIALIDADES:

VIALIDAD	Cantidad	U.M.
DONCELES ESQUINA ALLENDE (PROTESTA)	81	m2
CORREO MAYOR DE PERÚBLICA DE VENEZUELA A SAN JERÓNIMO	27	m2
JESÚS MARÍA DE SAN PABLO A REPÚBLICA DE VENEZUELA	19	m2
DONCELES DE EJE CENTRAL A REPÚBLICA DE ARGENTINA	56	m2
REPÚBLICA DE ARENTINA DE REPÚBLICA DE VENEZUELA A DONCELES	8	m2
BELISARIO DOMÍNGUEZ DE EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS A REPÚBLICA DE ARGENTINA	33	m2
TACUBA ESQUINA CONDESA	3.50	m2
5 DE MAYO DE EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS A MOTOLINIA	12	m2
PLAZA DEL EMPEDRADILLO	4	m2
REPÚBLICA DE CUBA DE REPÚBLICA DE BRASIL A EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	52	m2
PLAZA DE LA CONCEPCIÓN	61	m2
REPÚBLICA DE VENEZUELA DE JESÚS MARÍA A DEL CARMEN	13	m2
ACADEMIA DE CORREGIDORA A REPÚBLICA DE GUATEMALA	68	m2
SEGUNDO CALLEJÓN DE 5 DE MAYO	5	m2
REGINA DE 5 DE FEBRERO A SIMÓN BOLÍVAR	21	m2
CALLEJÓN DE MESONES DE 5 DE REGINA A MESONES	12	m2
MESONES DE ISABEL LA CATÓLICA A SIMÓN BOLÍVAR	36	m2
JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ DE REPÚBLICA DE URUGUAY A AV. JOSÉ MARÍA IZAZAGA	34	m2
SAN JERÓNIMO DE SIMÓN BOLÍVAR A ISABEL LA CATÓLICA	12	m2
16 DE SEPTIEMBRE ESQUINA EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	4	m2
VENUSTIANO CARRANZA DE EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS A AV. 5 DE FEBERRO	13	m2
5 DE FEBRERO DE REPÚBLICA DEL SALVADOR A AV. JOSÉ MARÍA IZAZAGA	24	m2



## Actividades de Limpieza Integral del Centro Histórico por parte de la DGSUyS

VIALIDAD	Cantidad	U.M.
AV. JUÁREZ FRENTE AL HEMICICLO A JUÁREZ (PROTESTA)	94	m2
CIRCUITO PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN FRENTE A PALACIO NACIONAL (PROTESTA)	53	m2
TOTAL ELIMINACIÓN DE GRAFITI	<b>745.50</b>	m2
<b>APLICACIÓN DE PINTURA</b>		
PINTADO DE VALLAS EN EL HEMICICLO A JUÁREZ	50	m2
TOTAL APLICACIÓN DE PINTURA	<b>50</b>	m2



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

## Actividades de Limpieza Integral del Centro Histórico por parte de la DGSUyS

ELIMINACIÓN DE 745.50 M2 DE GRAFITI VANDALICO Y DE PROTESTA Y APLICACIÓN DE PINTURA EN 50 M2





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

## Actividades de Limpieza Integral del Centro Histórico por parte de la DGSUyS





GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

## DGSUyS | Atención Fauna Nociva

SE REALIZO LA DESRATIZACIÓN POR MEDIO DE COLOCACIÓN DE 800 CEBOS BLOCK, EN UNA SUPERFICIE DE 129,340 M2 DE PLAZAS, CORREDORES Y VIALIDADES DEL CENTRO HISTÓRICO DEL PERIMETRO "A" Y "B"





## DGSUyS | Atención Fauna Nociva

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Plaza de la Solidaridad	A	Av. Juárez esquina Balderas Col. Centro Cuauhtémoc	Desratización 16 cebos block 860 m2
Plaza San Fernando	B	Eje 1 Poniente Guerrero, San Fernando, Puente de Alvarado col. Guerrero, Cuauhtémoc	Desratización 12 cebos block en 2,500 m2
Vialidad Puente de Alvarado	B	De Av. Paseo de la Reforma a callejón Sombrereros col. Centro Cuauhtémoc	Desratización 10 cebos block en 750 m2
Vialidad Eje 1 Poniente Rosales	B	De Puente de Alvarado a Av. Paseo de la Reforma col. Centro Cuauhtémoc	Desratización 16 cebos block en 900 m2
Vialidad Balderas	B	De Av. Paseo de la Reforma a Av. Juárez Col. Centro Cuauhtémoc	Desratización 20 cebos block en 1,200 m2
Plaza de la Santa Veracruz	A	Av. Hidalgo, Santa Veracruz Col. Centro Cuauhtémoc	Desratización 16 cebos block 300 m2
Alameda Central	A	Av. Juárez, Av. Hidalgo, Dr. Mora, Ángela Peralta Col. Centro Cuauhtémoc	Desratización 29 cebos block 33,000 m2
Vialidad Eje 1 Oriente Anillo de Circunvalación	B	Eje 1 Norte a San Pablo Col. Morelos, Venustiano Carranza	Desratización 36 cebos block 3,800 m2
Vialidad San Pablo	A	De Eje 1 Oriente a Av. José María Pino Suárez	Desratización 60 cebos block 2,100 m2



## DGSUyS | Atención Fauna Nociva

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Vialidad Av. José María Izazaga	A	De Isabel la Católica a Simón Bolívar	Desratización 10 cebos block 1,400 m2
Vialidad Eje Central Lázaro Cárdenas	A	De Callejón de la Esperanza a Venustiano Carranza, col. Centro Cuauhtémoc	Desratización 12 cebos block 800 m2
Vialidad Eje 1 Norte Mosqueta	A	De Eje 1 Poniente Guerrero a Av. Paseo de la Reforma, lado sur y norte col. Guerrero Cuauhtémoc	Desratización 40 cebos block 1,800 m2
Vialidad Eje Central Lázaro Cárdenas	B	Venustiano Carranza a Madero , col. Centro Cuauhtémoc	Desratización 10 cebos block 850 m2
Mercado de la Merced	B	Fray Servando Teresa de Mier, Eje 1 Oriente Circunvalación, General Anaya y San Ciprian, col. Merced Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 62 cebos block 8,200 m2
Plaza Teatro Blanquita	B	Eje Central Lázaro Cárdenas, Pensador Mexicano y Mina, COL. Centro Cuauhtémoc	Desratización 10 cebos block 800 m2
Vialidad Eje 2 Norte	B	Esquina Eje Central Lázaro Cárdenas, lado norte Col. Peralvillo Cuauhtémoc	Desratización 22 cebos block 350 m2
Vialidad Eje 1 Oriente	B	Esquina Constancia Tiradero clandestino No. 62, col. Morelos Cuauhtémoc	Desratización 12 cebos block 100 m2
Vialidad Eje 1 Oriente	B	Esquina Caridad Col. Morelos Cuauhtémoc	Desratización 18 cebos block 250 m2
Vialidad Eje 1 Oriente	B	Manuel Doblado Tiradero clandestino No. 64 col. Morelos Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 28 cebos block 100 m2



## DGSUyS | Atención Fauna Nociva

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Vialidad Av. 20 de Noviembre-Pino Suárez	A	Av. 5 de Mayo, 16 de Septiembre (Plaza de la Constitución), col. Centro Cuauhtémoc	Desratización 8 cebos block 46,800 m2
Plaza San Miguel	A	San Miguel, Pino Suárez, San Jerónimo, col. Centro Cuauhtémoc	Desratización 10 cebos block 2,200 m2
Plaza de la Soledad	B	Limón, San Simón y Cuadrante de la Soledad, Col. Merced Balbuena, Venustiano Carranza.	Desratización 51 cebos block 560 m2
Vialidad General Anaya	B	De Eje 1 Oriente a San Ciprian col. Merced Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 32 cebos block 1,200 m2
Vialidad San Ciprian	B	De General Anaya a Fray Servando Teresa de Mier Col Merced Balbuena, Venustiano Carranza.	Desratización 22 cebos block 1,200 m2
Exterior del Mercado Candelaria	B	Corregidora, Congreso de la Unión, San Ciprian y General Anaya , Col. Merced Balbuena Venustiano Carranza	Desratización 28 cebos block 1,140 m2
Mercado de la Merced	B	Fray Servando Teresa de Mier, Eje 1 Ote. Circunvalación, General Anaya y San Ciprian, Merced Balbuena, Venustiano Carranza.	Desratización 58 cebos block 8,200 m2
Vialidad Eje 1 Oriente Anillo de Circunvalación	B	Eje 1 Norte a República de Guatemala, Col. Centro Cuauhtémoc	Desratización 30 cebos block en 1,600 m2
Vialidad Eje 1 Oriente Anillo de Circunvalación	A	República de Guatemala a San Pablo, Col. Centro Cuauhtémoc	Desratización 69 cebos block en 2,200 m2
Plaza de la Santísima	A	República de Guatemala, la Santísima y Loreto col. Centro Cuauhtémoc	Desratización 5 cebos block en 900 m2



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

## DGSUyS | Atención Fauna Nociva

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Mercado San Lucas	B	Escuela Médico Militar Callejón del Hormiguero, Callejón San Miguel, Col. Centro, Cuauhtémoc	Desratización 18 cebos block en 1,800 m2
Predio	A	Regina 60 entre 5 de Febrero e Isabel la Católica col. Centro Cuauhtémoc	Desratización 15 cebos block en 280 m2
Plaza Santo Domingo	A	5 de Febrero, República de Cuba y Belisario Domínguez col. Centro, Cuauhtémoc	Desratización 5 cebos block en 400 m2
Parque Área Verde	B	Balderas, Tolsa y Enrico Martinez col. Centro Cuauhtémoc	Desratización 10 cebos block en 800 m2




GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

## Actividades de Limpieza Integral del Centro Histórico por parte de la DGSUyS

### LAVADO

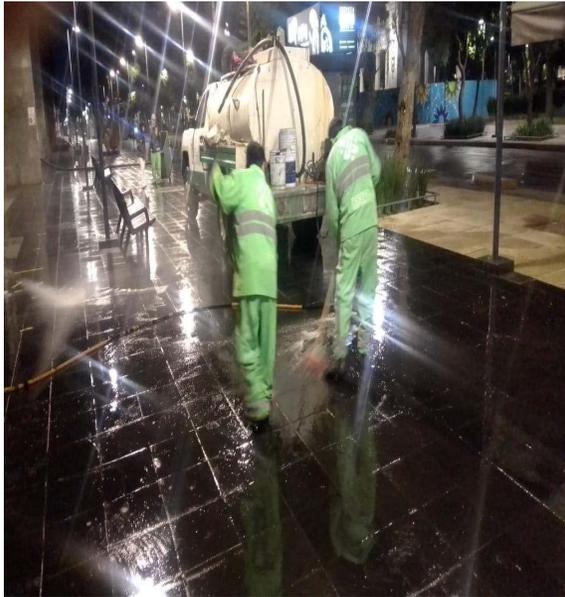

# Actividades de Limpieza Integral del Centro Histórico por parte de la DGSUyS

## BARRIDO MANUAL







GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS



## Actividades con el personal que realiza la Limpieza Integral del Centro Histórico por parte de la DGSUyS

### RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

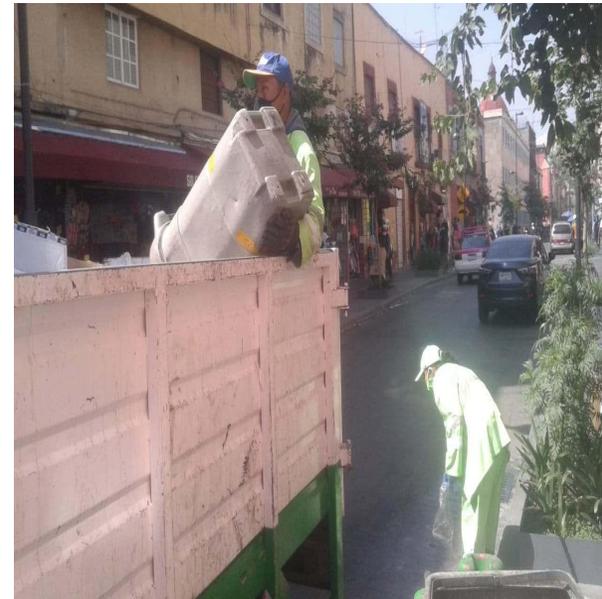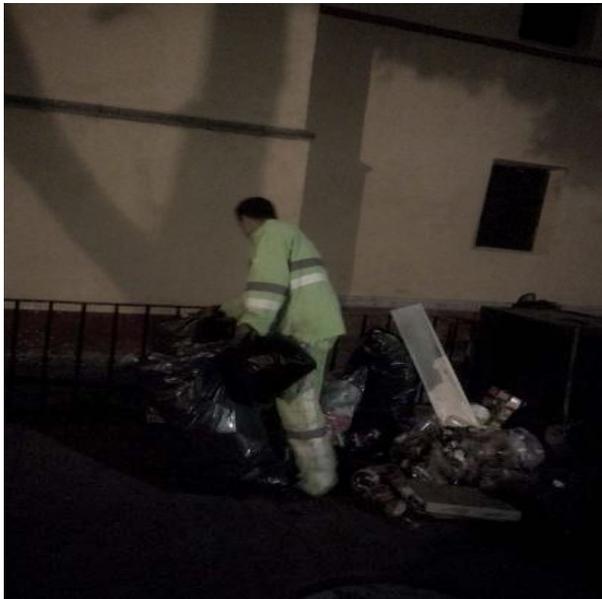

Actividades con el personal que realiza la Limpieza Integral del Centro Histórico por parte de la DGSUyS

**RECOLECCIÓN DE TIRADEROS CLANDESTINOS**

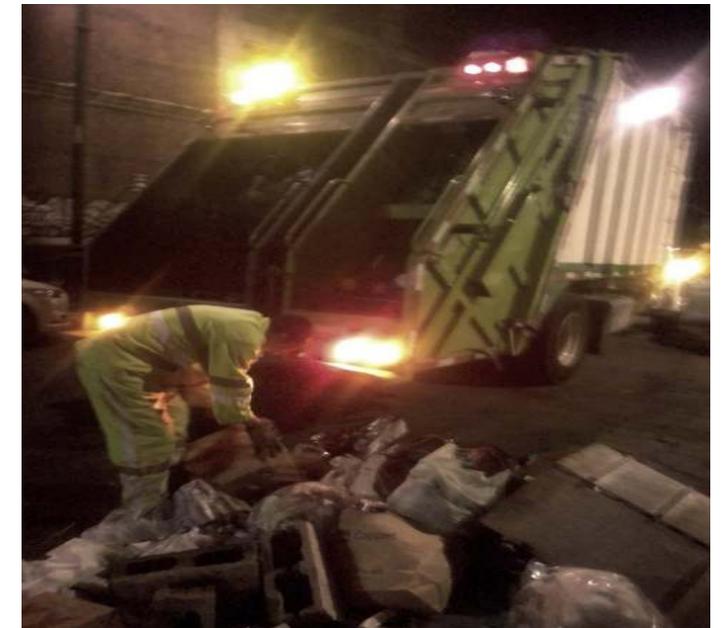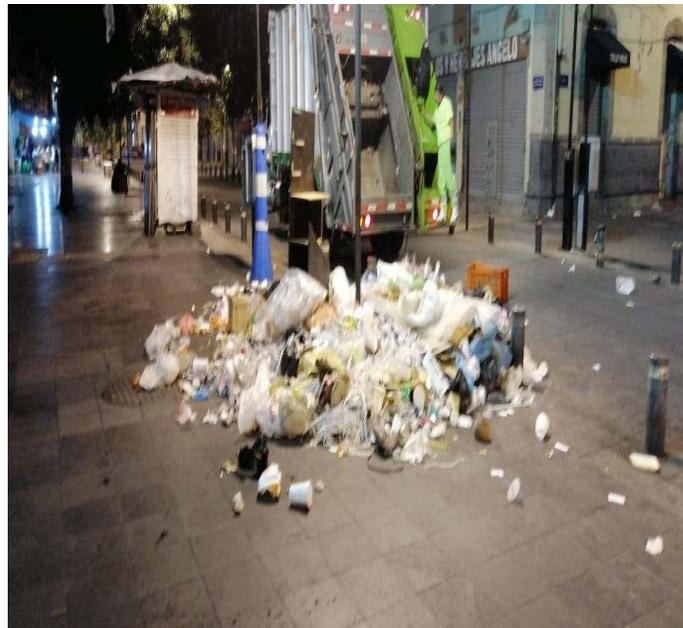





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

## Actividades con el personal que realiza la Limpieza Integral del Centro Histórico por parte de la DGSUyS

### LAVADO DE PAPELERAS

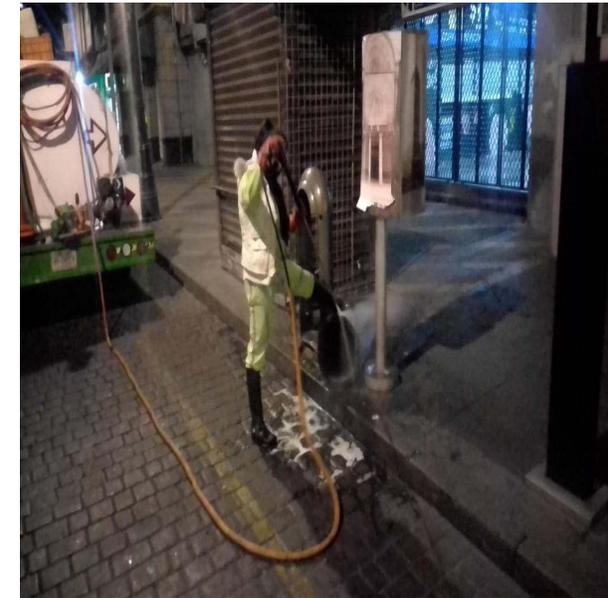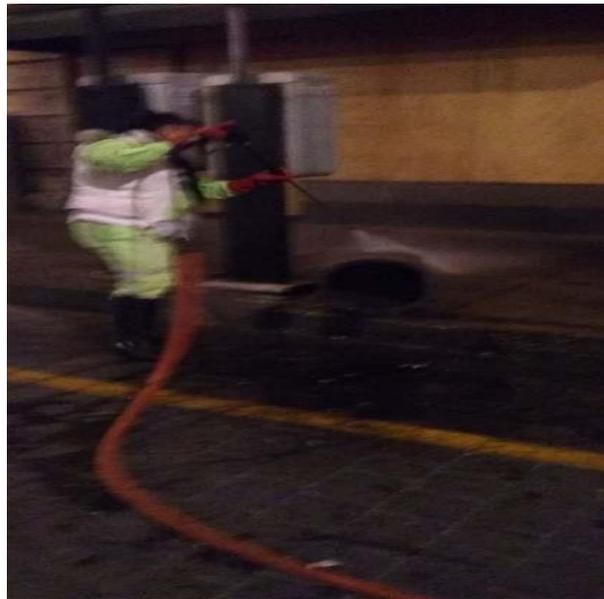




GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

DGSUyS




MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

## Acciones de limpieza recolección de basura producto de barrido

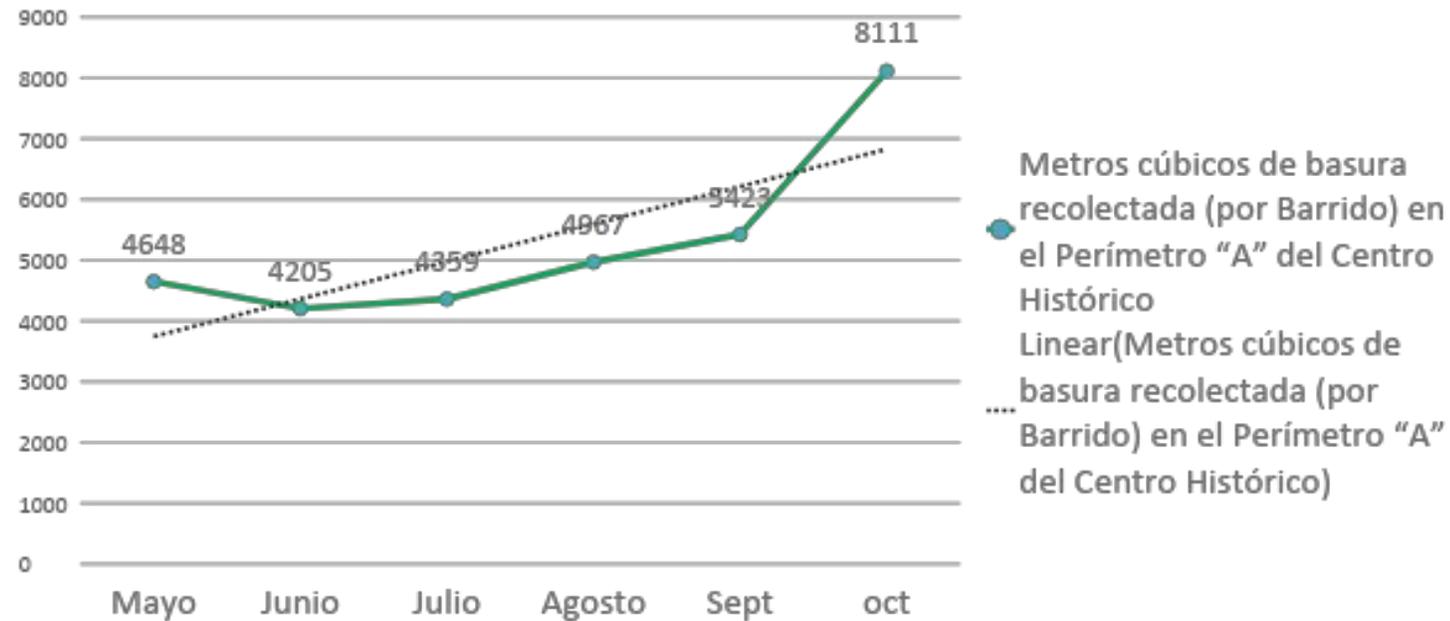




## Acciones de limpieza recolección de basura en tiraderos clandestinos

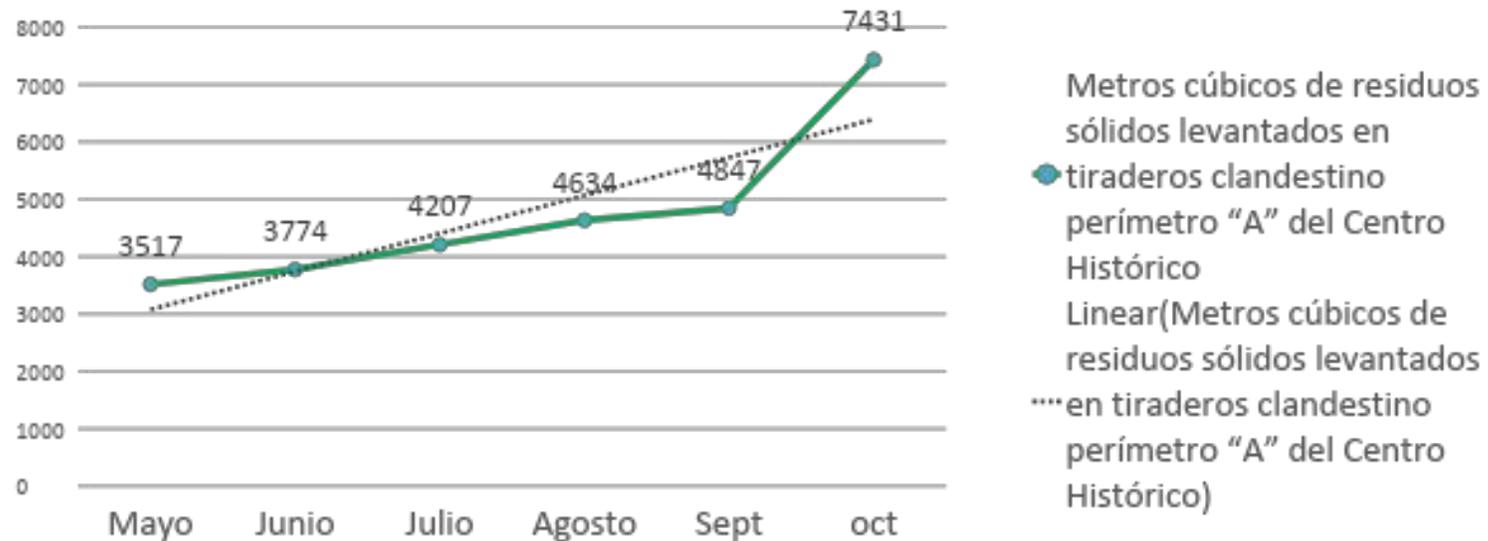



## Acciones de combate a fauna nociva desratización junio - octubre

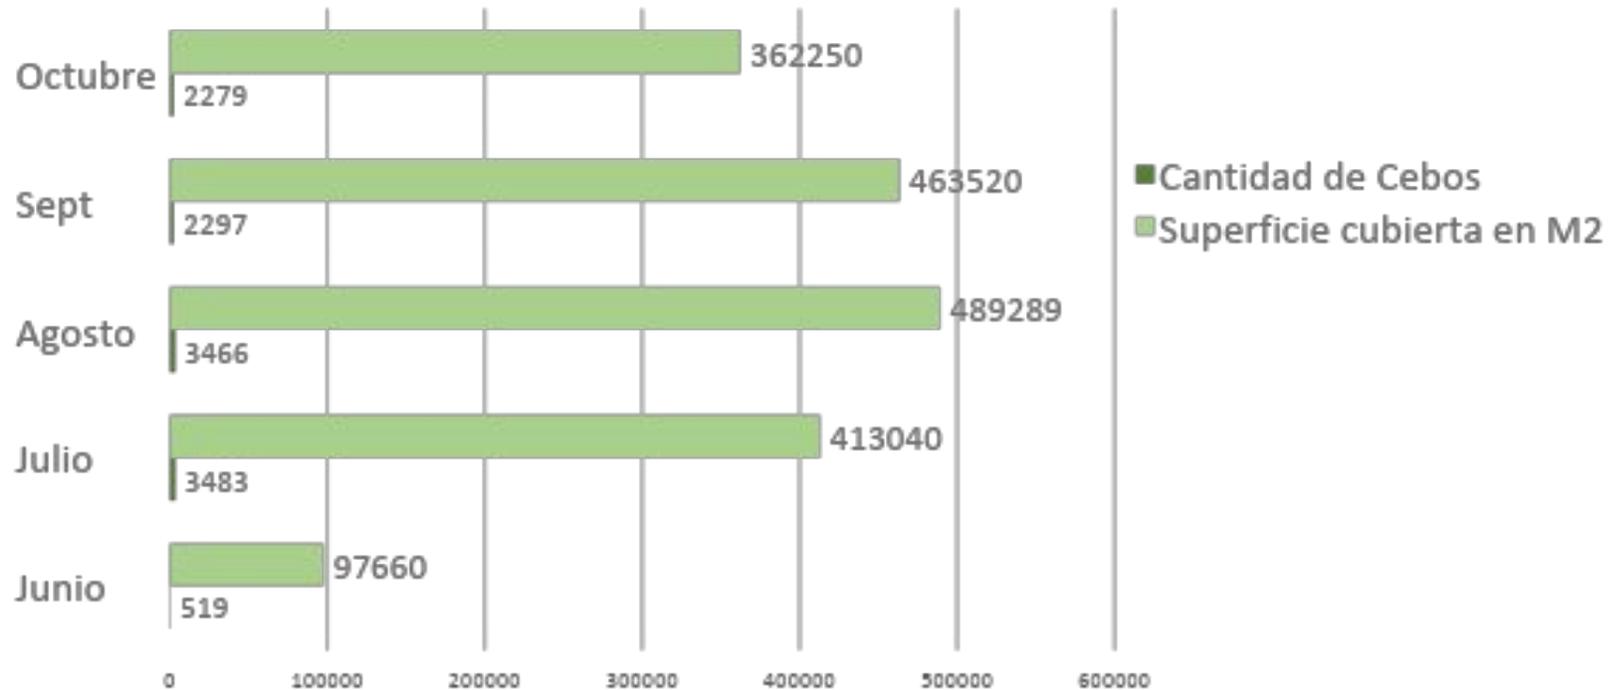

# STC-METRO

Tema	Indicador	Quincena AI 2/11	Observaciones	Próximo reporte
Infraestructura	Número de escaleras electromecánicas con falla o algún problema (línea base: 75 escaleras en 29 estaciones)	1 escalera detenida	74 equipos están funcionando	16 de Noviembre
Infraestructura	Número de elevadores en reparación (línea base: 19 elevadores en 29 estaciones)	2 elevadores detenidos	18 equipos están funcionando	16 de Noviembre

# AVANCE DE OBRA DE GALERÍAS


GALERÍAS	CAJAS	LONGITUD
<b>GALERÍA 1</b> (Revillagigedo) Avance 99 %	Caja 1 (95 %)	230.00 m N. Tubos: 92 Hincados 92
	Caja 2 (90 %)	
<b>GALERÍA 2</b> (Márquez Sterling) Avance 99.9 %	Caja 3 (99 %)	311.45 m N. Tubos: 132 Hincados 132
	Caja 4 (100%)	
<b>CONEXIÓN CON GALERÍA BUEN TONO</b>	Caja Avance 98 %	



- Proyecto ejecutivo 100 %
- Levantamiento Notariados 100 %

02/11/2020  
Avance General 97 %

METRO jul-oct

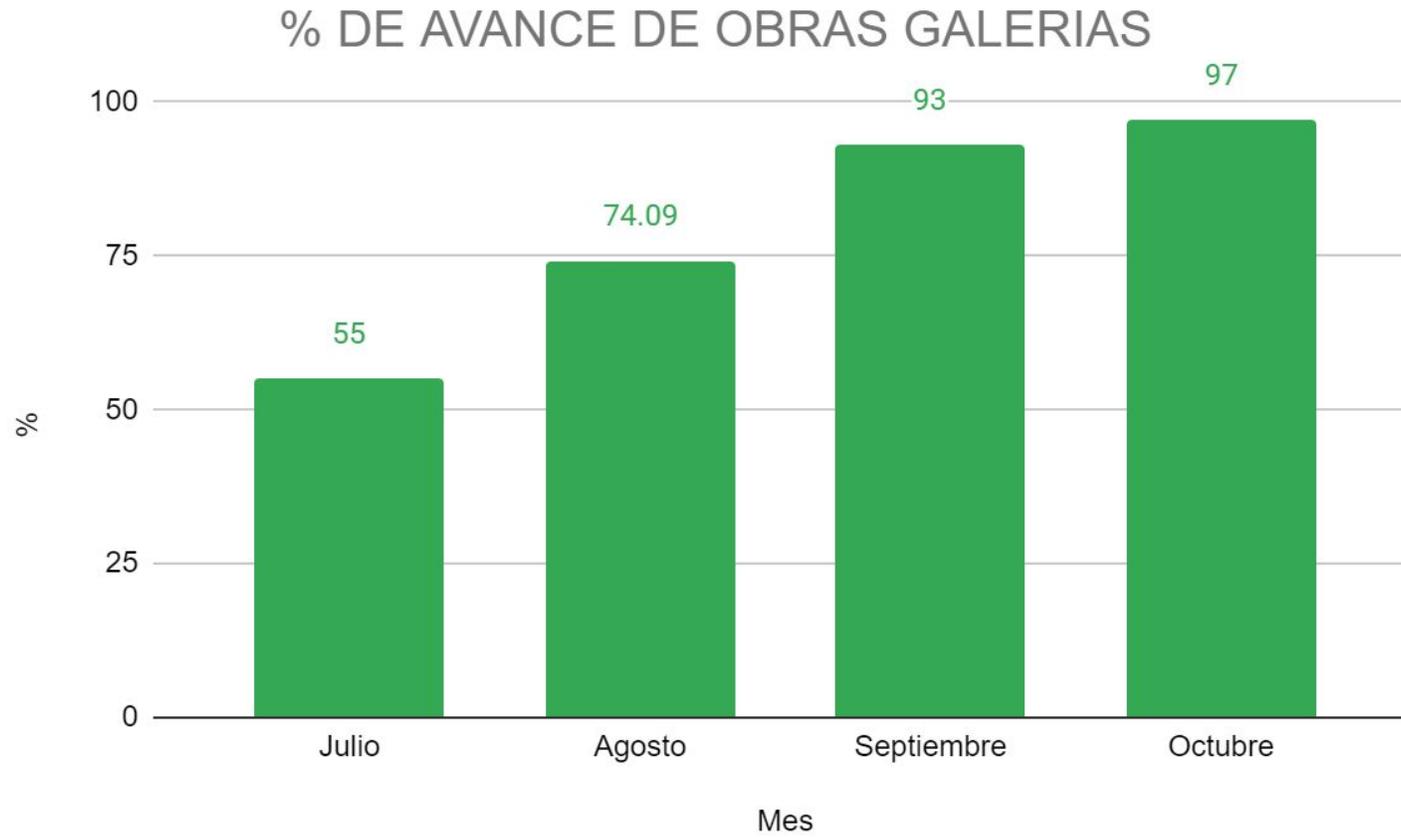



UNIVERSIDAD DEL  
CENTRO  
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

# CFE

Tema	Indicador	Periodicidad	Quincena del 19 de Octubre al 2 de Noviembre	Próximo reporte
<b>Mantenimiento a infraestructura</b>	<b>Número de siniestros de robo registrados de elementos de infraestructura</b>	<b>Quincenal</b>	<b>0</b>	<b>16 de Noviembre</b>
	<b>Número de bóvedas atendidas con acciones de desagüe</b>	<b>Quincenal</b>	<b>35</b>	
	<b>Número de atenciones a fallas en el suministro de energía eléctrica</b>	<b>Quincenal</b>	<b>4</b>	
	<b>Número de tapas de registros y/o bóvedas reparadas</b>	<b>Quincenal</b>	<b>1</b>	
	<b>Número de obras de mantenimiento que impliquen rompimiento en vía pública</b>	<b>Quincenal</b>	<b>4</b>	



# CFE

Anexo 2. Detalle de ubicaciones

Número de bóvedas atendidas con acciones de desagüe

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	
5 DE MAYO	Eje central	Correo mayor	SIN DATO	COL.CENTRO	12	INSPECCIION DESAGÜE Y LIMPIEZA DE BOVEDS
TACUBA	Eje central	MONTE DE PIEDAD	SIN DATO	COL.CENTRO	11	INSPECCIION DESAGÜE Y LIMPIEZA DE BOVEDAS
MADERO	EJE CENTRAL	SOLEDAD	SIN DATO	COL.CENTRO	12	INSPECCIION DESAGÜE Y LIMPIEZA DE BOVEDAS

TOTAL

35



# CFE

Anexo 3. Detalle de ubicaciones

Número de atenciones a fallas en el suministro de energía eléctrica

DIRECCION	ENTRE CALLES		NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
BRASIL 37	COLOMBIA	VENEZUELA	SIN DATO	COL.CENTRO	1	Se realiza reparación de emergencia de transformador
BRASIL 77	NICARAGUA	PARAGUAY	SIN DATO	COL.CENTRO	1	Se realiza reparación de emergencia
BRASIL 85	PARAGUAY	ECUADOR	SIN DATO	COL. CENTRO	1	Se realiza reparación de emergencia
ARGENTINA 82	PERU	NICARAGUA	SIN DATO	COL. CENTRO	1	Se realiza reparación de emergencia
				TOTAL	4	



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
CULTURA  
CENTRO  
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

# CFE

Anexo 4. Detalle de ubicaciones

Número de tapas de registros y/o bóvedas reparadas

DIRECCION	ENTRE CALLES	NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	
<b>MEDICO MILITAR</b>	<b>SAN PABLO</b>	SAN MIGUEL	S/D	MERCED	1	SE REALIZAR TAPA DE EMERGENCIA



# CFE

Anexo 5. Detalle de ubicaciones


Número de obras de mantenimiento que impliquen rompimiento en vía pública

DIRECCION	ENTRE CALLES		NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
BRASIL 37	COLOMBIA	VENEZUELA	SIN DATO	COL.CENTRO	1	Se realiza reparación de emergencia de transformador
BRASIL 77	NICARAGUA	PARAGUAY	SIN DATO	COL.CENTRO	1	Se realiza reparación de emergencia de transformador
BRASIL 85	PARAGUAY	ECUADOR	SIN DATO	COL.CENTRO	1	Se realiza reparación de emergencia de transformador
ARGENTINA 82	PERÚ	NICARAGUA	SIN DATO	COL.CENTRO	1	Se realiza reparación de emergencia de transformador




# CFE feb - oct


## 624 Bóvedas con desagüe

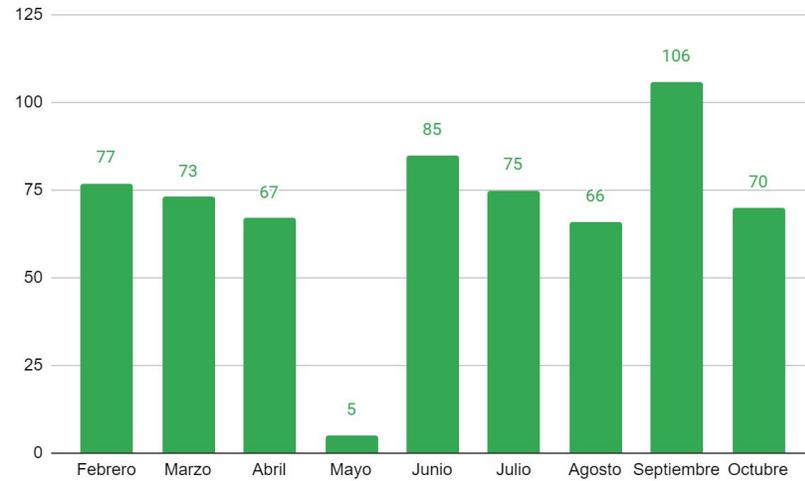


## 81 Atenciones a fallas

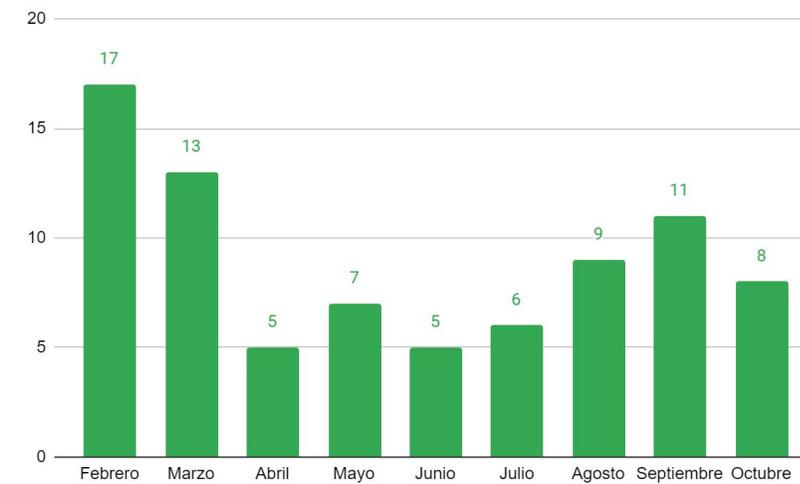

## 35 Tapas de registro reparadas

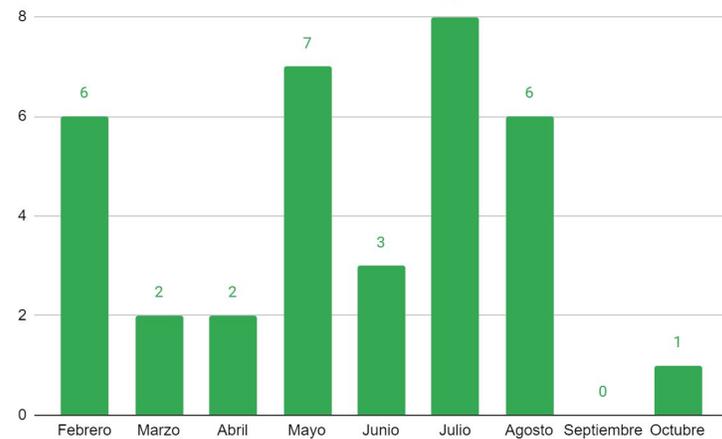

## 50 obras de mantenimiento

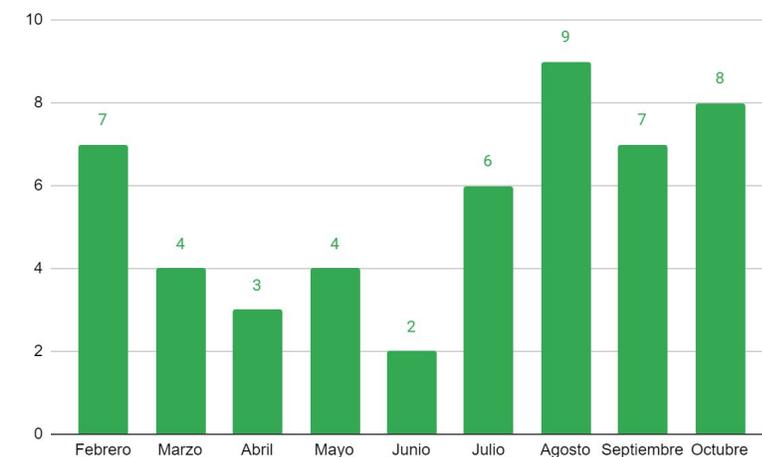

# INAH

Tema	Indicador	Quincena al 02/10	Observaciones	Próximo reporte
Obras	Número de trámites de solicitud de autorización de obra en inmuebles	0		16 de noviembre
Obras	Número de autorizaciones de obras emitidas en inmuebles	11		

# INAH


## Autorizaciones

- **AUT. 229/20** Palmas 43, Obra menor
- **AUT. 230/20** 20 de Noviembre 127 Remodelación
- **AUT. 232/20** 5 de Mayo 2 Trabajos para adaptación de un Museo
- **AUT. 234/20** Benjamin Hill 47 Prórroga
- **AUT. 235/20** Guerrero 39 Trabajos de restauración
- **AUT. 236/20** Moneda 2 Prórroga
- **AUT. 237/20** República de Brasil 33 Prórroga
- **AUT. 239/20** Dr. Valenzuela 28 Prórroga
- **AUT. 242/20** Monte de Piedad 7 Trabajos en fachadas
- **AUT. 243/20** Francisco I. Madero 60 Trabajos en fachadas
- **AUT. 244/20** Leandro Valle-Belisario Domínguez Restauración

INAH | ene - oct


124

Número de trámites de solicitud de autorización  
de trámites de obra en inmuebles

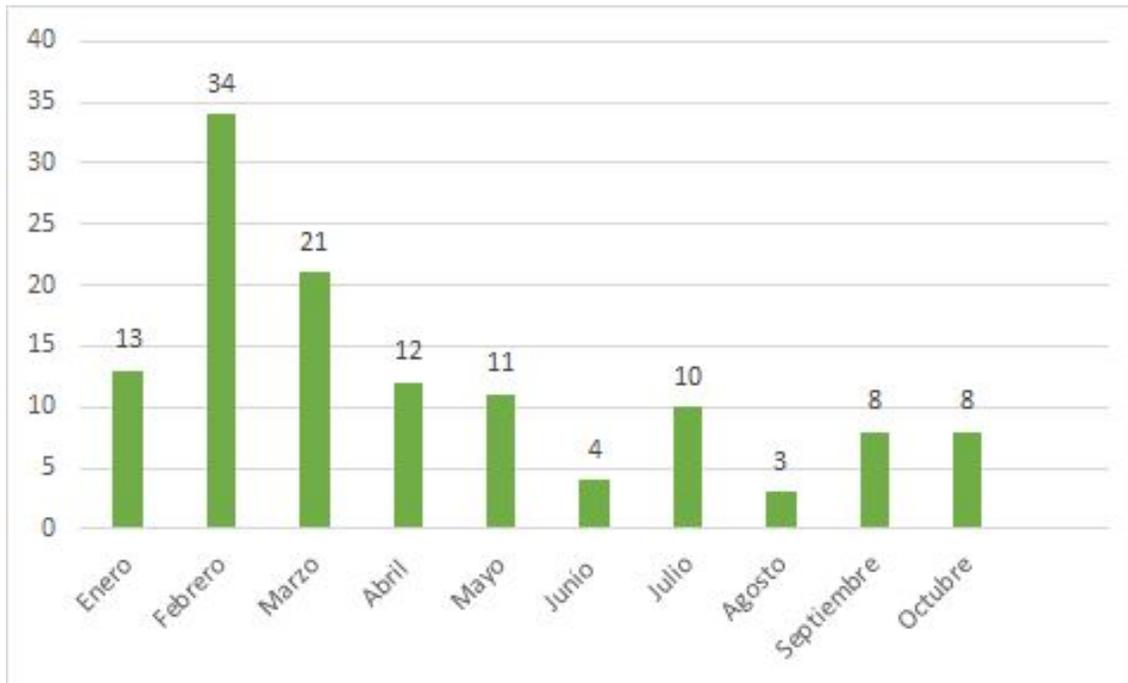

118

Número de autorizaciones de obras  
emitidas en inmuebles

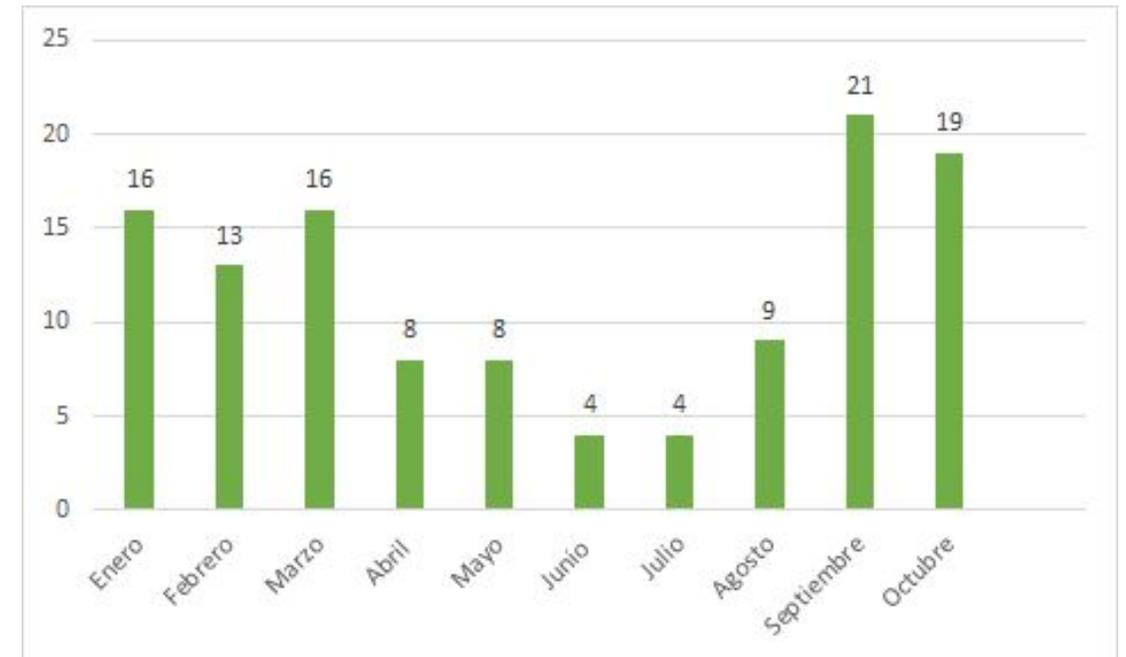

# INBAL

Tema	Indicador	Periodicidad	al 03/11/2020	Observaciones
Obras en el Centro Histórico	Número de solicitudes ingresadas para intervenciones diversas en inmuebles ubicados en el Centro Histórico	Mensual	6	<p>2 solicitudes de información 4 solicitudes de obras menores 0 solicitudes de obras mayores</p> <p>5 Inmuebles patrimonio artístico 1 Inmuebles colindantes 0 Inmuebles no incluidos s/col.</p>

# INBAL | ene - oct

**87**

Solicitudes ingresadas

**64**

Solicitudes de autorización

**22**


Solicitudes de intervenciones menores

**7**

Solicitudes de obra mayor

**13**


Trabajos Autorizados

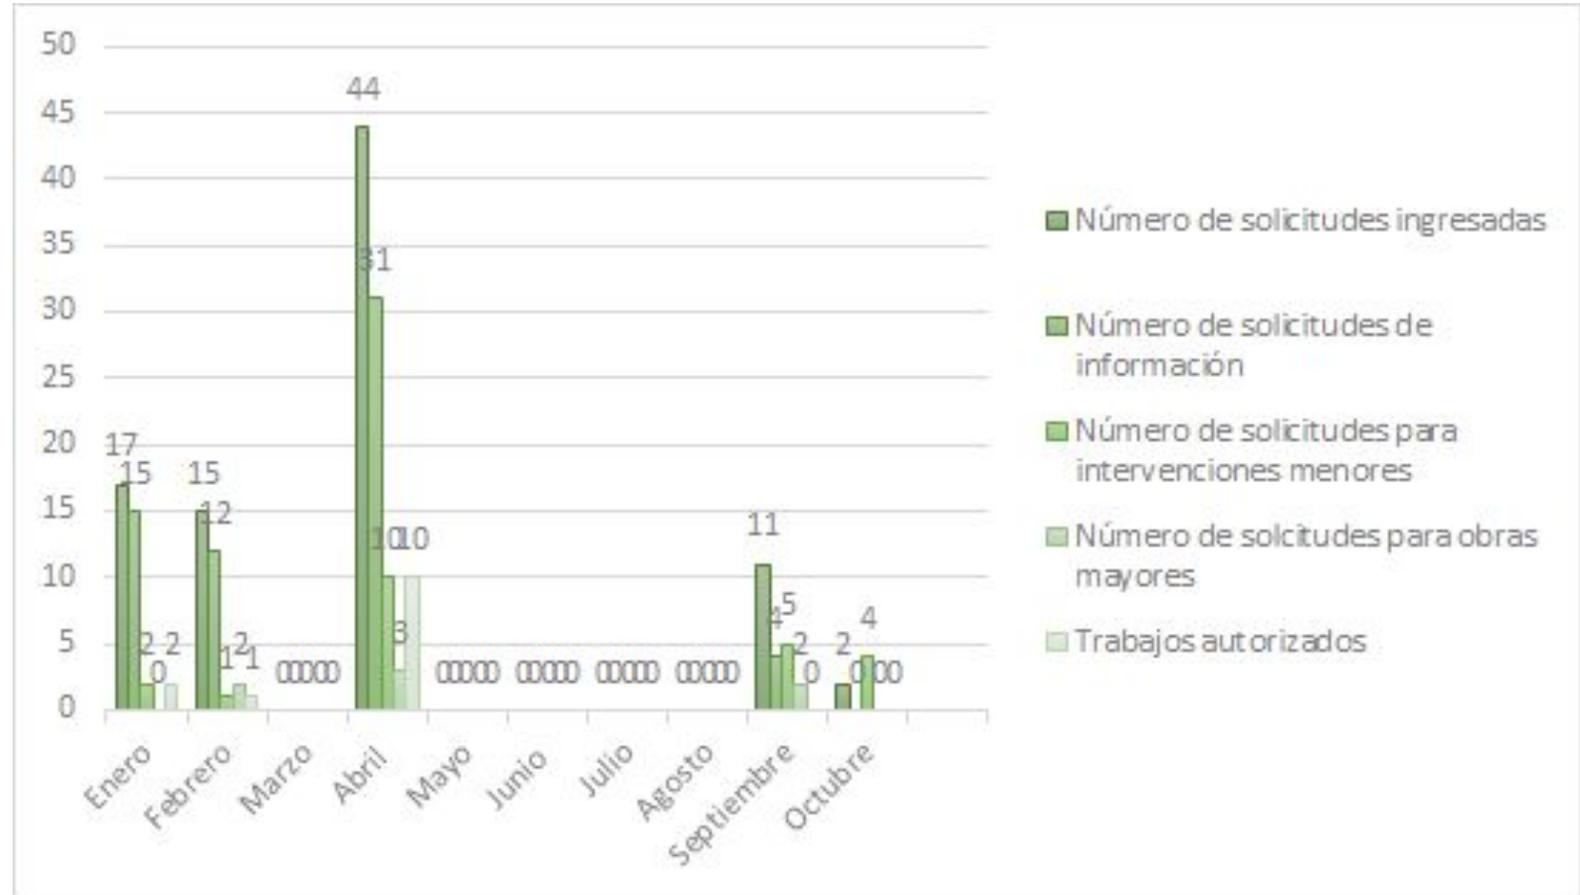

PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN 2020	
<b>INMUEBLE</b>	<b>STATUS</b>
CASA TALAVERA	TRÁMITE DE RECURSOS
CASA DEL CONDE DE REGLA	TRÁMITE DE RECURSOS
SOCIEDAD MEXICANA DE GEOGRAFIA Y ESTADISTICA	TRÁMITE DE RECURSOS
<b>INMUEBLE</b>	<b>AVANCE FÍSICO</b>
CENTRO CULTURAL ARTESANAL INDÍGENA DE LA CDMX	35% DE AVANCE FÍSICO Y REVISIÓN DE PROYECTO ESTRUCTURAL
<b>SEÑALÉTICA</b>	<b>AVANCE FÍSICO</b>
COMPLEMENTACIÓN Y MANTENIM. DE LA SEÑALÉTICA EN EL CHCDMX PRIMERA ETAPA 2020	65% EN PRODUCCIÓN DE PIEZAS, ESTELAS, PENDONES INFORMATIVOS
ARREGLO DE FACHADAS. ZONA SANTA MARÍA LA REDONDA.	EJECUCIÓN DE TRABAJOS EN 6 FACHADAS PUNTUALES 50% RECURSO AYUDAS
CONVENIO DE COORDINACIÓN INAH-FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO. 27 TEMPLOS	CONVENIO FORMALIZADO 21 SEPTIEMBRE 2020.



Centro Cultural  
Artesanal Indígena  
de la CDMX

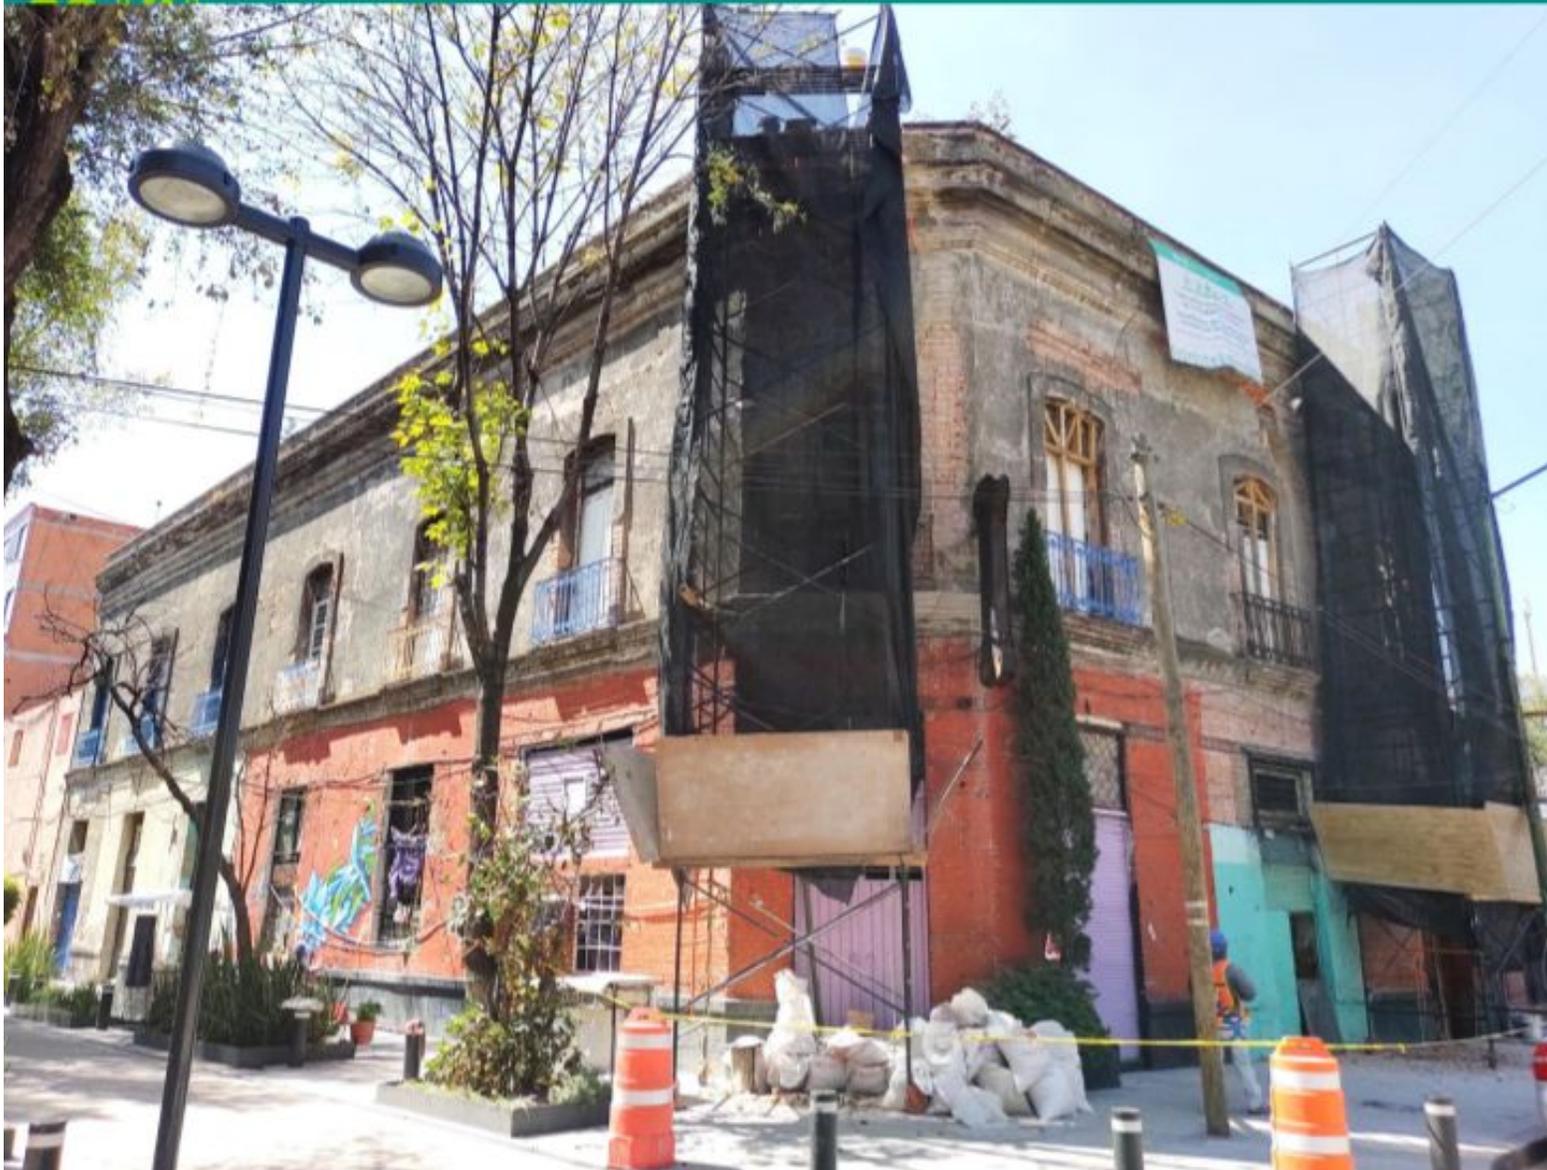

Pedro Moreno No.40  
Santa María La Redonda



Obraje No.3  
Santa María La Redonda



Pedro Moreno No.10  
Santa María La Redonda



Pensador Mexicano No. 15  
Santa María La Redonda



# ILIFE Mantenimiento de escuelas

No.	PLANTEL	AVANCE FISICO
1	INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO "ROSARIO CASTELLANOS CAMPUS JUSTO SIERRA"	15%
2	ESCUELA SECUNDARIA ADRIANA GARCIA CORAL (SEGUNDA ETAPA)	6%



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL  
CENTRO  
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

# PROCURADURÍA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

RESCATE INNOVADOR Y PARTICIPATIVO EN UNIDADES  
HABITACIONALES 2020

EVALUACIÓN 03 NOVIEMBRE



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL  
CENTRO  
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

# RIPUH EJERCICIO 2020

LISTADO PARCIAL PRELIMINAR DE UNIDADES HABITACIONALES  
A SER BENEFICIADAS



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL  
CENTRO  
HISTÓRICO




MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS


## LISTADO PARCIAL PRELIMINAR DE UNIDADES HABITACIONALES A SER BENEFICIADAS RIPUH 2020

ALCALDÍA	No DE UNIDADES
CUAUHTEMOC	22
VENUSTIANO CARRANZA	15


# PROSOC TOTAL DE OBRAS EJERCICIO 2020

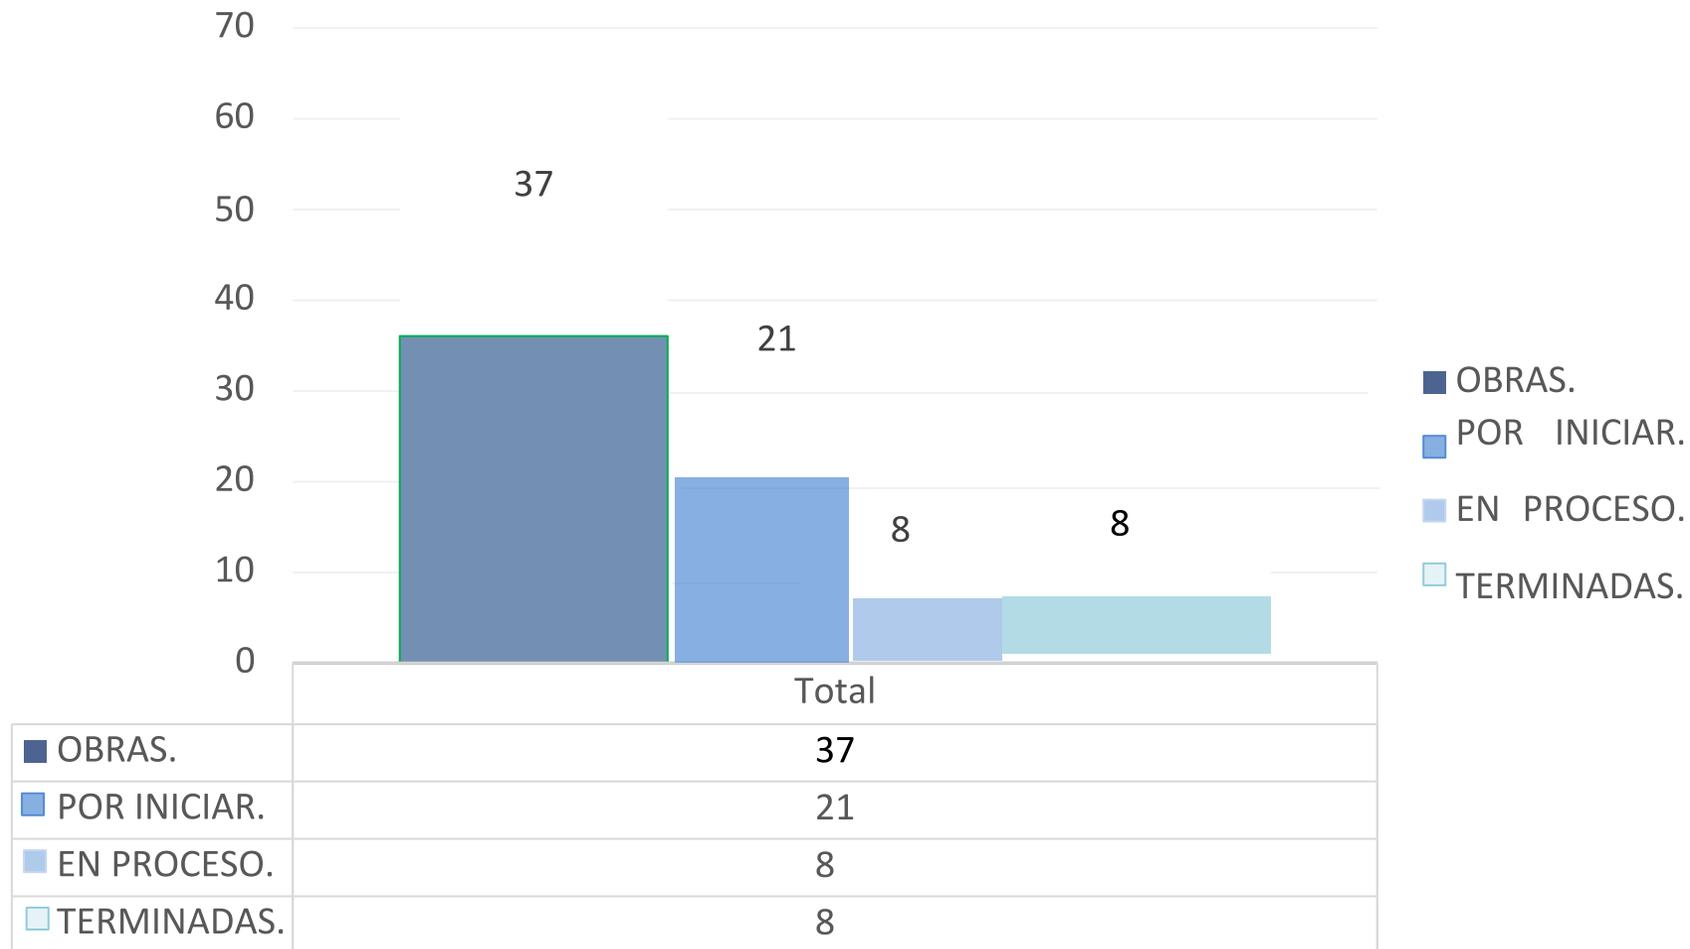

# PROSOC OBRAS CUAUHEMOC EJERCICIO 2020

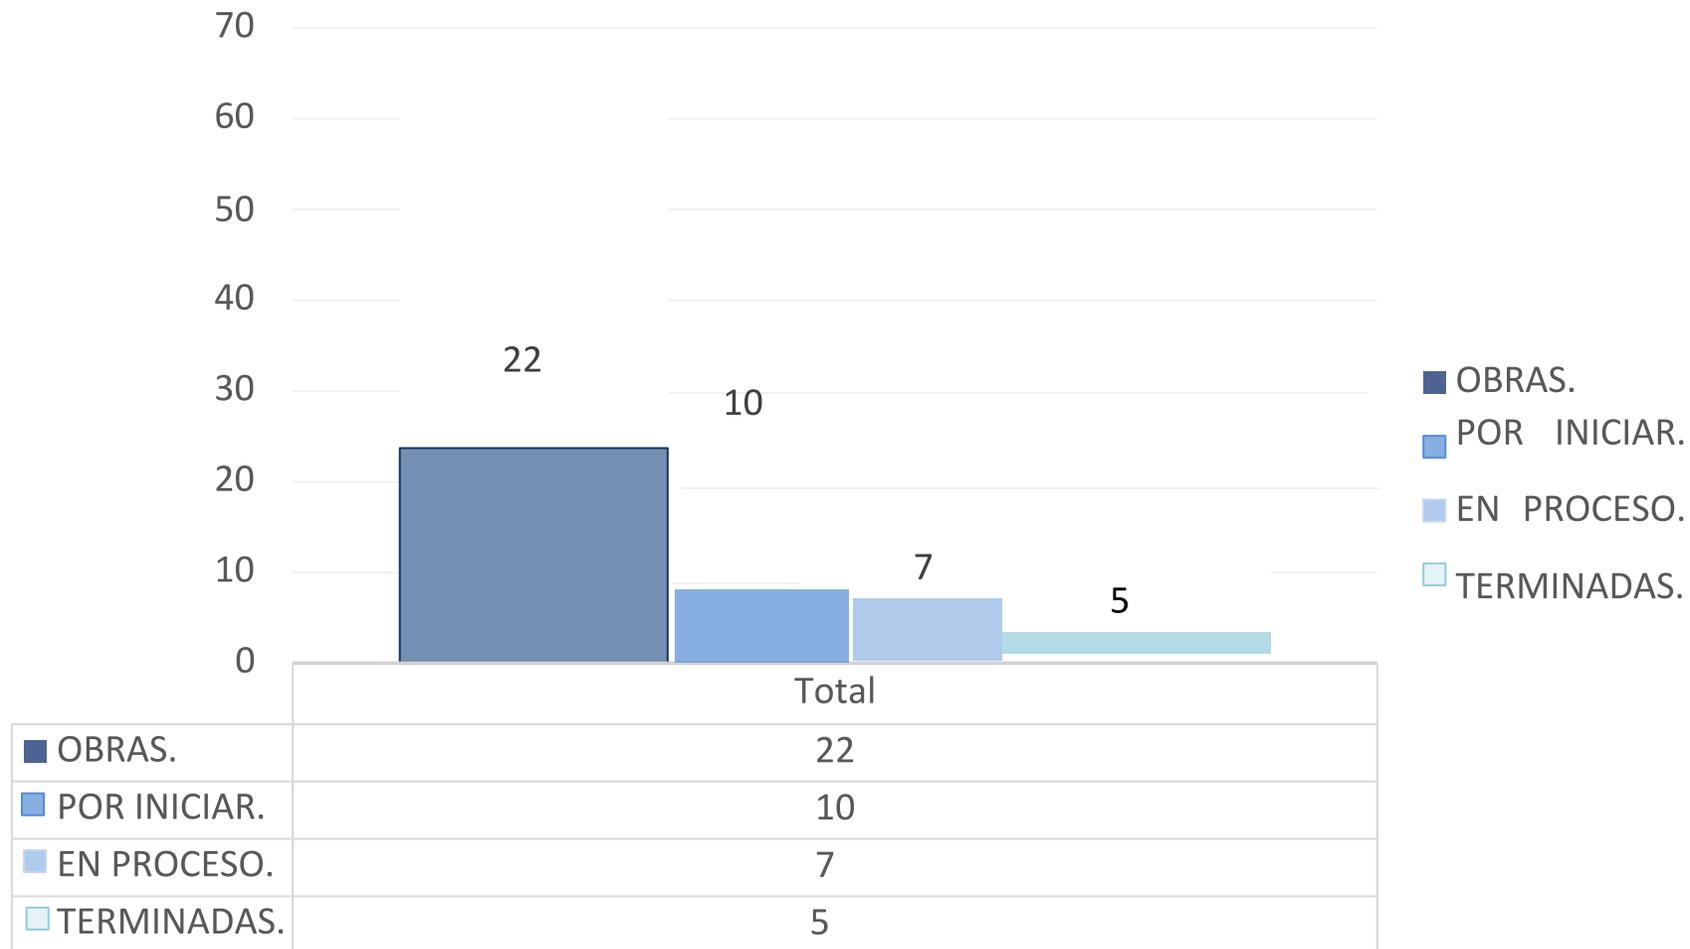

# PROSOC OBRAS VENUSTIANO CARRANZA EJERCICIO 2020

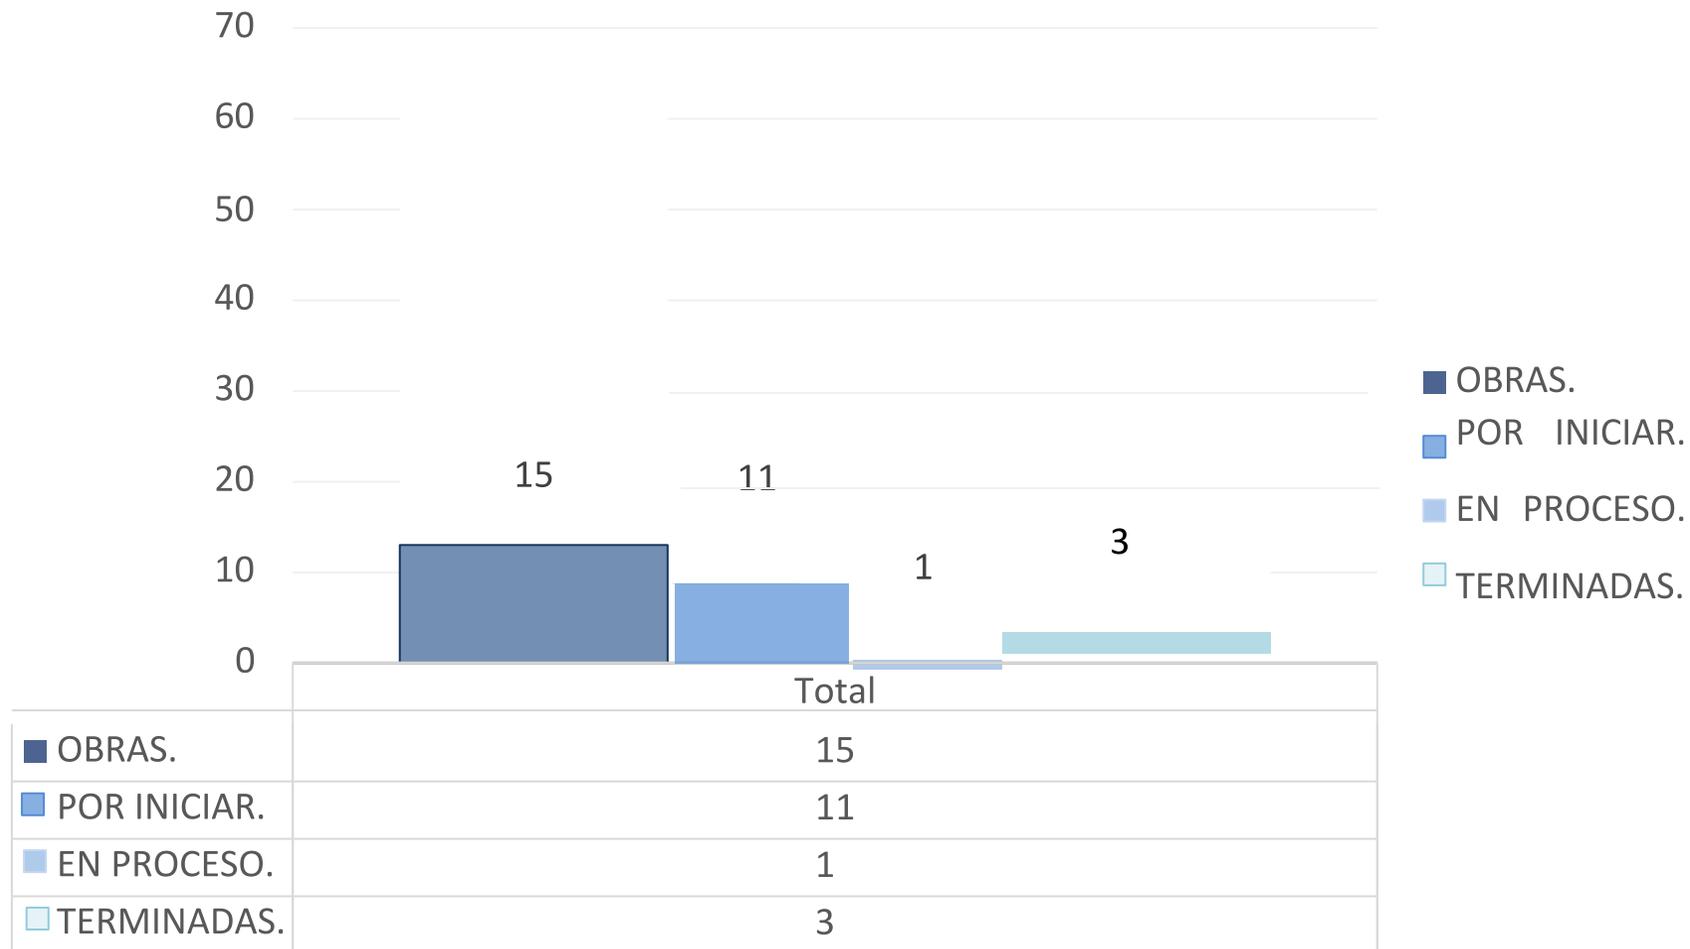

# RIPUH- CUAUHTÉMOC

# LISTA PARCIAL PRELIMINAR 2020

NO.	PREDIO	COLONIA	ALCALDIA	PROYECTO	ESTATUS	PORCENTAJE DE AVANCE	PERÍMETRO	CATALOGACIÓN
1	BOLIVAR 158	OBRERA	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA		0%	B	NO CATALOGADA
2	DR. JIMENEZ 41	DOCTORES	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA		0%	B	NO CATALOGADA
3	CALZADA DE LA VIGA 18	ESPERANZA	CUAUHTEMOC	IMPERMEABILIZACIÓN	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
4	CALZADA DE LA VIGA 16	ESPERANZA	CUAUHTEMOC	IMPERMEABILIZACIÓN	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
5	LIBERTAD 21 C3	MORELOS	CUAUHTEMOC	ESCALERAS	EN PROCESO	5%	B	NO CATALOGADA
6	3ra CERRADA DE LIBERTAD 6	MORELOS	CUAUHTEMOC	ESCALERAS		0%	B	
7	VIOLETA 58	GUERRERO	CUAUHTEMOC	HERRERIA (ESCALERAS)	EN PROCESO	5%	B	NO CATALOGADA

# RIPUH- CUAUHTÉMOC

# LISTA PARCIAL PRELIMINAR 2020

NO.	PREDIO	COLONIA	ALCALDÍA	PROYECTO	ESTATUS	PORCENTAJE DE AVANCE	PERÍMETRO	CATALOGACIÓN
8	NEZAHUALCOYOTL 136	CENTRO	CUAUHTEMOC	IMPERMEABILIZACION	EN PROCESO	30%	B	NO CATALOGADA
9	JOSE JOAQUIN HERRERA 6	CENTRO	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA		0%	B	NO CATALOGADA
10	JOSE JOAQUIN HERRERA 10-12	CENTRO	CUAUHTEMOC	HERRERIA (ESCALERAS)	PROCESO	20%	B	NO CATALOGADA
11	JOSE JOAQUIN HERRERA 28-32	CENTRO	CUAUHTEMOC	ESCALERAS	EN PROCESO	40%	B	NO CATALOGADA
12	FLORIDA 57	CENTRO	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA		0%	A	CATALOGADA
13	CALLEJON MONTERO 7	CENTRO	CUAUHTEMOC	CALLES Y ANDADORES	PROCESO	5%	B	NO CATALOGADA
14	MANUEL TOLSA 56	CENTRO	CUAUHTEMOC	ESTRUCTURA	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA

# RIPUH- CUAUHTÉMOC

# LISTA PARCIAL PRELIMINAR 2020

NO.	PREDIO	COLONIA	ALCALDÍA	PROYECTO	ESTATUS	PORCENTAJE DE AVANCE	PERÍMETRO	CATALOGACIÓN
15	REPUBLICA DE CHILE 49	CENTRO	CUAUHTEMOC	HERRERIA (ESCALERAS)		0%	A	CATALOGADA
16	BUCARELI 66	CENTRO	CUAUHTEMOC	CUBOS DE ÁREA COMÚN		0%	B	
17	SAN ILDEFONSO 65	CENTRO	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA SANITARIA		0%	A	
18	REPÚBLICA DE VENEZUELA 77	CENTRO	CUAUHTEMOC	IMPERMEABILIZACIÓN		0%	A	
19	SAN CAMILITO 25	CENTRO	CUAUHTEMOC	IMPERMEABILIZACIÓN	EN PROCESO	90 %	B	NO CATALOGADO
20	MESONES 138	CENTRO	CUAUHTEMOC	IMPERMEABILIZACIÓN		0%	A	
21	REPUBLICA DE PERU 32	CENTRO	CUAUHTEMOC	IMPERMEABILIZACIÓN	TERMINADA	100%	A	CATALOGADA

# RIPUH- CUAUHTÉMOC

# LISTA PARCIAL PRELIMINAR 2020

<b>NO.</b>	<b>PREDIO</b>	<b>COLONIA</b>	<b>ALCALDIA</b>	<b>PROYECTO</b>	<b>ESTATUS</b>	<b>PORCENTAJE DE AVANCE</b>	<b>PERÍMETRO</b>	<b>CATALOGACIÓN</b>
22	EJE CENTRAL LAZARO CARDENAS 17	CENTRO	CUAUHTEMOC	IMPERMEABILIZACION	TERMINADA	100%	A	CATALOGADA

# RIPUH- VENUSTIANO CARRANZA

# LISTA PARCIAL PRELIMINAR 2020

NO.	PREDIO	COLONIA	ALCALDIA	PROYECTO	ESTATUS	PORCENTAJE DE AVANCE	PERÍMETRO	CATALOGACIÓN
1	ROSARIO 32	CENTRO	VENUSTIANO CARRANZA	HERRERIA (ESCALERAS)	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
2	CORREGIDORA 148	CENTRO	VENUSTIANO CARRANZA	ESCALERAS	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
3	CORREGIDORA 140	CENTRO	VENUSTIANO CARRANZA	HERRERIA (ESCALERAS)	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
4	ANILLO DE CIRCUNVALACIÓN 40	CENTRO	VENUSTIANO CARRANZA	INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, ALBAÑILERIA, IMPERMEABILIZACION Y PINTURA		0%	B	NO CATALOGADA
5	CANDELARIA DE LOS PATOS MANZANA 4	CENTRO	VENUSTIANO CARRANZA	CALLES Y ANDADORES	EN PROCESO	70%	B	NO CATALOGADA
6	JOAQUIN HERRERA 64	CENTRO	VENUSTIANO CARRANZA	ESCALERAS		0%	B	NO CATALOGADA

# RIPUH- VENUSTIANO CARRANZA

# LISTA PARCIAL PRELIMINAR 2020

NO.	PREDIO	COLONIA	ALCALDÍA	PROYECTO	ESTATUS	PORCENTAJE DE AVANCE	PERÍMETRO	CATALOGACIÓN
7	ANILLO DE CIRCUNVALACIÓN 20	CENTRO	VENUSTIANO CARRANZA	ESTRUCTURAS		0%	A	NO CATALOGADA
8	LECUMBERRI 59	CENTRO	VENUSTANO CARRANZA	ESCALERAS		0%	A	NO CATALOGADA
9	UNIDAD HABITACIONAL CANDELARIA DE LOS PATOS MANZANA I	MORELOS	VENUSTANO CARRANZA	HERRERIA		0%	B	NO CATALOGADA
10	UNIDAD HABITACIONAL CANDELARIA DE LOS PATOS MANZANA II	MORELOS	VENUSTIANO CARRANZA	INFRAESTRUCTURA SANITARIA		0%	B	NO CATALOGADA
.11	UNIDAD HABITACIONAL CANDELARIA DE LOS PATOS MANZANA III	MORELOS	VENUSTIANO CARRANZA	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA		0%	B	NO CATALOGADA
12	CIRCUNVALACION 48	MORELOS	VENUSTIANO CARRANZA	PINTURA		0%	B	NO CATALOGADA

# RIPUH- VENUSTIANO CARRANZA

# LISTA PARCIAL PRELIMINAR 2020

NO.	PREDIO	COLONIA	ALCALDÍA	PROYECTO	ESTATUS	PORCENTAJE DE AVANCE	PERÍMETRO	CATALOGACIÓN
13	4TA LECUMBERRI 60	MORELOS	VENUSTIANO CARRANZA	INFRAESTRUCTURA SANITARIA		0%	B	NO CATALOGADA
.14	NACIONAL 32	MORELOS	VENUSTIANO CARRANZA	INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA (TINACOS)		0%	B	NO CATALOGADA
15	CIRCUNVALACIÓN 48	MORELOS	VENUSTIANO CARRANZA	PINTURA		0%	B	NO CATALOGADA



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO




AUTORIDAD DEL  
CENTRO  
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

# PROSOC ene-oct

92% de  
avance en el  
mes de Octubre

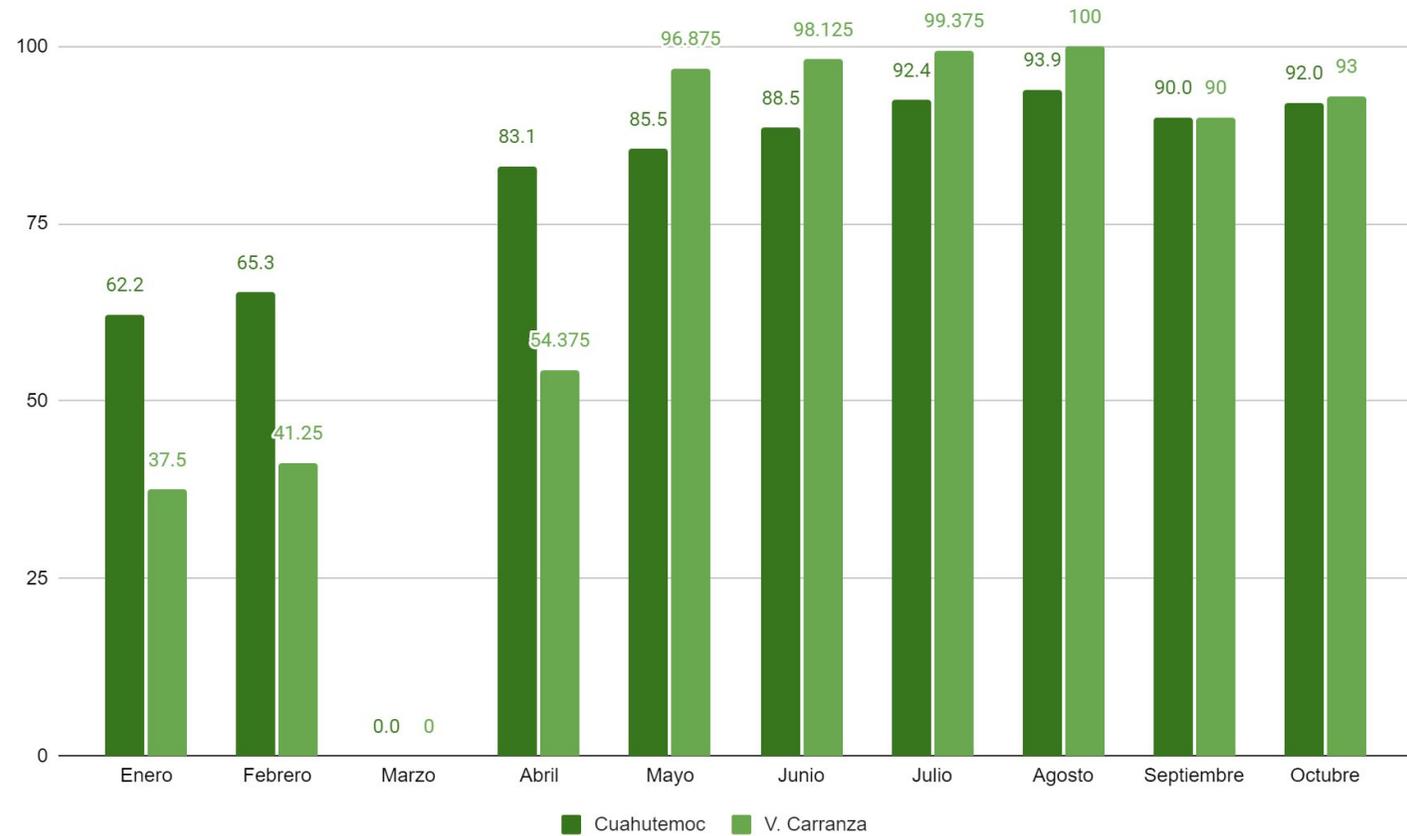



ASOCIACIÓN DEL  
CENTRO  
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Indicador	Línea base	Periodicidad	Semana del 20/10 al 02/11	Próximo reporte
No. cámaras con falla o intermitencia			<b>17 cámaras</b>	
Número de cámaras habilitadas del Programa Mi C911e	Línea base (266 cámaras en 133 sitios)	Quincenal	<b>184 cámaras en 92 sitios.</b>	17 de Noviembre
Número de obras de mantenimiento y/o reparación de atención a la infraestructura			<b>0 2 cámaras en 02 sitios</b>	


C5

## Evaluación enero - octubre

<h3>Mayo</h3> <p>Se concluyó el programa de sustitución de cámaras del programa 360 (línea base 385 cámaras en 77 sitios)</p> <p><b>¡ Se rebasó la Meta !</b> Se sustituyeron 590 cámaras en 118 sitios</p>	<h3>Septiembre</h3> <p>Se concluyó la renovación de equipo tecnológico 2da etapa (Línea base 480 cámaras en 96 sitios)</p> <p><b>¡ Meta cumplida !</b> 480 cámaras en 96 sitios</p>	<p>Número de cámaras habilitadas del Programa Mi C911e (Línea base 266 cámaras en 133 sitios)</p> <h3>Avance a octubre</h3> <p>184 cámaras en 92 sitios</p>
---	---	---


# Acumulado enero - octubre

## Número de fallas o intermitencias en cámaras de C5

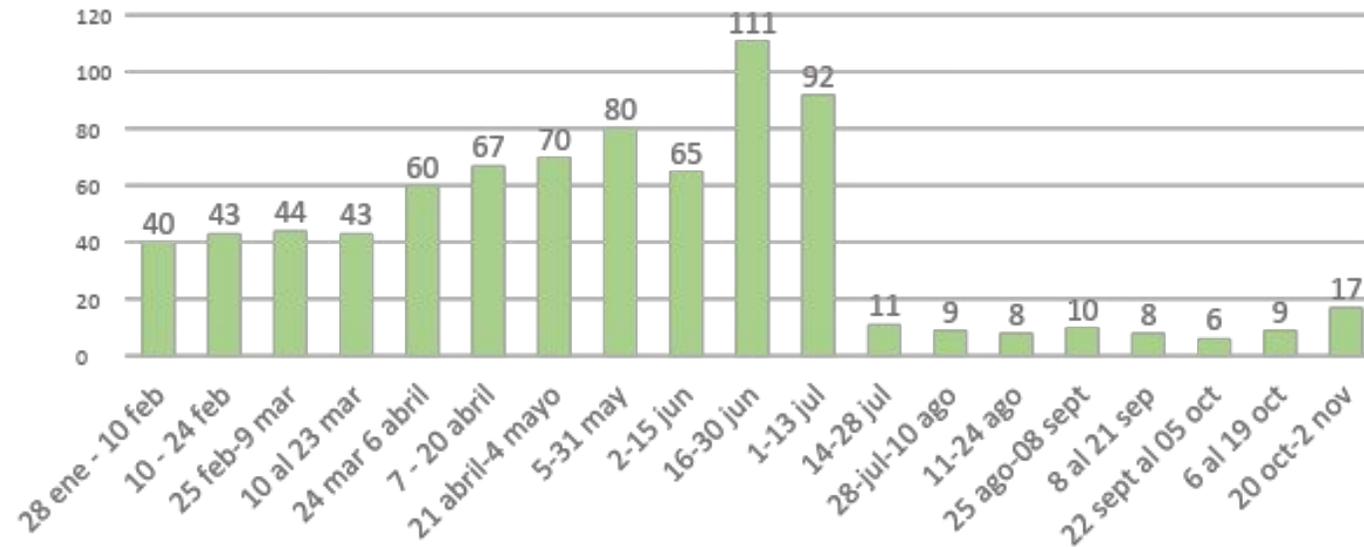

# Acumulado enero - octubre

Número de obras de mantenimiento y/o reparación a la infraestructura

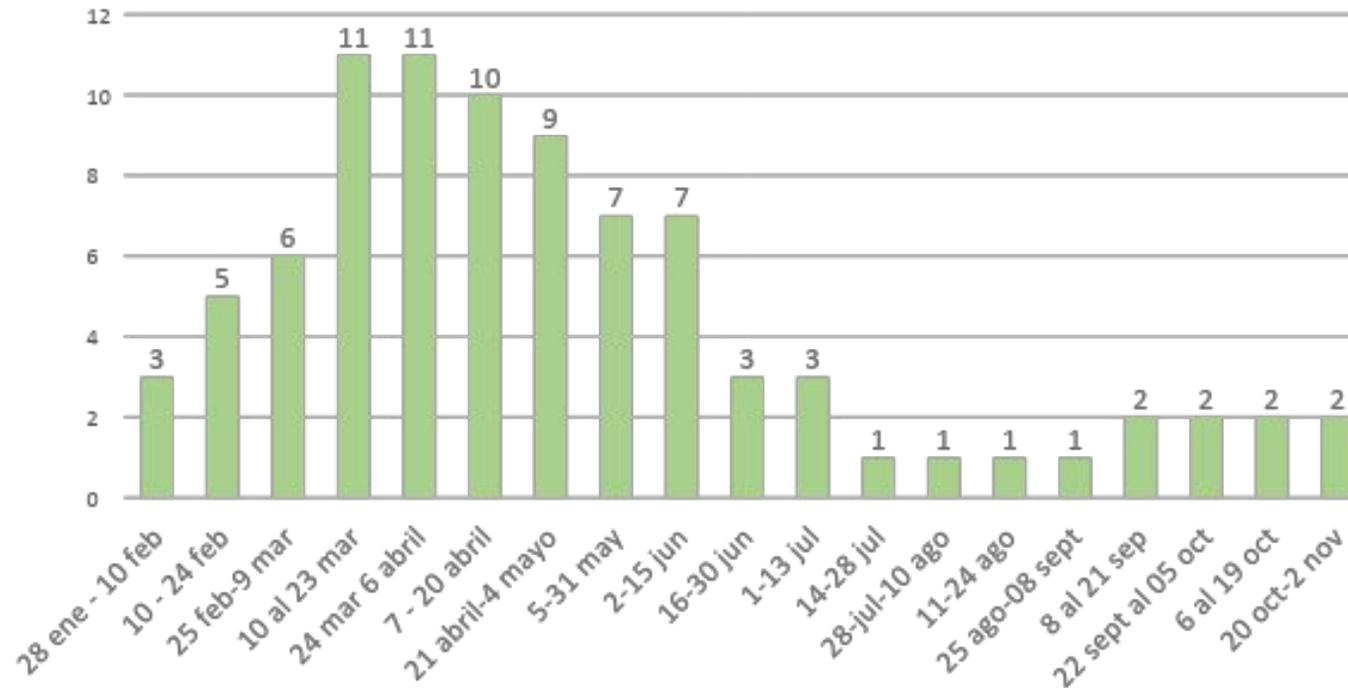

# SSC-TRÁNSITO (SEMÁFOROS Y CÁMARAS)


Tema	Unidad de medida	Periodicidad	20/10 al 2/11	Próximo reporte
Semáforos	Número de semáforos con mantenimiento preventivo		0	
	Número de semáforos con mantenimiento correctivo		42	
		Quincenal		17 de noviembre
Cámaras	Número de cámaras con mantenimiento preventivo		0	
	Número de cámaras con mantenimiento correctivo		0	



# SSC-SCT-DSOT

CORRECTIVO	
ACOMETIDA	1
AISLADA	1
APAGADO	4
CABLE DE COMUNICACIÓN	1
CINTILANTE	4
CORTO	9
DESCONECTADO	11
DESINSTALACIÓN	1
FOCO FUNDIDO	8
GOLPEADO	1
PEATÓN APAGADO	1
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>42</b>

## MANTENIMIENTO CORRECTIVO

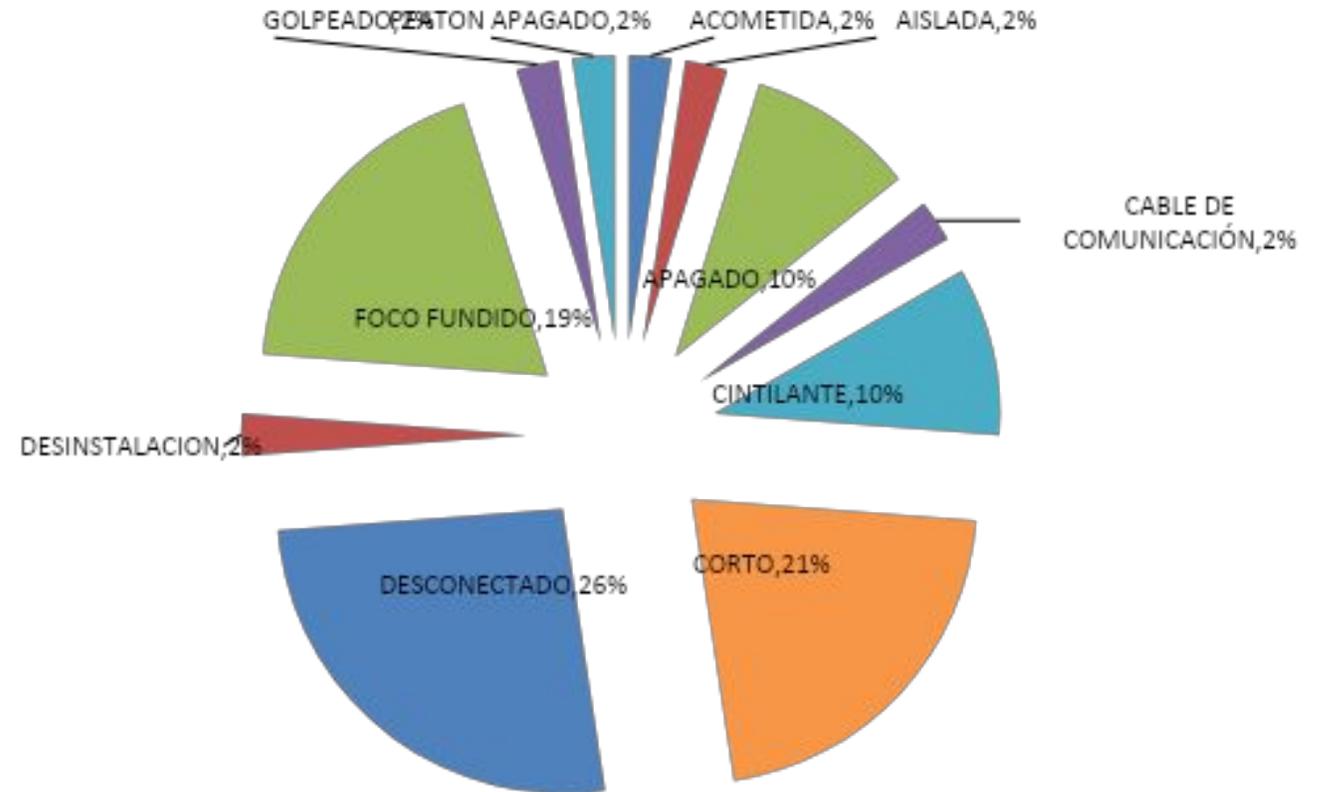



# SSC-TRÁNSITO


Atención a semáforos y cámaras / acumulado enero - octubre

**1353**

**Mantenimientos  
Correctivos**

**574**

**Mantenimientos  
preventivos**

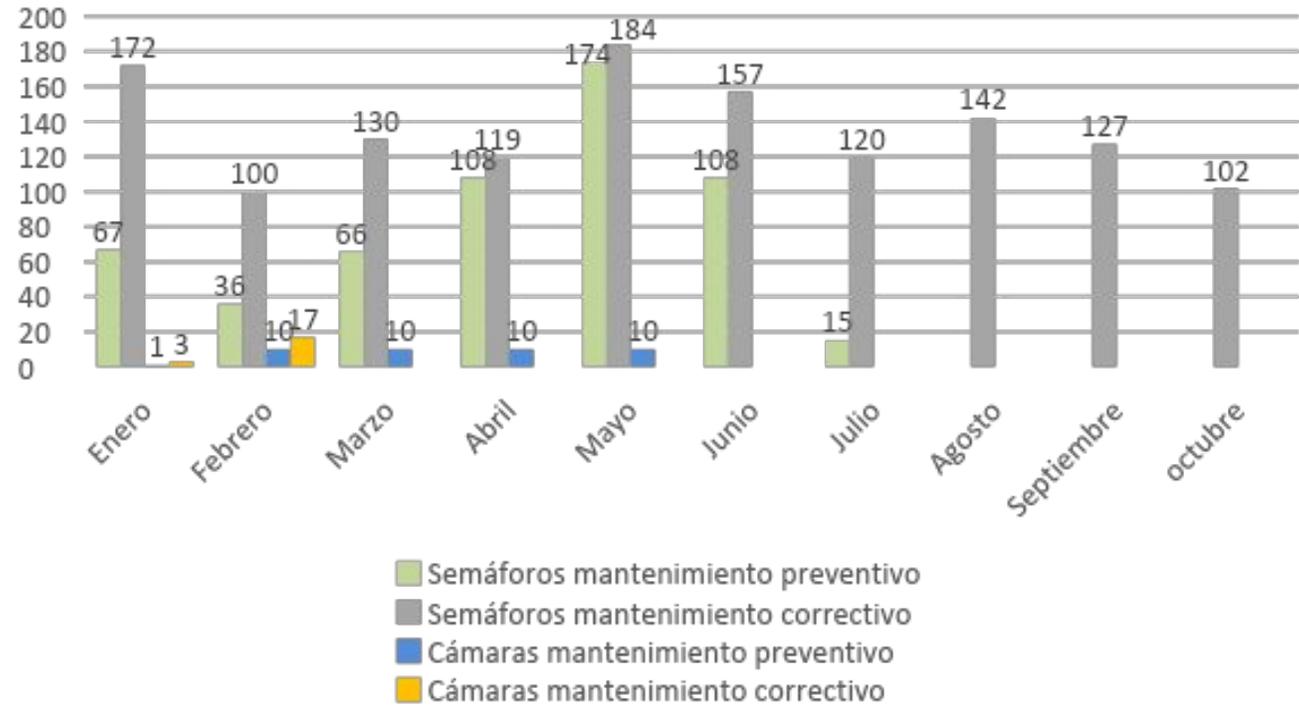



UNIVERSIDAD DEL  
CENTRO  
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Reportes

**Turnos e incidencias urbanas**

Asuntos generales

Acuerdos

Asistencia

**\*Corte de Transmisión\***

CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS

“2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”

# Matriz de seguimiento a turnos



DEPENDENCIA	ESTATUS		
Dependencia	Atendido	Proceso	Total general
ACH	9		9
Al. Cuauhtémoc	11		11
C5	9		9
CFE	102		102
FCH	3		3
Metro	1		1
SACMEX	90		90
SEDEMA	4	2	6
SOS-AP	44		44
SOS-DGOIV	17	3	20
SOS-DGSUS	7		7
TELMEX	4		4
Tránsito	11		11
<b>Total general</b>	<b>312</b>	<b>5</b>	<b>317</b>



# SEGUIMIENTO A TURNOS

## Mesa del 20 de octubre



FECHA DE REPORTE	SOLICITANTE	SOLICITUD	ATIENDE	ESTATUS	FECHA DE ATENCIÓN	EVIDENCIA	OBSERVACIONES
20/10/2020	ALCALDÍA CUAUHTÉMOC	Revisar conexión del colector de Márquez Sterling a línea principal	SACMEX	Atendido	23/10/2020		Se realizó recorrido el viernes 23 de octubre con Alcaldía, SACMEX y METRO revisando los puntos acordando su solución.
20/10/2020	ALCALDÍA CUAUHTÉMOC	Señalización, iluminación adecuada de las obras que se están realizando en avenida Balderas.	SACMEX	Atendido	23/10/2020		El alumbrado ya quedó rehabilitado, se dará seguimiento a los puntos restantes.
20/10/2020	SACMEX	Se realizará recorrido de sensibilización en Santa Veracruz y Valerio Trujano para evitar la aglomeración de basura que ocasiona taponamientos en el sistema de drenaje.	SOS-DGSUS	Atendido	29/10/2020		El jueves 29 de octubre se conversó con los representantes de las unidades habitacionales de Santa Veracruz 53, 47, así como Santa Veracruz 9, Sra. Isabel García, Sr. Juan Carlos Martínez y Sr. Mario Iglesias que son los que tienen mayoría habitacional comentando el problema que representa tirar basura en la calle.
20/10/2020	ACH	Se reubicaran los macetones de Guatemala y de la calle de Madero.	SOS-DGSUS	Atendido	30/10/2020		La noche del viernes 30 de octubre se regresaron a su lugar los macetones en República de Guatemala. Pendientes los de Madero por coordinación con IAPP
20/10/2020	SACMEX	Recorrido en Uruguay para sensibilizar a los restauranteros de esa zona	SEDEMA	Atendido	22/10/2020		Recorrido el jueves 22/10/2020 a las 11:00 horas  Se visitaron 12 establecimientos en compañía de SEDEMA Y SACMEX
20/10/2020	METROBÚS	Limpiar y podar los macetones que están en la infraestructura del Metrobús en Puente de Alvarado y Buenavista	SOS-DGSUS	Atendido			Se realiza deshierbe
20/10/2020	SOS-DGSUS	Concretar los acabados sobre resane gris en la loseta de avenida Juárez.	FCH	Atendido			Se tuvo reunión con el Arq. Olmos del FCH y se acordó que efectuarán los trabajos con los acabados y materiales correctos, ACH ofrece apoyo compartiendo fórmula de materiales y asesoría para acabado en Av. Juárez



## TURNOS EN PROCESO



FECHA DE REPORTE	SOLICITANTE	SOLICITUD	ATIENDE	ESTATUS
29/10/2019	ACH	Reforestación en la calle de Victoria.	SEDEMA	Proceso
29/10/2019	FCH	Retire árboles secos en la calle de República de Cuba en el tramo de República de Brasil a Eje Central Lázaro Cárdenas, particularmente el ubicado frente a la Antigua Escuela de Economía, Cuba 92.	SEDEMA	Proceso
18/04/2020	SACMEX	Se solicita realizar arenero en el último registro frente al inmueble de Mina No.17 por taponamiento en drenaje	SOS-DGOIV	Proceso
24/04/2020	SACMEX	Demolición de banquetta para liberar registro clausurado en Santa Veracruz 31	SOS-DGOIV	Proceso
21/05/2020	ACH	Limpieza de ductos de Telmex obstruidos con cascajo derivado de la obra en la calle de Mina	SOS-DGOIV	Proceso



# Matriz de seguimiento a Incidencias Urbanas



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Matriz IUCH	Estatus			Total general	
	Dependencia	Atendido	Pendiente		Proceso
ACH		26	2	3	31
Al. Cuauhtémoc		28	15	2	45
Al. Venustiano Carranza		1			1
C5		1			1
CFE		88	60	7	155
CIS		2	8		10
SACMEX		99	13	1	113
SEDEMA		1		2	3
SGIRyPC		1			1
SOS-AP		56	3		59
SOS-DGOIV		14	7	1	22
SOS-DGSUS		1	2		3
TELMEX		26	3	1	30
Tránsito		22		2	24
<b>Total general</b>		<b>366</b>	<b>113</b>	<b>19</b>	<b>498</b>

CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS

“2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”



# Atención VIPPSC

## Del 20 de oct al 02 de nov



CLAVE	FECHA DE REPORTE	IDENTIFICA	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS	FECHA DE ATENCIÓN
IUCH-1566	20/10/2020	VIPP 5 Zocalo	Tapa de boveda dañada	MONTE DE PIEDAD	REPÚBLICA DE GUATEMALA	PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN	Plaza del empedradillo			CFE	Atendido	23/10/2020
IUCH-1567	20/10/2020	VIPP 3 Santo Domingo	Falla en el suministro de energía eléctrica	REPÚBLICA DE BRASIL	REPÚBLICA DE BOLIVIA	REPÚBLICA DE COLOMBIA	No. 43			CFE	Atendido	20/10/2020
IUCH-1571	21/10/2020	VIPP 4 Alameda Sector Financiero	Desazolve	XICOTÉNCATL	TACUBA	DONCELES				SACMEX	Atendido	23/10/2020
IUCH-1572	21/10/2020	VIPP 2 Callejón del 57 Plaza de la Concepción	Falla en alumbrado público	BELISARIO DOMÍNGUEZ	EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	IGNACIO ALLENDE	Plaza de la Conchita			Al. Cuauhtémoc	Atendido	21/10/2020



# Atención VIPPSC Del 20 de oct al 02 de nov



CLAVE	FECHA DE REPORTE	IDENTIFICA	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS	FECHA DE ATENCIÓN
IUCH-1575	24/10/2020	VIPP 8 San Pablo	Desprendimiento de recubrimiento en fachada	REPÚBLICA DEL SALVADOR	CORREO MAYOR	LAS CRUCES	No. 153			SGIRyPC	Atendido	24/10/2020
IUCH-1580	27/10/2020	VIPP 7 Vizcaínas Corredor Cultural Regina	Falla en el alumbrado público	PLAZA LA AGUILITA						Al. Cuauhtémoc	Atendido	27/10/2020
IUCH-1582	28/10/2020	VIPP 6 Antigua Merced Mixcalco	Falla en el suministro de energía eléctrica	REPÚBLICA DE VENEZUELA	GIRÓN		MERCADO ABELARDO L. RODRÍGUEZ			CFE	Atendido	28/10/2020
IUCH-1583	29/10/2020	VIPP 2 Callejón del 57 Plaza de la Concepción	Falta tapa de coladera	REPÚBLICA DE PERÚ	IGNACIO ALLENDE	REPÚBLICA DE CHILE				SACMEX	Atendido	30/10/2020
IUCH-1585	01/11/2020	VIPP 7 Vizcaínas Corredor Cultural Regina	Retiro de caseta telefónica	ISABEL LA CATÓLICA	REGINA	SAN JERÓNIMO	Frente al No.93			TELMEX	Atendido	01/11/2020
IUCH-1586	02/11/2020	VIPP 8 San Pablo	Desazolve de coladera	RAMÓN CORONA	SANTO TOMÁS	EJE 1 ORIENTE (ANILLO DE CIRCUNVALACION)	Frente al No.42			SACMEX	Atendido	02/11/2020



# Incidencias en proceso Del 20 de oct al 02 de nov



CLAVE	FECHA DE REPORTE	IDENTIFICA	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	FOTOGRAFÍA ANTES	ATIENDE	ESTATUS
IUCH-1570	20/10/2020	VIPP 1 Santa María la Redonda	Falla en el suministro de energía eléctrica	MINA	EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	GALEANA		AL Cuauhtémoc	Proceso
IUCH-1573	22/10/2020	VIPP 5 Zocalo	Falta tapa de registro	JOSÉ MARÍA PINO SUAREZ	REPÚBLICA DEL SALVADOR			TELMEX	Proceso
IUCH-1574	24/10/2020	VIPP 3 Santo Domingo	Falla en el suministro de energía eléctrica	REPÚBLICA DE BRASIL	REPÚBLICA DE NICARAGUA	REPÚBLICA DE PARAGUAY		CFE	Proceso
IUCH-1576	25/10/2020	VIPP 3 Santo Domingo	Falta tapa de registro	REPÚBLICA DE ARGENTINA	REPÚBLICA DE BOLIVIA			ACH	Proceso
IUCH-1577	25/10/2020	VIPP 5 Zocalo	Registro en mal estado	ISABEL LA CATÓLICA	16 DE SEPTIEMBRE	FRANCISCO I. MADERO		ACH	Proceso



# Incidencias en proceso

## Del 20 de oct al 02 de nov



CLAVE	FECHA DE REPORTE	IDENTIFICA	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	FOTOGRAFÍA ANTES	ATIENDE	ESTATUS
IUCH-1578	26/10/2020	ACH	Falla de semaforos	BALDERAS	AV. JUÁREZ	ERNESTO PUGIBET		Tránsito	Proceso
IUCH-1579	27/10/2020	VIPP 6 Antigua Merced Mixcalco	Falla en el suministro de energía eléctrica	SOLEDAD	JESÚS MARÍA	ALHÓNDIGA		CFE	Proceso
IUCH-1581	28/10/2020	VIPP 3 Santo Domingo	Falta tapa de registro	PLAZA DE SANTA CATARINA	REPÚBLICA DE HONDURAS			CFE	Proceso
IUCH-1584	29/10/2020	VIPP 8 San Pablo	Cables expuestos	CARRETONES	SANTO TOMÁS	EJE 1 ORIENTE (ANILLO DE CIRCUNVALACION)		CFE	Proceso



UNIVERSIDAD DEL  
CENTRO  
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Reportes

Turnos e incidencias urbanas

Mesas de trabajo

**Asuntos generales**

Acuerdos

Asistencia

**\*Corte de Transmisión\***

CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS

“2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”



Reportes

Turnos e incidencias urbanas

Mesas de trabajo

Asuntos generales

**Acuerdos**

**Asistencia**

**\*Se reanuda transmisión  
en vivo\***



UNIVERSIDAD DE LEÓN  
CENTRO  
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

# PRÓXIMA SESIÓN

17 de noviembre de 2020

## A las 10:30 horas

**\*Transmisión en vivo\***

CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS

“2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”
