



ASOCIACIÓN DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA

XXII SESIÓN. Evaluación octubre

3 de noviembre de 2021

Orden del día

Presentación de Enlaces

Reportes institucionales

Turnos

Incidencias urbanas

Asuntos generales

Acuerdos

Asistencia



Autoridad del Centro Histórico | Presentación de Enlaces

El 1 de Octubre se solicitó a las Alcaldías de Cuauhtemoc y Venustiano Carranza la designación de enlaces para la mesa de Reordenamiento y de Infraestructura.

Alcaldía Venustiano Carranza

Reordenamiento

- Lic. Héctor Israel Rodríguez, Director de Gobierno

Infraestructura

- Dra. Graciela Martínez Ortega, Directora de Sustentabilidad, Mejoramiento Urbano e Impacto Ambiental.
- Elizabeth Moya Vizuetto, Directora de Desarrollo Urbano.
- Jorge Álvarez Domínguez, Subdirector de Manifestaciones, Licencias y Uso de Suelo.


oficio recibido el 7 de octubre de 2021

Alcaldía Cuauhtemoc


Reordenamiento e Infraestructura

- Jorge Rodrigo Torres Ortega, Subdirector de Vía Pública.
- Cristian Josúe Pacheco Reséndiz, Líder Coordinador de Proyectos
- Miguel Ángel Juárez Ugalde, Asesor Enlace con Gobierno
- Ing. Ariel Francisco González Gama, Director de Imagen y Mantenimiento del Espacio Público.

oficio recibido el 19 de octubre de 2021



Reportes Institucionales



Autoridad del Centro Histórico

Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

Tema	Indicador	Periodicidad	Quincena al 29/10/2021	Próximo reporte
Mantenimiento a infraestructura	Número de Incidencias de daño en infraestructura del Perímetro de la ACH reparadas y atendidas	Quincenal	202	12 de noviembre
Mantenimiento a infraestructura con apoyo de Justicia Cívica	Número de atenciones en parques, plazas o áreas verdes del Perímetro del Centro Histórico	Quincenal	2	12 de noviembre

Autoridad del Centro Histórico | Obras menores

República de
Brasil
República de
Guatemala
Plaza 2 de Abril
Santa Veracruz
Plaza
Seminario
Empedradillo
Donceles
Santísima
Plaza
Tlaxcoaque
Belisario
Domínguez
Moneda
16 de
Septiembre
Madero
5 de Mayo
República de
Argentina

Los trabajos realizados consistieron en **reparación de banqueta se colocaron 5 piezas de piso tipo recinto** en República de Brasil entre República de Colombia y República de Bolivia, **se reparó banqueta, se colocaron 2 piezas de recinto** en República de Brasil entre República de Bolivia y República de Perú, **se colocaron 3 biciestacionamientos** en República de Guatemala entre República de Brasil y República de Argentina, **se balizaron 3 flechas, se pintaron 2 tapas de registro y se elaboró una tapa de madera** en Plaza 2 de Abril entre Av. Hidalgo y Santa Veracruz, **se retiró biciestacionamiento** en Santa Veracruz esquina 2 de Abril, **se repuso 1 tapa de dren** en Plaza Seminario, **se reparó 1 tapa de registro** en Donceles entre Callejón del 57 y Bolívar, **se reparó 1 tapa de registro** en Santísima entre República de Guatemala y Zapata, **se repuso una pieza de rejilla Irving** en Santísima esquina Zapata, **se repusieron 9 tapas de dren, se renivelaron 2 bolardos de concreto, se colocaron 3 bolardos metálicos y se repusieron 9 piezas de rejilla Irving** en Plaza Tlaxcoaque, **se reparó 1 tapa de registro** en Belisario Domínguez esquina República de Brasil, **se repuso una pieza de rejilla irving y se repusieron 2 tapas de dren** en Moneda esquina Primo de Verdad y Ramos, **se colocaron 150 pendones** en las calles 16 de Septiembre, madero, 5 de Mayo y República de Guatemala, **se realizaron adecuaciones a la base de un alebrije** en República de Argentina 8, **se trasladaron 3 alebrijes** de la Nana a República de Argentina.



Autoridad del Centro Histórico | Gráficos de obras menores



Moneda

República de Ecuador

Zapata

Autoridad del Centro Histórico | Mantenimiento con apoyo de infractores de justicia cívica



Violeta de Reforma a Eje central con apoyo de 13 infractores




Plaza Santos Degollado, Andador Marroquí, Plaza Juárez y Calle Dolores de Av. Juárez a Independencia con apoyo de 19 infractores

Autoridad del Centro Histórico | Seguimiento de indicadores

2,512

Incidencias atendidas
enero - octubre


Atención a incidencias de daño en infraestructura del perímetro de la ACH

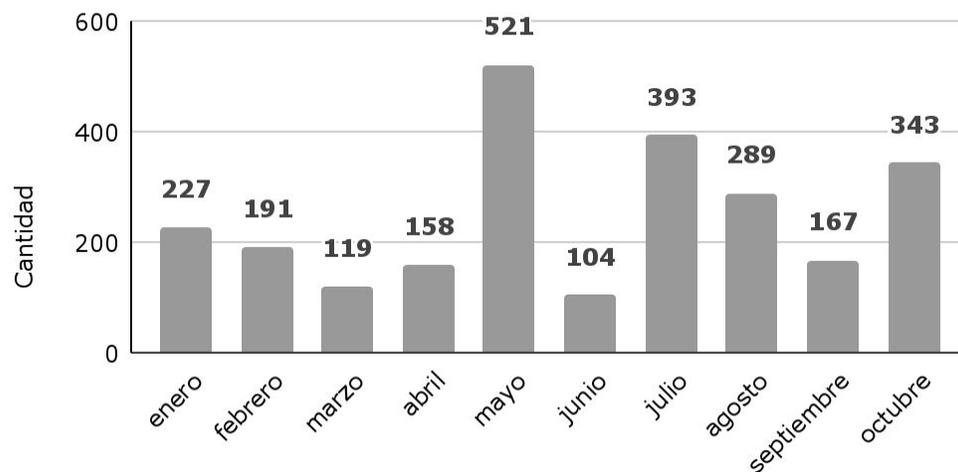

2,504 m²

Graffitis eliminados
enero - octubre

Eliminación de grafiti (m2)

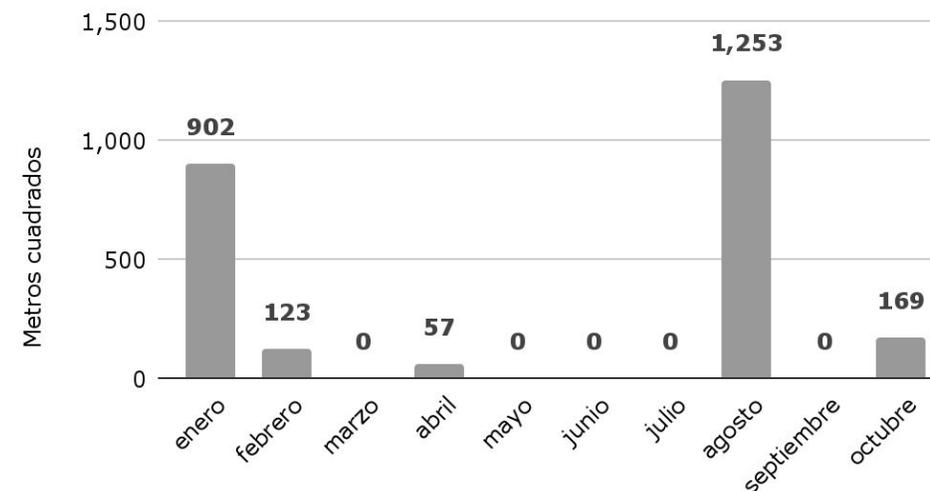

Autoridad del Centro Histórico | Seguimiento de indicadores

12

Riegos por vecinos
abril - octubre

13


Riegos por ACH
abril - octubre


07

Riegos por ACH - DGSUS
abril - octubre

08

Riegos por SEDEMA
abril - octubre

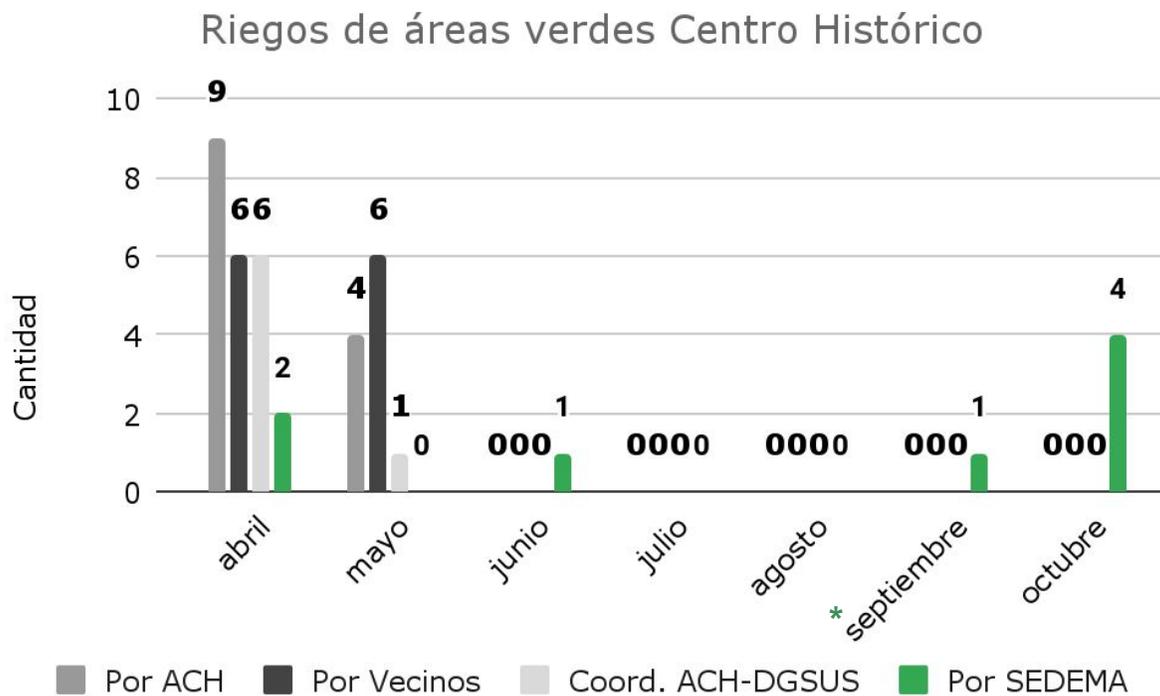



Alcaldía Cuauhtémoc

**SIN REPORTE POR CAMBIO
DE ADMINISTRACIÓN**




Alcaldía Cuauhtémoc | Seguimiento de indicadores

1,247

reparaciones de luminarias
enero - octubre


Reparaciones de luminarias en vías secundarias

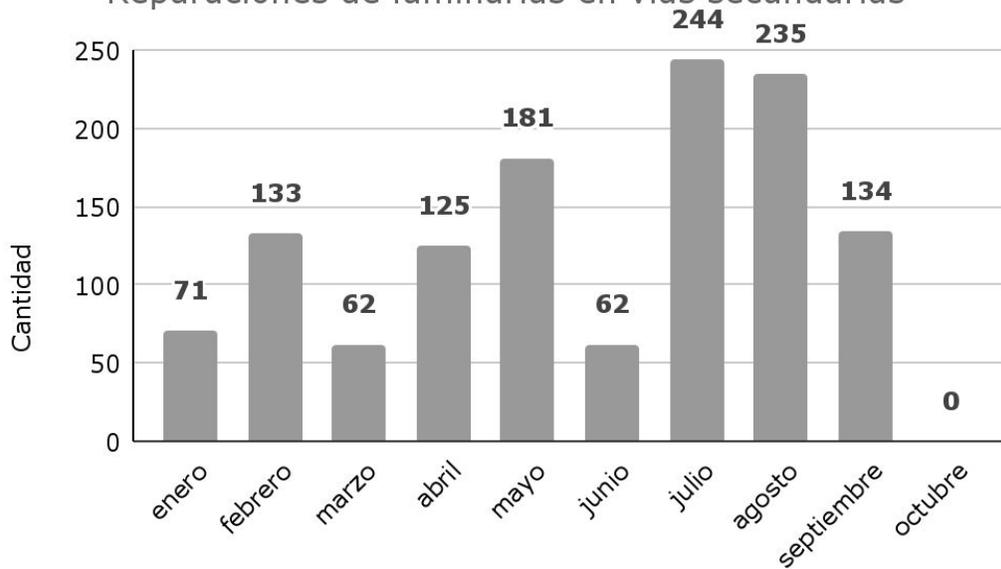

472

sujetos forestales podados
enero - octubre

Sujetos forestales podados en vías secundarias y/o plazas

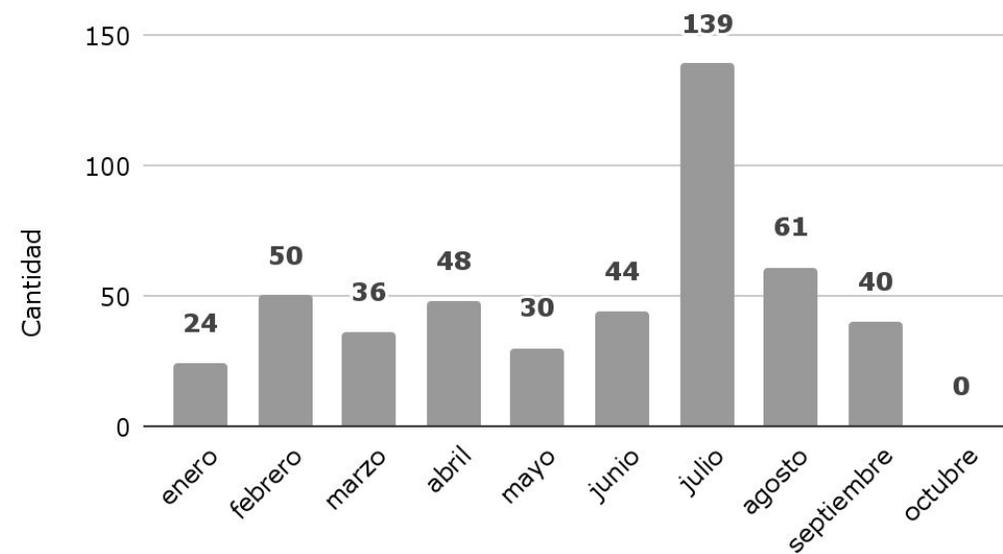


Alcaldía Cuauhtémoc | Seguimiento de indicadores

1,588 m

de desazolve en red de drenaje
enero - octubre

Desazolve de la red de drenaje




201


rejillas de piso
desazolvadas
enero - octubre

344

coladeras desazolvadas
enero - octubre

Desazolve de accesorios





Alcaldía Venustiano Carranza

Alcaldía Venustiano Carranza | Indicadores


Tema	Indicador	Periodicidad	Quincena al 29/10	Próximo reporte	Observaciones
Luminarias	Número de luminarias reparadas en vías secundarias	Quincenal	0	12 de noviembre	La Coordinación Territorial Morelos no reporta trabajos de alumbrado público en el periodo.
Tiraderos Clandestinos	Toneladas de residuos sólidos recolectados de tiraderos clandestinos en el PB de VC (línea base 26 tiraderos)	Quincenal	525	12 de noviembre	Se recolectaron 35 toneladas diariamente de Residuos Sólidos
Poda de árboles	Número de sujetos forestales podados en vías secundarias y/o plazas	Quincenal	0	12 de noviembre	La Coordinación Territorial Morelos no reporta trabajos de poda de sujetos forestales en el periodo.
Desazolve	Metros lineales de drenaje desazolvados	Quincenal	0	12 de noviembre	La Coordinación Territorial Morelos no reporta trabajos de desazolve en el periodo.

Alcaldía Venustiano Carranza | Seguimiento de indicadores

805

reparaciones de luminarias
enero - octubre


Reparaciones de luminarias en vías secundarias de CH

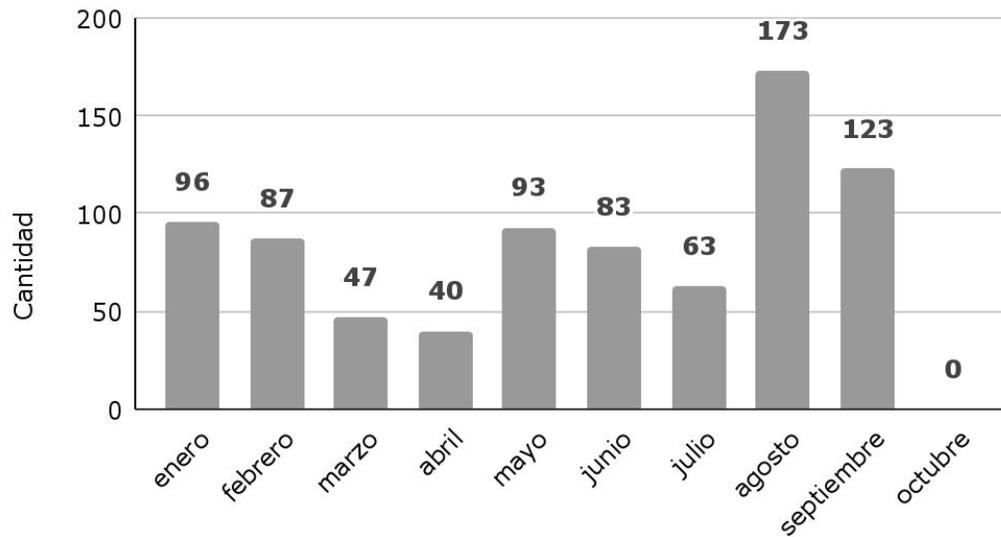

17,171.8 ton.

de residuos sólidos recolectados
enero - octubre

Residuos sólidos recolectados en tiraderos clandestinos

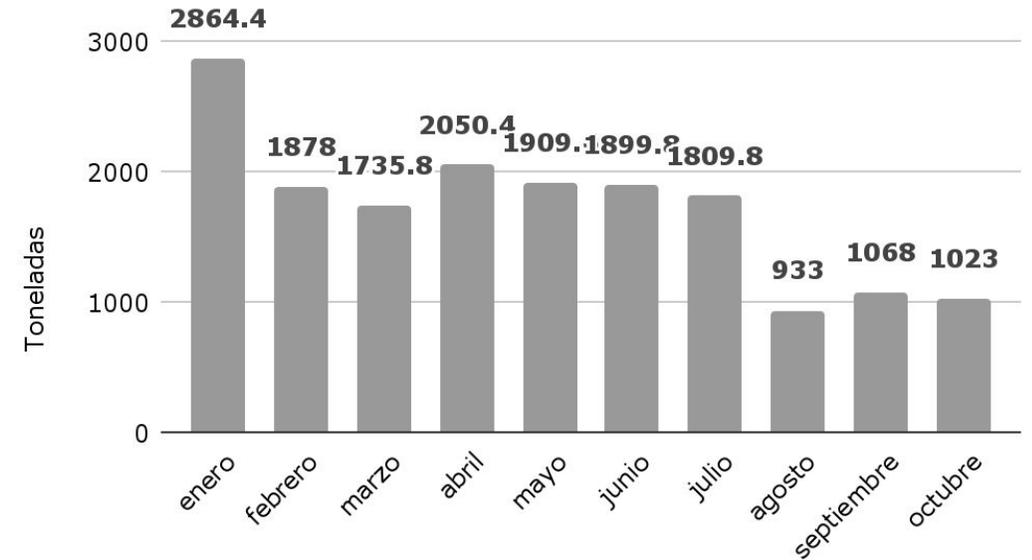


Alcaldía Venustiano Carranza | Seguimiento de indicadores

132

sujetos forestales podados
enero - octubre


Sujetos forestales podados en vías secundarias y/o plazas

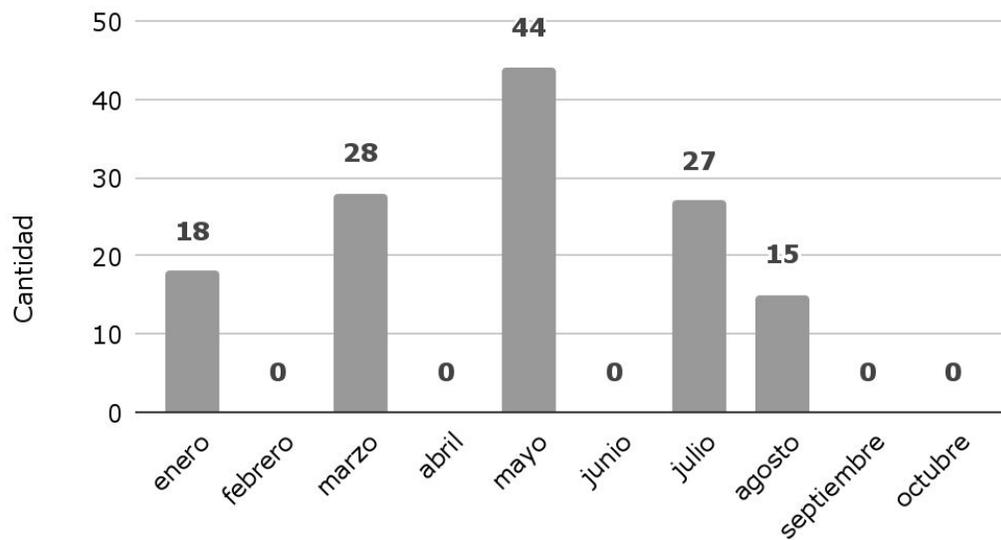

4,102 m

de desazolve en red de drenaje
enero - octubre

Desazolve de la red de drenaje





SACMEX

Dirección de Detección de Fallas y Rehabilitación de Drenaje




SACMEX Drenaje | Ejecución del programa



Desazolve de la red de drenaje y accesorios hidráulicos

**100 %
DE AVANCE**

	PROGRAMADO	ANTERIOR	EJECUTADO	AVANCE
ATARJEA (METROS)	21,000	19,400	840	20,240
POZOS DE VISITA	370	339	16	355
REJILLAS DE PISO	150	214	223	223
COLADERA PLUVIAL	160	257	14	271
ALBAÑAL (METROS)	1500	1671	70	1741



SACMEX Drenaje | Reporte Fotográfico




■ ■ ■ AV. CIRCUNVALACIÓN

■ ■ ■ (ENTRE EJE 1 NORTE Y FRAY SERVANDO TERESA DE MIER)

■ ■ ■ AVANCE DE TRABAJO LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE 1,800 ML DE ATARJEA, 22 PV, 25 RP, 40 CP, 145 ML DE ALBAÑAL.

SACMEX Drenaje | Reporte Fotográfico



REPÚBLICA DE ECUADOR NO. 99 (ENTRE JESÚS CARRANZA Y REPÚBLICA DE BRASIL)

AVANCE DE TRABAJO LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE 400 ML DE ATARJEA, 2 PV, 1 CP, 5 REGISTROS Y 20 ML DE ALBAÑAL.

SACMEX Drenaje | Reporte Fotográfico



REPÚBLICA DE GUATEMALA (ESQUINA LEONA VICARIO)

AVANCE DE TRABAJO LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE 60 ML DE ATARJEA, 2 PV, 1 CP, 5 ML DE ALBAÑAL.


SACMEX Drenaje | Reporte Fotográfico



REPÚBLICA DE ARGENTINA (ENTRE REPÚBLICA DE GUATEMALA Y DONCELES)

AVANCE DE TRABAJO LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE 120 ML DE ATARJEA, 4 PV, 5 CP, 4 RP, 20 ML DE ALBAÑAL.

SACMEX Drenaje | Reporte Fotográfico



CALLE MIXCALCO

(ENTRE LORETO Y EJE 1 OTE – VIDAL ALCOCER)

AVANCE DE TRABAJO LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE 160 ML DE ATARJEA, 5 PV, 7 CP, 5 RP, 25 ML DE ALBAÑAL.


SACMEX Drenaje | Reporte Fotográfico



CALLE DOLORES (ENTRE AYUNTAMIENTO Y VICTORIA)


AVANCE DE TRABAJO LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE 100 ML DE ATARJEA, 3 PV.

SACMEX Drenaje | Seguimiento de indicadores



100 %
avance acumulado
septiembre - octubre

20.24 km en atarjea
355 pozos de visita
223 rejillas de piso
271 coladeras pluviales
1,741 m de albañal




Secretaría de Obras y Servicios

Dirección General de Obras de Infraestructura Vial



SOS-DGOIV | Indicadores - Fechas de terminación de obra 2021

OBRA	ALCALDÍA	AVANCE FÍSICO	FECHA DE TERMINO REAL	COMENTARIOS
CALLE ZARCO TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y RECONFIGURACIÓN	CUAUHTÉMOC	100.00%	INAUGURADA	Sin comentarios
SANTA MARIA LA REDONDA NORTE TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y RECONFIGURACIÓN	CUAUHTÉMOC	100.00%	INAUGURADA	Sin comentarios
AV. BALDERAS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y RECONFIGURACIÓN	CUAUHTÉMOC	100.00%	INAUGURADA	Trabajos de Urbanismo Táctico en colindancia con Plaza Solidaridad y Ciudadela por licitar. Temas revisados con el INAH y SEMOVI por ser área patrimonial
MÉXICO TENOCHTITLÁN TRAMO 04-AV. INSURGENTES A AV. ROSALES	MIGUEL HIDALGO	100.00%	INAUGURADO	Sin comentarios
TACUBA	CUAUHTÉMOC	100.00 %	18/10/2021	Concluida en revisión de detalles
5 DE MAYO	CUAUHTÉMOC	100.00%	04/10/2021	Concluida en revisión de detalles
PLAZA EMPEDRADILLO	CUAUHTÉMOC	12.00 %	30/12/2021	En ejecución
PLAZA SOLIDARIDAD	CUAUHTÉMOC	60.00 %	30/10/2021	Se trabaja convenio
PLAZA MARTÍ	CUAUHTÉMOC	10.50%	30/10/2021	En ejecución
SAN HIPÓLITO (MINA-SOTO-HÉROES-VIOLETA-SAN FERNANDO Y AV. HIDALGO)	CUAUHTÉMOC	18.28 %	30/12/2021	En ejecución
REPÚBLICA DE CHILE	CUAUHTÉMOC	34.81 %	30/12/2021	En ejecución
SAN ILDEFONSO Y JUSTO SIERRA	CUAUHTÉMOC	17.98 %	30/11/2021	En ejecución

 Obra Inaugurados

 Obra concluida sin inaugurar

SOS-DGOIV | Indicadores - Fechas de terminación de obra 2021

OBRA	ALCALDÍA	AVANCE FÍSICO	FECHA DE TERMINO REAL	COMENTARIOS
REFORMA, DE AV. HIDALGO A GLORIETA VIOLETA	CUAUHTÉMOC	12.00 %	30/12/2021	En ejecución
URBANISMO TÁCTICO EN BALDERAS – PLAZA SOLIDARIDAD	CUAUHTÉMOC	00.00%	15/12/2021	En contratación
URBANISMO TÁCTICO EN BALDERAS – CIUADAELA Y EMILIO DONDÉ	CUAUHTÉMOC	00.00%	15/12/2021	En contratación
CICLOVÍA REFORMA	CUAUHTÉMOC	00.00%	15/12/2021	En proceso de licitación

SOS-DGOIV | Tacuba

Concluida



Alcaldía

Periodo

Avance

Fecha de conclusión

Inauguración o visita

Cuauhtémoc

Junio - Octubre


100 %

Concluida-Oct 2021

Por programar

SOS-DGOIV | 5 de mayo

Concluida. En Av. 20 de noviembre se espera proyecto para adecuar lanzadera.

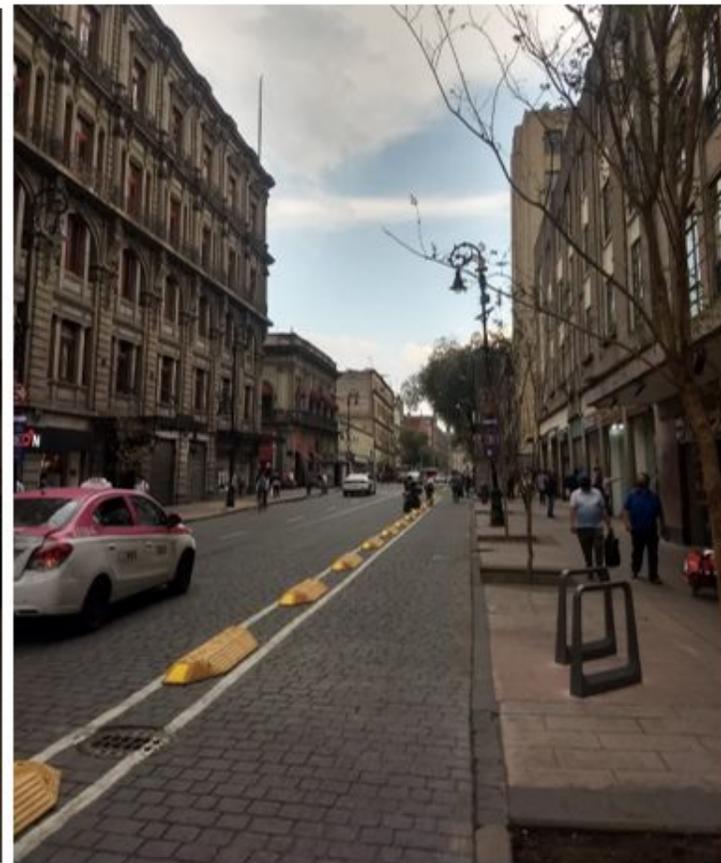

Alcaldía

Periodo

Avance

Fecha de conclusión

Inauguración o visita

Cuauhtémoc

Junio - Octubre

100.00 %

Concluida-Oct 2021

Por programar

SOS-DGOIV | Plaza Empedradillo - Obra nueva - Mantenimiento

Confinamiento de las áreas de trabajo e inicio de trabajos de demolición, así como fabricación de guarniciones que contendrán REVO.



Alcaldía

Periodo

Avance General

Fecha de conclusión

Inauguración o visita

Cuauhtémoc

Octubre - Diciembre

12.00 %

Diciembre 2021

Iniciando

SOS-DGOIV | Plaza Solidaridad

Se realizan trabajos de levantamiento topográfico, trazo y nivelación, demolición de guarniciones y banquetas. Se trabajan bases de luminarios, se consultó a la ACH sobre la posibilidad de iluminación donada por empresarios, aún no tenemos respuesta


Alcaldía
Periodo
Avance General
Fecha de conclusión
Inauguración o visita

Cuauhtémoc

Agosto - Noviembre



60.00 %

Noviembre 2021

Por programar

SOS-DGOIV | Plaza Martí

Por iniciar trabajos de mantenimiento, se realizan cambios de piezas de mármol en pasillos de la plaza.



Alcaldía

Cuauhtémoc

Periodo

Agosto - Noviembre

Avance General

10.50 %

Fecha de conclusión

Noviembre 2021

Inauguración o visita

Por programar

SOS-DGOIV | República de Chile

Se realizan trabajos de excavación y tendido de tubería para ducto maestro, baja y media tensión, colocación de mr-45 en arroyo vehicular.



Alcaldía

Cuauhtémoc

Periodo

Agosto - Diciembre

Avance

34.81 %

Fecha de conclusión

Diciembre 2021

Inauguración o visita

Por programar


SOS-DGOIV | República de Chile



SOS-DGOIV | República de Chile



SOS-DGOIV | Polígono de San Hipólito

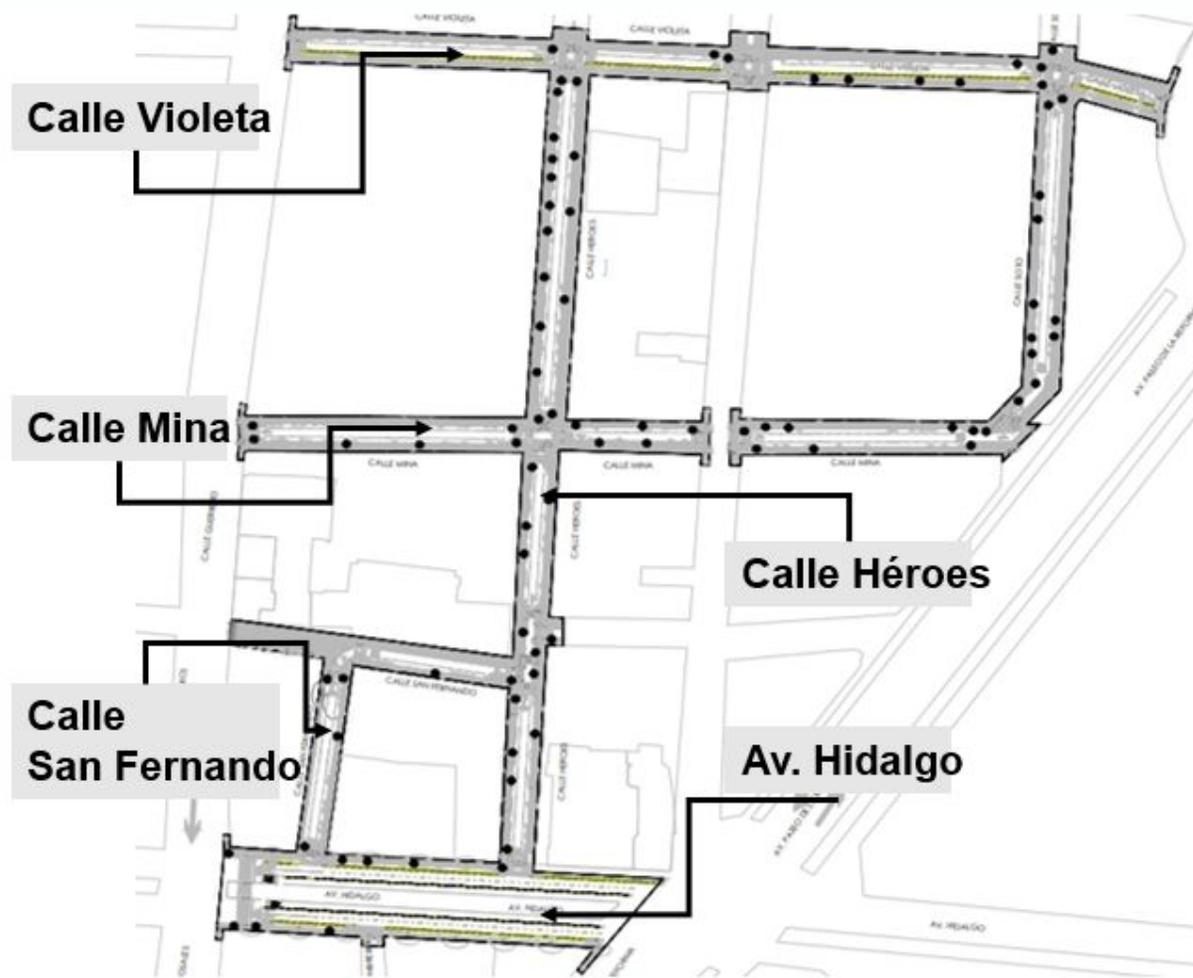

Alcaldía	Periodo	Avance General	Fecha de conclusión	Inauguración o visita
Cuauhtémoc	Agosto - Diciembre	18.28 %	Diciembre 2021	Por programar



SOS-DGOIV | Polígono de San Hipólito - Violeta

Se realizan trabajos de levantamiento topográfico, trazo y nivelación, demoliciones, y trabajos para colocación de acabados en banquetas, carga y retiro de escombros.



SOS-DGOIV | Polígono de San Hipólito - Héroes

Se realiza levantamiento topográfico, trazo y nivelación, se colocan acabados. Se abre otro frente de trabajo para colocar instalación y recibir acabados.



SOS-DGOIV | Polígono de San Hipólito - Mina

Se realiza levantamiento topográfico, trazo y nivelación, inician trabajos de demolición de guarniciones, banquetas y colado de guarniciones.



SOS-DGOIV | Polígono de San Hipólito - San Fernando

Se realizan trabajos de levantamiento topográfico, trazo y nivelación, instalaciones e inician trabajos de colocación de acabados. Se realizó acuerdo con el INAH para criterios para restitución de piso original sobre banqueta de portales colindantes al Panteón.



SOS-DGOIV | Polígono de San Hipólito - San Fernando



SOS-DGOIV | Polígono de San Hipólito - Av. Hidalgo

Se realiza levantamiento topográfico, trazo y nivelación, se ejecutan acabados en banqueta y guarniciones.



SOS-DGOIV | San Ildefonso y Justo Sierra

Se realizan trabajos de levantamiento topográfico, demolición de guarniciones y banquetas, colado de guarniciones y colocación de relleno fluido para integrar acabados prefabricados en banqueta.



Alcaldía

Periodo

Avance General

Fecha de conclusión

Inauguración o visita

Cuauhtémoc

Septiembre - Noviembre

17.98 %

Noviembre 2021

Por programar


SOS-DGOIV | Reforma (Av. Hidalgo a Glorieta Violeta)

Se realiza levantamiento topográfico, trazo y nivelación, inician trabajos de demolición de guarniciones y banquetas, carga y retiro de escombros, colocación de señalamiento preventivo.




Alcaldía	Periodo	Avance	Fecha de conclusión	Inauguración o visita
Cuauhtémoc	Septiembre-Diciembre	12.00 %	Diciembre 2021	Iniciando

SOS-DGOIV | Av. Balderas - Urbanismo Táctico - Solidaridad



Alcaldía	Periodo	Avance	Fecha de conclusión	Inauguración o visita
Cuauhtémoc	Octubre-Diciembre	En contratación	Diciembre 2021	Por programar

SOS-DGOIV | Av. Balderas - Urbanismo Táctico - Ciudadela

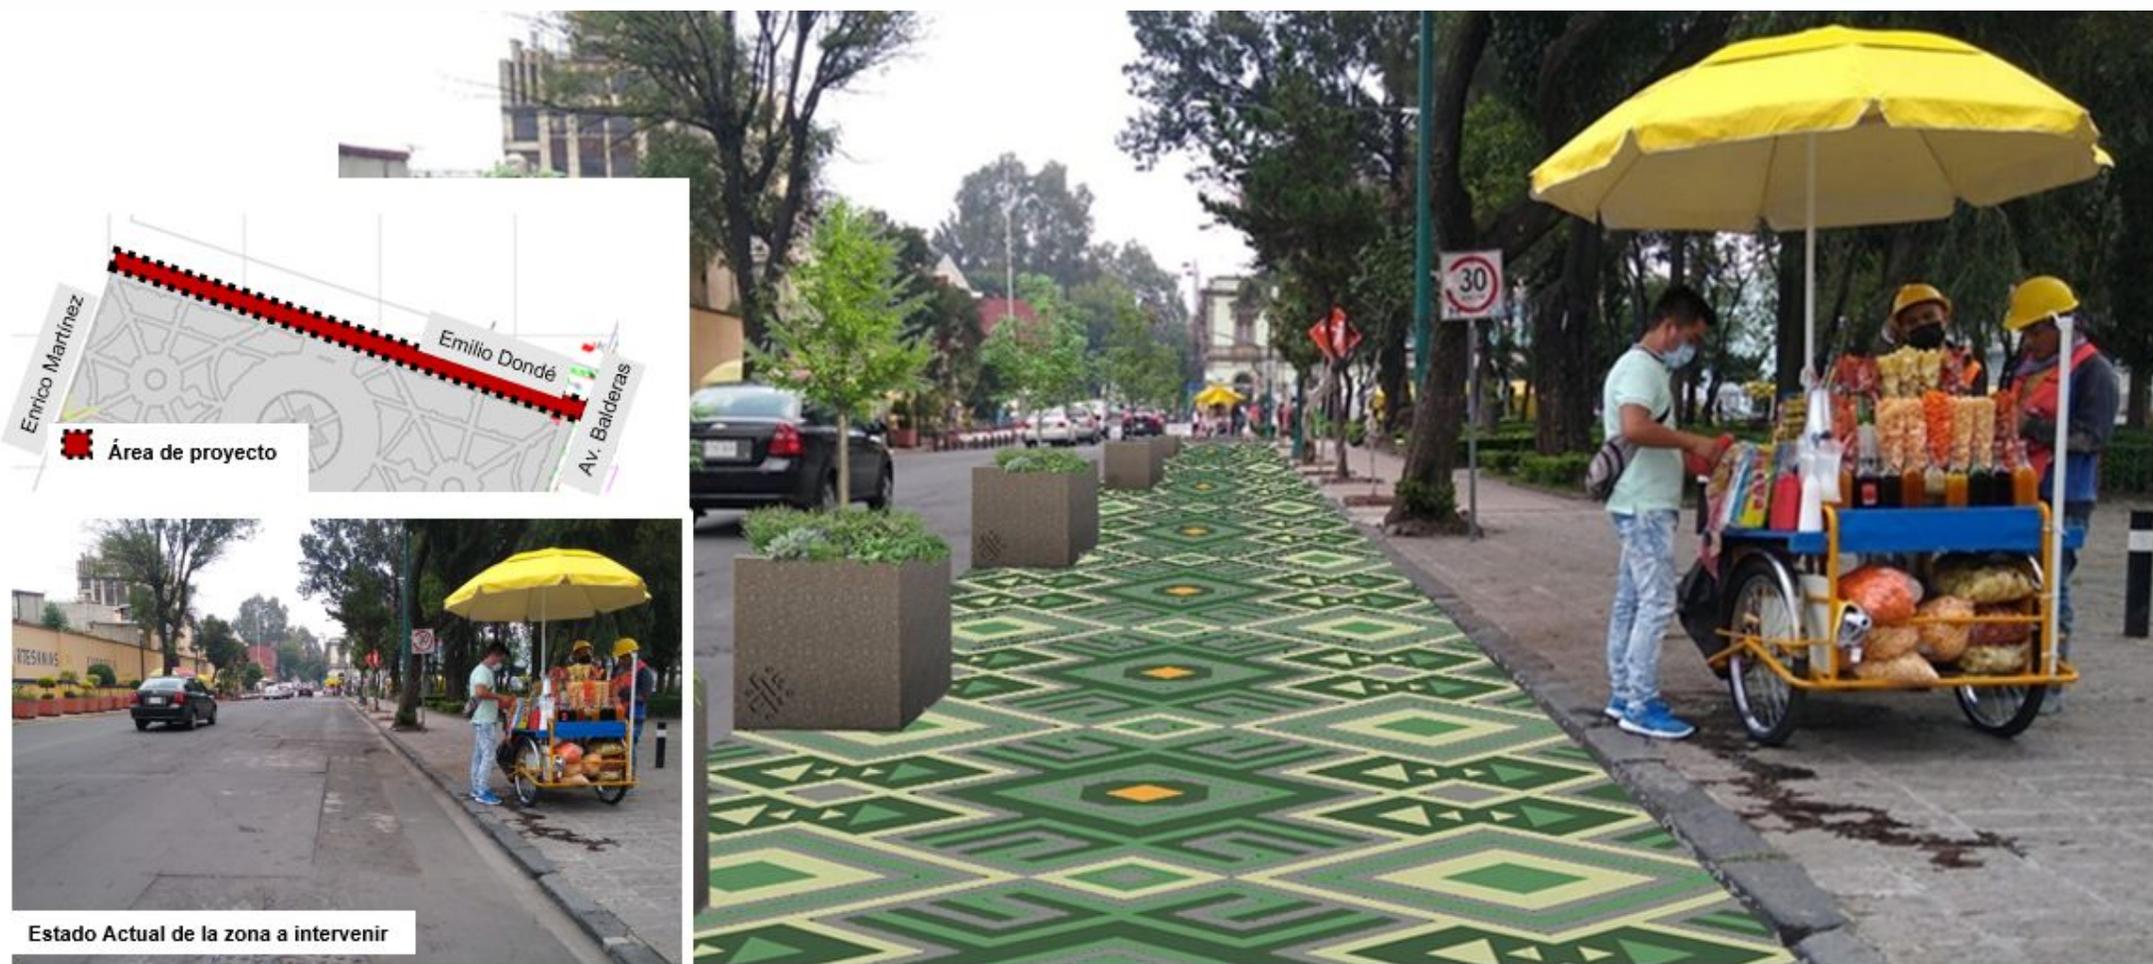


Estado Actual de la zona a intervenir

Alcaldía	Periodo	Avance	Fecha de conclusión	Inauguración o visita
Cuauhtémoc	Octubre-Noviembre	En contratación	Noviembre 2021	Por programar

SOS-DGOIV | Seguimiento de indicadores

Frentes de obra - Revitalización Integral Centro Histórico 2021

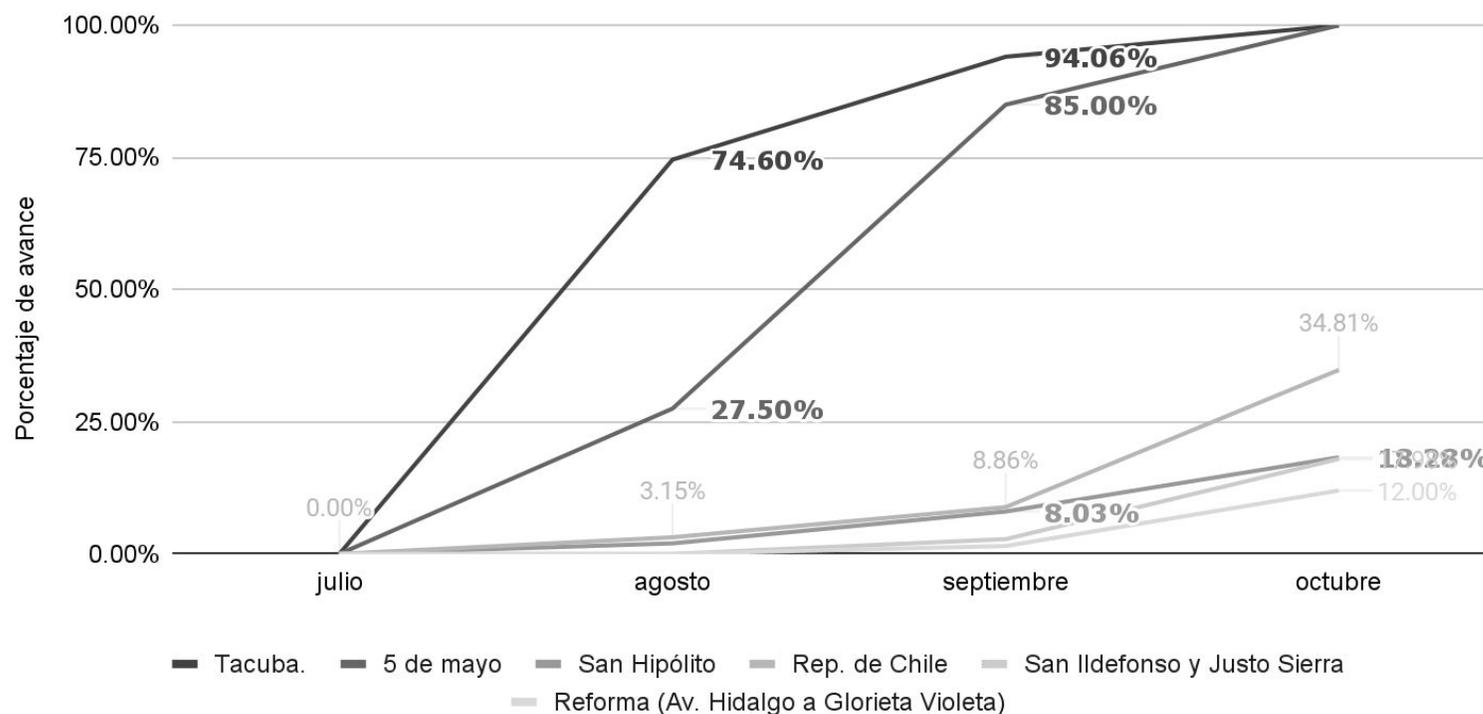


42.15 %
avance promedio
 julio - octubre

**Revitalización Integral
 Centro Histórico 2021**

5
**Frentes de obra
 en ejecución**

SOS-DGOIV | Seguimiento de indicadores

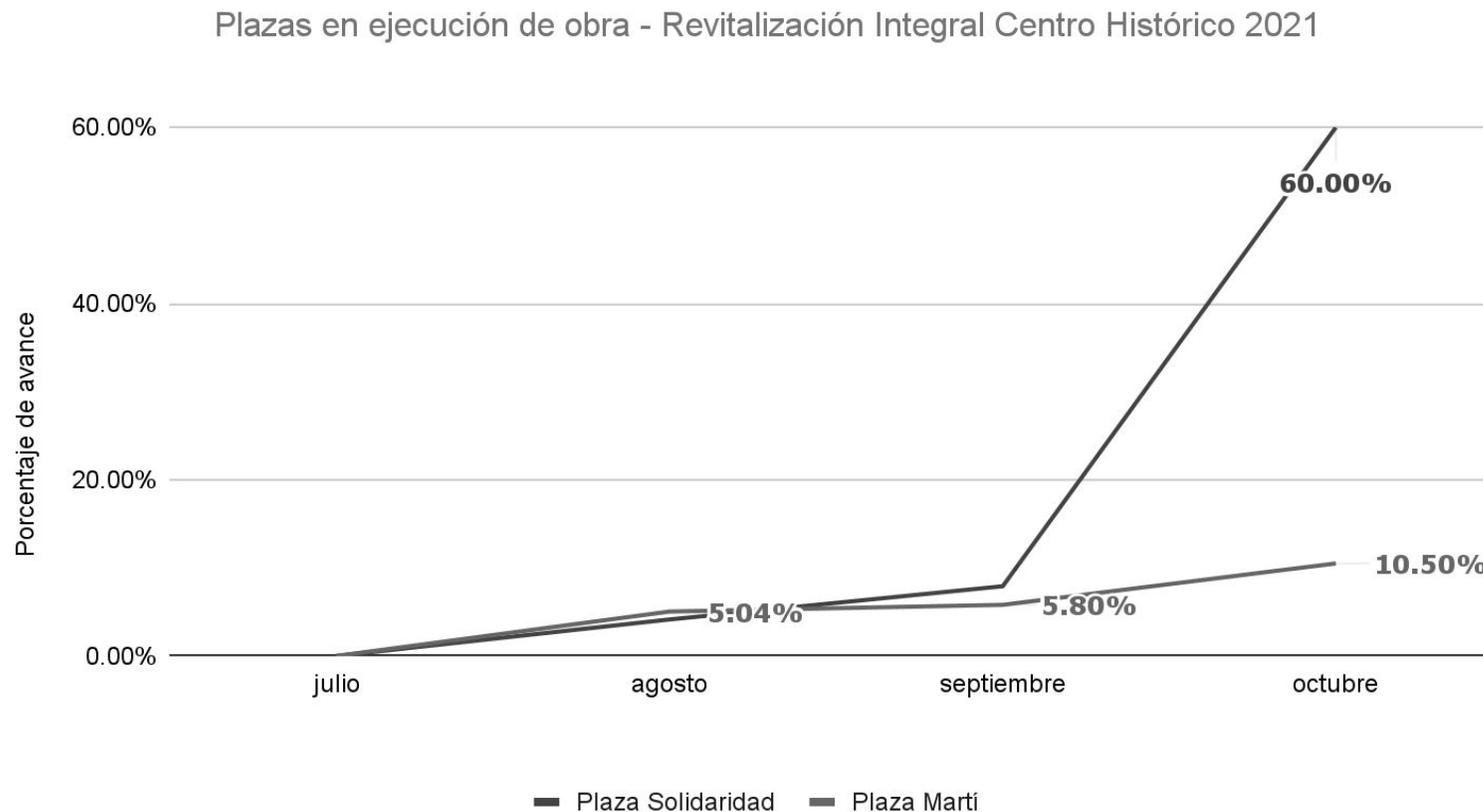


35.25 %
avance promedio
julio - octubre

Revitalización Integral
Centro Histórico 2021

2

Plazas en ejecución
de obra



Secretaría de Obras y Servicios



Dirección General de Construcción de Obras Públicas



SOS-DGCOP | Indicadores - Construcción de PILARES “La Pulga”

AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

DATOS GENERALES CONTRATISTA

No. CONTRATO	DGCOP-LPN-L-1-275-20
CONTRATISTA	INOVACION Y PROMOCION DE LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.
PLAZO DE EJECUCIÓN	149 DIAS CALENDARIO
FECHA DE INICIO	02/10/2020
FECHA DE TERMINACIÓN	27/02/2021
SUPERFICIE DEL TERRENO	3,076.31
AREA DE CONSTRUCCIÓN TOTAL	2,214.00 M2
AREAS EXTERIORES	3,625.00 M2

ESTADO FINANCIERO

IMPORTE DEL CONTRATO S/IVA	\$	19,989,459.25
IMPORTE ESTIMADO (PAGADO) S/IVA		\$12,005,252.52
IMPORTE POR ESTIMAR S/IVA	\$	7,984,206.73

ANTICIPO


ANTICIPO OTORGADO		SIN ANTICIPO
ANTICIPO AMORTIZADO	\$	-
ANTICIPO POR AMORTIZAR	\$	-



PERSPECTIVA DEL PROYECTO

RESIDENTE:
ARQ. GRACIELA DUARTE CALIXTO
J.U.D. DE SUPERVISION DE CONSTRUCCION C2

SOS-DGCOP | Indicadores - Construcción de PILARES “La Pulga”

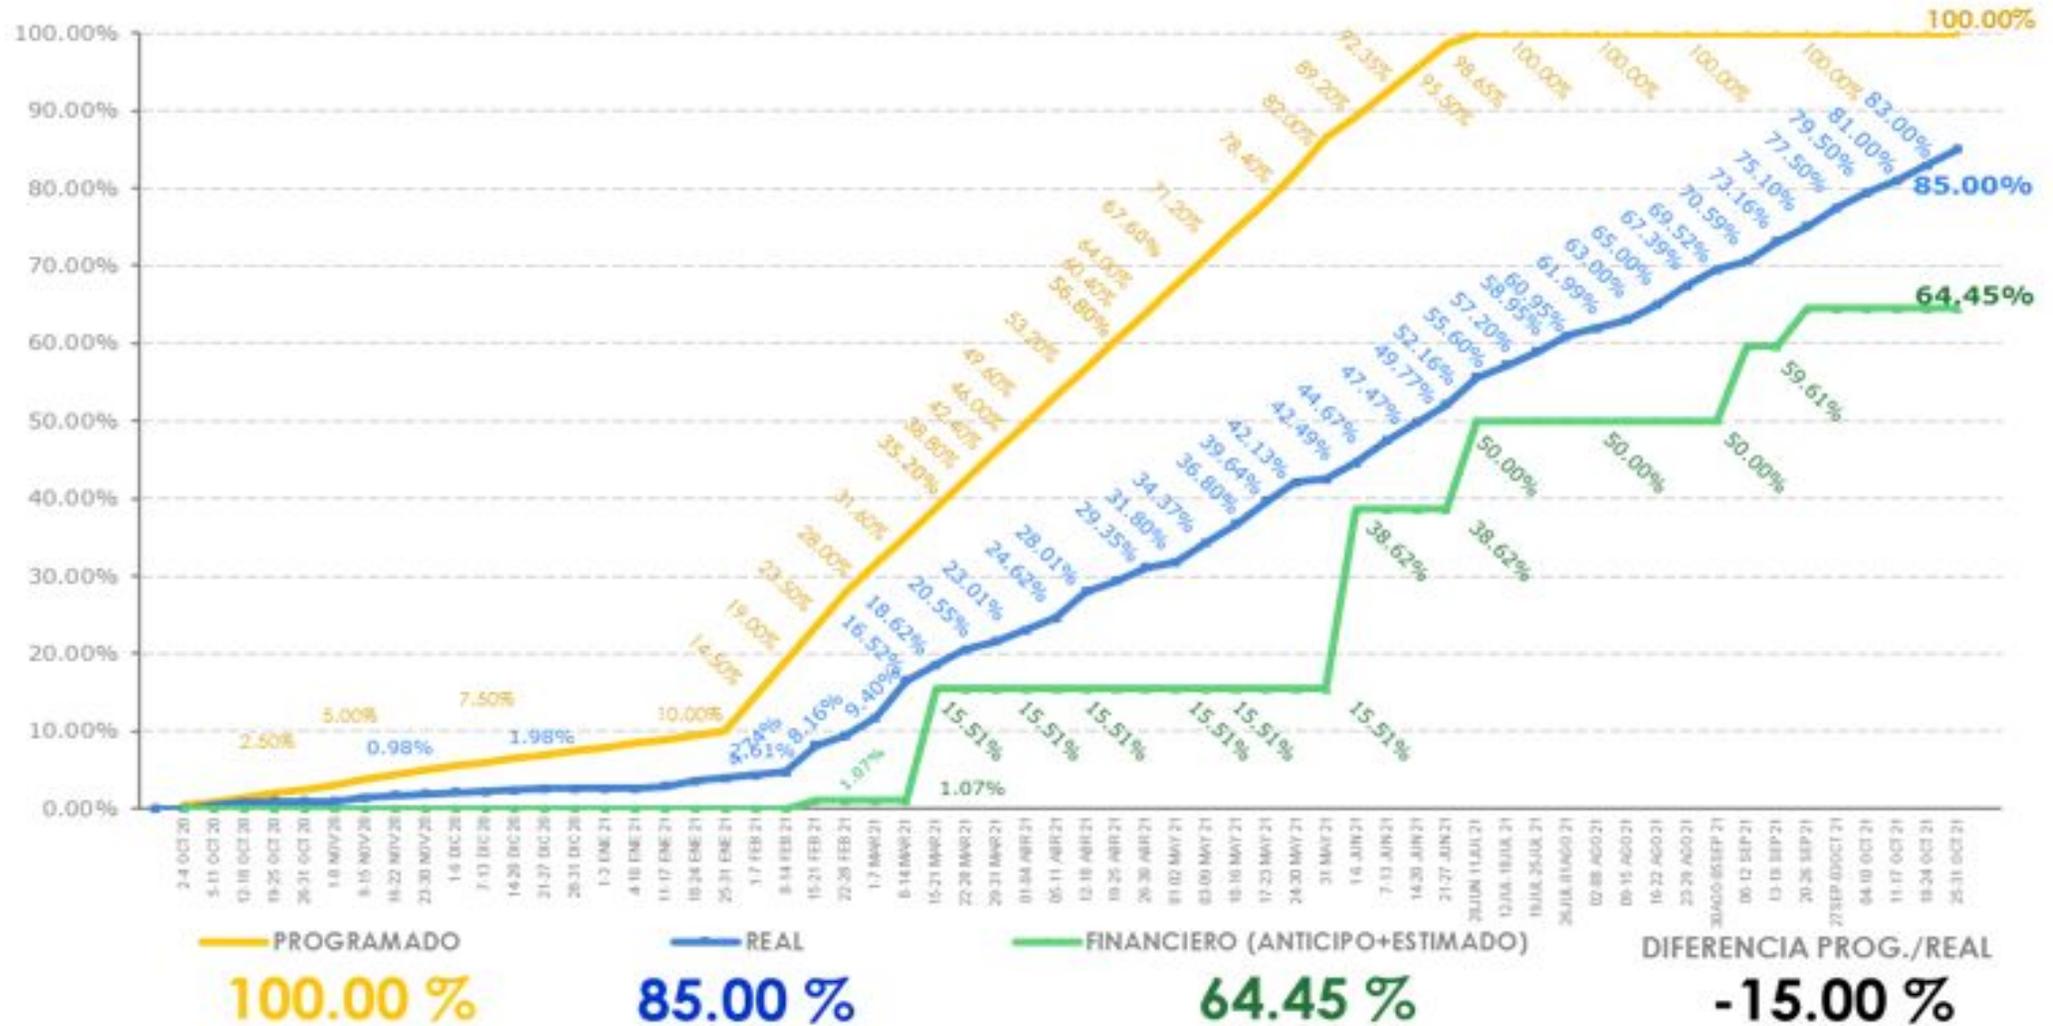

SOS-DGCOP | Reporte fotográfico - Construcción de PILARES “La Pulga”



**ARMADO CON ACERO DE REFUERZO
PARA CIMENTACION Y MUROS
DEL AREAS DE COMERCIO (EJES E-2)**



**COLADO CON CONCRETO PREMEZCLADO
F'C=250KG/CM2 EN MUROS
DEL AREAS DE COMERCIO (EJES B-7)**

SOS-DGCOP | Reporte fotográfico - Construcción de PILARES “La Pulga”



**ELABORACION DE FIJOS METALICOS
PARA TRONERAS T-01 DE 0.30X3.10 M.
(EJES B/1-6 Y C/1-6)**



**COLOCACION DE FIJOS METALICOS
PARA CANCEL C-02 DE LA P.B.-1N (EJE 6/B-C)**

SOS-DGCOP | Reporte fotográfico - Construcción de PILARES “La Pulga”




ELABORACION DE REJA DE HERRERIA H05 PARA PARQUE DE 1.90 M DE ALTURA (EJES 7/A-E)

SOS-DGCOP | Reporte fotográfico - Construcción de PILARES “La Pulga”



ELABORACION DE TRAGALUZ A BASE DE VITROBLOCK 19X19X08 CM. EN AZOTEA (EJES 1-6/B-C)

SOS-DGCOP | Reporte fotográfico - Construcción de PILARES “La Pulga”



COLOCACIÓN DE PISO DE ADOCRETO CIRCULAR NEGRO DE 10 CM. DE ESPESOR Y 10 CM. DE DIÁMETRO EN PLAZA (EJES 6-7/A-D)

SOS-DGCOP | Reporte fotográfico - Construcción de PILARES “La Pulga”



**SUMINISTRO A OBRA DEL ELEVADOR DE PASAJEROS
PARA EL EDIFICIO PRINCIPAL (EJES B-2)
POR PARTE DE LA EMPRESA “SCHINDLER”**



**SEGURISTA “CASCO ROJO”
DANDO SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS
MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE**

SOS-DGCOP | Reporte fotográfico - Construcción de PILARES “La Pulga”



**VISTA INTERIOR
PLANTA BAJA**

SOS-DGCOP | Reporte fotográfico - Construcción de PILARES “La Pulga”



**VISTA INTERIOR
NIVEL PRIMERO**

SOS-DGCOP | Reporte fotográfico - Construcción de PILARES “La Pulga”



VISTA INTERIOR
NIVEL AZOTEA

SOS-DGCOP | Reporte fotográfico - Construcción de PILARES “La Pulga”



VISTA PANORAMICA NORESTE



VISTA PANORAMICA NOROESTE

SOS-DGCOP | Reporte fotográfico - Construcción de PILARES “La Pulga”



VISTA PANORAMICA SURESTE



VISTA PANORAMICA SUROESTE


SOS-DGCOP | Seguimiento de Indicadores

85.00%


avance de obra

enero - octubre

Obra PILARES "La Pulga"



*Está programado el término de la obra para octubre 2021



Secretaría de Obras y Servicios



Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad
Alumbrado Público



Tema	Indicador	Periodicidad	Semana 43 Al 22 de octubre	Semana 44 Al 29 de octubre	Próximo reporte
Alumbrado Público	Número de luminarias reparadas en vías del PA del CH	Semanal	68	119	05 de noviembre
				Total 187	



REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA 43

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Alameda Central	Av. Hidalgo y Av. Juárez	CENTRO	2	cambió de lampara y balastro	Luminaria apagada
	Av. Hidalgo y Av. Juárez	CENTRO	1	cambió de balastro y lámpara	Luminaria apagada
	Dr. Mora y Ángela Peralta	CENTRO	1	Reconexión de líneas en luminaria y cambio de balastro	Luminaria apagada
	Av. Hidalgo y Av. Juárez	CENTRO	20	Instalación y soldadura tapa metálica de registro de 40 x 40	Falta tapa de registro
Av. Juárez	Iturbide y Humboldt	CENTRO	1	Cambió de balastro y lámpara	Luminaria apagada
	Balderas y Azueta	CENTRO	25	Reconexión de líneas	Circuitos apagados
	Dolores y López	CENTRO	1	Reparación de cable dañado y cambio de balastro	Luminaria apagada
		SUBTOTAL	51		

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA 43

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Calle Francisco I Madero	Filomeno Mata y Pasaje America	CENTRO	1	Cambió de balastro y lámpara	Luminaria apagada
Calle Monte de Piedad	5 de Mayo y Francisco I. Madero	CENTRO	1	Reconexión de líneas	Luminario apagada
Calle Plaza de la Constitución	José Ma. Pino Suárez y Moneda	CENTRO	1	Cambió de balastro y lámpara	Luminaria apagada
	Monte de Piedad y 16 de Septiembre	CENTRO	14	Reconexión de líneas	Circuito apagado
		SUBTOTAL	17		
		TOTAL	68		


REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA 44

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Alameda Central	Av. Hidalgo y Av. Juárez	CENTRO	1	Cambio de lámpara	Luminaria apagada
	Av. Hidalgo y Av. Juárez	CENTRO	30	Instalación y soldadura tapa metálica de registro de 40 x 40	Falta tapa de registro
Av. Juarez	Dolores y López	CENTRO	1	Cambio de balastro y lámpara	Luminaria apagada
	Luis Moya y Dolores	CENTRO	1	Cambio de balastro y lámpara	Luminaria apagada
	Luis Moya y Dolores	CENTRO	1	Reconexión de líneas	Luminaria apagada
Avenida José María Izazaga	5 de Febrero e Isabel la Católica	CENTRO	1	Cambio de fotocelda	Luminaria encendida de día
	1er. Cjón Nezahualcóyotl y Simon Bolivar	CENTRO	1	Reconexión líneas	Luminaria apagada
Calle Corregidora	Corregidora y Moneda	CENTRO	12	Restablecimiento de control	Circuito apagado
Calle Filomeno Mata	Fray Pedro de Gante y Eje Central	CENTRO	1	Cambio de lampara y balastro	Luminaria apagada
Calle Francisco I. Madero	Francisco I. Madero y 16 de Septiembre	CENTRO	1	Cierre tapa de luminaria	Tapa de luminaria abierta
		TOTAL	50		

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA 44


DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Calle Francisco I. Madero	Fray Pedro de Gante y Bolívar	CENTRO	20	Restablecimiento de control	Circuito apagado
	Monte de Piedad y Eje Central	CENTRO	23	Cambio balastro y lámpara	Preventivo
Calle Palma	Isabel la Católica y Palma	CENTRO	17	Restablecimiento de control	Circuito apagado
Calle Talavera	República de Uruguay y República	CENTRO	8	Reparación de falso contacto en control	Circuito apagado
José María Pino Suarez	Regina y San Jerónimo	CENTRO	1	Instalación de poste, cableado de caña e instalación de luminaria	Falta Poste
		SUBTOTAL	69		
		TOTAL	119		

ALAMEDA CENTRAL






SE REALIZA CAMBIO DE LÁMPARA Y BALASTRO .

AV. JUÁREZ



SE REALIZA CAMBIO DE LÁMPARA Y BALASTRO .

CALLE PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN



SE REALIZA RECONEXIÓN DE LÍNEAS.

CALLE FRANCISCO I. MADERO



SE REALIZA CAMBIO DE LÁMPARA Y BALASTRO.

ALAMEDA CENTRAL



SE REALIZA COLOCACIÓN DE TAPA EN REGISTRO Y SOLDA.

AV. JUÁREZ




SE CAMBIO BALASTRO / LÁMPARA APAGADA.

FRANCISCO I. MADERO



SE REALIZA CAMBIO DE BALASTRO/LÁMPARA/SOQUET .

FRANCISCO I. MADERO

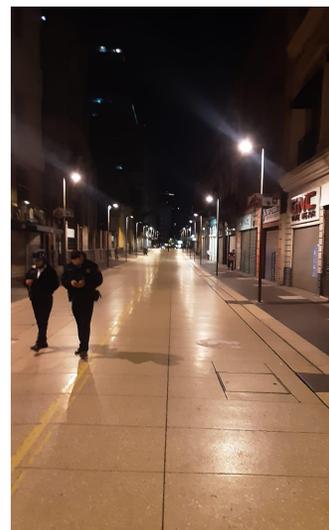

SE RESTABLECE BREAK.

JOSÉ MARÍA PINO SUAREZ




SE INSTALA POSTE, BRAZO Y LUMINARIA.

SOS-DGSUS Alumbrado Público | Seguimiento de indicadores Enero-octubre

7,950

enero - octubre

Reparación a luminarias en CH

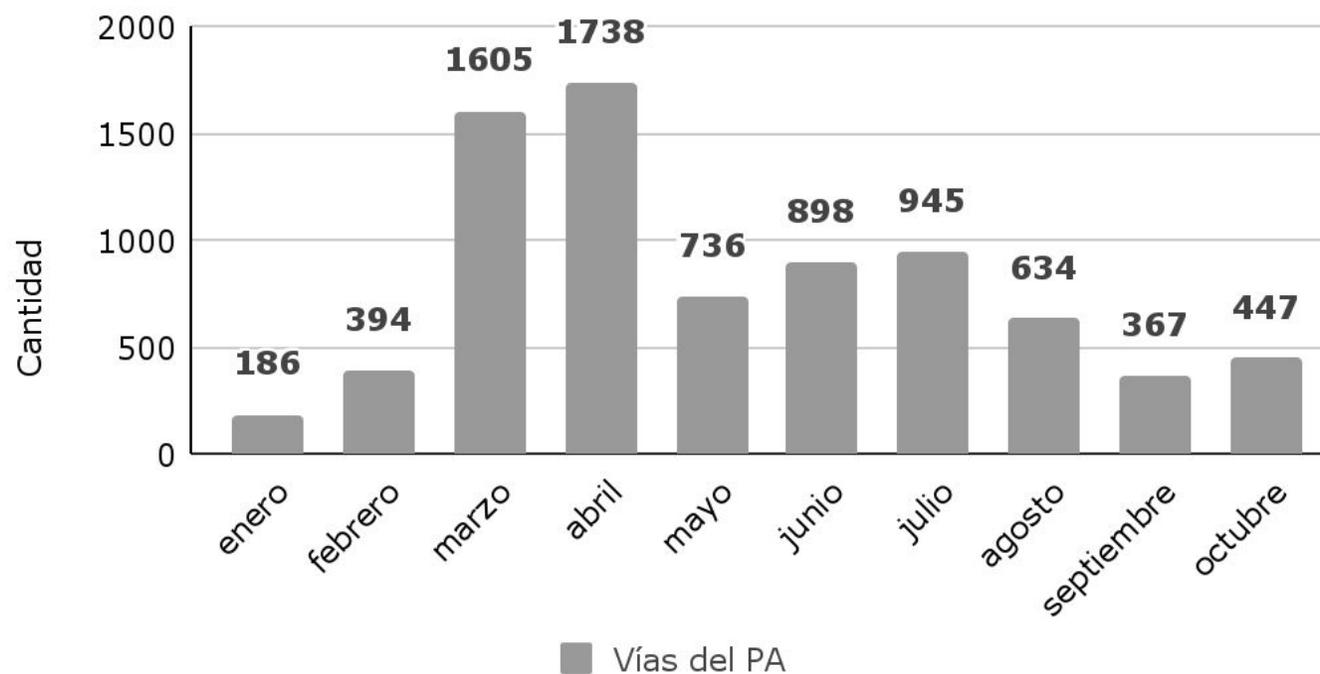




Secretaría de Obras y Servicios



Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad
Subdirección de Parques B



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Indicadores

Tema	Indicador	Periodicidad	04/10 al 17/10	18/10 al 31/10	Próximo reporte
Limpieza	Kilómetros Barridos de guarnición en el perímetro "A" del Centro Histórico	Quincenal	8,618.512 km	8,618.512 Km	16 de Noviembre
Limpieza	Metros cuadrados Barridos de Banquetas en el perímetro "A" del Centro Histórico	Quincenal	16,768,780 m2	16,768,780 m2	
Limpieza	Metros Cuadrados Barridos de Plazas y Corredores en el perímetro "A" del Centro Histórico	Quincenal	8,474,312 m2	8,474,312 m2	

SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Indicadores

Tema	Indicador	Periodicidad	04/10 al 17/10	18/10 al 31/10	Próximo reporte
Limpieza	Kilómetros de Barrido Mecánico en el perímetro "A" del Centro Histórico	Quincenal	1,279.040 km	1,279.040 km	16 de Noviembre
Limpieza	Metros cúbicos de residuos sólidos levantados en tiraderos clandestinos y recolección de residuos producto del barrido en el perímetro "A" del Centro Histórico	Quincenal	7,537 m3	7,423 m3	
Recolección de tierra	Metros cúbicos de tierra recolectada en el perímetro "A" del Centro Histórico	Quincenal	122.25 m3	119.25 m3	

SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Indicadores

Tema	Indicador	Periodicidad	04/10 al 17/10	18/10 al 31/10	Próximo reporte
Lavado de papeleras	Piezas de papeleras lavadas en el perímetro "A" del Centro Histórico	Quincenal	1,120 piezas	1,120 piezas	16 de Noviembre
Lavado	Metros cuadrados lavados en Plazas, Calles, Corredores peatonales y semipeatonales en el perímetro "A" del Centro Histórico	Quincenal	654,271 m2	647,331 m2	
Lavado de sitios críticos	Sitios críticos lavados en el perímetro "A" del Centro Histórico	Quincenal	18 Sitios (255 promedio en la quincena)	18 Sitios (257 promedio en la quincena)	

SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Indicadores

Tema	Indicador	Periodicidad	04/10 al 17/10	18/10 al 31/10	Próximo reporte
Recolección tiraderos clandestinos	Recolección diaria de 25 tiraderos clandestinos en el Perímetro "A" del Centro Histórico	Quincenal	25 Tiraderos (350 promedio en la quincena)	25 Tiraderos (350 promedio en la quincena)	16 de Noviembre
Retiro de chicles	Piezas de Chicles retiradas en el Corredor Madero	Quincenal	3,399 piezas	3,120 piezas	
Eliminación de grafiti	Metros Cuadrados de grafiti eliminado en el Perímetro "A" el Centro Histórico	Quincenal	791 m2	397 m2	

SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Indicadores

Tema	Indicador	Periodicidad	04/10 al 17/10	18/10 al 31/10	Próximo reporte
Retiro de propaganda	Piezas retiradas de propaganda en el Perímetro “A” el Centro Histórico	Quincenal	2,834 piezas	2,459 piezas	16 de Noviembre




SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Indicadores

Tema	Indicador	Periodicidad	04/10 al 17/10	18/10 al 31/10	Próximo reporte
Desratización	Desratización en el Perímetro “A” y “B” del Centro Histórico		Colocación 262 Lanirat Block, 1,488 Racumin pasta, 227 Cereal B, y 5,734 Rodilón Block en una superficie de 133,020 m2	Colocación 3,305 Lanirat pasta, y 3,076 Racumin pasta en una superficie de 133,340 m2	16 de Noviembre

SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Gráficas - Acciones preventivas con el personal por COVID-19

- Toma la temperatura todos los días en los tres turnos.
- Entrega de caretas, cubrebocas y guantes a toda la gente para su protección.

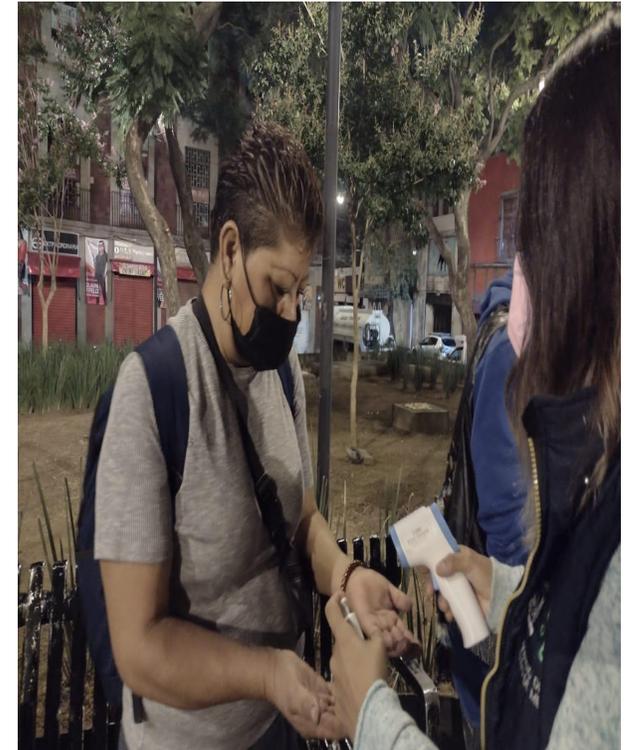



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

ELIMINACIÓN DE GRAFITI



VIALIDAD	Cantidad	U.M.
AV. 5 DE MAYO DE EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS A MONTE DE PIEDAD	54	m2
REPÚBLICA DE URUGUAY DE JESÚS MARÍA A EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	12	m2
TACUBA DE MONTE DE MONTE DE PIEDAD A EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	8	m2
REPÚBLICA DE CHILE DE BELISARIO DOMÍNGUEZ A TACUBA	25	m2
TACUBA DE MONTE DE PIEDAD A EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	19.50	m2
AV. 20 DE NOVIEMBRE DE AV. JOSÉ MARÍA IZAZAGA A PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN	21	m2
DONCELES DE EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS A REPÚBLICA DE BRASIL	26	m2
16 DE SEPTIEMBRE DE 5 DE FEBRERO A EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	32	m2
TACUBA DE MONTE DE PIEDAD A EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	29	m2
PALMA DE BELISARIO DOMÍNGUEZ A VENUSTIANO CARRANZA	11	m2
ISABEL LA CATÓLICA DE AV. JOSÉ MARÍA IZAZAGA A TACUBA	17	m2
CALLEJÓN DE MESONES DE REGINA A MESONES	30	m2
SAN JERÓNIMO DE CORREO MAYOR A EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	33.50	m2
5 DE FEBRERO DE 16 DE SEPTIEMBRE A AV. JOSÉ MARÍA IZAZAGA	12	m2
MESONES DE JESÚS MARÍA A ALDACO	54	m2
CALLEJÓN HÉROES DEL 57 DE DONCELES A BELISARIO DOMÍNGUEZ	13	m2
TOTAL	397	m2

SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

ELIMINACIÓN DE 397 M2 DE GRAFITI VANDÁLICO

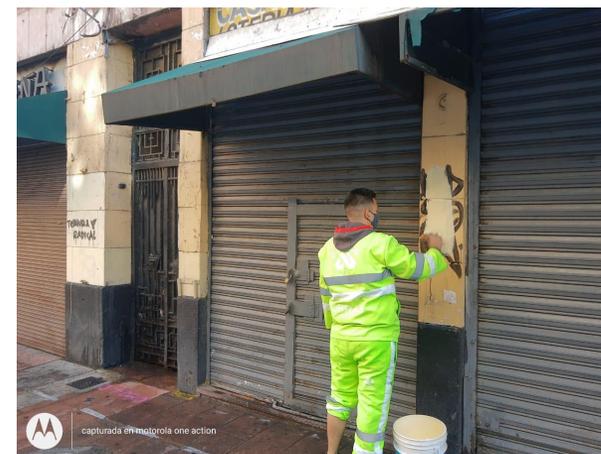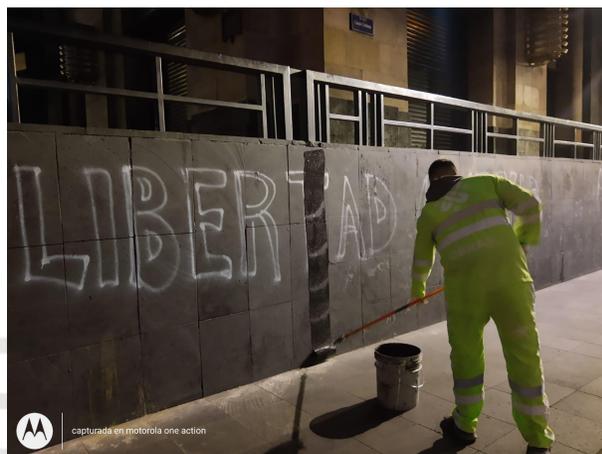

SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

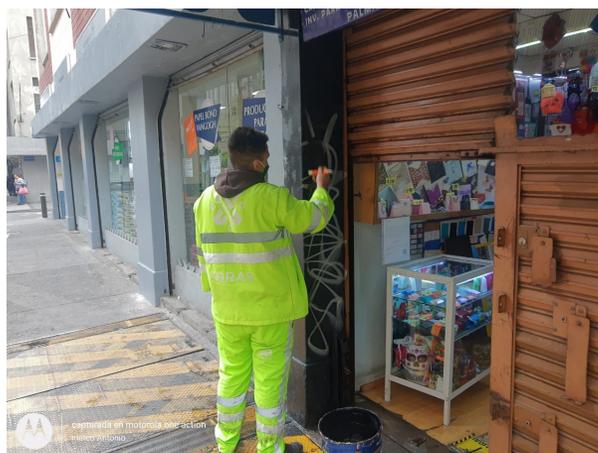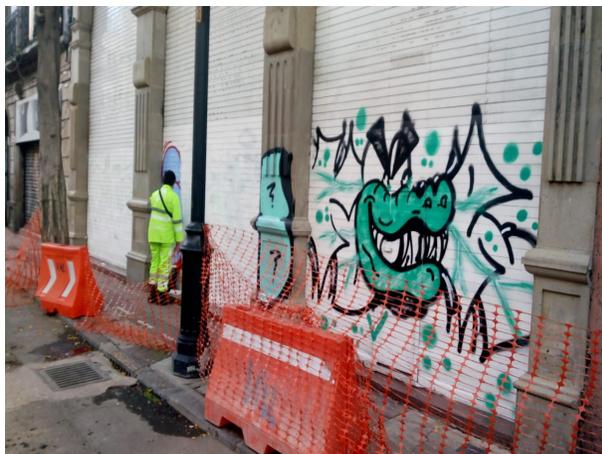

SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores




SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

LIMPIEZA CON MOTIVO DEL TALLER FORO DENOMINADO “LOS DERECHOS DE NUESTRA COTIDIANIDAD” POR PARTE DEL FIDEICOMISO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Gráficas de indicadores

Atención Fauna Nociva

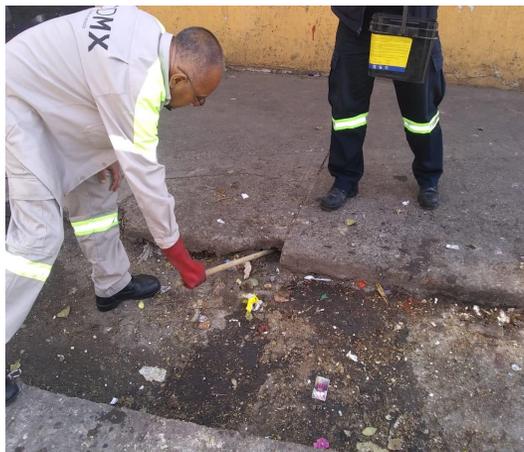

SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Gráficas de indicadores



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

Atención Fauna Nociva

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Vialidad Av. Morelos	B	Congreso de la Unión a Calzada de la Viga, Col. Jamaica, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 105 Racumín pasta en un área de 850 m2.
Vialidad Congreso de la Unión	B	Emiliano Zapata a Herreros de Oriente a Poniente, Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 130 Racumin pasta en un área de 800 m2.
Vialidad Congreso de la Unión	B	De Fray Servando a Sidar y Rovirosa, Col. Merced Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 165 Racumín pasta en un área de 1,200 m2.
Exterior del mercado de Jamaica	B	Congreso de la Unión lado Oriente, Calzada Mixhuca y Melchor Ocampo, Col. Magdalena Mixhuca, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 136 Racumín pasta en un área de 650 m2.
Exterior del metro Moctezuma	B	Calzada Zaragoza y Troncoso, Col. Unidad Kennedy, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 161 Racumín pasta en un área de 260 m2.
Parque Periodistas	B	Fray Servando Teresa de Mier, esquina Congreso de la Unión, Col. Parque, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 113 Racumín pasta en un área de 800 m2.
Vialidad Av. Del Trabajo	B	De Gorostiza a Panaderos, Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 105 Lanirat Block, y 108 Racumín pasta en un área de 680 m2.
Vialidad Congreso de la Unión	B	De Canal del Norte a Aluminio, Col. Felipe Ángeles, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 126 Lanirat Block, y 84 Racumín pasta en un área de 380 m2.
Vialidad Congreso de la Unión	B	De Circunvalación a Eje 2 Norte, Col. Michoacana, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 114 Lanirat Block, y 90 Racumín pasta en un área de 350 m2.
Tiradero Clandestino	B	Congreso de la Unión Herreros a Hortelanos (Tiradero Clandestino), Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 120 Lanirat Block, y 114 Racumín pasta en un área de 100 m2.

SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

Atención Fauna Nociva

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Vialidad Congreso de la Unión	B	Congreso de la Unión esquina Hortelanos (Tiradero Clandestino), Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 135 Lanirat Block, y 75 Racumín pasta en un área de 100 m2.
Canal del Norte	B	De Plomeros a Eje 2 Oriente (Canal del Norte), Col. Michoacana, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 156 Lanirat Block, y 72 Racumín pasta en un área de 1,750 m2.
Canal del Norte	B	De Bonanza a Eje 2 Oriente Congreso de la Unión, Col. Ampliación Michoacana, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 90 Lanirat Block, y 114 Racumín pasta en un área de 350 m2.
Vialidad Congreso de la Unión Camellón	B	De Aluminio a Estaño, Col. Felipe Ángeles, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 75 Lanirat Block, y 81 Racumín pasta en un área de 380 m2.
Vialidad Aluminio	B	De Congreso de la Unión a Pabellón, Col. Felipe Ángeles, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 90 Lanirat Block, y 60 Racumín pasta en un área de 760 m2.
Exterior del Mercado del Rastro	B	Ing. Eduardo Molina Aluminio, Sorpresa y Estaño, Exterior del Mercado el Rastro, Col. Felipe Ángeles, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 105 Lanirat Block, y 54 Racumín pasta en un área de 2,150 m2.
Vialidad Av. Del Trabajo	B	De Panaderos a Mecánicos, Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 114 Lanirat Block, y 96 Racumín pasta en un área de 850 m2.
Tramo	B	Av. Del Trabajo No. 28, Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización y fumigación 80 Racumín pasta en un área de 1,410 m2.
Tiradero Clandestino	B	Plutarco Elías Calles y Congreso de la Unión, Col. Barrio Zapotla, Alcaldía Iztacalco	Desratización y fumigación 145 Racumín pasta en un área de 600 m2.

SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

Atención Fauna Nociva

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Parque S/N	B	Manuel Doblado y Obreros, Col. Morelos, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 135 Lanirat Block, y 95 Racumín pasta en un área de 220 m2.
Eje 2 Norte	B	Esquina Eje Central Lázaro Cárdenas, Col. Peralvillo, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 78 Lanirat Block, y 126 Racumín pasta en un área de 350 m2.
Tiradero Clandestino No. 62	B	Eje 1 Oriente esquina Constancia, Col. Morelos, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 54 Lanirat Block, y 105 Racumín pasta en un área de 100 m2.
Vialidad Eje 1 Oriente	B	Esquina Caridad, Col. Morelos, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 78 Lanirat Block, y 144 Racumín pasta en un área de 250 m2.
Tiradero Clandestino No. 64	B	Eje 1 Oriente Manuel Doblado Tiradero, Col. Morelos, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 51 Lanirat Block, y 90 Racumín pasta en un área de 100 m2.
Vialidad Eje 1 Oriente Circunvalación	B	De Eje 1 Norte a República de Guatemala, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 180 Lanirat Block en un área de 1,600 m2.
Vialidad Eje 1 Oriente Circunvalación	B	De Av. San Pablo a Fray Servando Teresa de Mier, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 162 Lanirat Block en un área de 800 m2.
Eje 1 Oriente Circunvalación	B	De República de Guatemala a San Pablo, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 135 Lanirat Block en un área de 2,200 m2.
Exterior Mercado San Lucas	B	Escuela Médico Militar Callejón del Hormiguero, Callejón San Miguel, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc.	Desratización 90 Lanirat Block en un área de 1,800 m2.

SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

Atención Fauna Nociva

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Parque Área Verde	B	Balderas, Tolsa y Enrico Martínez, Col. Centro Cuauhtémoc.	Desratización 114 Lanirat Block en un área de 800 m2.
Vialidad Plaza de la Ciudadela	B	Av. Balderas, Enrico Martinez y José María Morelos, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc.	Desratización 75 Lanirat Block en un área de 850 m2.
Vialidad Arcos de Belem	B	De Luis Moya a Balderas, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 96 Lanirat Block en un área de 1,500 m2.
Metro Oceanía	B	Rio Consulado y Av. 608, Col. Pensador Mexicano, Alcaldía Gustavo A. Madero	Desratización 138 Lanirat Block en un área de 800 m2.
Plaza de la Soledad	B	Limón, San Simón y Cuadrante de la Soledad, Col. Merced Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza.	Desratización 114 Larinat Block en un área de 560 m2.
Vialidad General Anaya	B	De Eje 1 Oriente a San Ciprian, Col. Merced Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 78 Lanirat Block en un área de 1,200 m2.
Vialidad San Ciprian	B	De General Anaya a Fray Servando Teresa de Mier, Col Merced Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza.	Desratización 105 Lanirat Block en un área de 1,200 m2.
Exterior del Mercado Candelaria	B	Corregidora, Congreso de la Unión, San Ciprian y General Anaya , Col. Merced Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 116 Lanirat Block en un área de 1,140 m2.
Mercado de la Merced	B	Fray Servando Teresa de Mier, Eje 1 Ote. Circunvalación, General Anaya y San Ciprian, Col. Merced Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza.	Desratización 120 Lanirat Block en un área de 8,200 m2.

SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

Atención Fauna Nociva

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Vialidad Eje 1 Oriente Anillo de Circunvalación	B	Eje 1 Norte a San Pablo, Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 156 Lanirat Block en un área de 1,800 m2.
Plaza San Fernando	A	Puente de Alvarado, Av. Paseo de la Reforma Callejón Sombrereros, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 24 Racumin pasta en un área de 2,500 m2.
Vialidad Eje 1 Poniente Rosales	B	De Puente de Alvarado a Av. Paseo de la Reforma, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 54 Racumin pasta en un área de 900 m2.
Vialidad Balderas	B	De Av. Paseo de la Reforma a Av. Juárez, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 81 Racumín pasta en un área de 1,200 m2.
Alameda Central	A	Av. Juárez, Av. Hidalgo, Dr. Mora, Ángela Peralta, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 24 Racumín pasta en un área de 33,000 m2.
Bodega de Limpieza Urbana Av. Juárez No. 20	A	Av. Juárez, Av. Hidalgo, Dr. Mora, Ángela Peralta, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 25 Racumin pasta en un área de 200 m2.
Vialidad San Pablo	A	De Eje 1 Oriente a Av. José María Pino Suárez, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 42 Racumín pasta en un área de 1,800 m2.
Vialidad AV. José María Izazaga	A	De Isabel La Católica a Bolívar, Col, Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 65 Racumín pasta en un área de 1,400 m2.
Eje 1 Norte Mosqueta	A	Eje 1 Poniente Guerrero a Paseo de la Reforma, lado sur norte, Col Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 40 Racumín pasta en un área de 1,400 m2.

SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

Atención Fauna Nociva

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Vialidad Roldan	B	De Fray Servando Teresa de Mier a Puente de Santo Tomás, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 40 Racumín pasta en un área de 1,800 m2.
Plaza de la Constitución	A	Av. 20 de Noviembre, Av. José María Pino Suárez, Av. 5 de Mayo, 16 de Septiembre, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 40 Racumín Pasta en un área de 46,800 m2.
Plaza Teatro Blanquita	B	Eje Central Lázaro Cárdenas, Pensador Mexicano y Mina, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 40 Racumín pasta en un área de 1,800 m2.
Vialidad Eje 1 Oriente Anillo de Circunvalación	B	Fray Servando y Calzada de la Viga, Col. Esperanza, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 55 Racumin pasta en un área de 650 m2.

SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Gráficas de indicadores

LAVADO




SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Gráficas de indicadores

BARRIDO MANUAL



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Gráficas de indicadores

RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

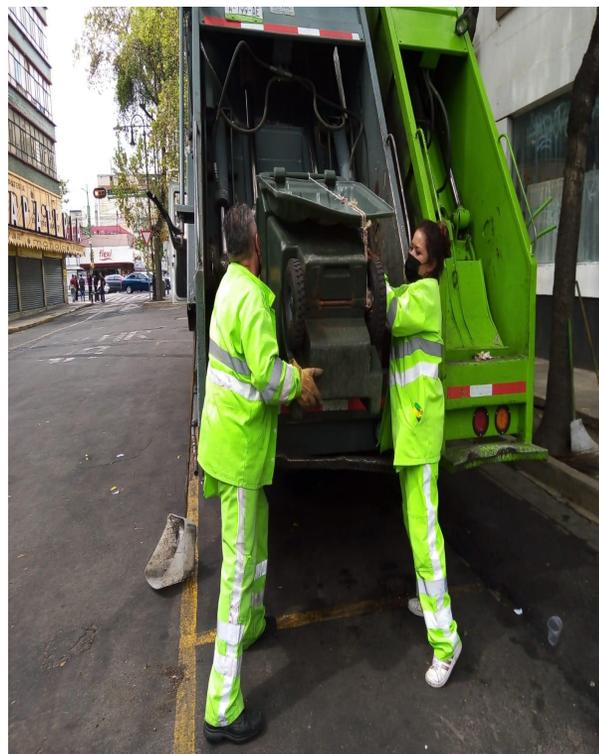

SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Gráficas de indicadores

RECOLECCIÓN DE TIRADEROS CLANDESTINOS



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Gráficas de indicadores

LAVADO DE PAPELERAS





RETIRO DE PROPAGANDA



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Gráficas de indicadores

RETIRO DE CHICLES

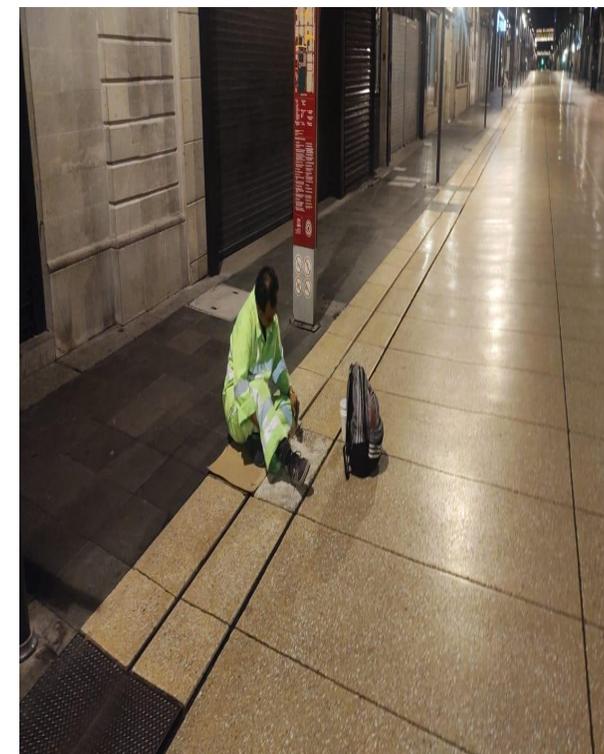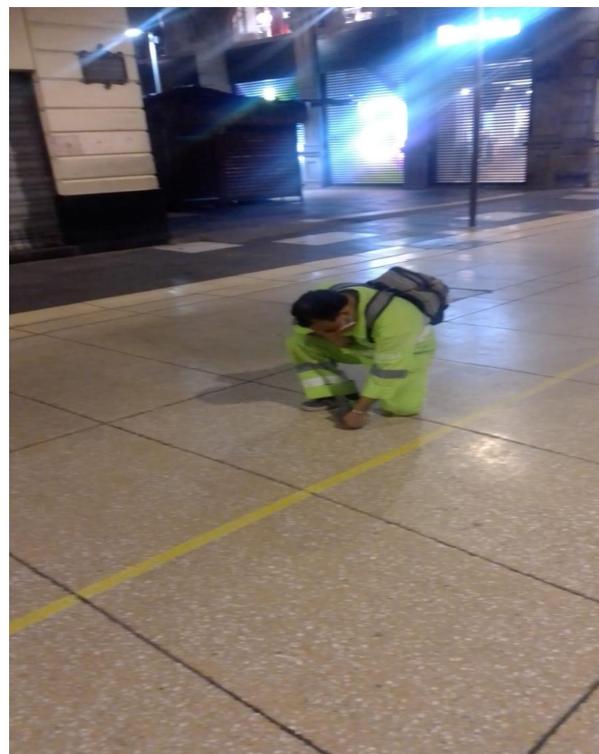

SOS-DGSUS Recolección Zona I | Seguimiento de indicadores Enero - octubre


149,199 m³

enero - octubre


68,980.5 m²

enero - octubre

Recolección en tiraderos clandestinos y barrido en PA

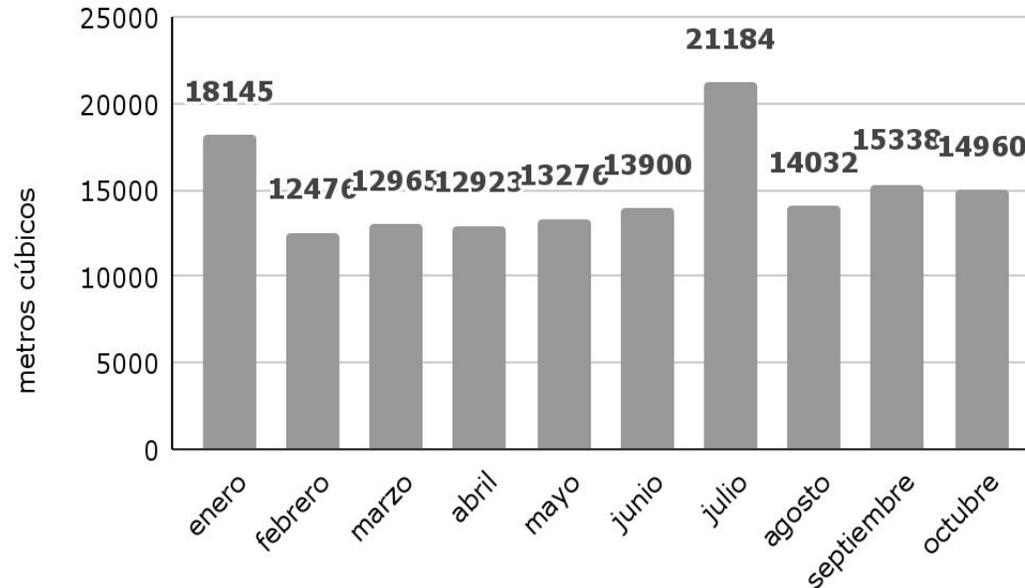

Eliminación de grafiti (m2)

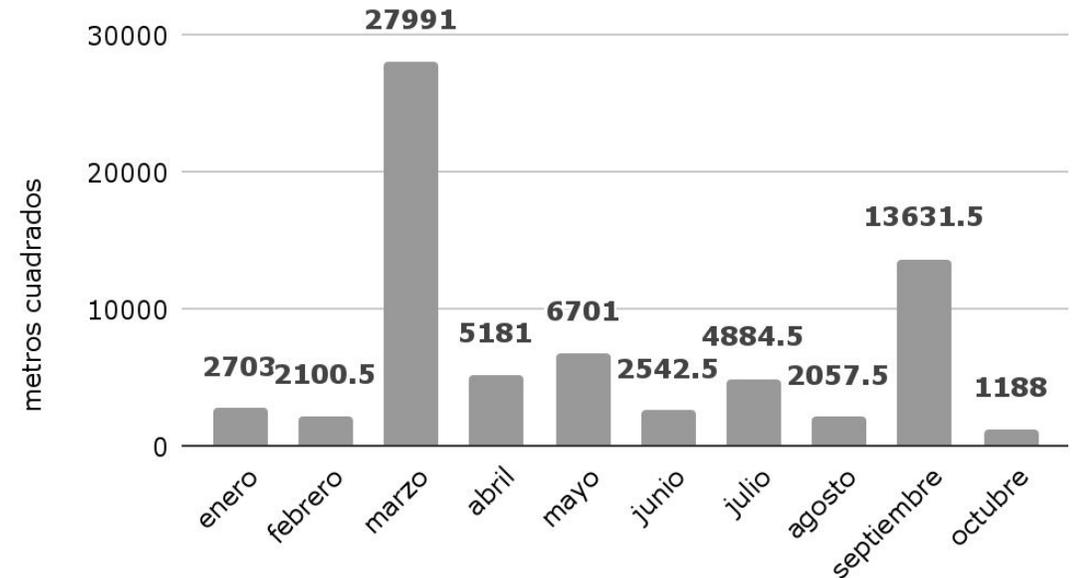


SOS-DGSUS Recolección Zona I | Seguimiento de indicadores

88,369

enero - octubre


Chicles retirados en PA

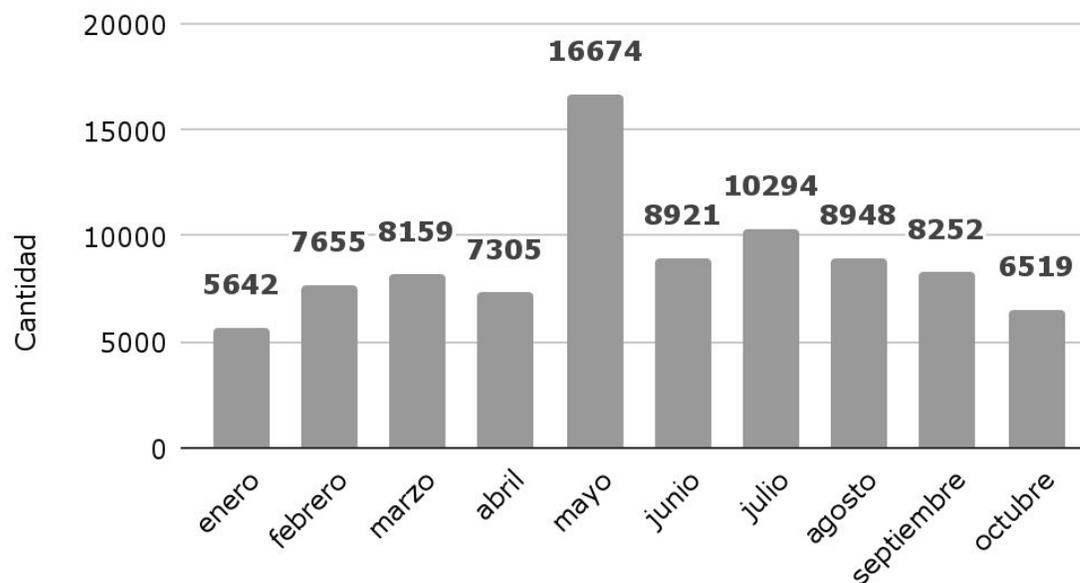

59,612

enero - octubre

Desratización - colocación de cebos en PA y PB

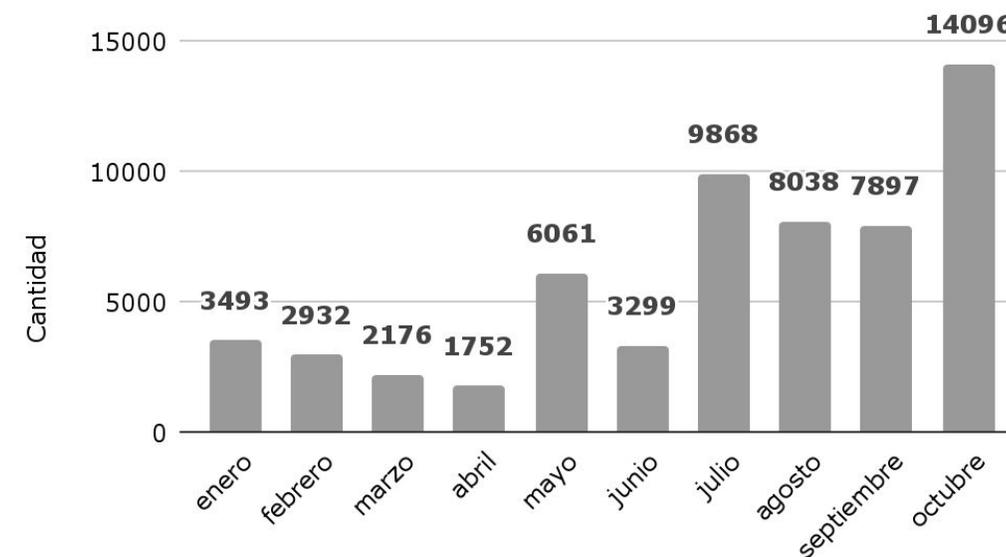


SOS-DGSUS Recolección Zona I | Seguimiento de indicadores

El equivalente a
15,668 km²

enero - octubre


Lavado de Plazas, calles y corredores peatonales y semipeatonales en PA

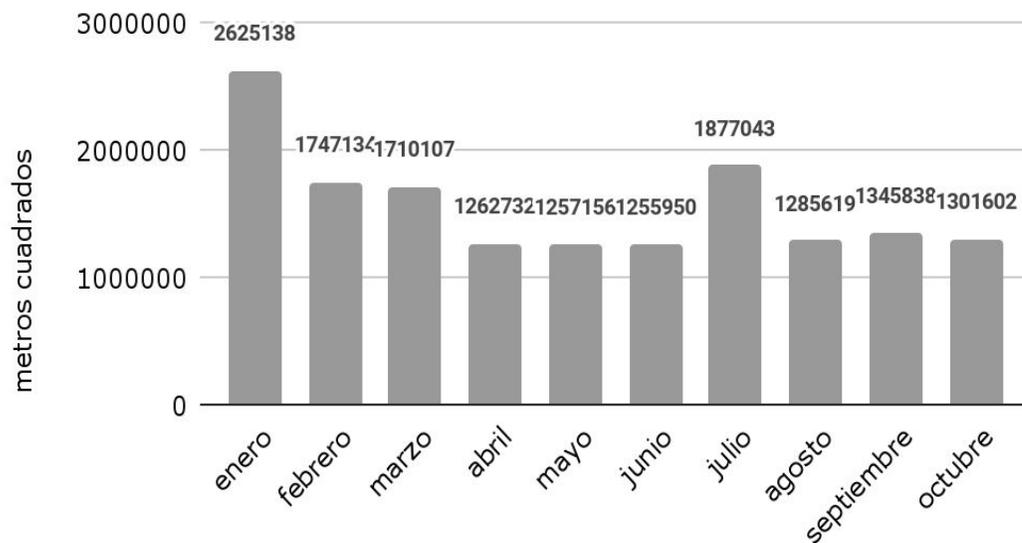


22,369

piezas de propaganda retirada
enero - octubre

Retiro de propaganda

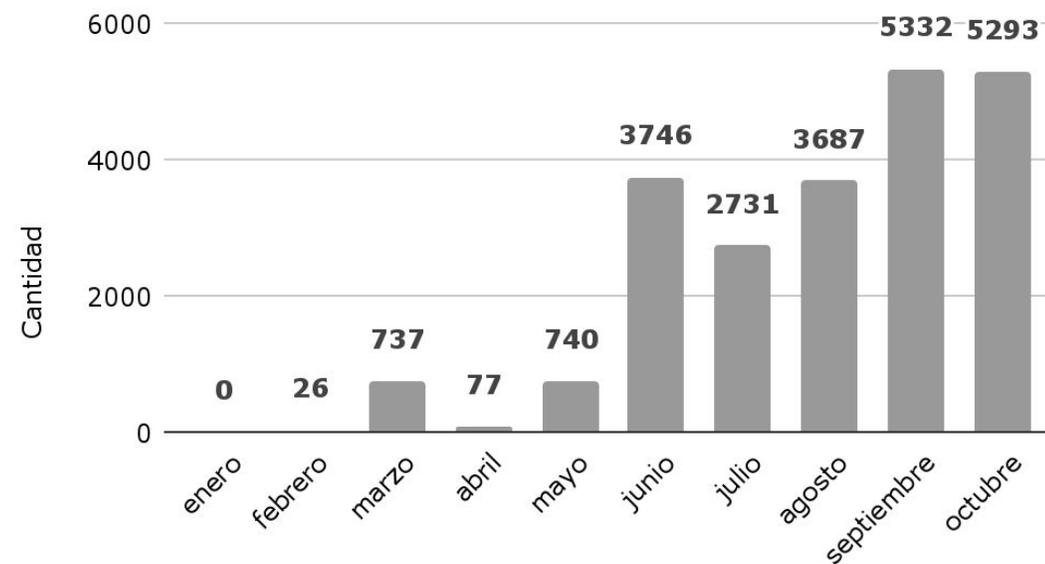

* En junio 2063 piezas fueron de **propaganda electoral**



Sistema de Transporte Colectivo

Metro

STC Metro | Indicadores

Indicador	Periodicidad	al 29/10/2021	Próximo reporte
75 Escaleras eléctricas en las 29 estaciones del Centro Histórico	Quincenal	4 escaleras detenidas (en mantenimiento)	16 de noviembre
19 Elevadores en estaciones del Centro Histórico		2 elevadores detenidos	




STC Metro | Seguimiento de indicadores Enero - octubre

98.66%

de eficiencia en funcionamiento de escaleras eléctricas CH
enero - octubre


Funcionamiento de escaleras instalados en 29 estaciones de metro en Centro Histórico

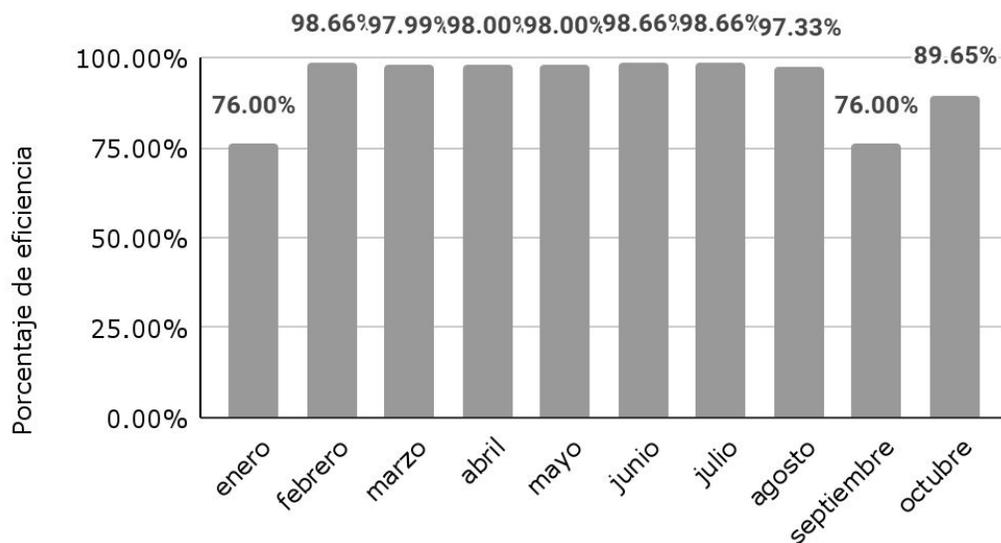

89.47%


de eficiencia en funcionamiento de elevadores CH
enero - octubre

Funcionamiento de elevadores instalados en 29 estaciones de metro en Centro Histórico

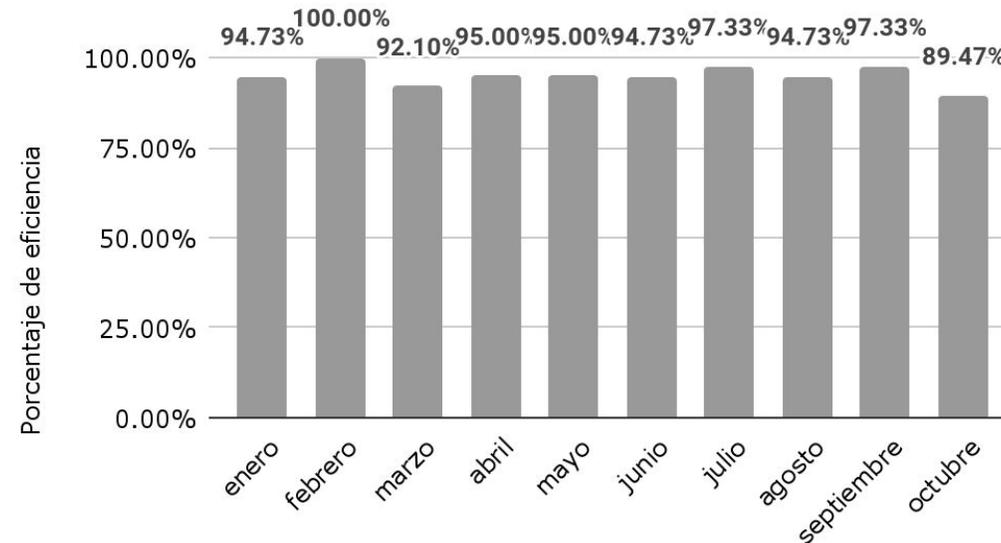



Metrobús



Metrobús | Corredor Centro Histórico Inaugurada el 1 de abril del 2012


| Cuenta con 62 parabuses y 3 terminales.

CONCEPTO	PENDIENTES	REALIZADOS
Rehabilitación de Guarnición y Recinto en para bus.	18 ESTACIONES	71%
Rehabilitación de Estelas informativas.	57 PIEZAS	26 piezas
Suministro de Estelas informativas.	6 PIEZAS	3 pieza
Colocación de Bolardos .	49 PIEZAS	12%
Colocación de Elementos de Confinamiento.	5880 PIEZAS	4555 PIEZAS
Balizamiento general	73,795.15 ml	80%

Metrobús | Para bus al 90% pero que faltan bolardos en cruces peatonales.



Delegación Cuauhtémoc

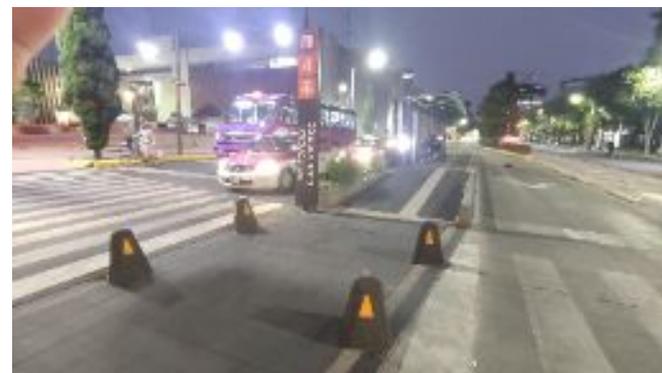

México Tenochtitlán



Metrobús | Para bus al 90% pero que faltan bolardos en cruces peatonales.



Vocacional 5



Juárez

Metrobús | Para bus al 90% pero que faltan bolardos en cruces peatonales.



Morelos



Ferrocarril de Cintura



Metrobús | Para bus al 90% pero que faltan bolardos en cruces peatonales.



Glorieta de Colón



Defensoría Pública antes Expo Reforma



Metrobús | Para bus al 90% pero que faltan bolardos en cruces peatonales.



Eje Central



Plaza de la República



Metrobús | Para bus al 80%.




Museo de San Carlos




Cecilio Robelo



Metrobús | Elementos de Confinamiento.




Metrobús | Balizamiento.



Metrobús | Seguimiento de indicadores

Rehabilitación de Metrobús




55.91%

avance de proyecto*

junio- octubre

*SE INICIARON TRABAJOS EN JUNIO 2021



Comisión Federal de Electricidad

Comisión Federal de Electricidad | Indicadores

Tema	Indicador	Periodicidad	Quincena del 19 de octubre al 2 de noviembre de 2021	Próximo reporte
Mantenimiento a infraestructura	Número de robos registrados de elementos de infraestructura	Quincenal	0	
	Número de bóvedas atendidas con acciones de desagüe	Quincenal	56	
	Número de atenciones a fallas en el suministro de energía eléctrica	Quincenal	9	16 de noviembre 2021
	Número de tapas de registros y/o bóvedas reparadas	Quincenal	1	
	Número de obras de mantenimiento que impliquen rompimiento en vía pública	Quincenal	4	

Comisión Federal de Electricidad | Anexo de indicadores

Anexo 1. Detalle de ubicaciones Número de robos registrados de elementos de infraestructura

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	Anexo
SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO



Comisión Federal de Electricidad | Anexo de indicadores

Anexo 2. Detalle de ubicaciones Número de bóvedas atendidas con acciones de desagüe

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	Anexo	
REPÚBLICA DE ECUADOR	AZTECAS	SAN CAMILITO	SIN DATO	COL. CENTRO	8	INSPECCIÓN DESAGÜE Y LIMPIEZA DE BÓVEDAS
REPÚBLICA DE HONDURAS	AZTECAS	EJE CENTRAL	SIN DATO	COL. CENTRO	12	INSPECCIÓN DESAGÜE Y LIMPIEZA DE BÓVEDAS
REPÚBLICA DE PERÚ	CARMEN	EJE CENTRAL	SIN DATO	COL. CENTRO	11	INSPECCIÓN DESAGÜE Y LIMPIEZA DE BÓVEDAS
BELISARIO DOMÍNGUEZ	EJE CENTRAL	CIRCUNVALACIÓN	SIN DATO	COL. CENTRO	25	INSPECCIÓN DESAGÜE Y LIMPIEZA DE BÓVEDAS
				TOTAL	56	

Comisión Federal de Electricidad | Anexo de indicadores

Anexo 3. Detalle de ubicaciones

Número de atenciones de fallas en el suministro de energía eléctrica

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	Anexo
REP. DE PERÚ 131	REP. DE ARGENTINA	REP. DE BRASIL	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
INCAS 17	REP. DE HONDURAS	REP. DE PERÚ	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
REP. DE VENEZUELA	RODRÍGUEZ PUEBLA	DEL CARMEN	SIN DATO	COL. CENTRO	2	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
ACADEMIA 36	SOLEDAD	CORREGIDORA	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
16 DE SEPTIEMBRE 82	PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN	PALMA	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
REP. DE HONDURAS 73	REP. DE BRASIL	REP. DE CHILE	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
TOPACIO 32	SANTO TOMÁS	CARRETONES	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
PALMA	MADERO	16 DE SEPTIEMBRE	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
				TOTAL	9	

Comisión Federal de Electricidad | Anexo de indicadores

Anexo 4. Detalle de ubicaciones

Número de tapas de registros y/o bóvedas reparadas

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	Anexo
EJE CENTRAL	REP. DE ECUADOR	REP. DE PERÚ	SIN DATO	COL. CENTRO	1	REPARACIÓN DE TAPA EN BÓVEDA
				TOTAL	1	

Comisión Federal de Electricidad | Anexo de indicadores

Anexo 5. Detalle de ubicaciones

Número de obras de mantenimiento que impliquen rompimiento en vía pública


DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	Anexo
REP. DE PERÚ 131	REP. DE ARGENTINA	REP. DE BRASIL	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
INCAS 17	REP. DE HONDURAS	REP. DE PERÚ	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
REP. DE VENEZUELA 72	RODRÍGUEZ PUEBLA	DEL CARMEN	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
REP. DE HONDURAS 73	REP. DE BRASIL	REP. DE CHILE	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
				TOTAL	4	

Comisión Federal de Electricidad | Seguimiento de indicadores

20

Robos de elementos de infraestructura
enero - octubre


Robos registrados de elementos de infraestructura

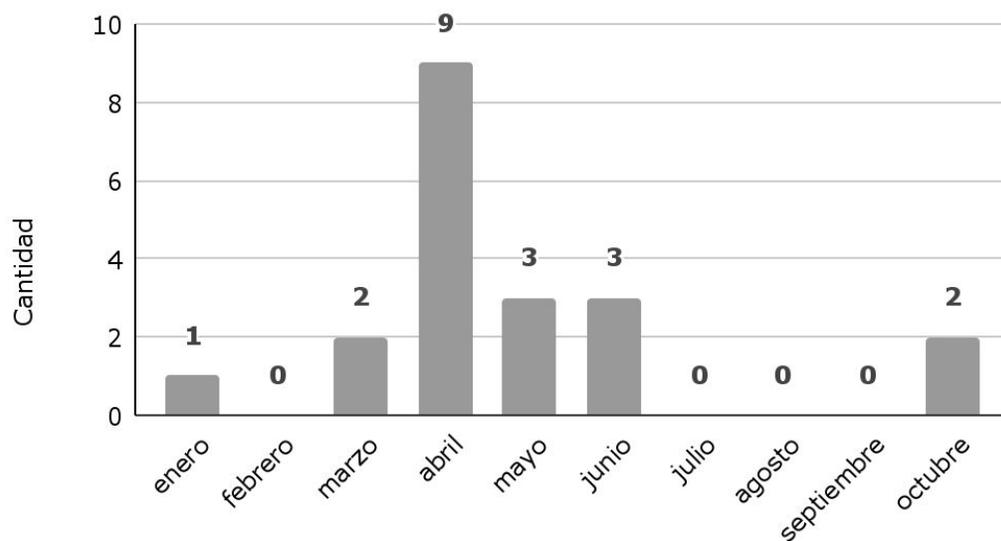

875

bóvedas con acciones de desagüe
enero - octubre

Bóvedas atendidas con acciones de desagüe

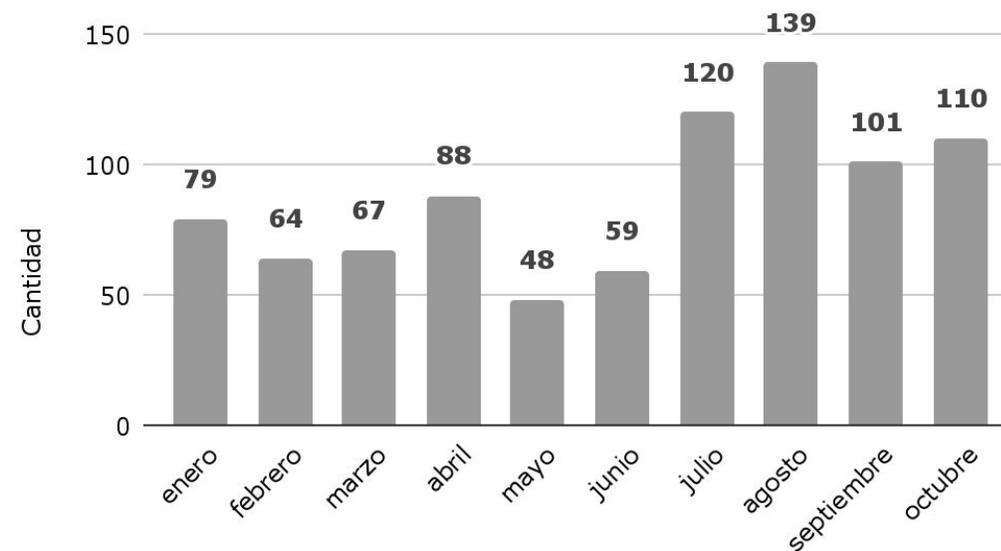


Comisión Federal de Electricidad | Seguimiento de indicadores

179

Atenciones de fallas en suministro de energía eléctrica
enero - octubre


Atenciones de fallas en el suministro de energía eléctrica

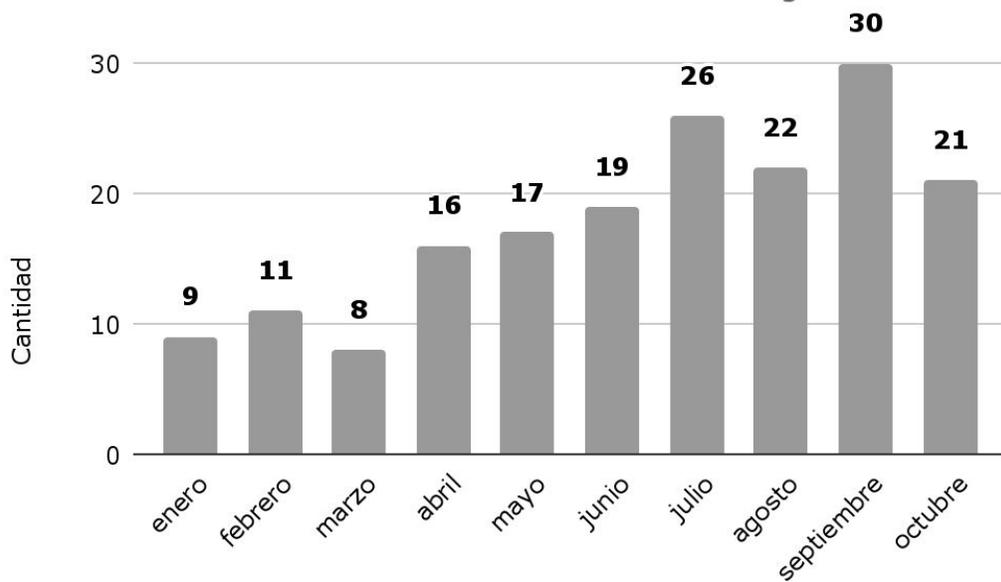

72

tapas de registros y/o bóvedas reparadas
enero - octubre

Tapas de registros y/o bóvedas reparadas

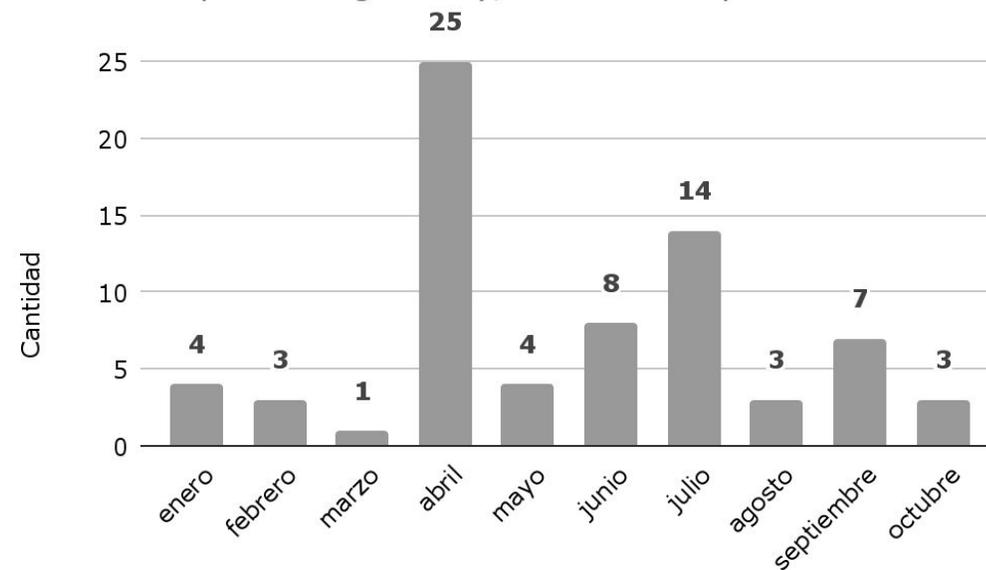


Comisión Federal de Electricidad | Seguimiento de indicadores

167

obras de mantenimiento que implican rompimiento
enero - octubre

Mantenimiento que implique rompimiento en vía pública

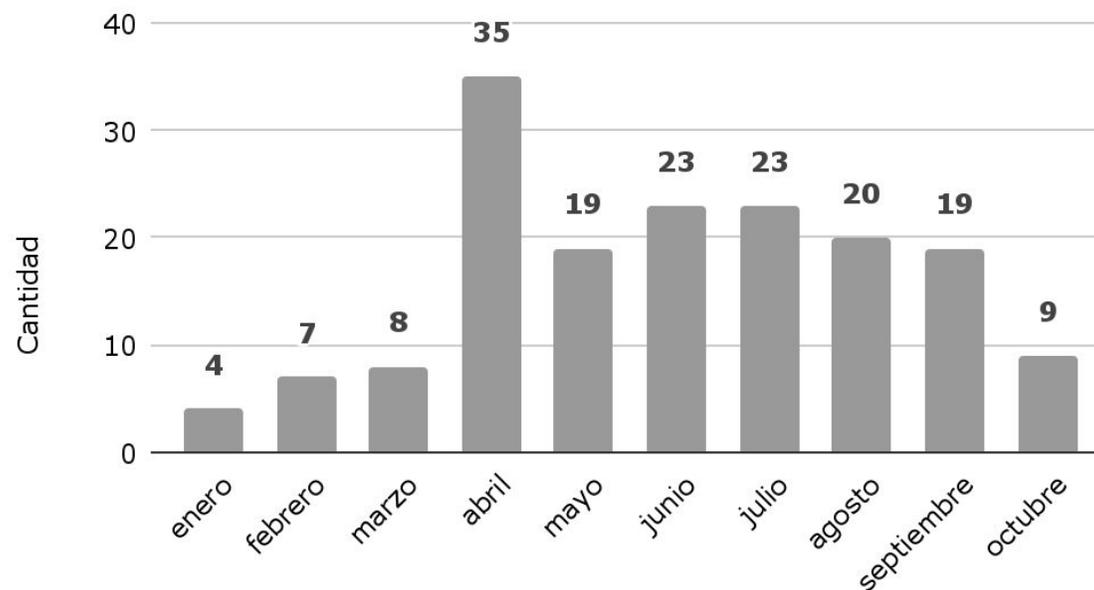



REHABILITACIÓN DE VIVIENDA CON VALOR PATRIMONIAL “CIUDAD DE MÉXICO”

PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN 2020
CONAVI



DESARROLLO TERRITORIAL
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO



CONAVI
COMISIÓN NACIONAL
DE VIVIENDA



CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA




SC/DGSMPC/COLAB/01136/2020 CIUDAD DE MÉXICO SC/DGSMPC/COLAB/01313/2020 PRIMERAS ETAPAS					
NO. ACCIONES	ENTIDAD	MONTO TOTAL	% PROYECTO	INICIO DE OBRA	TERMINO DE OBRA
8	CIUDAD DE MÉXICO	\$ 17,081,265.00	100%	FEBRERO-JUNIO 2021	JULIO-NOVIEMBRE 2021

SC/DGSMPC/COLAB/01136/2020 CIUDAD DE MÉXICO							
NO.	ESTADO	MONTO TOTAL	MONTO PROYECTO	% PROYECTO	MONTO DE OBRA	% AVANCE FÍSICO 30 ABRIL 2021	SUPERVISIÓN
1	MAGNOLIA #162	\$ 4,000,000.00	\$ 239,520.00	100%	\$ 3,604,782.34	85%	\$ 150,199.26
2	MANZANARES # 21	\$ 3,500,000.00	\$ 222,717.04	100%	\$ 3,140,354.36	87%	\$ 127,764.60
3	MINA # 42	\$ 900,000.00	\$ 125,743.41	100%	\$ 741,526.84	100%	\$ 30,896.95
4	MINA # 106	\$ 1,799,865.00	\$ 249,671.77	100%	\$ 1,472,350.11	85%	\$ 61,347.92
5	PENSADOR MEXICANO # 12	\$ 1,881,400.00	\$ 400,350.00	100%	\$ 1,416,529.54	100%	\$ 59,022.06
6	SEMINARIO # 12	\$ 300,000.00	\$ 44,725.08	100%	\$ 243,304.44	100%	\$ 10,137.68
7	SOLEDAD # 45	\$ 4,200,000.00	\$ 373,637.94	100%	\$ 3,643,396.29	99%	\$ 151,808.18
8	REPÚBLICA DE VENEZUELA # 93	\$ 500,000.00	\$ 69,230.22	100%	\$ 408,260.51	100%	\$ 17,010.87
TOTAL CONVENIO		\$ 17,081,265.00					

MAGNOLIA # 162, INICIO DE TRABAJOS 22/02/2021



REINTEGRACIÓN DE ENLADRILLADO DE CUBIERTA



REINTEGRACIÓN DE APLANADOS Y PINTURA DE MUROS



MANZANARES # 21 INICIO DE TRABAJOS 02/02/2021



LIBERACION DE ENTREPISO DE VIVENDA



INTEGRACIÓN DE ENTREPISO REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA



LIMPIEZA DE VIGAS EXISTENTES Y APLICACIÓN DE PRESERVADOR DE MADERA



REINTEGRACIÓN DE APLANADOS Y LIMPIEZA DE CANTERA, LADRILLO Y REJUNTEO



MINA # 106, INICIO DE TRABAJOS EL 12/04/2021



LIBERACIÓN DE APLANADOS EN MUROS



REMAMPOSTEO EN MUROS CAPUCHINOS



REINTEGRACIÓN DE APLANADOS EN MUROS REFORZADOA CON MALLA ELÉCTROSOLDADA



REINTEGRACIÓN DE APLANADOS EN MUROS REFORZADOA CON MALLA ELÉCTROSOLDADA



SOLEDAD # 45

INICIO DE TRABAJOS 02/06/2021



HABILITADO DE APUNTALAMIENTO E INTEGRACIÓN DE CONTRAFUERTE EN PLANTA ALTA




INTEGRACIÓN DE CONTRAFUERTE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO ASENTADOS CON CEMENTO- CAL- ARENA



CONAVI | Seguimiento de indicadores

Rehabilitación de vivienda con valor patrimonial en CH

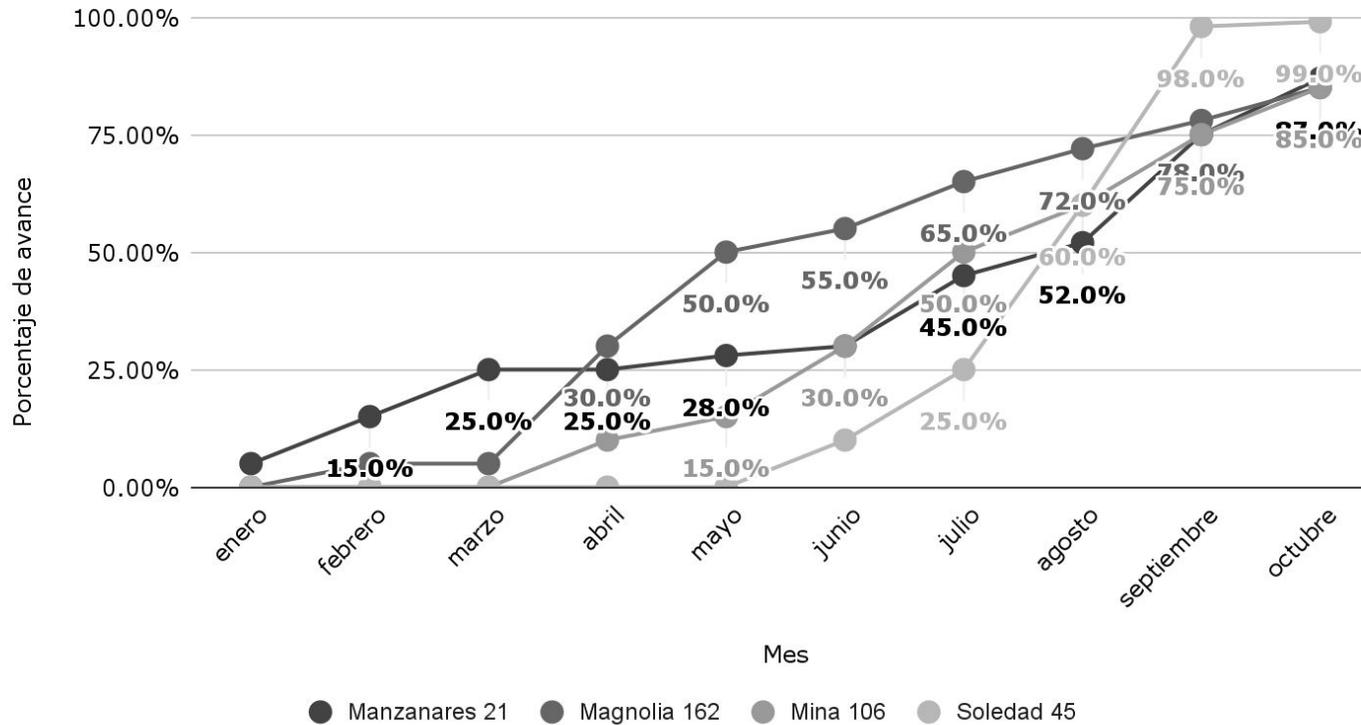

95 %
avance promedio
 enero - octubre

**Programa Nacional de
 Reconstrucción 2020**

04 proyectos concluidos

- Mina no. 42
- Pensador Mexicano no. 12
- Seminario no. 12
- Rep. de Venezuela no. 93

04 proyectos en proceso

Instituto Nacional de Antropología e Historia | Indicadores

Tema	Indicador	Quincena del 19/10 al 01/11	Próximo reporte
Obras	Número de trámites de solicitud de autorización de obra en inmuebles	6	
Programa Ciudad al Aire Libre	Número de trámites de solicitud de autorización de colocación de enseres	1	
Obras	Número de autorizaciones de obras emitidas en inmuebles	11	16 de noviembre
Programa Ciudad al Aire Libre	Número de autorizaciones emitidas para la colocación de enseres	1	

Instituto Nacional de Antropología e Historia | Anexo de indicadores

Solicitudes de autorización de obra

Fecha de Ingreso	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
19/10/2021	BUCARELI	161, 171 Y 181.	CENTRO HISTÓRICO	LA RENOVACION DEL PERMISO PARA EL REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE OBRA MENOR A ALGUNOS ACABADOS DE LAS FACHADAS INTERIORES DE EDIFICIOS HABITACIONALES.	Obra menor
19/10/2021	FLAMENCOS	12 BIS	CUAUHTÉMOC	SOLICITO PRORROGA PARA LA AUTORIZACION 069/20 DE FECHA 26 DE FEBRERO DEL 2020. PARA CONCLUIR TRABAJOS DE APLICACION DE RECUBRIMIENTOS, CAMBIO DE PUERTAS DE MADERA, CAMBIO DE CANCELERIA, APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE Y PINTURA EN GENERAL.	Obra menor
19/10/2021	JUAREZ	52	CUAUHTÉMOC	Mantenimiento en muro bajo color negro y cortina en color blanco debido a vandalismo	Obra menor
25/10/2021	ECHAVESTE	7	CENTRO HISTÓRICO	REPARACIÓN Y COLOCACIÓN DE PISO EN PASILLO, PARA SEGURIDAD DEL INMUEBLE	Obra menor
26/10/2021	PRAGA	12	CUAUHTÉMOC	TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE REJA EN ACCESO	Obra mayor
28/10/2021	JOSÉ MARÍA IZAZAGA	11	CENTRO HISTÓRICO	Solicito a su Dirección la expedición de 2 juegos de copias certificadas de TODAS LAS AUTORIZACIONES, LICENCIAS, PLANOS Y MEMORIAS que han sido otorgadas para el proyecto denominado Barrio Letrán.	Obra menor

Instituto Nacional de Antropología e Historia | Anexo de indicadores

Solicitudes de Colocación de enseres Programa Ciudad al Aire Libre

Fecha de Ingreso	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
20/10/2021	SEMINARIO	12	CUAUHTÉMOC	Instalación de enseres en vía publica	Obra menor

Autorizaciones de obra

AUTORIZACIÓN	DOMICILIO	MOTIVO	TIPO
409/21	JESÚS MARÍA 128	MANTENIMIENTO.	OBRA MENOR
410/21	ARTÍCULO 123 44	MANTENIMIENTO.	OBRA MENOR
412/21	ENRICO MARTÍNEZ 35	RESANES Y PINTURA EN EL DEPARTAMENTO C-002 Y ACCESORIA C-2.	OBRA MENOR

Instituto Nacional de Antropología e Historia | Anexo de indicadores

Autorizaciones de obra

AUTORIZACIÓN	DOMICILIO	MOTIVO	TIPO
414/21	ALDACO 6	MANTENIMIENTO DE FACHADA.	OBRA MENOR
415/21	BOLÍVAR 38	MANTENIMIENTO.	OBRA MENOR
416/21	FRANCISCO I. MADERO 1	LIMPIEZA DE CRISTALES EN PLANTA BAJA Y SEGUNDO PISO DE LA TORRE LATINOAMERICANA.	OBRA MAYOR
417/21	LIC. PRIMO VERDAD 3	RESARCIMIENTO DE DAÑOS POR SISMO DE 2017.	OBRA MENOR
418/21	FRANCISCO I. MADERO 33	REMODELACIÓN Y ADAPTACIÓN DE LOCAL UBICADO EN LA PLANTA BAJA.	OBRA MENOR
PRO-419/21	PALMA 43	PRÓRROGA PARA LA INSTALACIÓN DE UN ELEVADOR.	OBRA MENOR
PRO-422/21	TALAVERA 24	PRÓRROGA PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS Y LOCALES COMERCIALES.	OBRA MAYOR
424/21	20 DE NOVIEMBRE 3	ILUMINACIÓN NAVIDEÑA-PENDIENTE POR FIRMAR.	OBRA MENOR

Autorización de Colocación de enseres


AUTORIZACIÓN	DOMICILIO	MOTIVO	TIPO
413/21	ISABEL LA CATÓLICA 88-4	COLOCACIÓN DE ENSERES.	OBRA MENOR

Instituto Nacional de Antropología e Historia | Seguimiento de indicadores

151

solicitudes de autorización de obra
enero - octubre


Solicitudes de autorización de obra en inmuebles

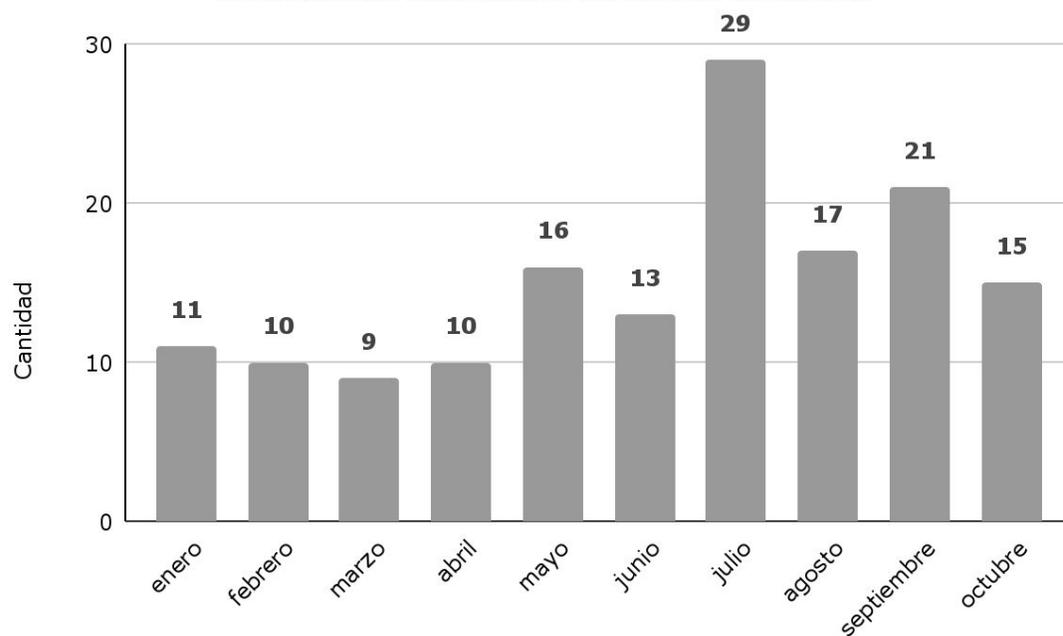

233

autorizaciones de obra
enero - octubre

Autorizaciones de obra para inmuebles

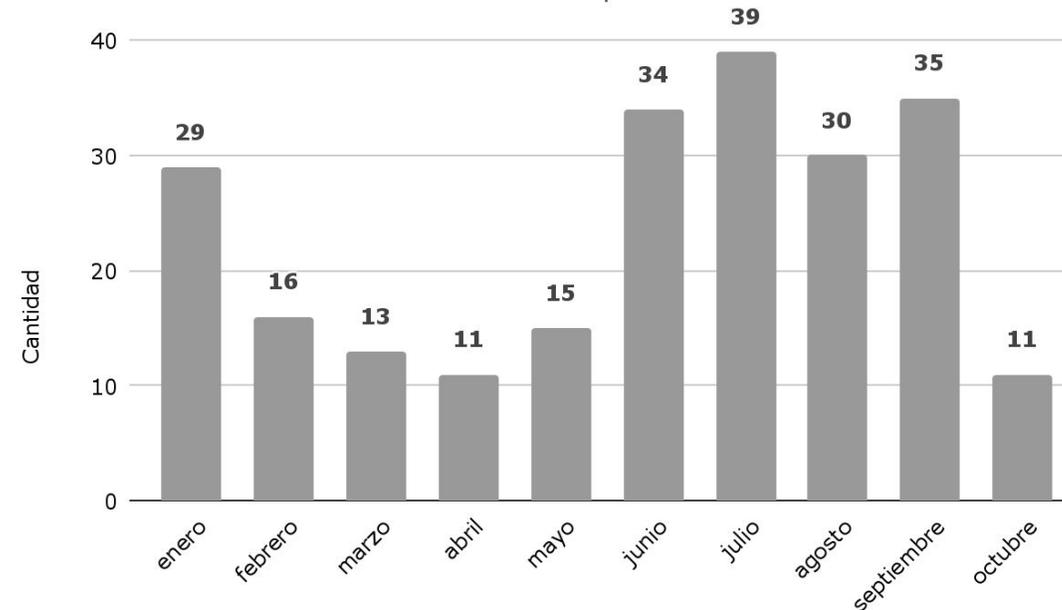


Instituto Nacional de Antropología e Historia | Seguimiento de indicadores

93

Solicitudes de Colocación de enseres en vía pública enero - octubre


Solicitud de colocación de enseres - Programa Ciudad al Aire Libre

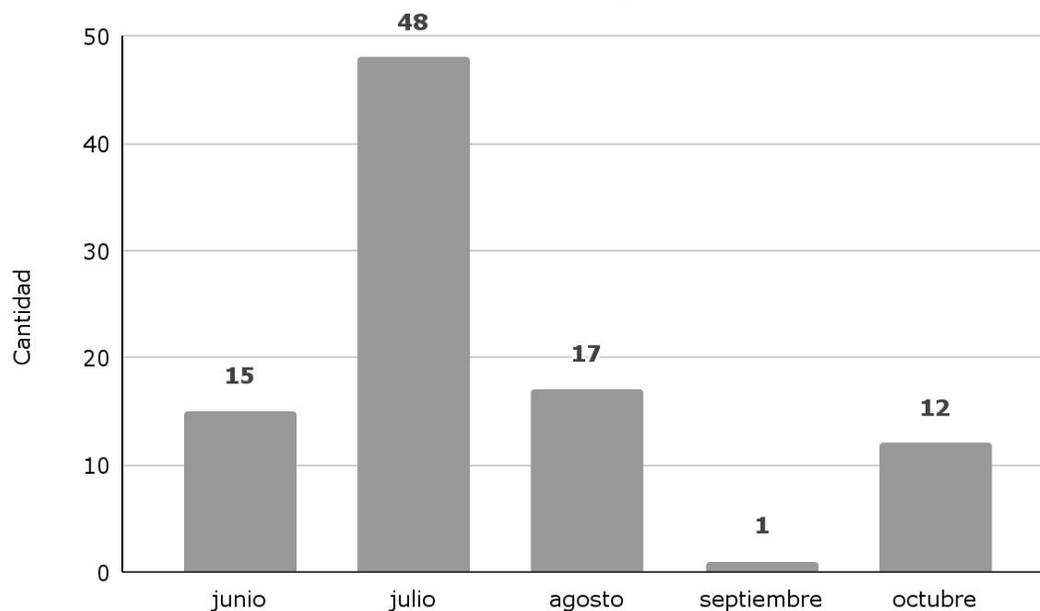


86

Autorizaciones para Colocación de enseres enero - octubre

Autorización de colocación de enseres - Programa Ciudad al Aire Libre

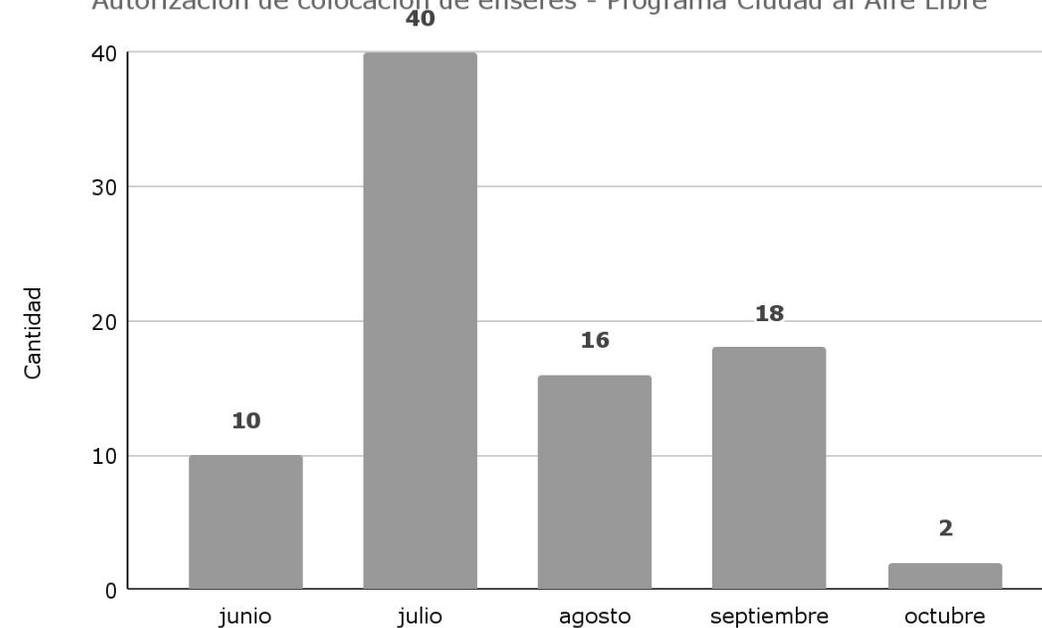



Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura


Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura | Indicadores

Tema	Indicador	Quincena al 30/09	Próximo reporte	Observaciones
Obras	Número de solicitudes de autorización	12	07 de diciembre	<ul style="list-style-type: none"> ● 04 consultas de calidad artística ● 08 solicitudes de obra
Obras	Número de autorizaciones de obra	08	07 de diciembre	<ul style="list-style-type: none"> ● 08 obras menores

Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura | Indicadores

Consultas de Calidad Artística

UBICACIÓN	CATÁLOGO
Palma No. 43	Incluído
República de Argentina 111	No Incluído
Eje Central Lázaro Cárdenas 191	No Incluido
20 de Noviembre 195	No Incluído

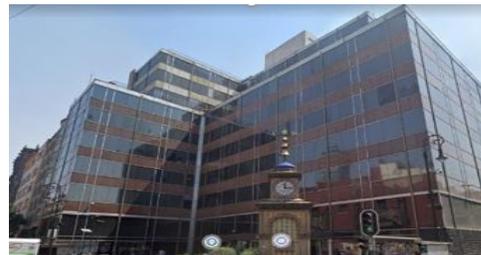

Palma 43



República de Argentina 111



Eje Central Lázaro Cárdenas 191



20 de Noviembre 195



Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura | Indicadores

Autorizaciones de Obra

UBICACIÓN	TIPO DE OBRA	DESCRIPCIÓN
Palma No. 43	Menor	Colocación de elevador y montacargas
Palma Norte No. 413	Menor	Adecuación de local comercial en planta baja
Independencia No. 56	Menor	Reparación de Marquesinas en fachadas
Delicias No. 67	Menor	Mantenimiento de acabados e instalaciones
Dr. José María Vertiz No. 12	Menor	Adecuación de acceso vehicular
Dr. Leopoldo Río de la Loza No. 11	Menor	Adecuación de acceso vehicular
16 de Septiembre No. 73	Menor	Adecuación de local
Isabel La Católica No. 30	Informativo	Mantenimiento de acabados e instalaciones



Palma 43



Palma Norte 413




Independencia 56



Delicias 67



Dr. José María Vertiz 12



Dr. Leopoldo Río de la Loza 11



16 de Septiembre 73




Isabel La Católica 30

Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura | Seguimiento de Indicadores

68

consultas de calidad artística
enero - octubre


Consulta de calidad artística

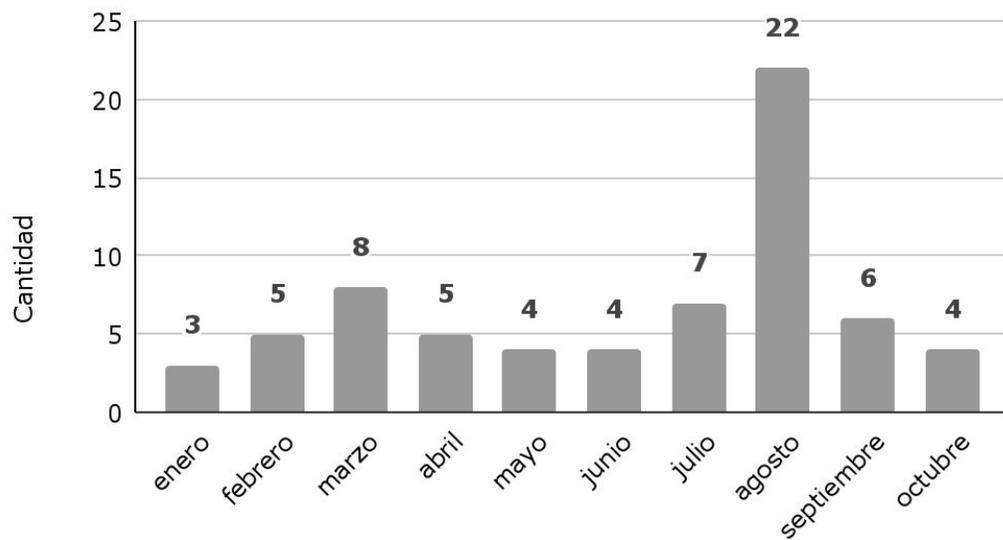

57


obras autorizadas
enero - octubre

Obras autorizadas

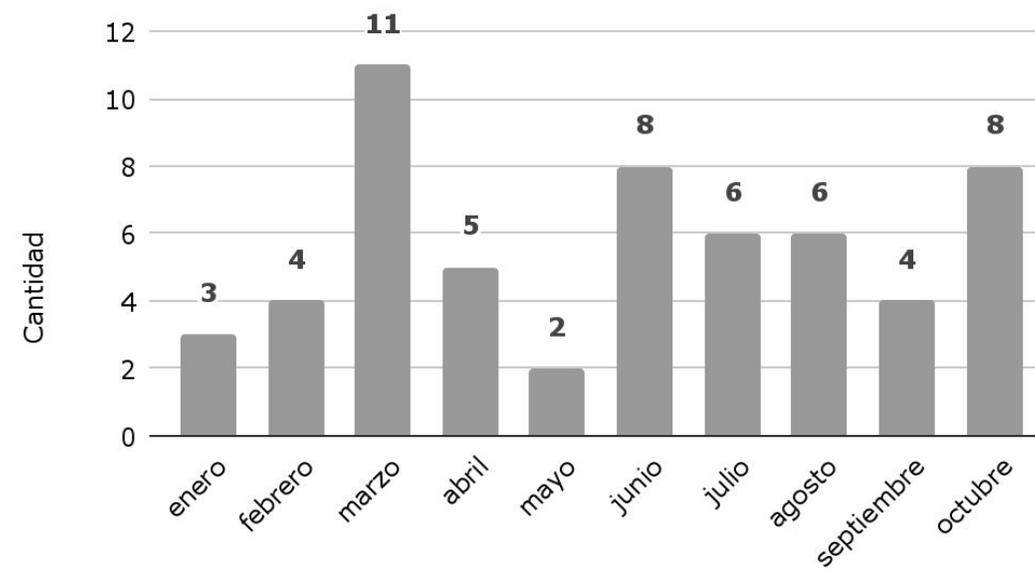



Instituto de Vivienda de la Ciudad de México



INVI | Indicadores


PREDIO	COLONIA	ACCIONES	ESTATUS DE OBRA	PORCENTAJE DE AVANCE
2 DE ABRIL No. 42	GUERRERO	11	OBRA EN PROCESO	80.37%
ACADEMIA No.33	CENTRO	20	OBRA EN PROCESO	86.70%
ARCOS DE BELÉN No. 49	CENTRO	24	OBRA CONCLUIDA	100.00%
EJE 1 PONIENTE GUERRERO No. 164	GUERRERO	58	OBRA EN PROCESO	88.22%
EJE 1 PONIENTE GUERRERO No. 110	BUENAVISTA	37	OBRA CONCLUIDA	100.00%
MAGNOLIA No. 12 (ANTES No. 12 Y 16)	GUERRERO	19	OBRA EN PROCESO	91.43%
REPÚBLICA DE ARGENTINA No. 58	CENTRO	16	POR INICIAR	0.00%
REPÚBLICA DE ARGENTINA No. 87	CENTRO	25	OBRA EN PROCESO	99.80%
REPÚBLICA DE PERÚ No. 40	CENTRO	33	OBRA EN PROCESO	93.61%

INVI | Indicadores

PREDIO	COLONIA	ACCIONES	ESTATUS DE OBRA	PORCENTAJE DE AVANCE
ALLENDE No. 46	CENTRO	32	OBRA CONCLUIDA	100.00%
LERDO No. 12	GUERRERO	53	POR INICIAR	0.00%
PEDRO MORENO No. 154	GUERRERO	18	POR INICIAR	0.00%
TALAVERA No. 24	CENTRO	63	POR INICIAR	0.00%
VIOLETA No. 15	GUERRERO	26	POR INICIAR	0.00%
PEDRO MORENO No. 156	GUERRERO	18	POR INICIAR	0.00%
LECUMBERRI No. 66	ZONA CENTRO	54	OBRA CONCLUIDA	100.00%
BELISARIO DOMINGUEZ No. 78	CENTRO	23	OBRA EN PROCESO	98.14%
NACIONAL No. 57	MORELOS	42	OBRA EN PROCESO	85.48%



INVI | Seguimiento de Indicadores

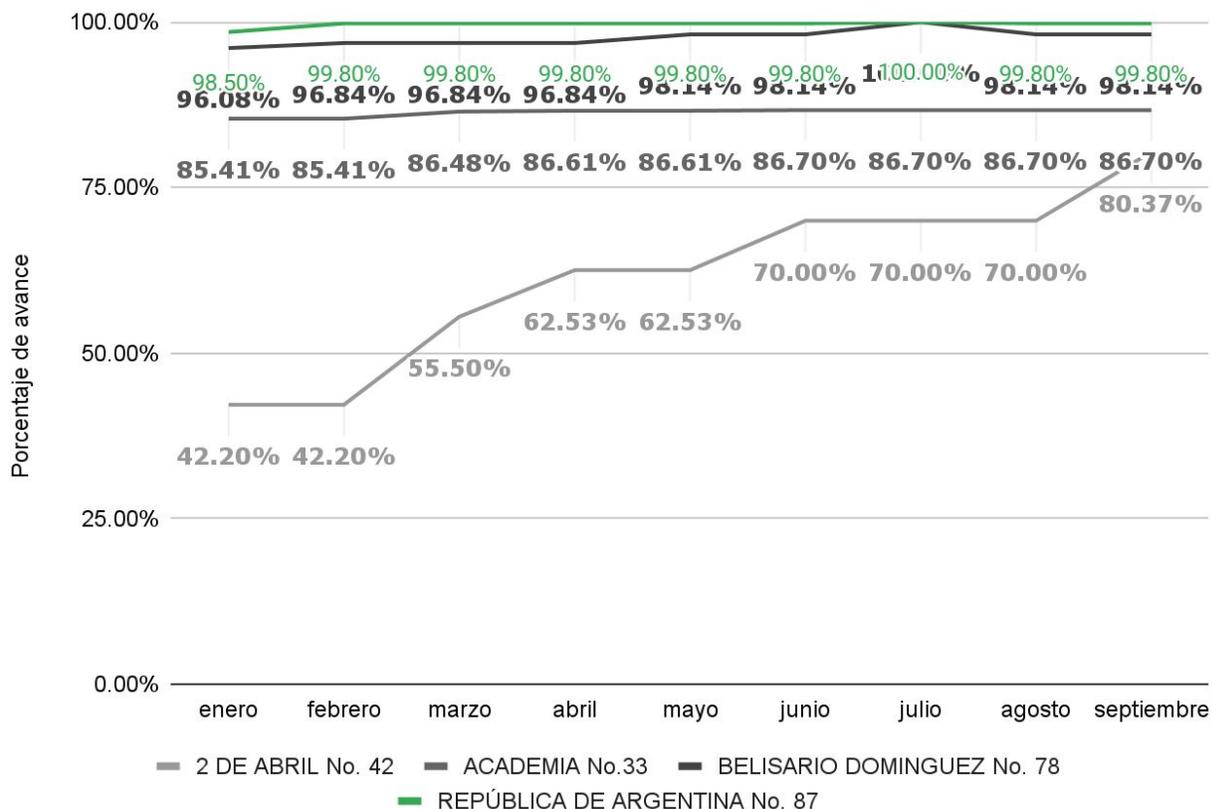

91.77%
avance global
 enero - octubre

04 Obras de vivienda terminadas

- Arcos de Belén No. 49
- Eje 1 Pte. Guerrero No. 110
- Allende No. 46
- Lecumberri No. 66

08 Obras en proceso


06 Obras por iniciar



Procuraduría Social de la Ciudad de México


PROSOC | Indicadores

LISTADO DEFINITIVO DE UNIDADES HABITACIONALES BENEFICIADAS RIPUH 2020

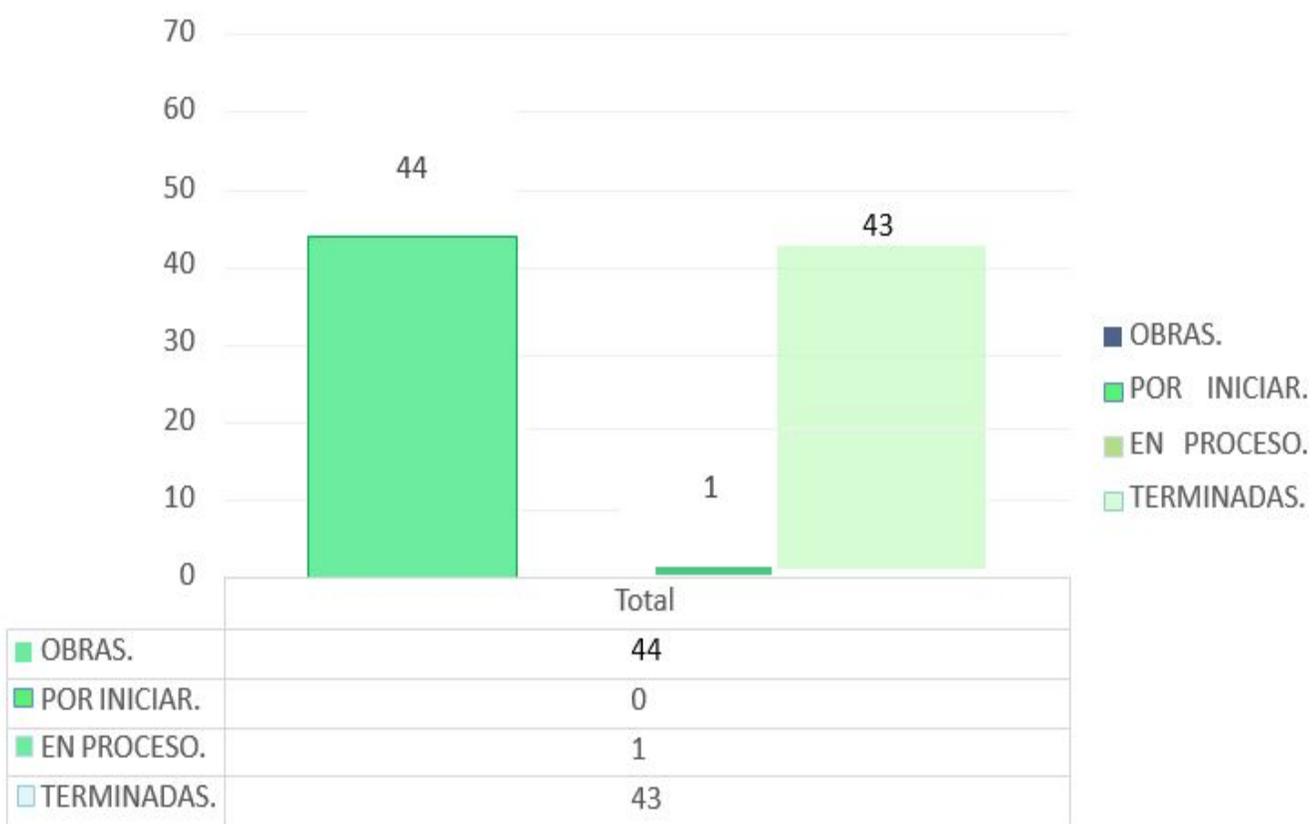


ALCALDÍA	No DE UNIDADES
CUAUHTÉMOC	27
VENUSTIANO CARRANZA	17

PROSOC | Indicadores

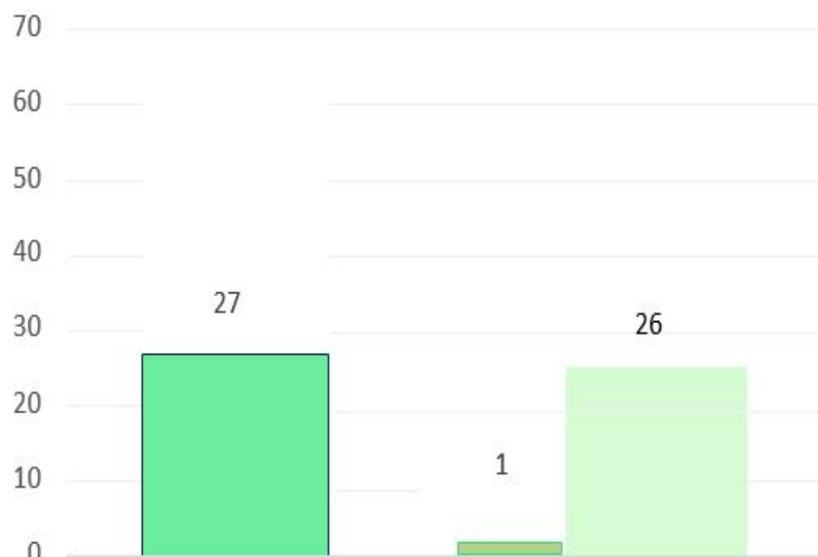

■ OBRAS.
 ■ POR INICIAR.
 ■ EN PROCESO.
 ■ TERMINADAS.

■ OBRAS.	27
■ POR INICIAR.	0
■ EN PROCESO.	1
■ TERMINADAS.	26
Total	

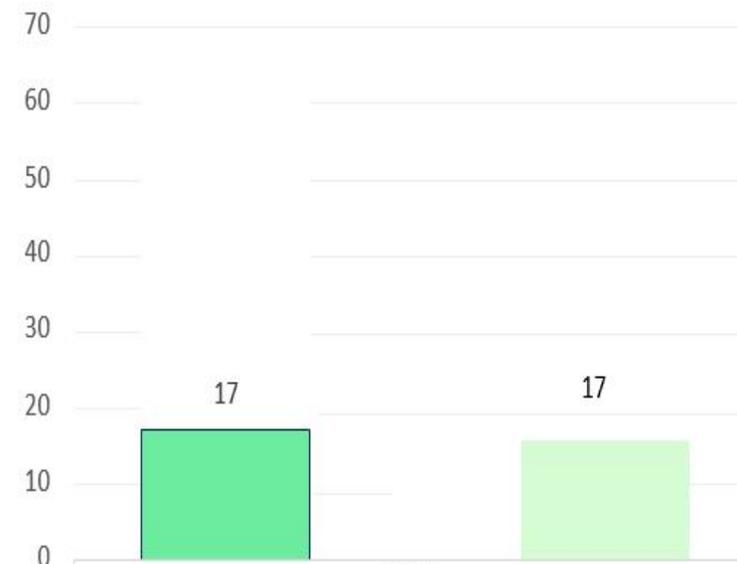

■ OBRAS.
 ■ POR INICIAR.
 ■ EN PROCESO.
 ■ TERMINADAS.

■ OBRAS.	17
■ POR INICIAR.	0
■ EN PROCESO.	0
■ TERMINADAS.	17
Total	



PROSOC | Anexo de indicadores - Alcaldía Cuauhtémoc 2020

NO.	PREDIO	COLONIA	ALCALDIA	PROYECTO	ESTATUS	PORCENTAJE DE AVANCE	PERÍMETRO	CATALOGACIÓN
1	BOLIVAR 158	OBRERA	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
2	DR. JIMENEZ 41	DOCTORES	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
3	CALZADA DE LA VIGA 18	ESPERANZA	CUAUHTEMOC	IMPERMEABILIZACION	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
4	CALZADA DE LA VIGA 16	ESPERANZA	CUAUHTEMOC	IMPERMEABILIZACION	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
5	LIBERTAD 21 C3	MORELOS	CUAUHTEMOC	ESCALERAS	EN PROCESO	65%	B	NO CATALOGADA
6	3ra CERRADA DE LIBERTAD 6	MORELOS	CUAUHTEMOC	ESCALERAS	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
7	VIOLETA 58	GUERRERO	CUAUHTEMOC	HERRERIA (ESCALERAS)	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA

PROSOC | Anexo de indicadores - Alcaldía Cuauhtémoc 2020

NO.	PREDIO	COLONIA	ALCALDIA	PROYECTO	ESTATUS	PORCENTAJE DE AVANCE	PERÍMETRO	CATALOGACIÓN
8	GALEANA 36	GUERRERO	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
9	MAGNOLIA 90	GUERRERO	CUAUHTEMOC	IMPERMEABILIZACION	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
10	JOSE JOAQUIN HERRERA 10-12	CENTRO	CUAUHTEMOC	HERRERIA (ESCALERAS)	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
11	JOSE JOAQUIN HERRERA 28-32	CENTRO	CUAUHTEMOC	ESCALERAS	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
12	FLORIDA 57	CENTRO	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	TERMINADA	100%	A	CATALOGADA
13	CALLEJON MONTERO 7	CENTRO	CUAUHTEMOC	CALLES Y ANDADORES	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
14	MANUEL TOLSA 56	CENTRO	CUAUHTEMOC	ESTRUCTURA	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA

PROSOC | Anexo de indicadores - Alcaldía Cuauhtémoc 2020

NO.	PREDIO	COLONIA	ALCALDIA	PROYECTO	ESTATUS	PORCENTAJE DE AVANCE	PERÍMETRO	CATALOGACIÓN
15	REPUBLICA DE CHILE 49	CENTRO	CUAUHTEMOC	HERRERIA (ESCALERAS)	TERMINADA	100%	A	CATALOGADA
16	BUCARELI 66	CENTRO	CUAUHTEMOC	CUBOS DE AREA COMUN	TERMINADA	100%	B	CATALOGADA
17	SAN IDELFONSO 65	CENTRO	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA SANITARIA	TERMINADA	100%	A	
18	REPUBLICA DE VENEZUELA 77	CENTRO	CUAUHTEMOC	IMPERMEABILIZACION	TERMINADA	100%	A	
19	SAN CAMILITO 25	CENTRO	CUAUHTEMOC	IMPERMEABILIZACION	TERMINADA	100 %	B	NO CATALOGADO
20	MESONES 138	CENTRO	CUAUHTEMOC	IMPERMEABILIZACION	TERMINADA	100%	A	
21	REPUBLICA DE PERU 32	CENTRO	CUAUHTEMOC	IMPERMEABILIZACION	TERMINADA	100%	A	CATALOGADA

PROSOC | Anexo de indicadores - Alcaldía Cuauhtémoc 2020

NO.	PREDIO	COLONIA	ALCALDIA	PROYECTO	ESTATUS	PORCENTAJE DE AVANCE	PERÍMETRO	CATALOGACIÓN
22	EJE CENTRAL LAZARO CARDENAS 17	CENTRO	CUAUHTEMOC	IMPERMEABILIZACION	TERMINADA	100%	A	NO CATALOGADA
23	NEZAHUALCOYOTL 136	CENTRO	CUAUHTEMOC	IMPERMEABILIZACION	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
24	JOSE JOAQUIN HERRERA 6	CENTRO	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
25	REPUBLICA DE CHILE 47	CENTRO	CUAUHTEMOC	ESCALERAS	TERMINADA	100%	A	NO CATALOGADA
26	REPUBLICA DE PARAGUAY 62	CENTRO	CUAUHTEMOC	IMPERMEABILIZACION	TERMINADA	100%	A	NO CATALOGADA
27	JOSE JOAQUIN HERRERA 17	CENTRO	CUAUHTEMOC	IMPERMEABILIZACION	TERMINADA	100%	A	NO CATALOGADA

PROSOC | Anexo de indicadores - Alcaldía Venustiano Carranza 2020

NO.	PREDIO	COLONIA	ALCALDIA	PROYECTO	ESTATUS	PORCENTAJE DE AVANCE	PERÍMETRO	CATALOGACIÓN
1	ROSARIO 32	CENTRO	VENUSTIANO CARRANZA	HERRERIA (ESCALERAS)	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
2	CORREGIDORA 148	CENTRO	VENUSTIANO CARRANZA	ESCALERAS	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
3	CORREGIDORA 140	CENTRO	VENUSTIANO CARRANZA	HERRERIA (ESCALERAS)	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
4	ANILLO DE CIRCUNVALACION 40	CENTRO	VENUSTIANO CARRANZA	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA, ALBAÑILERIA, IMPERMEABILIZACION Y PINTURA	PROCESO	100%	B	NO CATALOGADA
5	CANDELARIA DE LOS PATOS MANZANA 4	CENTRO	VENUSTIANO CARRANZA	CALLES Y ANDADORES	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
6	JOAQUIN HERRERA 64	CENTRO	VENUSTIANO CARRANZA	ESCALERAS	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA

PROSOC | Anexo de indicadores - Alcaldía Venustiano Carranza 2020


NO.	PREDIO	COLONIA	ALCALDIA	PROYECTO	ESTATUS	PORCENTAJE DE AVANCE	PERÍMETRO	CATALOGACIÓN
7	ANILLO DE CIRCUNVACION 20	CENTRO	VENUSTIANO CARRANZA	ESTRUCTURAS	PROCESO	100%	A	NO CATALOGADA
8	LECUMBERRI 59	CENTRO	VENUSTANO CARRANZA	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	TERMINADA	100%	A	NO CATALOGADA
9	UNIDAD HABITACIONAL CANDELARIA DE LOS PATOS MANZANA I	MORELOS	VENUSTANO CARRANZA	HERRERIA	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
10	UNIDAD HABITACIONAL CANDELARIA DE LOS PATOS MANZANA II	MORELOS	VENUSTIANO CARRANZA	INFRAESTRUCTURA SANITARIA	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
.11	UNIDAD HABITACIONAL CANDELARIA DE LOS PATOS MANZANA III	MORELOS	VENUSTIANO CARRANZA	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
12	CIRCUNVALACION 48	MORELOS	VENUSTIANO CARRANZA	PINTURA	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA

PROSOC | Anexo de indicadores - Alcaldía Venustiano Carranza 2020

NO.	PREDIO	COLONIA	ALCALDIA	PROYECTO	ESTATUS	PORCENTAJE DE AVANCE	PERÍMETRO	CATALOGACIÓN
13	4TA LECUMBERRI 60	MORELOS	VENUSTIANO CARRANZA	INFRAESTRUCTURA SANITARIA	PROCESO	100%	B	NO CATALOGADA
14	NACIONAL 44	MORELOS	VENUSTIANO CARRANZA	ESTRUCTURAS	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
15	NACIONAL 32	MORELOS	VENUSTIANO CARRANZA	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA (TINACOS)	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
16	NACIONAL 52	MORELOS	VENUSTIANO CARRANZA	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
17	VANEGAS ARROYO 30	MERCED	VENUSTIANO CARRANZA	IMPERMEABILIZACION	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA

PROSOC | Indicadores

LISTADO DE UNIDADES HABITACIONALES SELECCIONADAS RIPUH 2021

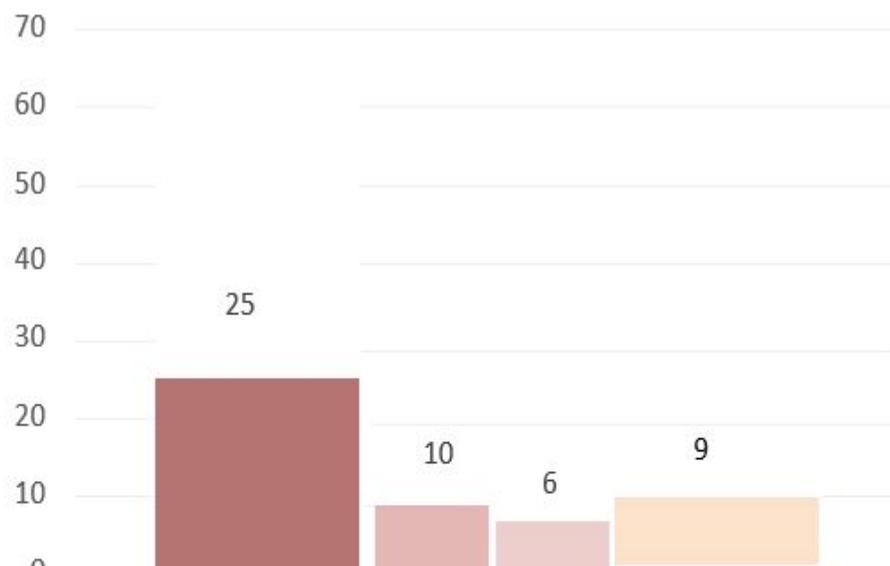

	Total
OBRAS.	25
POR INICIAR.	10
EN PROCESO.	6
TERMINADAS.	9

ALCALDÍA	No DE UNIDADES
CUAUHTÉMOC	18
VENUSTIANO CARRANZA	7

PROSOC | Anexo de indicadores - Alcaldía Cuauhtémoc 2021

NO.	PREDIO	COLONIA	ALCALDIA	PROYECTO	ESTATUS	PORCENTAJE DE AVANCE	PERÍMETRO	CATALOGACIÓN
1	LUIS MOYA 115	CENTRO	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	TERMINADA	100%	A	NO CATALOGADA
2	REPUBLICA DE VENEZUELA 77	CENTRO	CUAUHTEMOC	IMPERMEABILIZACION	PROCESO	80%	A	NO CATALOGADA
3	JOSE JOAQUIN HERRERA 6	CENTRO	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	POR INICIAR	0%	A	NO CATALOGADA
4	MARQUEZ STERLING 2	CENTRO	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	PROCESO	60%	A	NO CATALOGADA
5	FRAY SERVANDO TERESA DE MIER 142	CENTRO	CUAUHTEMOC	ESCALERAS	TERMINADA	100%	A	NO CATALOGADA
6	BELIZARIO DOMINGUEZ 17	CENTRO	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	PROCESO	20%	A	NO CATALOGADA
7	MARIANA DEL TORO 19	CENTRO	CUAUHTEMOC	CALLES Y ANDADORES	POR INICIAR	0%	A	NO CATALOGADA

PROSOC | Anexo de indicadores - Alcaldía Cuauhtémoc 2021

NO.	PREDIO	COLONIA	ALCALDIA	PROYECTO	ESTATUS	PORCENTAJE DE AVANCE	PERÍMETRO	CATALOGACIÓN
8	ITURBIDE 18	CENTRO	CUAUHTEMOC	IMPERMEABILIZACION	PROCESO	5%	A	NO CATALOGADA
9	VIZCAINAS 18	CENTRO	CUAUHTEMOC	IMPERMEABILIZACION	PROCESO	5%	A	NO CATALOGADA
10	SOL 58 - 66	GUERRERO	CUAUHTEMOC	ALBAÑILERIA	PROCESO	50%	B	NO CATALOGADA
11	3RA. CERRADA DE LIBERTAD 6	MORELOS	CUAUHTEMOC	ESCALERAS	POR INICIAR	100%	B	NO CATALOGADA
12	FLORIDA 57	MORELOS	CUAUHTEMOC	CALLES Y ANDADORES	POR INICIAR	100%	B	NO CATALOGADA

PROSOC | Anexo de indicadores - Alcaldía Cuauhtémoc 2021


NO.	PREDIO	COLONIA	ALCALDIA	PROYECTO	ESTATUS	PORCENTAJE DE AVANCE	PERÍMETRO	CATALOGACIÓN
13	CALLEJON DEL NIÑO PERDIDO 17	CENTRO	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA SANITARIA	POR INICIAR	0%	A	NO CATALOGADA
14	REPUBLICA DE CHILE 38	CENTRO	CUAUHTEMOC	ESCALERAS	POR INICIAR	0%	A	NO CATALOGADA
15	BOLIVAR 158	CENTRO	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	PROCESO	50%	B	NO CATALOGADA
16	PRIMERA CERRADA DE FRAY SERVANDO TERESA DE MIER 57	CENTRO	CUAUHTEMOC	HERRERIA EN GENERAL	POR INICIAR	0%	B	NO CATALOGADA
17	PENSADOR MEXICANO Y/O 2 DE ABRIL	GUERRERO	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	POR INICIAR	0%	B	NO CATALOGADA
18	RIVA PALACIO 45	GUERRERO	CUAUHTEMOC	ESCALERAS	PROCESO	10%	B	NO CATALOGADA

PROSOC | Anexo de indicadores - Alcaldía Venustiano Carranza 2021

NO.	PREDIO	COLONIA	ALCALDIA	PROYECTO	ESTATUS	PORCENTAJE DE AVANCE	PERÍMETRO	CATALOGACIÓN
1	CORREGIDORA 140	ZONA CENTRO	VENUSTIANO CARRANZA	ESCALERAS	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
2	HABITACIONAL CANDELARIA DE LOS PATOS MANZANA II	ZONA CENTRO	VENUSTIANO CARRANZA	CALLES Y ANDADORES	POR INICIAR	0%	B	NO CATALOGADA
3	JOAQUIN HERRERA 64	ZONA CENTRO	VENUSTIANO CARRANZA	ESCALERAS	POR INICIAR	0%	B	NO CATALOGADA
4	NACIONAL 52	ZONA CENTRO	VENUSTIANO CARRANZA	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	PROCESO	80%	B	NO CATALOGADA
5	NACIONAL 32	ZONA CENTRO	VENUSTIANO CARRANZA	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
6	JARDINEROS 9	MORELOS	VENUSTIANO CARRANZA	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
7	CIRCUNVALACION 48	MORELOS	VENUSTIANO CARRANZA	PINTURA	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA

PROSOC | Seguimiento de indicadores

Unidades Habitacionales Beneficiadas RIPUH 2020

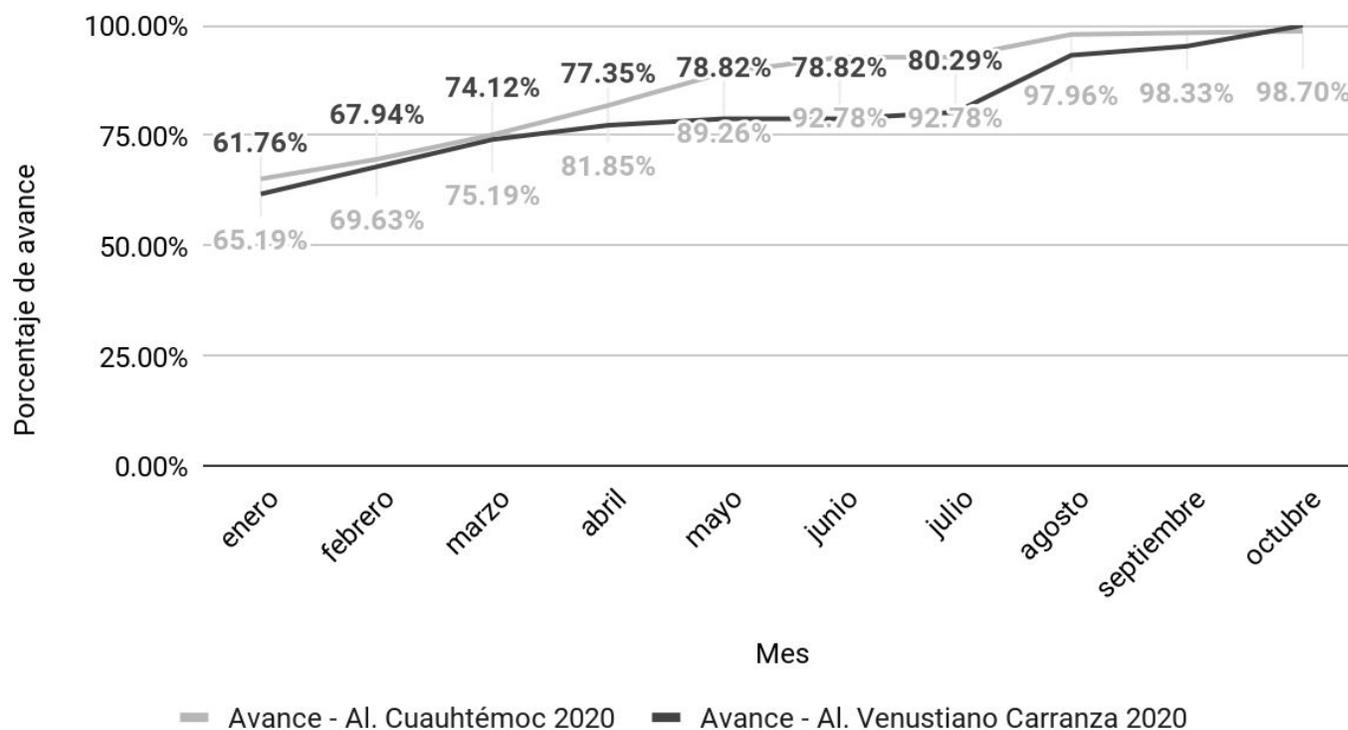

44

Unidades habitacionales beneficiadas
año 2020


43 UNIDADES HAB. TERMINADAS

01 UNIDADES HAB. EN PROCESO OBRA

PROSOC | Seguimiento de indicadores

25

Unidades habitacionales beneficiadas
año 2021

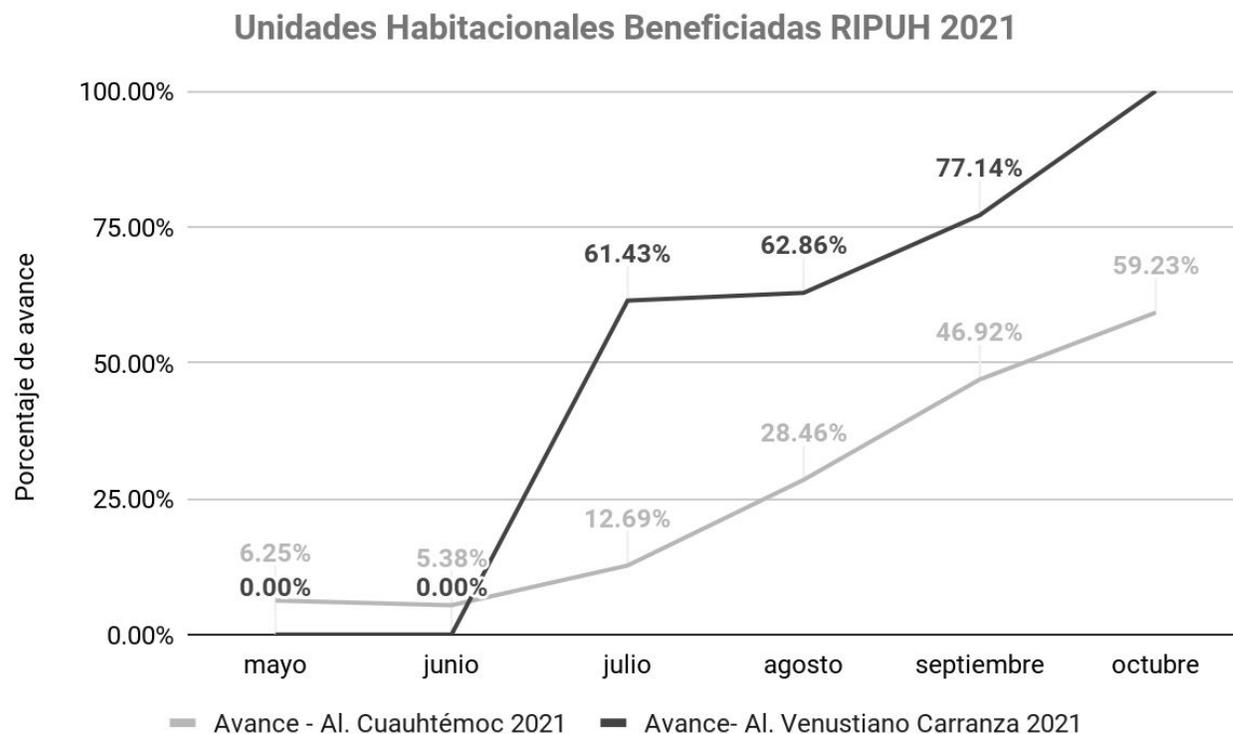

- 18 en Al. Cuauhtémoc
- 07 en Al. Venustiano Carranza

09 UNIDADES HAB. EN PROCESO OBRA

08 UNIDADES HAB. POR INICIAR

08 UNIDADES HAB. TERMINADAS



Fideicomiso Centro Histórico




FCH | Gráficas de obras en proceso.

EJERCICIO 2020 – 2021.

CONVENIO DE COORDINACIÓN INAH - FCHCM	AVANCE FISICO ANTERIOR (%)	AVANCE FÍSICO ACTUAL (%)	TERMINACIÓN PROGRAMADA
PROYECTO INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN, RECUPERACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL MONUMENTO INMUEBLE CONOCIDO COMO TEMPLO SAN JUAN DE DIOS	65 Suspensión temporal	65 Suspensión temporal	SEPTIEMBRE 2021
PROYECTO INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN, RECUPERACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL MONUMENTO INMUEBLE CONOCIDO COMO TEMPLO DE SANTA CATARINA	53 Suspensión temporal	53 Suspensión temporal	DICIEMBRE 2021

FCH | Seguimiento de indicadores.

CONVENIO DE COORDINACIÓN INAH - FCHCM

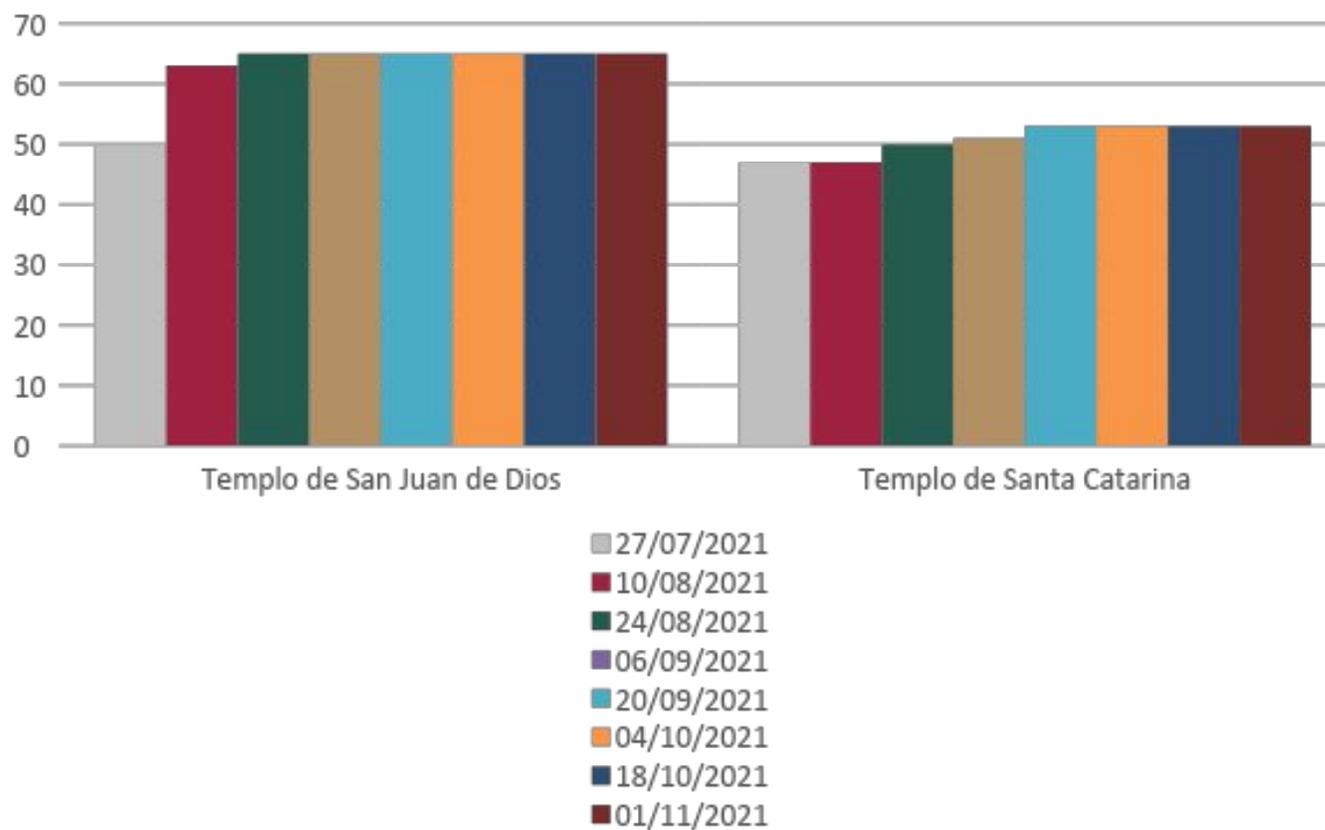


FCH | Gráficas de obras en proceso.

EJERCICIO 2020 – 2021.

CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA FIDEICOMISO F/54 Y EL FCHCM	AVANCE FISICO ANTERIOR (%)	AVANCE FÍSICO ACTUAL (%)	TERMINACIÓN PROGRAMADA
REHABILITACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL ESPACIO PÚBLICO Y CULTURAL 'JARDÍN REGINA' . REGINA No. 40, CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	95 En espera de pago	95 En espera de pago	JULIO 2021
SEÑALÉTICA PARA EL CENTRO HISTÓRICO, PERÍMETRO B.	30	42	ENERO 2022

FCH | Obras en Proceso. Convenio de Participación Conjunta Fideicomiso F/54 - FCHCM.




Troquelado de piezas para pendones restrictivos.

SEÑALÉTICA PARA EL CENTRO HISTÓRICO, PERÍMETRO B

FCH | Seguimiento de indicadores.

CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA FIDEICOMISO F/54 - FCHCM

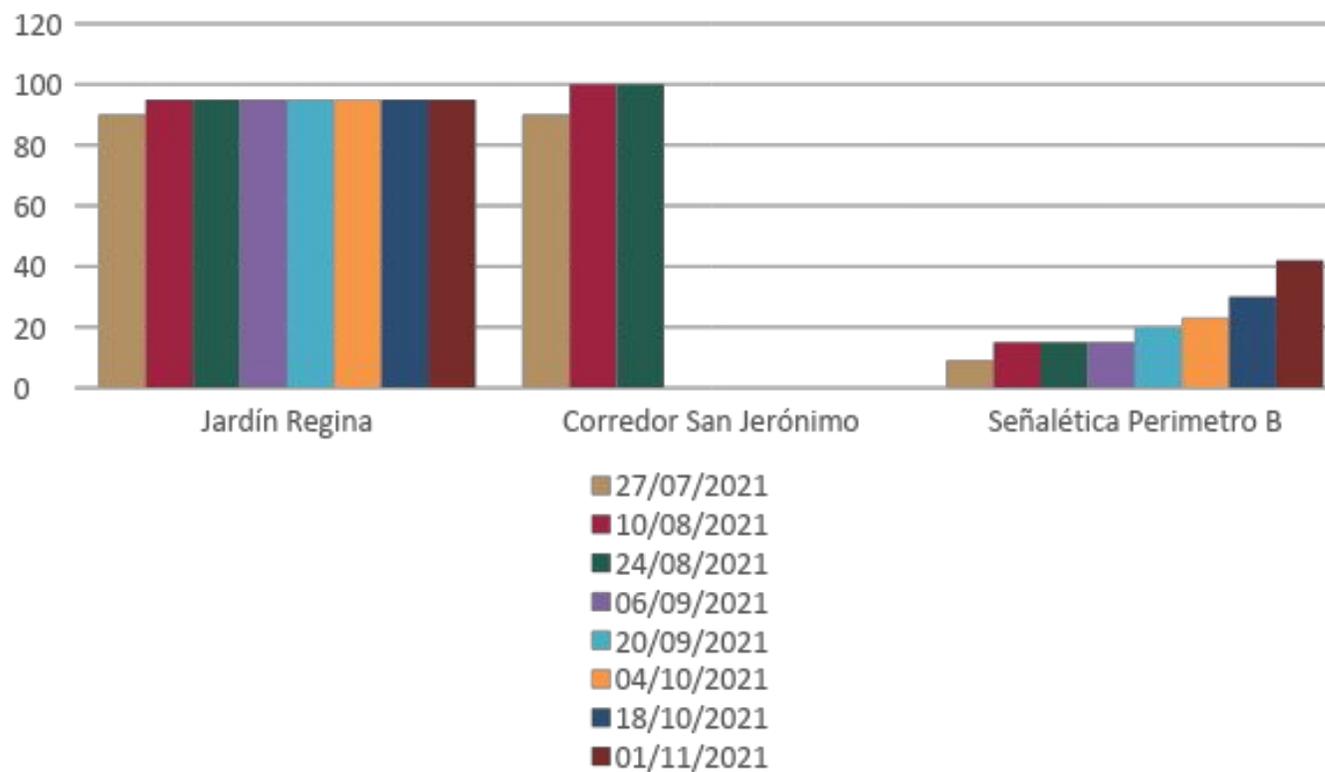


FCH | Gráficas de obras en proceso.

EJERCICIO 2020 – 2021.

REHABILITACIÓN DE ESPACIOS ARQUEOLÓGICOS FCHCM - AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO	AVANCE FISICO ANTERIOR (%)	AVANCE FÍSICO ACTUAL (%)	TERMINACIÓN PROGRAMADA
CONSTRUCCIÓN DE NUEVA REJA PERIMETRAL EN EL TEMPLO MAYOR.	18	18	SEPTIEMBRE 2021

FCH | Seguimiento de indicadores.

REHABILITACIÓN DE ESPACIOS ARQUEOLÓGICOS FCHCM - AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO

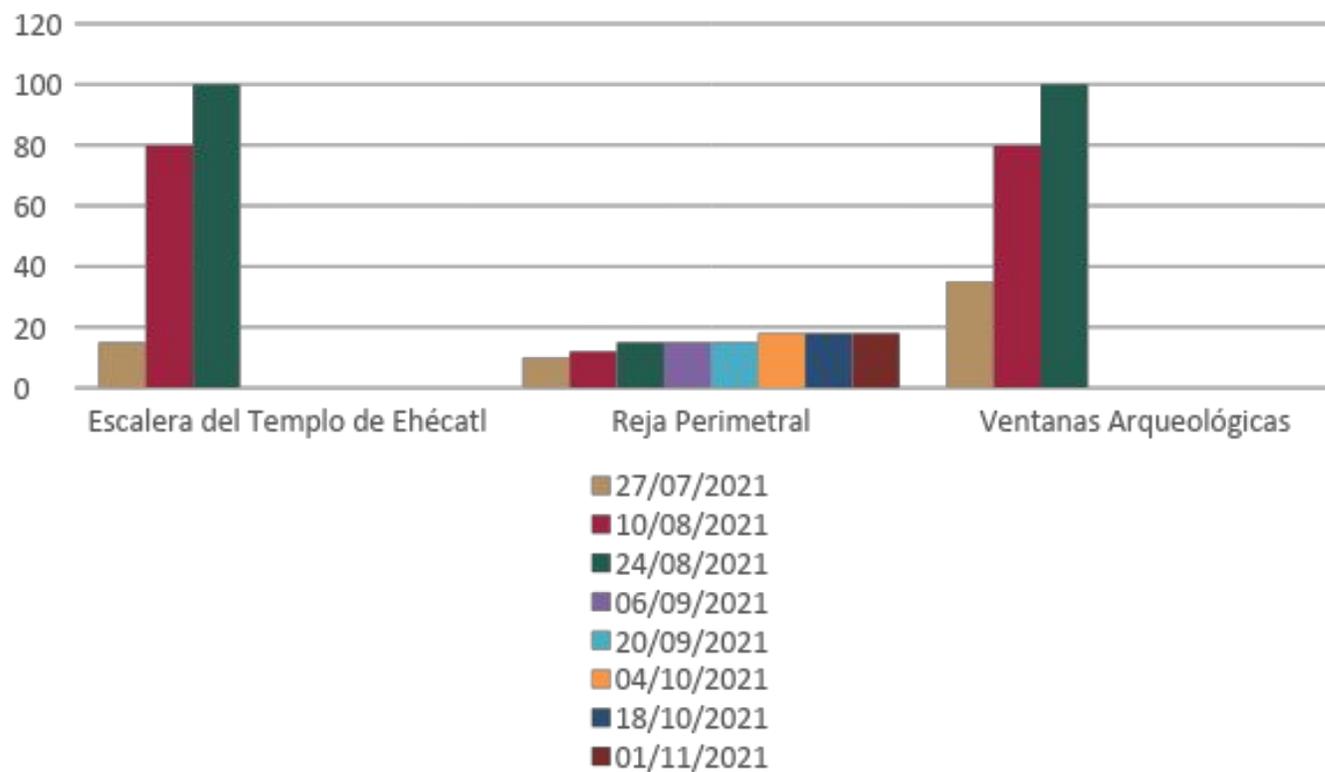

FCH | Gráficas de obras en proceso.

EJERCICIO 2020 – 2021.

ACUERDOS DE COLABORACIÓN PARA AYUDAS SOCIALES.	AVANCE FISICO ANTERIOR (%)	AVANCE FÍSICO ACTUAL (%)	TERMINACIÓN PROGRAMADA
FACHADAS: OBRAJE No. 7, LAS CRUCES No. 5, RIVA PALACIO No. 45, RIVA PALACIO No. 46-48, RIVA PALACIO No. 49 y RIVA PALACIO No. 52.	42	58	OCTUBRE 2021

FCH | Obras en Proceso. Ayudas Sociales.



Las Cruces No.5.



Obraje No. 7.



Riva Palacio No. 52.

AYUDAS SOCIALES – FACHADAS.

FCH | Obras en Proceso. Ayudas Sociales.



Riva Palacio No. 46-48.



Riva Palacio No 45.




Riva Palacio No. 49.

AYUDAS SOCIALES – FACHADAS.

FCH | Seguimiento de indicadores.

ACUERDOS DE COLABORACIÓN PARA AYUDAS SOCIALES. FACHADAS.

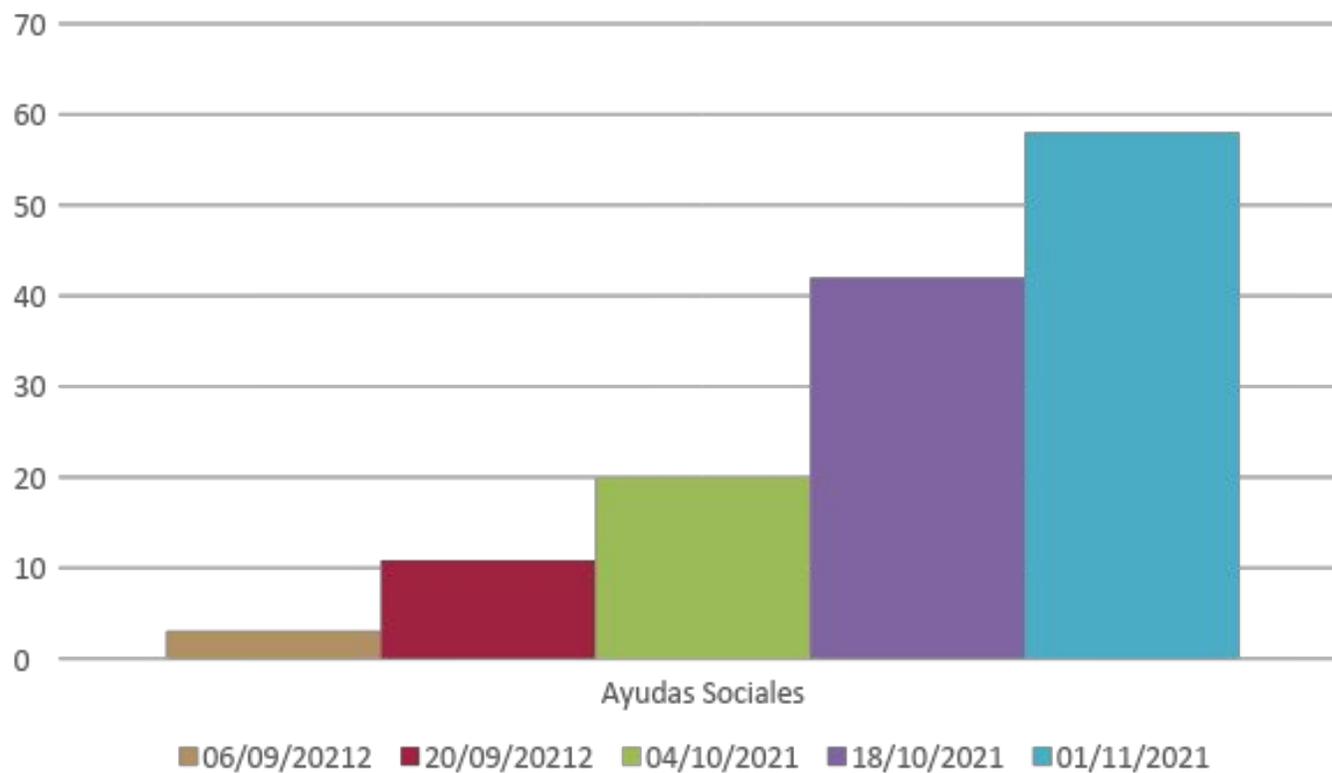

FCH | Gráficas de obras en proceso.

EJERCICIO 2020 – 2021.

APOYO A LAS CIUDADES MEXICANAS PATRIMONIO MUNDIAL.	AVANCE FISICO ANTERIOR (%)	AVANCE FÍSICO ACTUAL (%)	TERMINACIÓN PROGRAMADA
<p>“ARREGLO DE FACHADAS EN SANTA MARÍA LA REDONDA, REPÚBLICA DE BRASIL Y BARRIO LAGUNILLA, SEGUNDA ETAPA”</p> <p>(Bloque A): REPUBLICA DE BRASIL No. 29 y No. 46 y REPÚBLICA DE PARAGUAY No. 44</p> <p>(Bloque B): República de Brasil No. 44, 43, 62, 63 y 64 y República de Ecuador 95.</p>	0	SE DIO COMIENZO	DICIEMBRE 2021

FCH | Obras en Proceso. ACMPM.



República de Paraguay No. 44.

APOYO A CIUDADES MEXICANAS PATRIMONIO MUNDIAL- FACHADAS BLOQUE A.

FCH | Obras en Proceso. ACMPM.



República de Brasil No.62.



República de Brasil No.63.




República de Ecuador No. 95.

APOYO A CIUDADES MEXICANAS PATRIMONIO MUNDIAL- FACHADAS BLOQUE A.

FCH | Seguimiento de Indicadores


59%
avance global
 marzo - octubre

Convenio de coordinación INAH - FCHCM

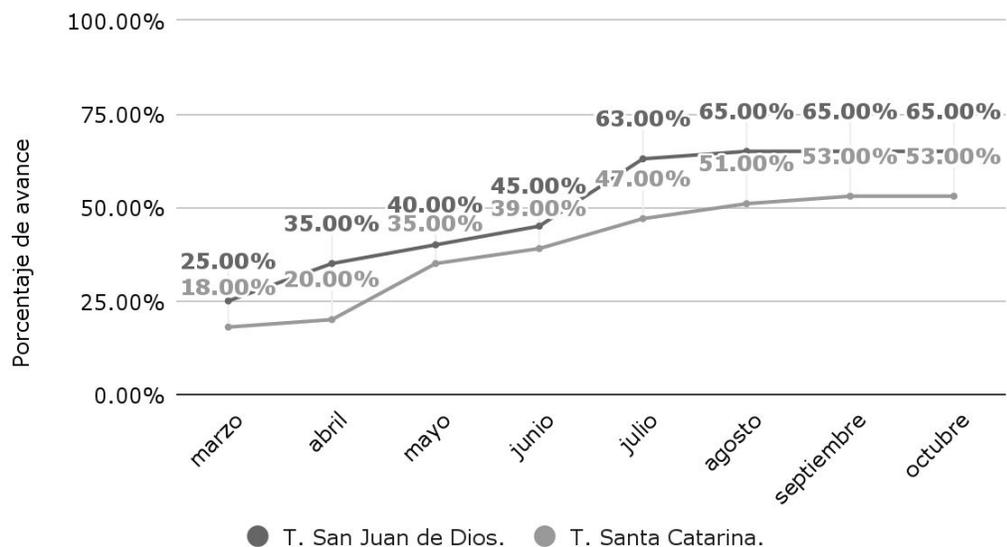

68.5%
avance global
 junio - octubre

Convenio de coordinación y colaboración fideicomiso f/54 y el FCHCM

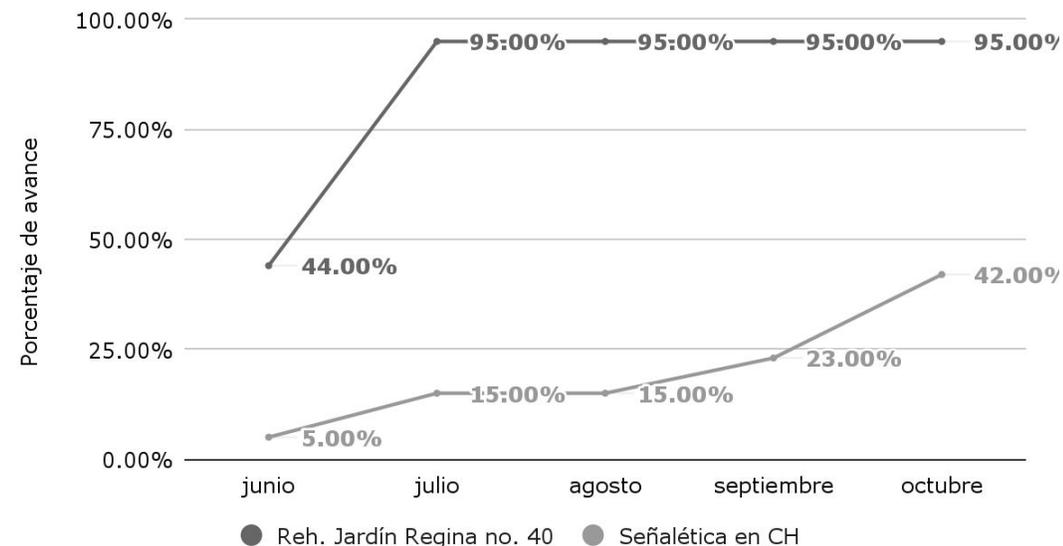

01 Proyecto terminado

- T. Santísima Trinidad


01 Proyecto terminado

- Mantenimiento Corredor San Jerónimo

FCH | Seguimiento de Indicadores

18%
avance
junio - octubre


Rehabilitación de espacios arqueológicos FCH/ACH



● Construcción de nueva reja perimetral en el Templo Mayor

58%
avance
julio - octubre

Colaboración para ayudas sociales

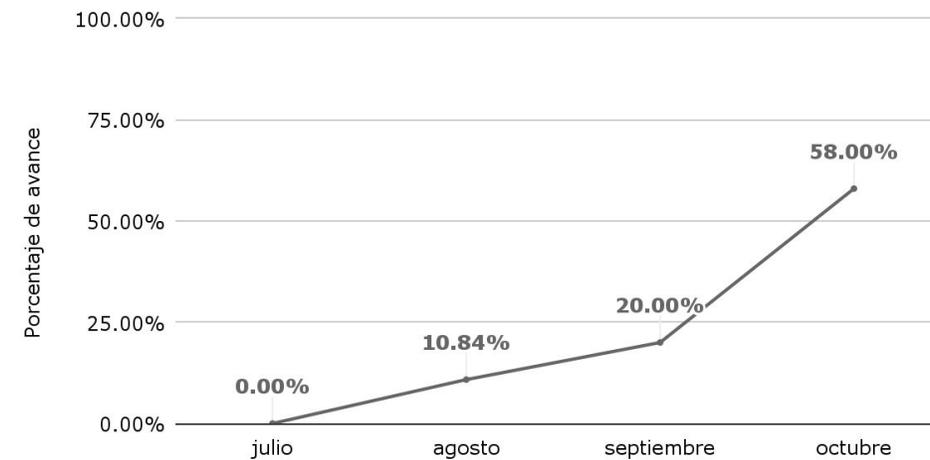


● Fachadas: Obraje 7, Las Cruces 5, Riva Palacio 46-48 y Riva Palacio 52

02 Proyectos terminados

- Escalera de acceso al templo de Ehécatl
- Mantenimiento y rehabilitación a ventanas arqueológicas en Rep. de Argentina

01 Proyecto en proceso

- Fachadas en Fachadas: Obraje 7, Las Cruces 5, Riva Palacio 46-48 y Riva Palacio 52



Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa de la CDMX


ILIFE | Indicadores

Tema	Inmueble	Periodicidad	Al 29/10	Próximo reporte
Rehabilitación de Inmuebles escolares en el Centro Histórico	Escuela Secundaria Adriana García Corral (Tercera etapa)	Mensual	100 %	30 de noviembre




ILIFE | Seguimiento de Indicadores. Enero -octubre de 2021

Meta cumplida!!

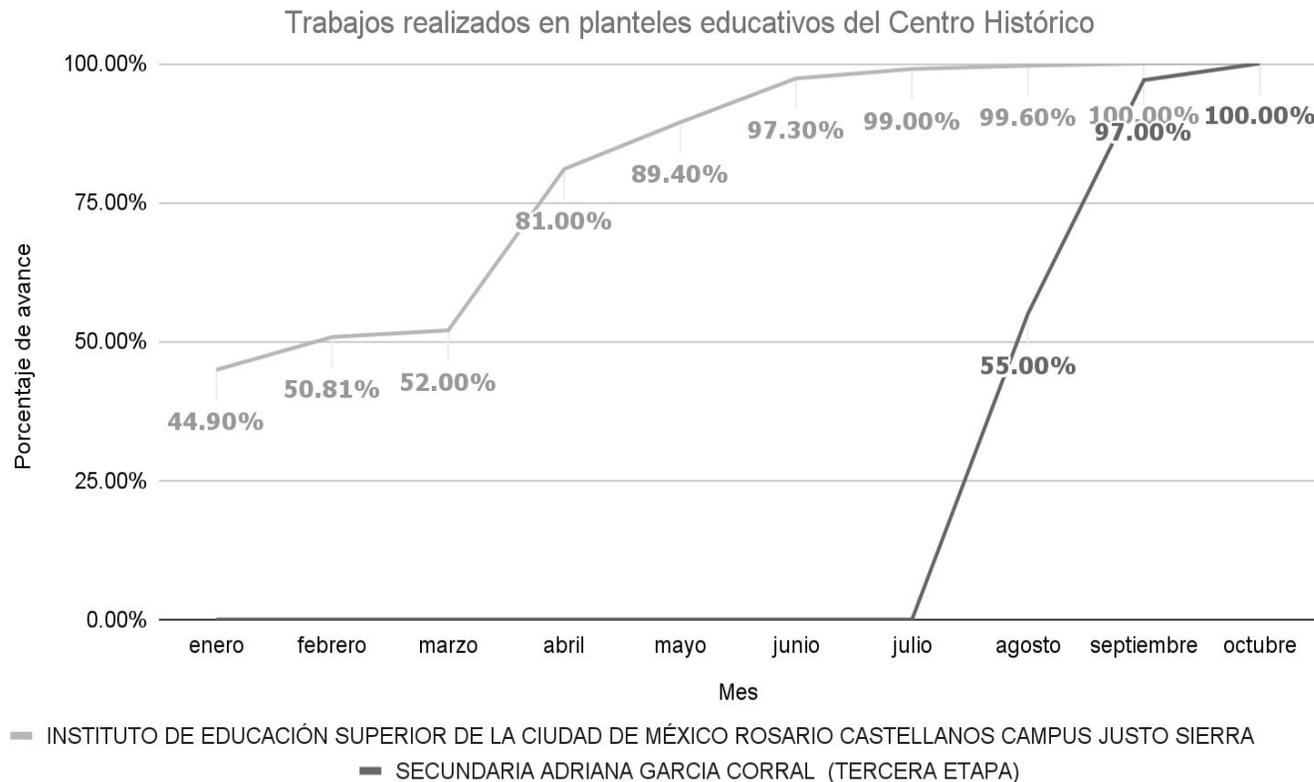

03 Proyectos terminados

- Escuela Primaria Francisco González Bocanegra (enero 2021)
- Instituto de Educación Superior de la Ciudad de México Rosario Castellanos, Campus Justo Sierra
- Escuela Secundaria Adriana García Corral (Tercera etapa)



Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5)

C5 | Indicadores

Indicador	Periodicidad	16/10 al 30/10	Próximo reporte
No. cámaras con falla o intermitencia		03 cámaras	
	Quincenal		16 de noviembre
Número de obras de mantenimiento y/o reparación de atención a la infraestructura		02 cámaras	


NOTA: Los datos proporcionados son extraídos de los Reportes de mesa de ayuda de C5

C5 | Seguimiento de indicadores Enero - octubre

207

enero - octubre


Cámaras con falla o intermitencia

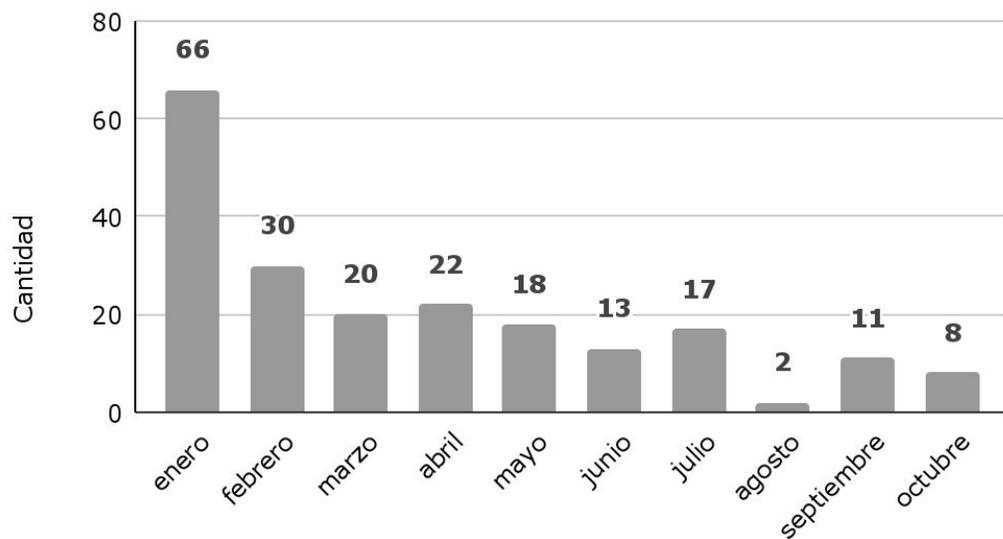

38

enero - octubre

Obras de mantenimiento y/o reparación de infraestructura

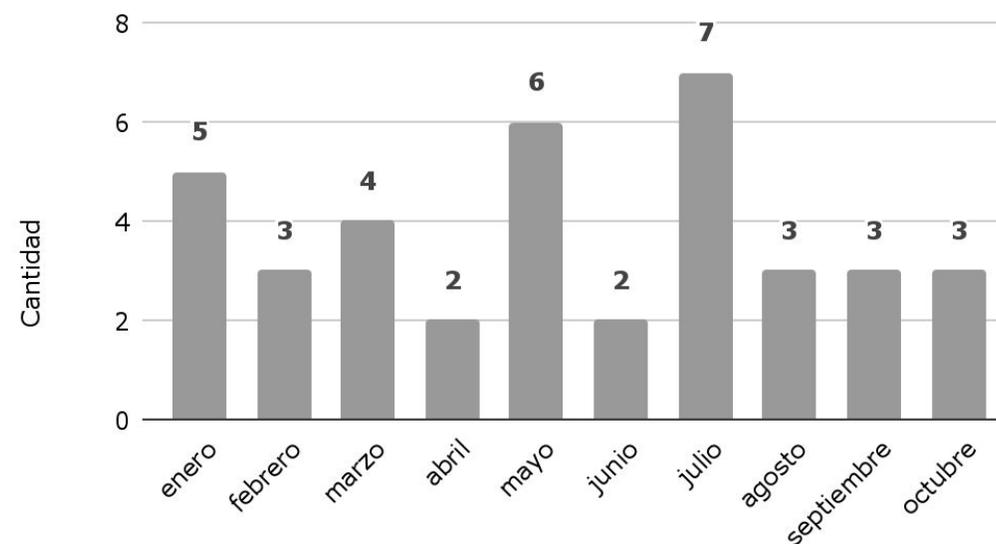



SSC Tránsito

SSC Tránsito | Indicadores

Tema	Unidad de medida	Periodicidad	18 al 31/10	Próximo reporte
Semáforos	Número de semáforos con mantenimiento preventivo	Quincenal	0	16 de noviembre
	Número de semáforos con mantenimiento correctivo		49	
Cámaras	Número de cámaras con mantenimiento preventivo		0	
	Número de cámaras con mantenimiento correctivo		0	




SSC Tránsito | Anexo de Indicadores

CORRECTIVO

ACOMETIDA	2
APAGADO	6
CABLE DE COMUNICACIÓN DAÑADO	1
CAMBIO DE COMPONENTE	1
CORTO	3
DESINSTALACION	2
DESORIENTADO	4
FOCO FUNDIDO	8
FY-CINTILANTE	5
MEMORIA DAÑADA	5
OBRA CIVIL	2
SINIESTRO	2
ST-DESCONECTADO / FUERA DE COMUNICACIÓN	5
TAPA DAÑADA	2
TIEMPOS (EXTRACCION O REVISION)	1
TOTAL GENERAL	49

MANTENIMIENTO SEMAFORICO




SSC Tránsito | Seguimiento de indicadores Enero - octubre

151

enero - octubre


Acciones mantenimiento preventivo a semáforos

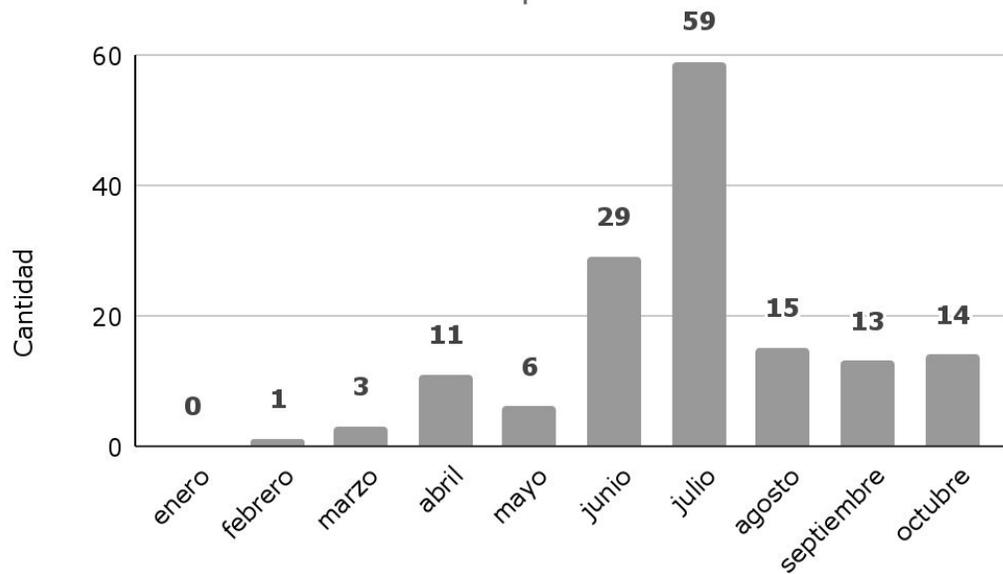

1277

enero - octubre

Acciones mantenimiento correctivo a semáforos

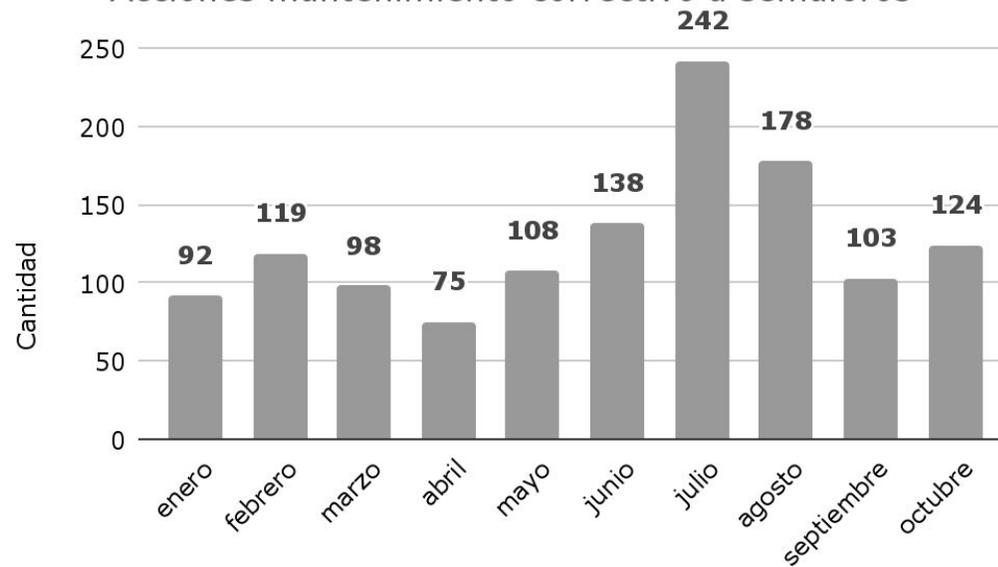

Reportes

Turnos e incidencias urbanas

Asuntos generales

Acuerdos

Asistencia

ACH | Matriz de seguimiento a turnos - enero a octubre 2021

**91%
atención**

Matriz de Turnos

ATIENDE	Atendido	En proceso	Pendiente
ACH	28	2	1
Al. Cuauhtémoc	5	2	1
C5	4		
CFE	5		
CONAVI	1		
FCH	1		
INAH	1		
INBAL	1		
METRO	1		
Metrobús	1		
SACMEX-Drenaje	15	1	1
SACMEX-Obra			1
SEDEMA	1		
SEDUVI	2		
SOS-AP	1		
SOS-DGCOP	2		
SOS-DGOIV	14	1	
SOS-DGSUS	7		
Telmex	1		
Tránsito	3		
Suma total	94	6	4

ACH | Seguimiento a turnos **ATENDIDOS**

CLAVE	FECHA DE MESA	SOLICITANTE	SOLICITUD	ATIENDE	EVIDENCIA	ESTATUS	OBSERVACIONES
TCH-093	19/10/2021	METRO	Realizar gestiones con SOBSE para que se proteja la estación de plaza José Martí por los trabajos de restitución de piso que se están haciendo	ACH		Atendido	SOBSE pondrá protección cuando realice los trabajos. menciona que son solo algunas piezas (Ing. Ivan Vite)
TCH-094	19/10/2021	SOS-DGSUS	Haga el retiro de bolardos que depositó en Héroes de Naozari.	Metrobús		Atendido	Retirados el mismo día 19 de oct
TCH-095	26/10/2021	Metrobús	En la esquina de Dolores y Ayuntamiento en ruta Metrobús, sobre el revo se estaciona un camión de basura y chorrea líquidos viscosos que ensucian y dejan manchado y resbaloso el piso permanentemente. Tomar fotos para ver si es camión de la Alcaldía o de la DGSUS para seguimiento y solución del tema	SOS-DGSUS		Atendido	Turno surgido en MR
TCH-096	26/10/2021	Metrobús	Se realice visita a establecimientos de la esquina de Dolores y Ayuntamiento para que realicen adecuado desecho de residuos de grasas y aceites	ACH		Atendido	Turno surgido en MR Se realizó visita el jueves 28 a las 11 am, con SACMEX y SEDEMA para informar sobre el adecuado desecho de grasas y dar a conocer las consecuencias de no hacerlo adecuadamente. SACMEX realizó limpieza del pozo de visita.

ACH | Seguimiento a turnos **EN PROCESO**

CLAVE	FECHA DE MESA	SOLICITANTE	SOLICITUD	ATIENDE	EVIDENCIA	ESTATUS	OBSERVACIONES
TCH-079	2/9/2021	VI - Santa María la Redonda	Se atiende la falla en el alumbrado público en la calle de Valerio Trujano de Av. Hidalgo a Paseo de la Reforma	Al. Cuauhtémoc		En proceso	La Subdirección de alumbrado de la Alcaldía Cuauhtémoc ya rehabilitó las luminarias en ambas aceras entre Pensador Mexicano y Av Hidalgo. Están en proceso de rehabilitación las luminarias entre Pensador Mexicano y Paseo de la Reforma con reposición de cable
TCH-080	2/9/2021	VI - Santa María la Redonda	Se atiende apuntalamiento en el predio de Violeta No. 62	Al. Cuauhtémoc		En proceso	<ul style="list-style-type: none"> -El miércoles 8 de agosto se contactó a la vecina -Se generó folio SUAC -ACH compartió el reporte al Ing. Fernando Corso del Área de Protección Civil de la Alcaldía -El dictamen está en proceso. La vecina Ma. Cristina tuvo cita el lunes 27/09 -Se realizó la solicitud a la Alcaldía por oficio
TCH-089	7/9/2021	Venustiano Carrán	Acompañamiento para trámites de obra de un Presupuesto Participativo en calle San Ciprián y alrededores del perímetro B	ACH		En proceso	La Alcaldía aún está en licitaciones, en cuanto estén listos notificarán para darle seguimiento a sus solicitudes.
TCH-093	8/10/2021	ACH	Rehabilitación de la conexión de drenaje en el predio de Peralvillo no. 16 reconstruyendo salida en Jesús Carranza 28	SACMEX - Drenaje		En proceso	<ul style="list-style-type: none"> abordado en la 21 MID_19 oct Martes 2 de noviembre inició trabajos de reconstrucción la Dirección de detección de fallas de drenaje
TCH-092	15/10/2021	ACH	Limpieza y retiro de escombros en el predio de Jaime Nuno s/n, col. Morelos	SDS-DGSUS		En proceso	La Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad iniciará los trabajos de limpieza el día 3 de noviembre a las 12:00 horas
TCH-097	26/10/2021	ACH	Retiro de tanques de gas en azotea de Joaquín Herrera #17	ACH		En proceso	<ul style="list-style-type: none"> Turno surgido en MR Solicitado al H Cuerpo de Bomberos, el Director General instruyó visita el 3 de noviembre para evaluar la atención solicitada.

ACH | Seguimiento a turnos **PENDIENTES**

CLAVE	FECHA DE MESA	SOLICITANTE	SOLICITUD	ATIENDE	EVIDENCIA	ESTATUS	OBSERVACIONES
TCH-098	28/0/2021	Amada-Sector Fini	Desazolve de coladera tapada frente al número 65 en República de El Salvador	SACMEX-Drenaje		Pendiente	TURNO NUEVO PARA SOLICITAR EN LA 22a MESA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS
TCH-099	28/0/2021	Amada-Sector Fini	Poda de árboles afuera de la Cancillería	Al. Cuauhtémoc		Pendiente	TURNO NUEVO PARA SOLICITAR EN LA 22a MESA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS
TCH-100	28/0/2021	Amada-Sector Fini	Reposición de coladera rota en la banqueta en Allende esquina Tacuba, frente a las maletas	SACMEX-Obra		Pendiente	TURNO NUEVO PARA SOLICITAR EN LA 22a MESA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS
TCH-101	28/0/2021	Amada-Sector Fini	Mantenimiento a los árboles plantados en 5 de Mayo entre Bolívar y Motolinia porque están descuidados	ACH		Pendiente	TURNO NUEVO PARA SOLICITAR EN LA 22a MESA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

ACH | Matriz de seguimiento a incidencias urbanas - enero a octubre 2021

88%
atención

Matriz de Incidencias <i>Dependencia</i>	ESTATUS			Suma total
	Atendido	En proceso	Pendiente	
ACH	62		9	71
ADIP	1		2	3
Al. Cuauhtémoc	118	1	18	137
C5	5			5
CFE	284	1	44	329
SACMEX	185	5	21	211
SEDEMA	1			1
SGIRyPC	3		1	4
SOS-AP	98		8	106
SOS-DGOIV	37		7	44
SOS-DGSUS	59			59
STC-Metro	2			2
TELMEX	26		13	39
Tránsito	66		4	70
Suma total	947	7	127	1081

Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 19 de octubre al 01 de noviembre 2021

CLAVE	REPORTA	FECHA DE REPORTE	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ESTATUS
IUCH-1161	ACH	19/10/2021	Falla en semáforo	Justo Sierra	República de Argentina		Tránsito			Atendida
IUCH-1163	V3- Santa Domingo	19/10/2021	Falta de luz al interior de las inmuebles	República de Perú			CFE	<p>Buenos días, tenemos registro de la falla que nos mencionas, se atenderá con el número de cuenta.</p> <p>MEJORAR: cuando puedas mencionar por esta vía las 24hrs o en nuestra línea o atención O24. Gracias por contactarnos.</p>		Atendida
IUCH-1164	V2- Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	19/10/2021	Falta de luz al interior de las inmuebles	República de Perú			CFE			Atendida
IUCH-1165	V3- Santa Domingo	19/10/2021	Falta de luz al interior de las inmuebles	República de Chile			CFE			Atendida
IUCH-1166	V2- Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	19/10/2021	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	Belisario Domínguez	Ignacio Allende	República de Chile	SOS-AP			Atendida

Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 19 de octubre al 01 de noviembre 2021

CLAVE	REPORTA	FECHA DE REPORTE	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ESTATUS
IUCH-1167	V3- Santa Dominga	19/10/2021	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	Callejón de República de Ecuador			SOS-AP			Atendida
IUCH-1168	V3- Santa Dominga	19/10/2021	Tiraderas de basura	Callejón de República de Ecuador			SOS-DGSUS			Atendida
IUCH-1169	V6- Antigua Merced- Mixcalca	19/10/2021	Tapas, registros o cobaderas faltantes o dañados	República de Uruguay			SACMEX			Atendida
IUCH-1171	SOS-DGSUS	20/10/2021	Daño al equipamiento urbano				Metrobis			Atendida
IUCH-1172	V6- Antigua Merced- Mixcalca	19/10/2021	Tapas, registros o cobaderas faltantes o dañados	Las Cruces	República de Uruguay	República del Salvador	SACMEX			Atendida

Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 19 de octubre al 01 de noviembre 2021

CLAVE	REPORTA	FECHA DE REPORTE	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	ATENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ESTATUS
IUCH-1173	V1 - Santa María la Redonda	20/10/2021	Tapas, registros o calderas faltantes o dañados	Mercedo 2 de abril	Mina		SACMEX			Atendida
IUCH-1177	V1 - Santa María la Redonda	20/10/2021	Incendios	Violeta	Mina	Av. Guerrero	CFE			Atendida
IUCH-1178	V3 - Santa Dominga	20/10/2021	Despedidas en banquetas	República de Brasil			CFE			Atendida
IUCH-1180	V5 - Antigua Merced - Mixcalco	20/10/2021	Tiraderos de basura	Santísima	Emilia Zapata		SOS-DGSUS			Atendida
IUCH-1181	V3 - Santa Dominga	20/10/2021	Falta de luz al interior de las inmuebles	República de Perú	República de Brasil	República de Argentina	CFE			Atendida

Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 19 de octubre al 01 de noviembre 2021

CLAVE	REPORTA	FECHA DE REPORTE	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ESTATUS
IUCH-1184	VI - Santa María la Redonda	21/10/2021	Fallas en el sistema de drenaje y desazolve	Violeta			SACHEX			Atendida
IUCH-1185	VI - Antigua Merced - Mixcalca	21/10/2021	Tapas, registros o cobaderas faltantes o dañados	República de Uruguay			SACHEX			Atendida
IUCH-1186	VI - San Pablo	21/10/2021	Tapas, registros o cobaderas faltantes o dañados	República del Salvador	José María Pinos Suárez		TELMEX			Atendida
IUCH-1188	VI - Antigua Merced - Mixcalca	21/10/2021	Tiraderas de basura	Emilia Zapata	Jesús María		SOS-DGSUS			Atendida
IUCH-1189	Estructura de Supervisión ACH	22/10/2021	Tapas, registros o cobaderas faltantes o dañados	Santísima	Emilia Zapata					Atendida

Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 19 de octubre al 01 de noviembre 2021

CLAVE	REPORTA	FECHA DE REPORTE	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ESTATUS
IUCH-1181	Estructura de Supervisión ACH	22/10/2021	Tapas, registros o calderas faltantes o dañados	Emilia Zapata	Santísima					Atendida
IUCH-1182	Estructura de Supervisión ACH	22/10/2021	Tapas, registros o calderas faltantes o dañados	Plaza Seminario	Maneda					Atendida
IUCH-1186	Estructura de Supervisión ACH	22/10/2021	Tapas, registros o calderas faltantes o dañados	República del Salvador	José María Pinos Suárez					Atendida
IUCH-1186	Estructura de Supervisión ACH	22/10/2021	Falla en semáforo	Palma	Francisco L. Madera					Atendida
IUCH-1187	V6- Antigua Mercedes-Mixcalco	22/10/2021	Falta de luz interior de las inmuebles	Mercado Abelardo L. Rodríguez			CFE			Atendida

Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 19 de octubre al 01 de noviembre 2021

CLAVE	REPORTA	FECHA DE REPORTE	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	ATENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ESTATUS
IUCH-1188	V6- Antigua Merced- Hicazal	22/10/2021	Tapas, registros o coberturas faltantes o dañados	Jesús María	Corregidas		SACMEX			Atendida
IUCH-1189	V2- Callejón del 57- Plaza de la Concepción	22/10/2021	Falta de luz interior de las inmuebles	Héroes del 57			CFE			Atendida
IUCH-1200	V1- Santa María la Redonda	22/10/2021	Falta de luz interior de las inmuebles	Mina			CFE			Atendida
IUCH-1201	V1- Santa María la Redonda	22/10/2021	Falla en semáforo	Eje 1 Norte	Paseo de la Reforma		Tránsito			Atendida
IUCH-1202	V8- San Pablo	22/10/2021	Falta de luz interior de las inmuebles	Tapacía			CFE			Atendida

Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 19 de octubre al 01 de noviembre 2021

CLAVE	REPORTA	FECHA DE REPORTE	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	ATENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ESTATUS
IUCH-1203	V1 - Santa María la Redonda	23/10/2021	Falta de luz al interior de las inmuebles	Violeta	Av. Guerrero		CFE			Atendida
IUCH-1204	V4 - Alameda-Sedar Financiera	23/10/2021	Fugas de agua	Alameda Central			SACMEX			Atendida
IUCH-1205	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	23/10/2021	Falla en semáforo	Ignacio Allende	República de Honduras		Tránsito			Atendida
IUCH-1207	V4 - Alameda-Sedar Financiera	23/10/2021	Tapas, registros o calderas faltantes o dañados	Av. Hidalgo	Angela Peralta		ACH			Atendida
IUCH-1208	V3 - Santa Dominga	23/10/2021	Tapas, registros o calderas faltantes o dañados	República de Venezuela	República de Brasil		Tránsito			Atendida

Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 19 de octubre al 01 de noviembre 2021

CLAVE	REPORTA	FECHA DE REPORTE	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ESTATUS
IUCH-1209	V3- Santa Domingo	23/10/2021	Problemas con cableado	República de Honduras			CFE			Atendida
IUCH-1212	V6- Antigua Merced-Mixcalco	23/10/2021	Fallas en alumbrado público, apagones y fallos en el voltaje	Talavera	República del Salvador	República de Uruguay	SOS-AP			Atendida



Atención VIPPSC | Incidencias **PENDIENTES** - del 19 de octubre al 01 de noviembre 2021

CLAVE	REPORTA	FECHA DE REPORTE	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ESTATUS
IUCH-1160	Estructura de Supervisión ACH	19/10/2021	Tapas, registros o calderas faltantes o dañados	Eje 1 Oriente (Circunvalación)	Carregidas					Pendiente
IUCH-1174	Estructura de Supervisión ACH	20/10/2021	Baches	Jesús María	Emilia Zapata	República de Guatemala				Pendiente
IUCH-1175	Estructura de Supervisión ACH	20/10/2021	Tapas, registros o calderas faltantes o dañados	Loreta	Micaela					Pendiente
IUCH-1176	Estructura de Supervisión ACH	20/10/2021	Tapas, registros o calderas faltantes o dañados	República de Honduras	República de Chile					Pendiente
IUCH-1179	V3- Santa Domingo	20/10/2021	Baches	República de Brasil	República de Bolivia		CFE			Pendiente

Atención VIPPSC | Incidencias **PENDIENTES** - del 19 de octubre al 01 de noviembre 2021

CLAVE	REPORTA	FECHA DE REPORTE	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ESTATUS
IUCH-1182	VI - Santa María la Redonda	20/10/2021	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	Valeria Trujano			SOS-AP			Pendiente
IUCH-1187	V3 - Santa Domingo	21/10/2021	Falta de baldosas	República de Argentina			Metrobús			Pendiente
IUCH-1189	Estructura de Supervisión ACH	22/10/2021	Baches	Francisco I. Madero	Isabel La Católica					Pendiente
IUCH-1188	Estructura de Supervisión ACH	22/10/2021	Tapas, registros o colectoras faltantes o dañados	Justo Sierra	Loreto					Pendiente
IUCH-1204	VI - Santa María la Redonda	25/10/2021	Falta de baldosas	Valeria Trujano	Mina		ACH			Pendiente

Atención VIPPSC | Incidencias **PENDIENTES** - del 19 de octubre al 01 de noviembre 2021

CLAVE	REPORTA	FECHA DE REPORTE	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	ATENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ESTATUS
IUCH-1205	V1 - Santa María la Redonda	25/10/2021	Falta de baldosas	Av. Hidalgo	Valeria Trujano		ACH			Pendiente
IUCH-1206	V4 - Alameda-Sedat Financiera	23/10/2021	Tapas, registros o calderas faltantes o dañados	Av. Juárez	Dolores		CFE			Pendiente
IUCH-1210	V4 - Alameda-Sedat Financiera	23/10/2021	Baches	Eje Central	Av. Hidalgo		SOS-DGOM			Pendiente
IUCH-1214	V2- Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	25/10/2021	Mal estado de cables o equipamiento	Ignacia Allende	Danceles	República de Cuba	TELMEX			Pendiente
IUCH-1218	V2- Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	25/10/2021	Desperdicios en banquetas	Danceles	Ignacia Allende		Al Cuauhtémoc			Pendiente

Atención VIPPSC | Incidencias **PENDIENTES** - del 19 de octubre al 01 de noviembre 2021

CLAVE	REPORTA	FECHA DE REPORTE	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	ATENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ESTATUS
IUCH-1216	V2- Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	25/10/2021	Desperfección en banquetas	República de Cuba	República de Chile	Ignacio Allende	Al Cuauhtémoc			Pendiente



Reportes

Turnos e incidencias urbanas

Mesas de trabajo

Asuntos generales

Acuerdos

Asistencia
