



MESA INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA

I SESIÓN. Enero

11 de enero de 2022



Orden del día

Reportes institucionales

Turnos

Incidencias urbanas

Asuntos generales

Acuerdos

Asistencia





Reportes Institucionales



Autoridad del Centro Histórico


Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

Tema	Indicador	Periodicidad	Quincena al 03/01/2022	Próximo reporte
Mantenimiento a infraestructura	Número de Incidencias de daño en infraestructura del Perímetro de la ACH reparadas y atendidas	Quincenal	44	25 de enero
Mantenimiento a infraestructura con apoyo de Justicia Cívica	Número de atenciones en parques, plazas o áreas verdes del Perímetro del Centro Histórico	Quincenal	4	25 de enero

Autoridad del Centro Histórico | Obras menores

16 de
septiembre
República de
Chile
Pescaditos
Gante
Donceles
Ecuador
Rivapalacio

Los trabajos realizados consistieron en **demolición y reparación de piso tipo mármol Santo Tomás se reparan 11.00 m²** en 16 de septiembre esquina Palma , **retiro de grafiti en cortina artística** en República de Chile entre República de Cuba y Belisario Domínguez, **colocación de 3 biciestacionamientos** en Pescaditos entre Revillagigedo y Luis Moya, **reparación de 12 piezas tipo basaltex** en en calle Gante entre 16 de septiembre y Madero, **colocación de 2 bolardos** en 16 de septiembre esquina Gante, **demolición de banqueta, extracción de tocón y reparación de banqueta estampada 4.00 m²**, en calle Donceles entre Allende y República de Chile, **fabricación y colocación de tapa de registro**, en Ecuador entre Brasil y Argentina, **retiro de bolardos 9 piezas y reparación de banqueta estampada** en Rivapalacio entre Pedro Moreno y Violeta.

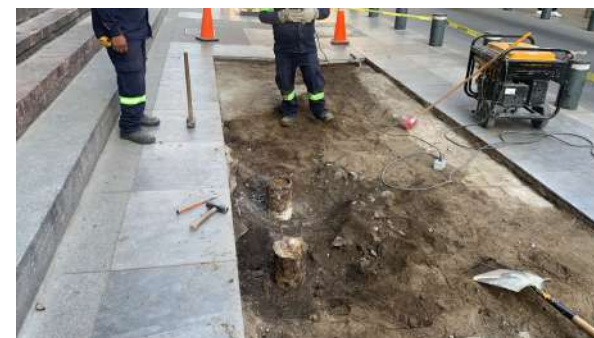

16 de septiembre esquina Palma


Autoridad del Centro Histórico | Gráficos de obras menores



Pescaditos



Gante

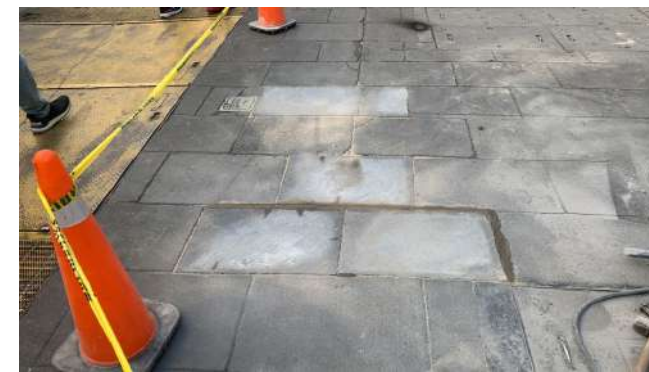

Gante



16 de septiembre



Donceles



Ecuador

Autoridad del Centro Histórico | Gráficos de obras menores



Rivapalacio



Autoridad del Centro Histórico | Mantenimiento con apoyo de infractores de justicia cívica



Atención de áreas verdes maceteros de Guatemala



Atención de áreas verdes maceteros de Emilio Donde



Atención a maceteros en González Obregón



Alcaldía Cuauhtémoc

Alcaldía Cuauhtémoc | Indicadores

Tema	Indicador	Periodicidad	Quincena al 09/01	Próximo reporte
Alumbrado Público	Número de luminarias reparadas en vías secundarias	Quincenal	1	24 de enero
Alumbrado Público	Número de reconexiones de circuito	Quincenal	6	24 de enero
Drenaje	Número de metros de sondeo de albañal pluvial	Quincenal	240	24 de enero
Residuos	Número de kilómetros de barrido diario	Quincenal	283	24 de enero
Residuos	Número de toneladas de recolección en tiraderos clandestinos	Quincenal	538.70	24 de enero

Alcaldía Cuauhtémoc | Indicadores

Tema	Indicador	Periodicidad	Quincena al 24/01	Próximo reporte
Residuos	Número de toneladas de recolección orgánica domiciliaria y barrido	Quincenal	345.70	24 de enero
Residuos	Número de toneladas de recolección inorgánica domiciliaria y barrido	Quincenal	914.80	24 de enero


Alcaldía Cuauhtémoc | Gráficas



Reparación de luminarias en calle Carretones



Reparación de alumbrado en plaza Santo Domingo

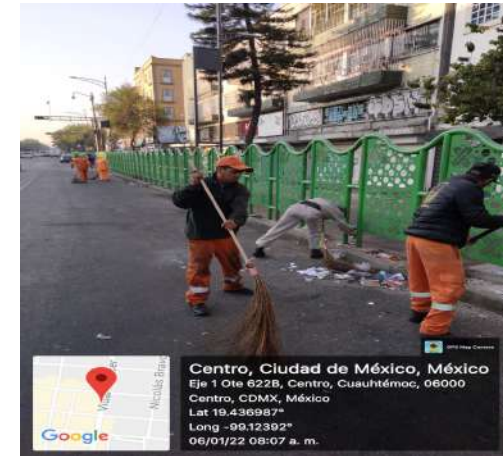

Barrido y recolección de residuos en Eje 1



Barrido y recolección de residuos en Av. Independencia



Alcaldía Venustiano Carranza



Alcaldía Venustiano Carranza | Indicadores

Tema	Indicador	Periodicidad	Quincena al 10/12	Próximo reporte	Observaciones
Luminarias	Número de luminarias reparadas en vías secundarias	Quincenal	0	25 de enero	La Coordinación Territorial Morelos no reporta trabajos de alumbrado público en el periodo.
Tiraderos Clandestinos	Toneladas de residuos sólidos recolectados de tiraderos clandestinos en el PB de VC (línea base 26 tiraderos)	Quincenal	633	25 de enero	Se recolectaron 42.2 toneladas diariamente de Residuos Sólidos
Poda de árboles	Número de sujetos forestales podados en vías secundarias y/o plazas	Quincenal	0	25 de enero	La Coordinación Territorial Morelos no reporta trabajos de poda de sujetos forestales en el periodo.
Desazolve	Metros lineales de drenaje desazolvados	Quincenal	0	25 de enero	La Coordinación Territorial Morelos no reporta trabajos de desazolve en el periodo.



SACMEX

Dirección de Detección de Fallas y Rehabilitación de Drenaje




SACMEX Drenaje | Ejecución del programa

Desazolve de la red de drenaje y accesorios hidráulicos


EN EL AÑO 2021 SE REBASA EL 100 % DE ATENCIÓN EN CENTRO HISTÓRICO, CON RESPECTO AL PROGRAMADO

PROGRAMACIÓN 2022

	PROGRAMADO	ANTERIOR	EJECUTADO	AVANCE
ATARJEA (METROS)	21,000	20390	80	80
POZOS DE VISITA	370	357	3	3
REJILLAS DE PISO	150	223	3	3
COLADERAS PLUVIALES	160	272	3	3
ALBAÑALES (METROS)	1500	1761		

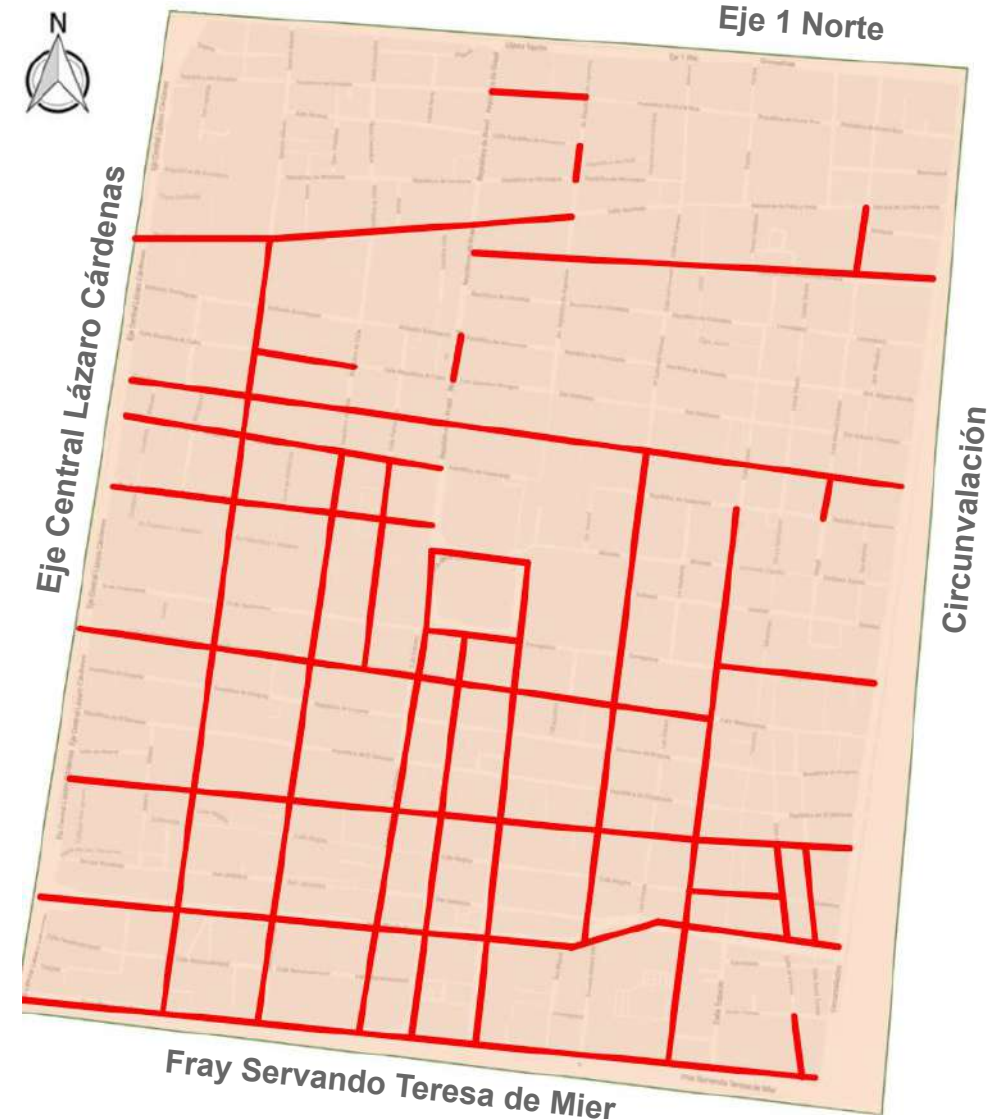

SACMEX Drenaje | Reporte Fotográfico

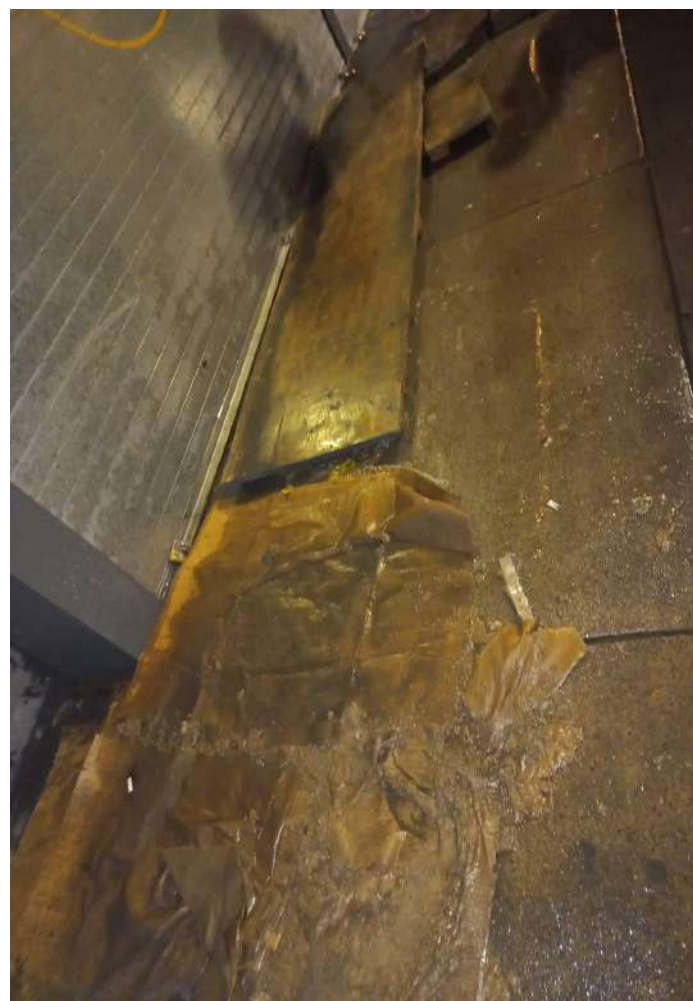

ESCRITO DE CONFORMIDAD

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO | SACMEX | SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
 DIRECCIÓN GENERAL DE DRENAJE, TRATAMIENTO Y REUSO
 SUBDIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DESAZOLVE
 OFICINA DE HIDRONUMÁTICOS CENTRO


FOLIO No. _____
 FECHA: 29 Diciembre 2021 TURNO: SD NUMERO: 38
 CALLE: Jose MA Izazaga
 ENTRE: Bolívar y Eje Central
 COLONIA: Centro ALCALDÍA: Cuauhtémoc
 TRABAJOS REALIZADOS: Limpieza de atarjeas pluviales con agua a presión y pozos de visitas.

OBSERVACIONES: El usuario solicita el cambio de albañal, debido a que está roto.
 NOTA: TODOS LOS TRABAJOS SON REALIZADOS SIN COBRO ALGUNO

ING. VICTOR JUAN LOPEZ ALONSO NOMBRE Y FIRMA DE ING. DE GUARDIA
Cesar... NOMBRE Y FIRMA DE CONFORMIDAD



Izazaga # 38 entre Bolívar y E. Central Desazolve de 80 m de atarjea 1 pozos de visitas y 3 coladera pluviales ; retiro de 0.5 m3 de azolve

SACMEX Drenaje | Reporte Fotográfico

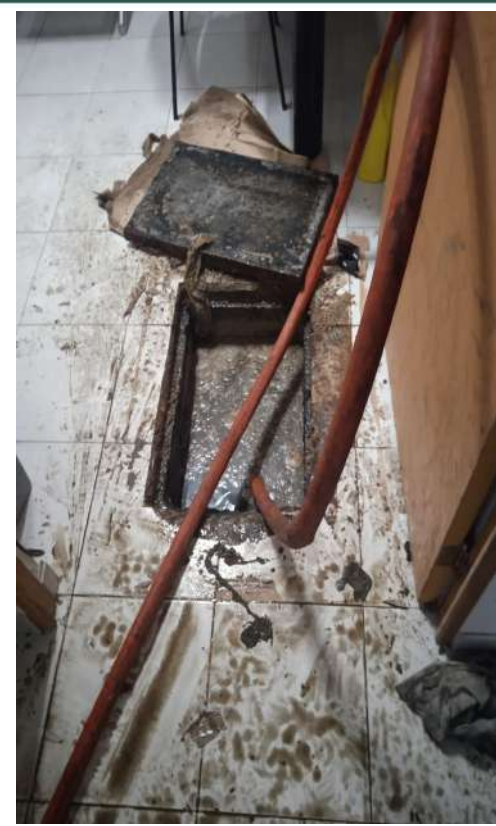

Rep. de Cuba # 86 ; Se presentó personal de Sacmex, pero el trabajo de desazolve lo realizó personal de la alcaldía Cuauhtémoc

SACMEX Drenaje | Reporte Fotográfico

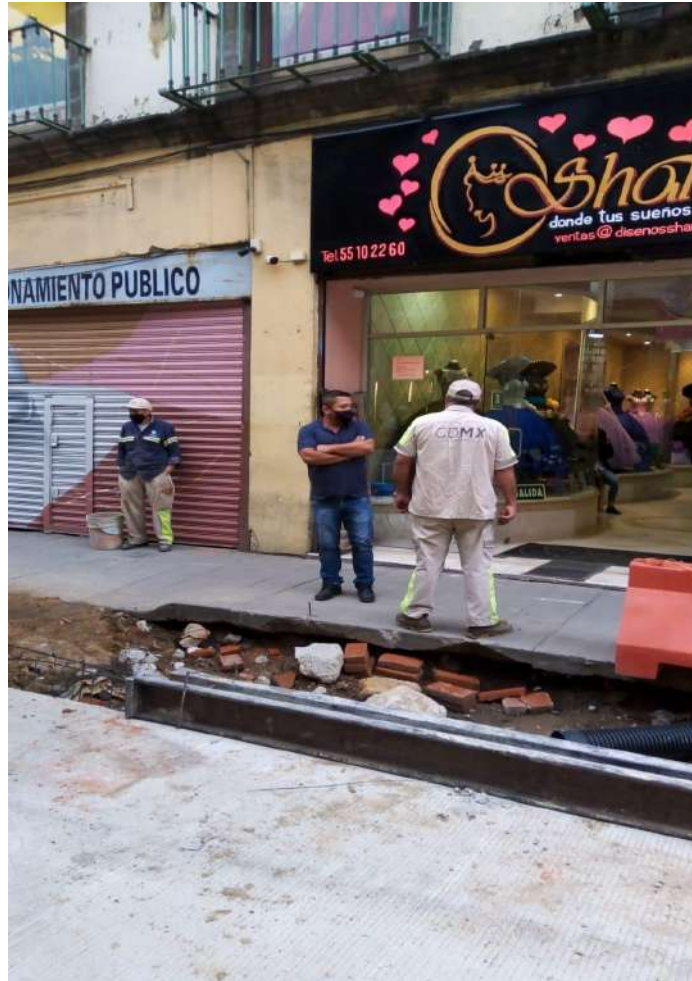

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO | SACMEX | SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Orden de Trabajo

Fuga de Agua Falta de Agua Mala Calidad Pipa 30

Fecha: 08-ENERO-2022 | FOLIO:

Fecha del Reporte: 15 de Noviembre

Lugar: REPUBLICA DE CHILE No. 5 COL CENTRO. CITA ALAS 7-00 HS

Causa: falta de Accesorio Hidráulico o se encuentra en Mal Estado, describir: TOMA TAPADA.

TA DE AGUA EN EL PREDIO		Observaciones del Usuario	
Diámetro de la Toma	1/2"	Lectura del Medidor	012483
Profundidad	0.400	Total de Niveles	3
Profundidad de Sistema	1.100	Cantidad de Viviendas	Asesoria
Profundidad Tanque Elevado	1.100	Población Aproximada	
Tipos de Manguera		Causa de la Deficiencia:	
Acciones Efectuadas		Observaciones del Usuario	
Se le dio explicación a la dirección de la toma y se le indicó que se debe esperar a que se restablezca el servicio de agua en esta block.		Se encuentra en servicio de agua restablecido	
Ingeniero Responsable DANIEL GUERRERO Nombre y Firma	Sobrestante Nombre y Firma	Firma de Conformidad del Usuario Nombre y Firma	

Rep. de Chile # 5 ; Se presenta personal de agua potable, se hace la purga en toma domiciliaria y queda atendida quedando conforme el usuario



Secretaría de Obras y Servicios

Dirección General de Obras de Infraestructura Vial



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
OBRAS Y SERVICIOS

Fechas de Conclusión de Obras

Para Inauguraciones y Visitas

OBRA	ALCALDÍA	AVANCE FÍSICO	FECHA DE TERMINO REAL	COMENTARIOS
CALLE ZARCO TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y RECONFIGURACIÓN	CUAUHTÉMOC	100.00%	INAUGURADA	Sin comentarios
SANTA MARIA LA REDONDA NORTE TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y RECONFIGURACIÓN	CUAUHTÉMOC	100.00%	INAUGURADA	Sin comentarios
AV. BALDERAS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y RECONFIGURACIÓN	CUAUHTÉMOC	100.00%	INAUGURADA	Trabajos de Urbanismo Táctico en colindancia con Plaza Solidaridad y Ciudadela por licitar. Temas revisados con el INAH y SEMOVI por ser área patrimonial
TACUBA	CUAUHTÉMOC	100.00 %	18/10/2021	Concluida
5 DE MAYO	CUAUHTÉMOC	100.00 %	04/10/2021	Concluida
PLAZA EMPEDRADILLO	CUAUHTÉMOC	77.88 %	30/12/2021	En ejecución
PLAZA SOLIDARIDAD	CUAUHTÉMOC	89.66%	15/12/2021	En ejecución
PLAZA MARTÍ	CUAUHTÉMOC	99.00 %	30/11/2021	En ejecución
SAN HIPÓLITO (MINA-HÉROES-VIOLETA-SAN FERNANDO Y AV. HIDALGO)	CUAUHTÉMOC	68.18 %	30/12/2021	En ejecución
REPÚBLICA DE CHILE	CUAUHTÉMOC	81.06 %	30/12/2021	En ejecución

Obra Inaugurados

Obra concluida sin inaugurar

OBRA	ALCALDÍA	AVANCE FÍSICO	FECHA DE TERMINO REAL	COMENTARIOS
SAN ILDEFONSO Y JUSTO SIERRA	CUAUHTÉMOC	51.86 %	30/12/2021	En ejecución
REFORMA, DE AV. HIDALGO A GLORIETA VIOLETA	CUAUHTÉMOC	70.00 %	30/12/2021	En ejecución
URBANISMO TÁCTICO EN BALDERAS – PLAZA SOLIDARIDAD	CUAUHTÉMOC	100.00 %	30/12/2021	En solicitud de pintura
URBANISMO TÁCTICO EN BALDERAS – CIUADDELA Y EMILIO DONDE	CUAUHTÉMOC	100.00 %	15/12/2021	Se concluye durante la presente semana, se proporcionó plano de la plaza a la ACH para planificar distribución de comercio ambulante
PROYECTO LAGUNILLA	CUAUHTÉMOC	100.00 %	31/12/2021	En ejecución proyecto

Obra Inaugurados

Obra concluida sin inaugurar

Concluida



Alcaldía

Cuauhtémoc

Presupuesto

4.73 mdp

Periodo original

Junio - Octubre

Avance

100.00 %


Fecha de conclusión

Concluida-Oct 2021

Inauguración o visita

Por programar

Concluida. En Av. 20 de noviembre se espera proyecto para adecuar lanzadera.

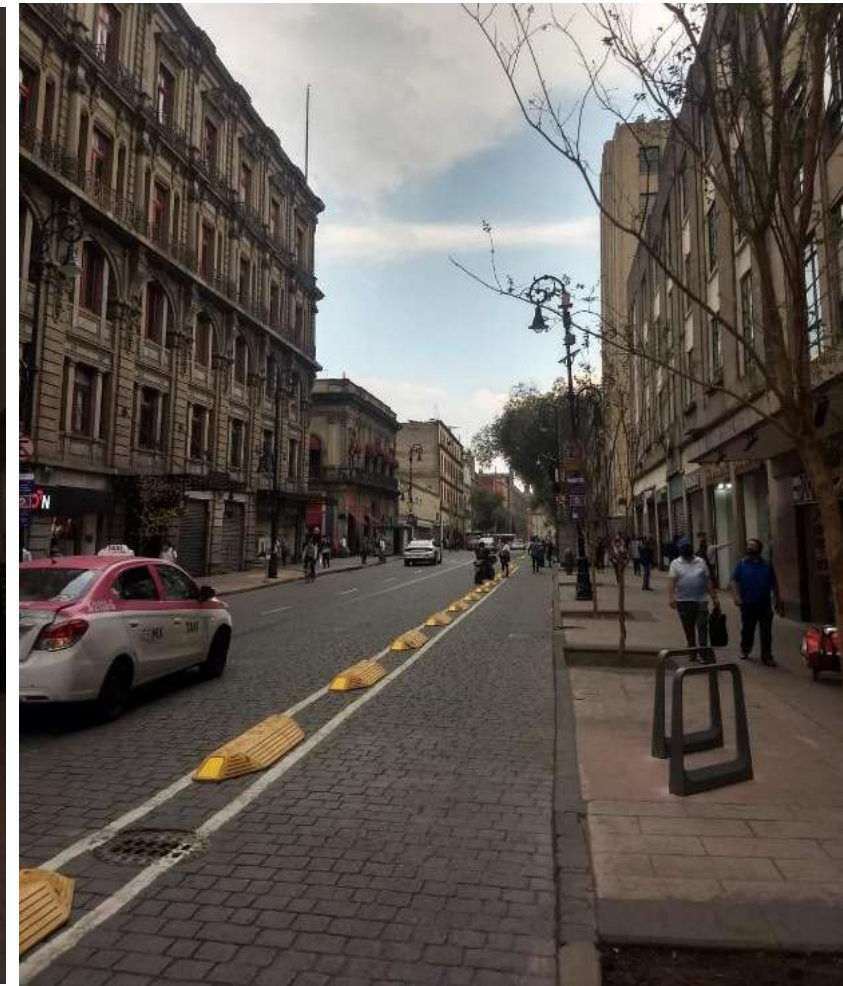

Alcaldía

Cuauhtémoc

Presupuesto

5.12 mdp

Periodo original

Junio - Octubre

Avance

100.00 %

Fecha de conclusión

Concluida-Oct 2021

Inauguración o visita

Por programar

PLAZA DEL EMPEDRADILLO-OBRA NUEVA Y MANTENIMIENTO



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



REVO concluido, se colocan pisos en zona ampliada de plaza como área peatonal, se realizan preparaciones para instalaciones, rejillas, mobiliario y mantenimiento en área actual. Tema de adquisiciones de mobiliario y colocación del mismo en proceso

Alcaldía

Cuauhtémoc

Presupuesto

9.98 mdp

Periodo original

Octubre - Diciembre

Avance General


77.88 %

Fecha de conclusión

04/02/2022

Inauguración o visita

Por programar

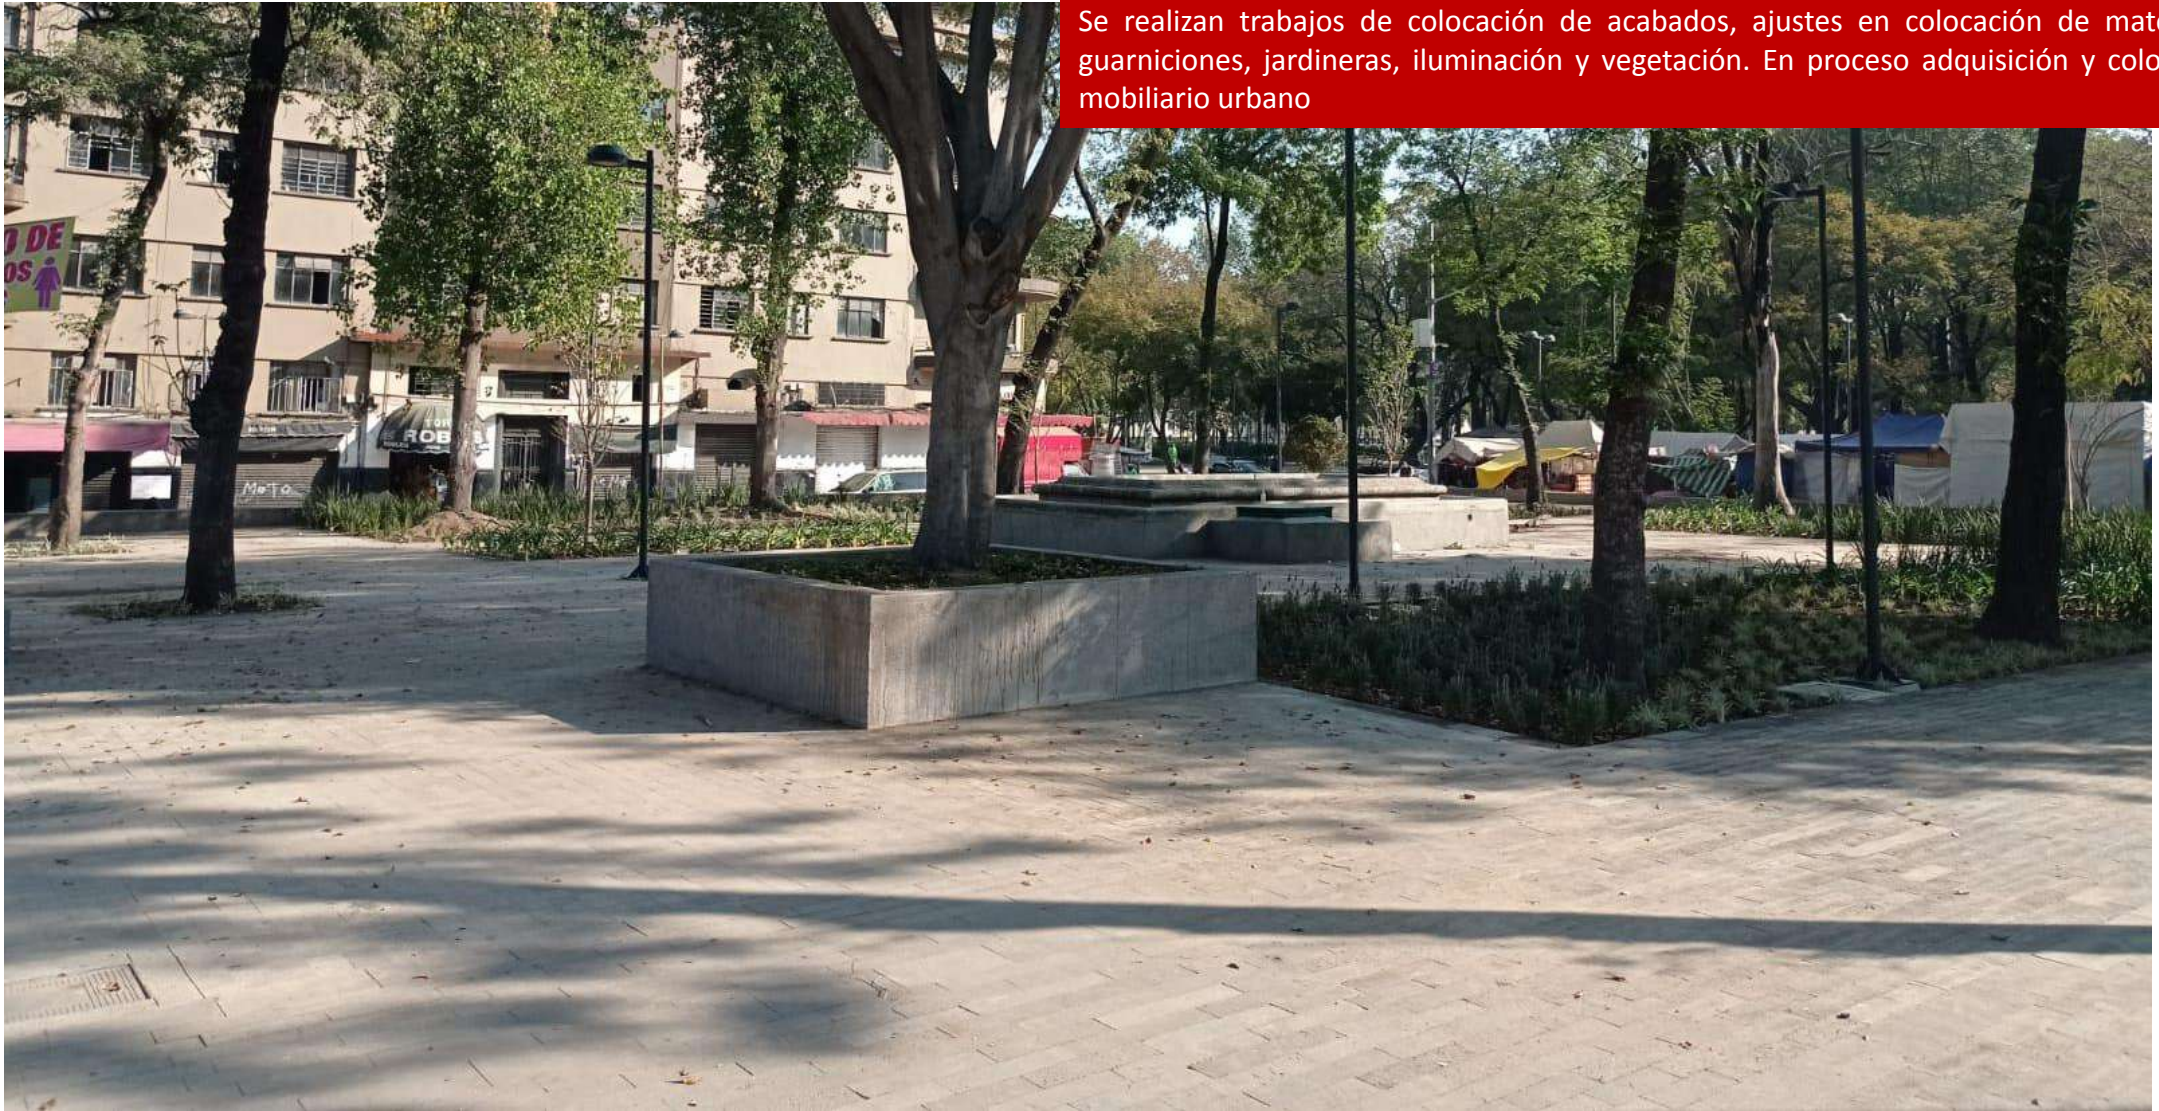

Se realizan trabajos de colocación de acabados, ajustes en colocación de materiales en guarniciones, jardineras, iluminación y vegetación. En proceso adquisición y colocación de mobiliario urbano

Alcaldía

Cuauhtémoc

Presupuesto

5.16 mdp

Periodo original

Agosto - Diciembre

Avance General


89.66 %

Fecha de conclusión

04/02/2022

Inauguración o visita

Por programar

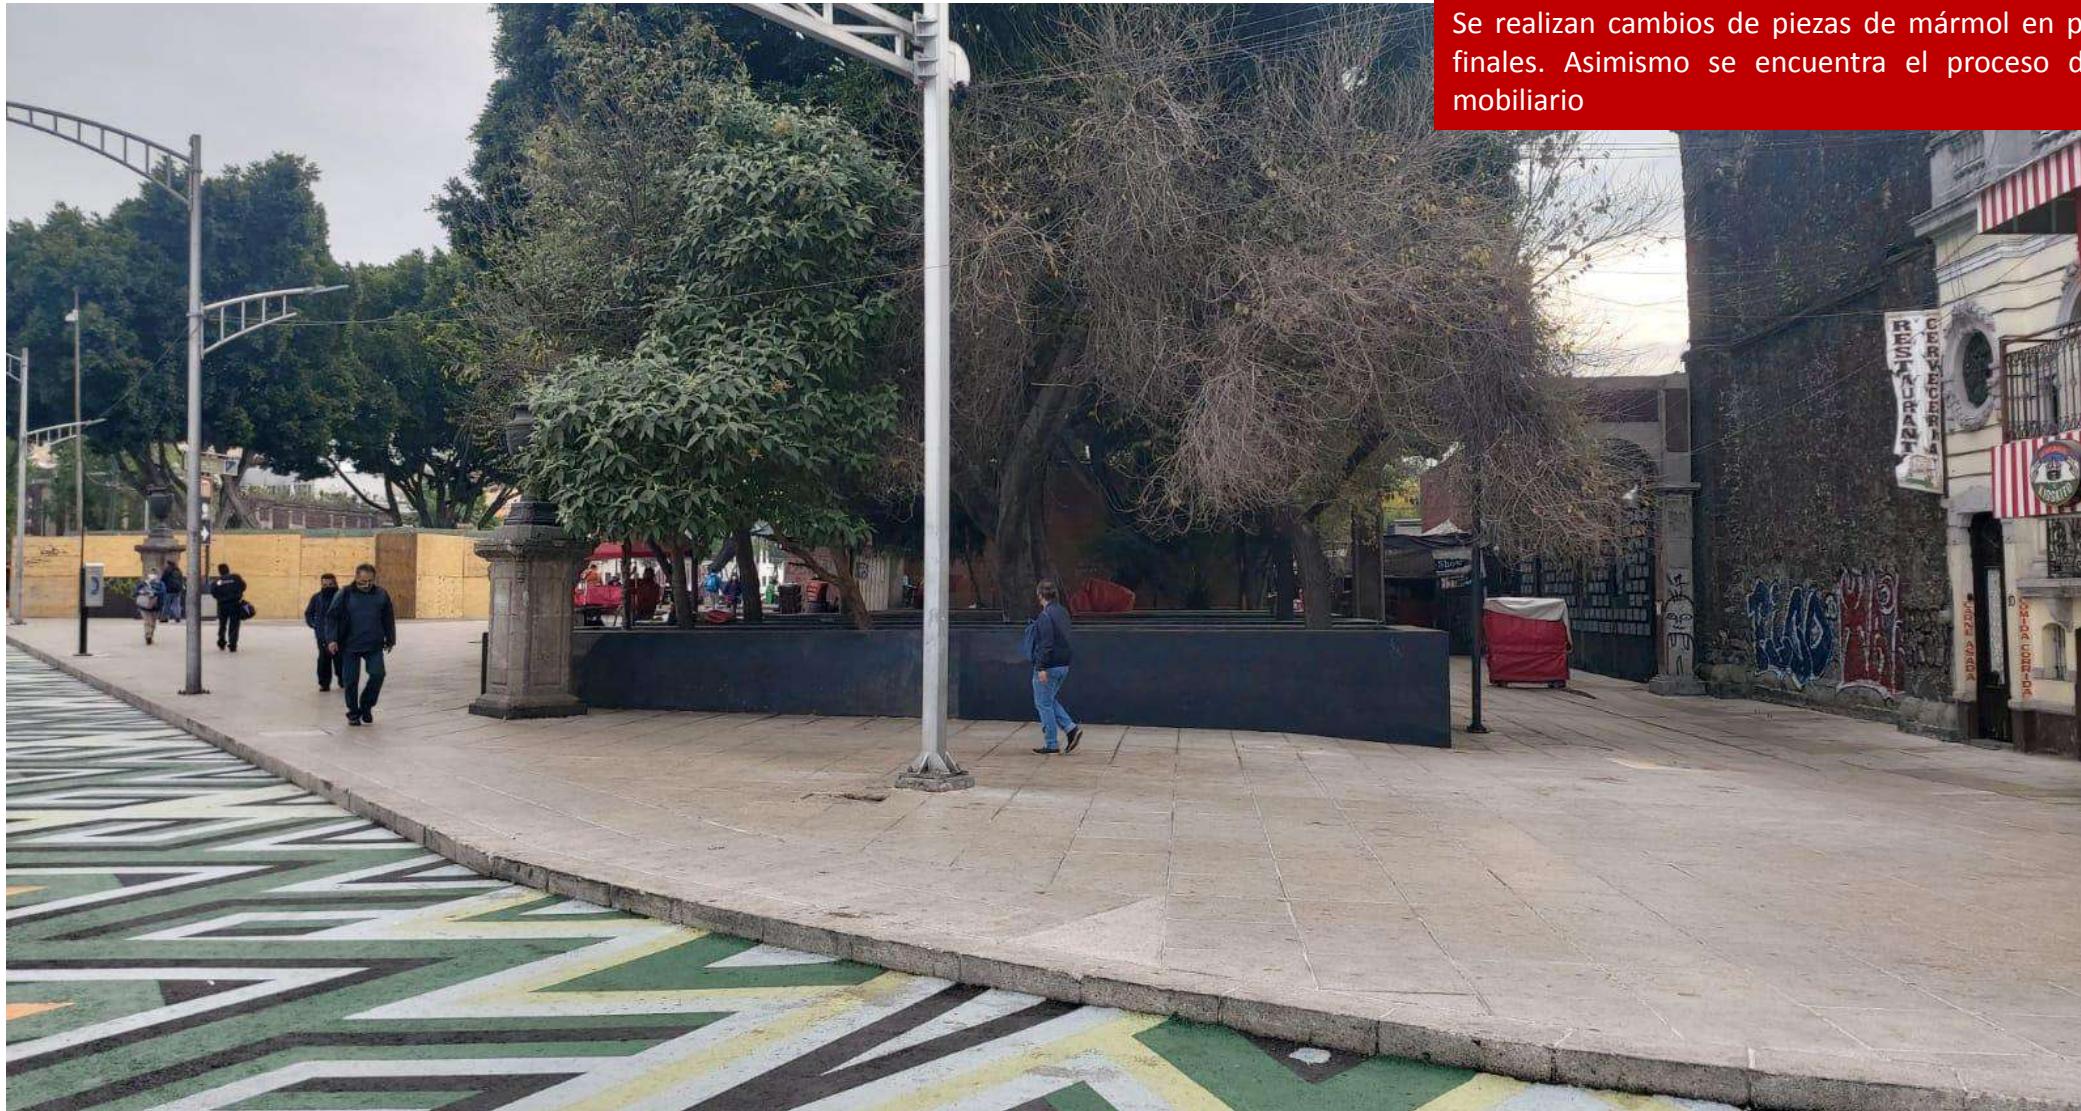

Se realizan cambios de piezas de mármol en pasillos de la plaza. En limpiezas finales. Asimismo se encuentra el proceso de adquisición y colocación de mobiliario

Alcaldía

Cuauhtémoc

Presupuesto

3.45 mdp

Periodo original

Agosto - Diciembre

Avance General

99.00 %



Fecha de conclusión

04/02/2022

Inauguración o visita

Por programar

Continúan acciones de obra inducida de instalaciones de media y baja tensión, colocación de mr-45 en arroyo vehicular. Se colocan acabados, tapas de accesorios y mobiliario en zonas de mayor avance

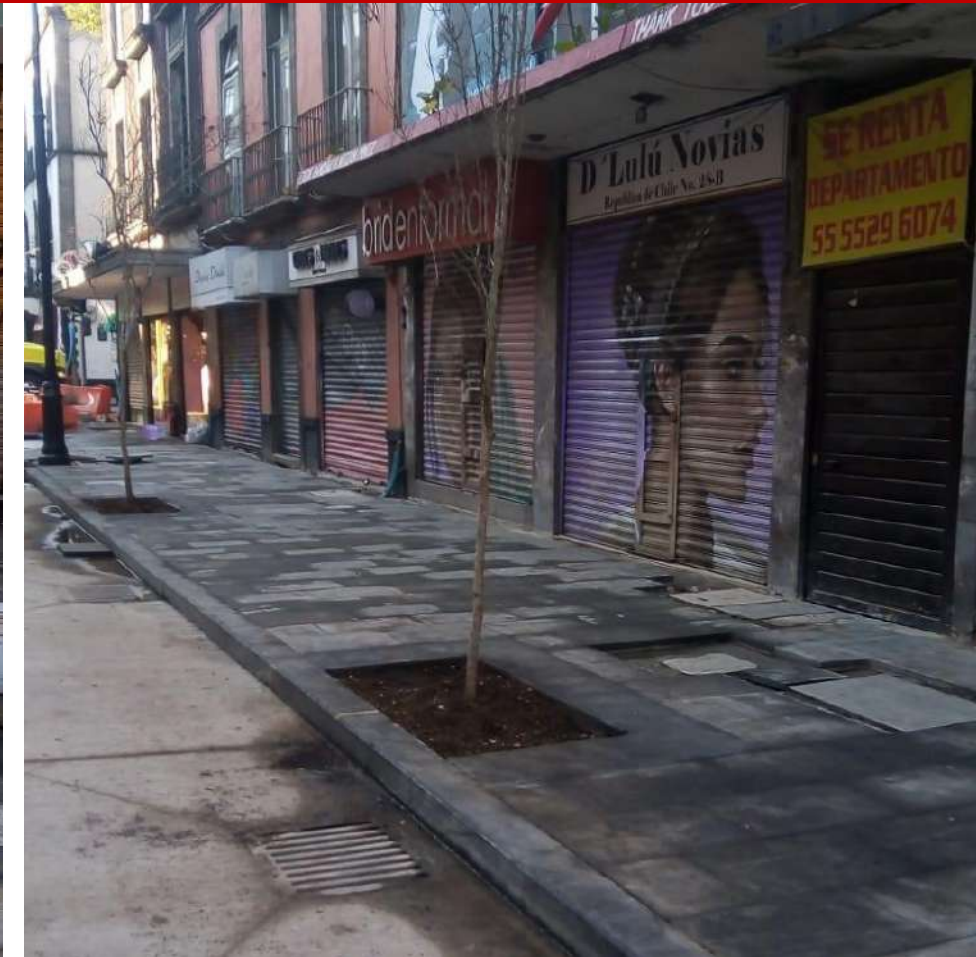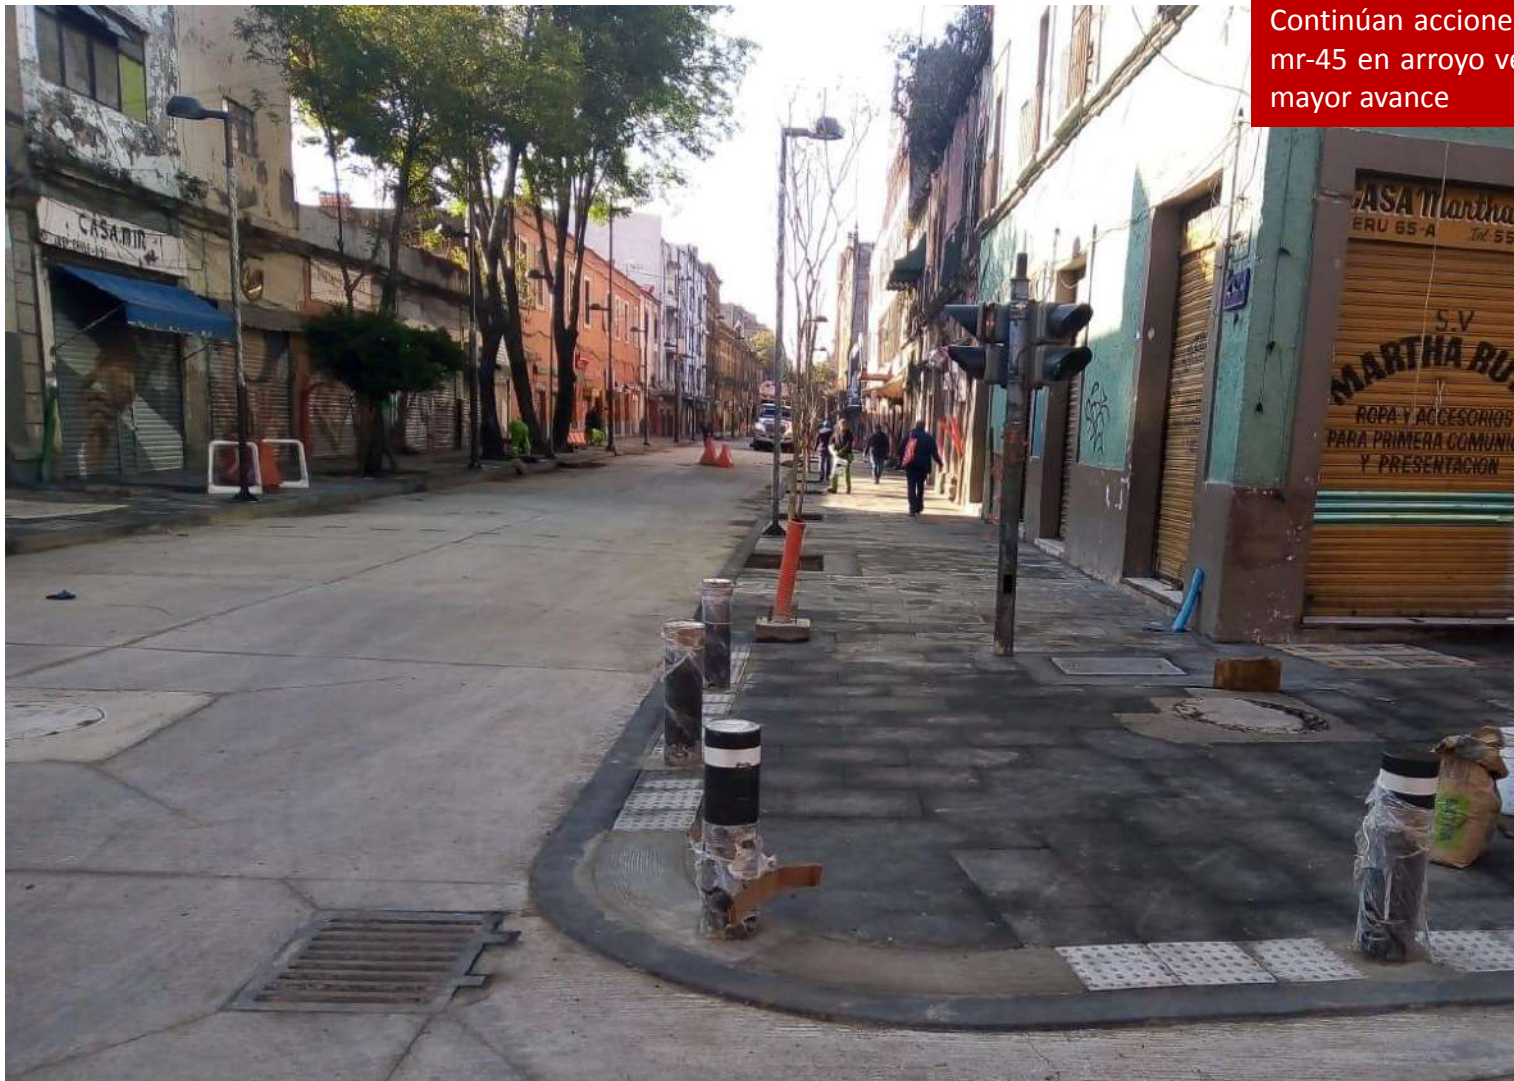

Alcaldía
Cuauhtémoc

Presupuesto
22.84 mdp

Periodo original
Agosto - Diciembre

Avance
81.06 %


Fecha de conclusión
21/Ene/2022

Inauguración o visita
Por programar

POLÍGONO SAN HIPÓLITO



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

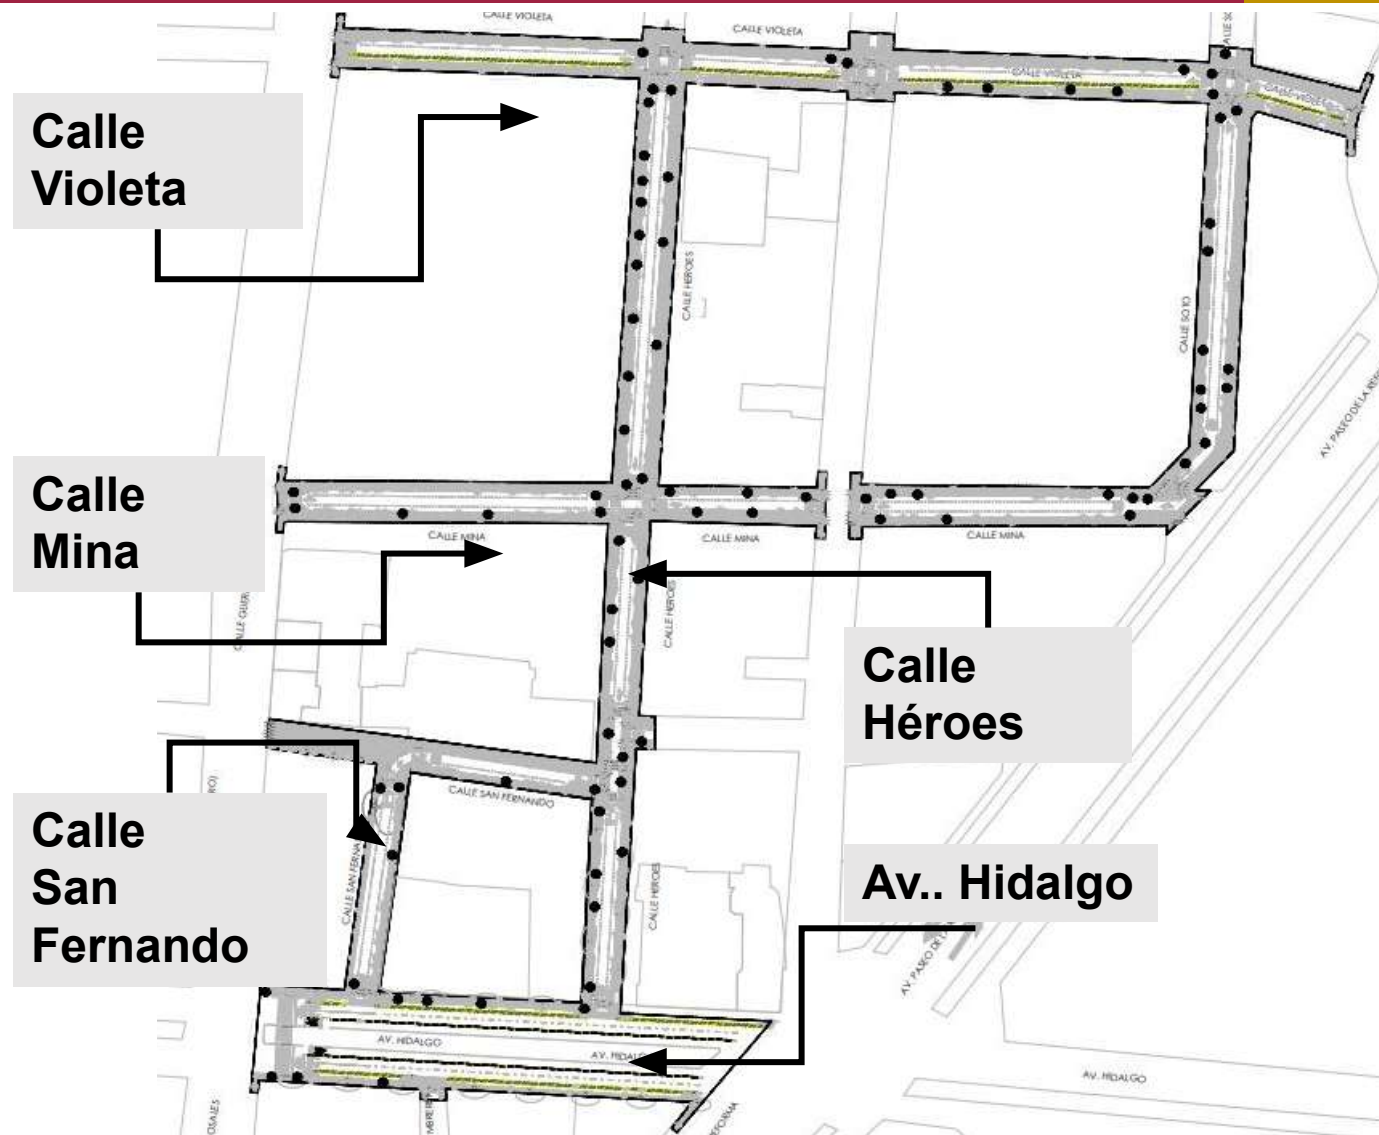

Calle Violeta

Calle Mina

Calle San Fernando

Calle Héroes

Av. Hidalgo

Alcaldía

Cuauhtémoc

Presupuesto

62.99 mdp

Periodo original

Agosto - Diciembre

Avance General

68.18 %

Fecha de conclusión

31/Ene/2022

Inauguración o visita

Por programar

Se realizan trabajos de levantamiento topográfico, trazo y nivelación, demoliciones, y trabajos en colado de guarniciones, colocación de acabados en banquetas, y obra de pavimentación, además se coloca vegetación.



POLÍGONO SAN HIPÓLITO - HÉROES

Se realiza levantamiento topográfico, trazo y nivelación, se colocan acabados. Se abre otro frente de trabajo para colocar instalación y recibir acabados, se realizan limpiezas en frentes con mayor avance y detallando para recibir tapas de registros. Se lleva a cabo pavimentación de la vialidad



Se realiza levantamiento topográfico, trazo y nivelación en secciones para colocación de rellenos fluidos para acabados en banquetas y colado de, colocación de vegetación y las instalaciones.



POLÍGONO SAN HIPÓLITO – SAN FERNANDO



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

Se realizan trabajos en instalaciones y colocación de acabados. Se realizó acuerdo con el INAH para criterios para restitución de piso original sobre banquetas de portales colindantes al Panteón. Se realizó pavimentación, en proceso colocación de mobiliario urbano, detalles y limpiezas finales




POLÍGONO SAN HIPÓLITO – AV. HIDALGO



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

Se colocan instalaciones derivado de la obra inducida, se ejecutan acabados en banqueta y guarniciones y colocación de vegetación, así como colocación de mobiliario

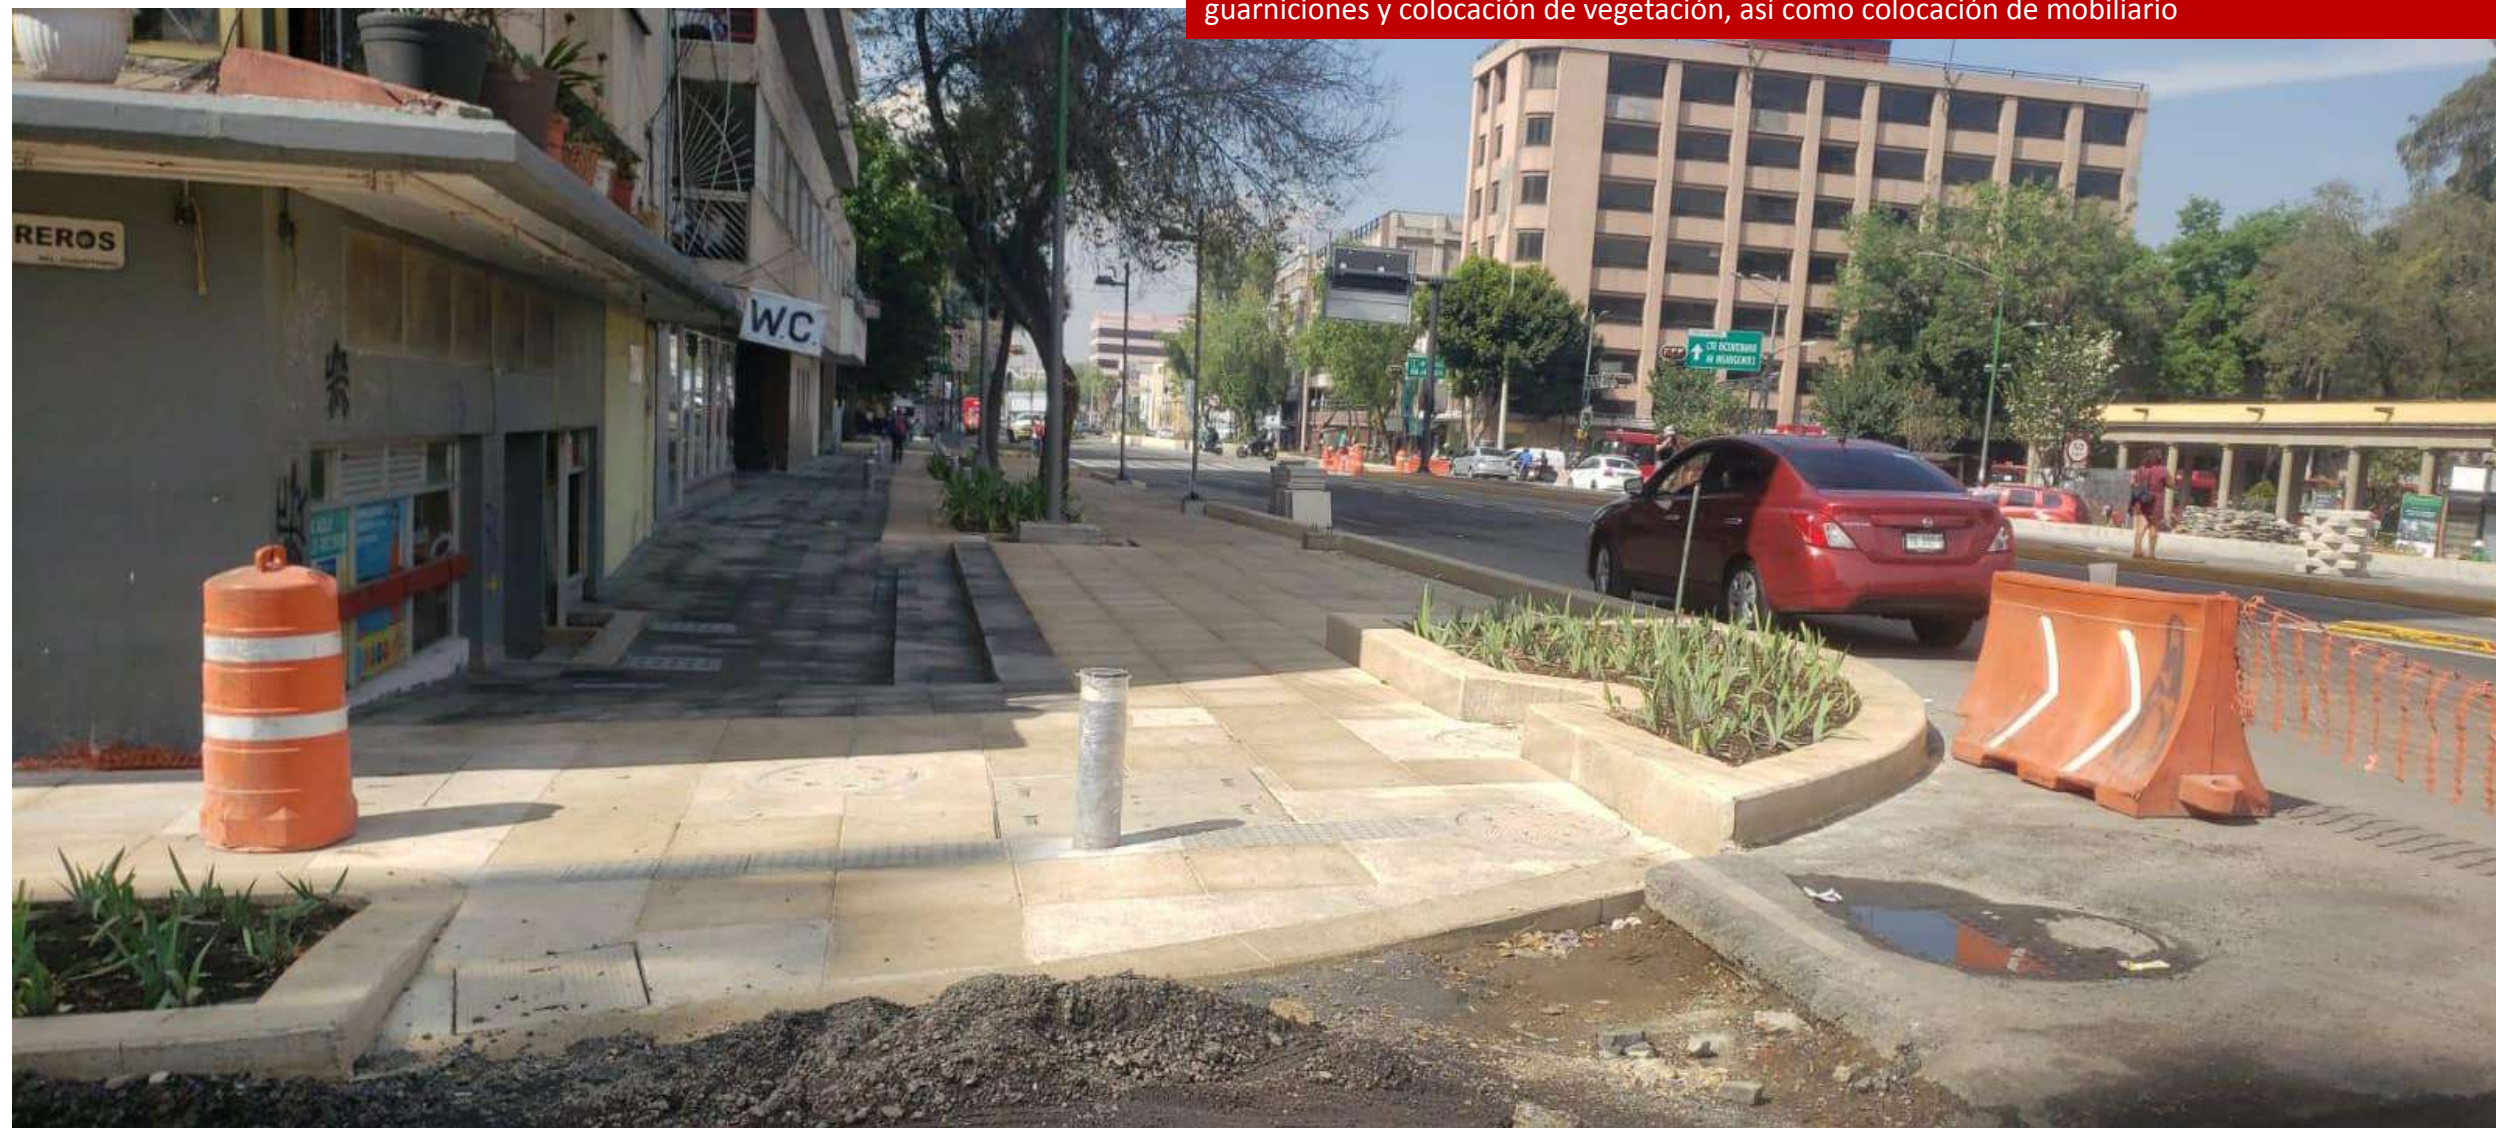

SAN ILDEFONSO Y JUSTO SIERRA

Se realizan trabajos de levantamiento topográfico para fabricación de guarniciones y banquetas, colocación de relleno fluido en área de banqueta, acabados y preparación de instalaciones.



Alcaldía

Cuauhtémoc

Presupuesto

6.04 mdp

Periodo original

Septiembre - Diciembre

Avance General

51.86 %

Fecha de conclusión

31/Ene/2022

Inauguración o visita

Por programar

REFORMA (AV. HIDALGO A GLORIETA VIOLETA)



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

Se realiza levantamiento topográfico, trazo y nivelación, demoliciones de guarniciones y banquetas, colocación de adocreto en área de banquetas y piezas prefabricadas en camellón, además de instalaciones y mobiliario urbano.

Para 2022, se programó obra de GLORIETA DE VIOLETA A EJE 1 NORTE



Alcaldía

Cuauhtémoc

Presupuesto

56.43 mdp

Periodo original

Sep-Dic 2021

Avance

70.00 %

Fecha de conclusión


31/Ene/2022

Inauguración o visita

Iniciando

AV. BALDERAS – URBANISMO TÁCTICO - SOLIDARIDAD

Concluida. Se colocará mobiliario similar al de la plaza, en proceso de adquisición



Estado Actual de Balderas (Entre Juárez e Hidalgo)


Alcaldía	Presupuesto	Periodo original	Avance	Fecha de conclusión	Inauguración o visita
Cuauhtémoc	1.2 mdp	Octubre-Diciembre	100.00 %	Concluida-Dic 2021	Por programar

AV. BALDERAS – URBANISMO TÁCTICO - CIUDADELA



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

Concluida

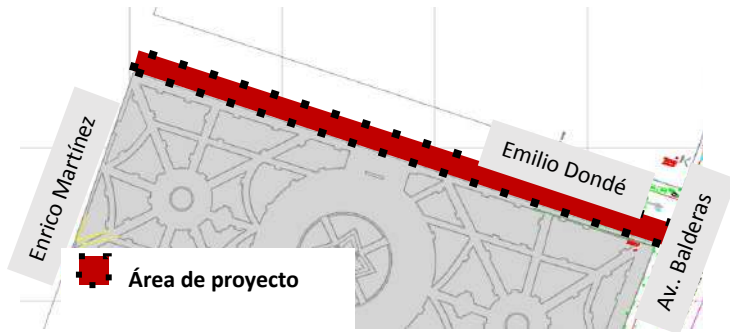

Alcaldía

Cuauhtémoc

Presupuesto

0.90 mdp

Periodo original

Octubre-Noviembre

Avance

100.00 %

Fecha de conclusión

Concluida-Nov 2021


Inauguración o visita

Por programar

Se realizó diagnóstico del polígono completo, se evalúan posibilidades de adecuaciones geométricas con las áreas normativas. Se esperan resultados de esta revisión, para obtener vistos buenos y detonar obra en el 2022 en secciones priorizadas.

Para 2022, se programó obra en REPUBLICA DE HODUNRAS, DE ALLENDE A REP. DE ARGENTINA

Croquis de localización

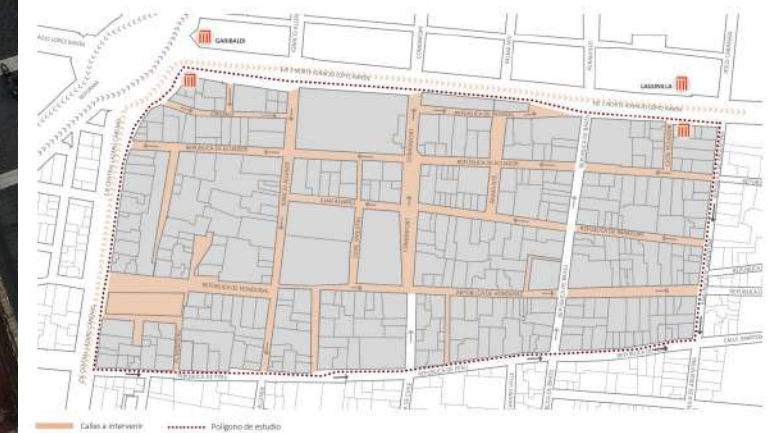

Alcaldía

Cuauhtémoc

Presupuesto

1.90 mdp

Periodo original

Noviembre-Diciembre

Avance

100.00 %

Fecha de conclusión

Concluido-Dic 2021

Inauguración o visita

Para revisión

PROYECTO LAGUNILLA – IMAGEN OBJETIVO

República de Honduras



Estado Actual



Imagen objetivo



Secretaría de Obras y Servicios

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

SOS-DGCOP | Indicadores - Construcción de PILARES “La Pulga”

AL 09 DE ENERO DE 2022

DATOS GENERALES CONTRATISTA

No. CONTRATO	DGCOP-LPN-L-1-275-20
CONTRATISTA	INOVACION Y PROMOCION DE LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.
PLAZO DE EJECUCIÓN	149 DIAS CALENDARIO
FECHA DE INICIO	02/10/2020
FECHA DE TEMINACIÓN	25/09/2021
SUPERFICIE DEL TERRENO	3,076.31
AREA DE CONSTRUCCIÓN TOTAL	2,214.00 M2
AREAS EXTERIORES	3,625.00 M2

ESTADO FINANCIERO

IMPORTE DEL CONTRATO S/IVA	\$	19,989,459.25
IMPORTE ESTIMADO (PAGADO) S/IVA		\$16,470,653.98
IMPORTE POR ESTIMAR S/IVA	\$	3,518,805.27


ANTICIPO

ANTICIPO OTORGADO		SIN ANTICIPO
ANTICIPO AMORTIZADO	\$	-
ANTICIPO POR AMORTIZAR	\$	-

RESIDENTE:


ARQ. GRACIELA DUARTE CALIXTO

J.U.D. DE SUPERVISION DE CONSTRUCCION C2

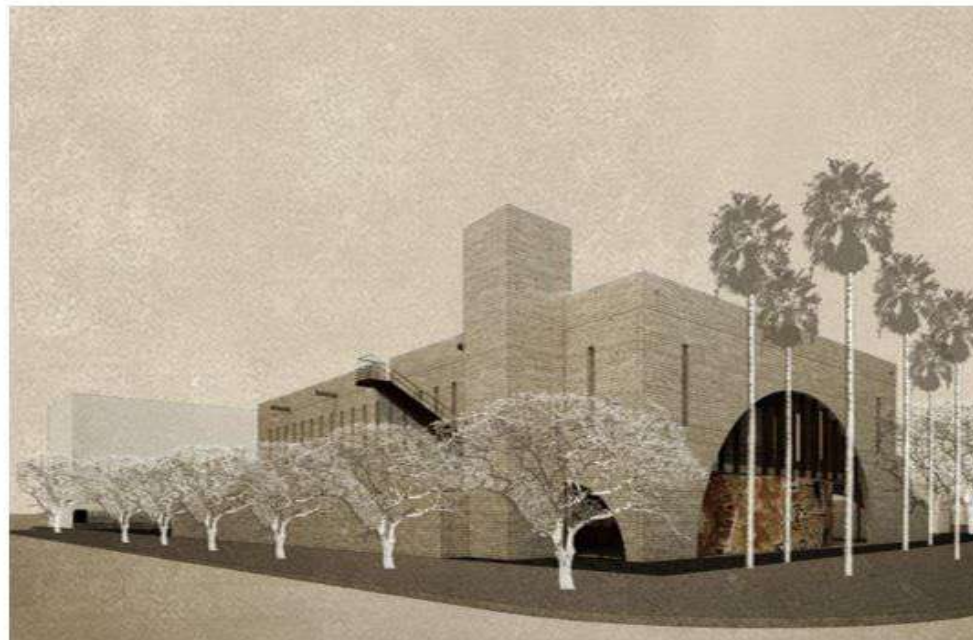


PERSPECTIVA DEL PROYECTO

SOS-DGCOP | Indicadores - Construcción de PILARES “La Pulga”

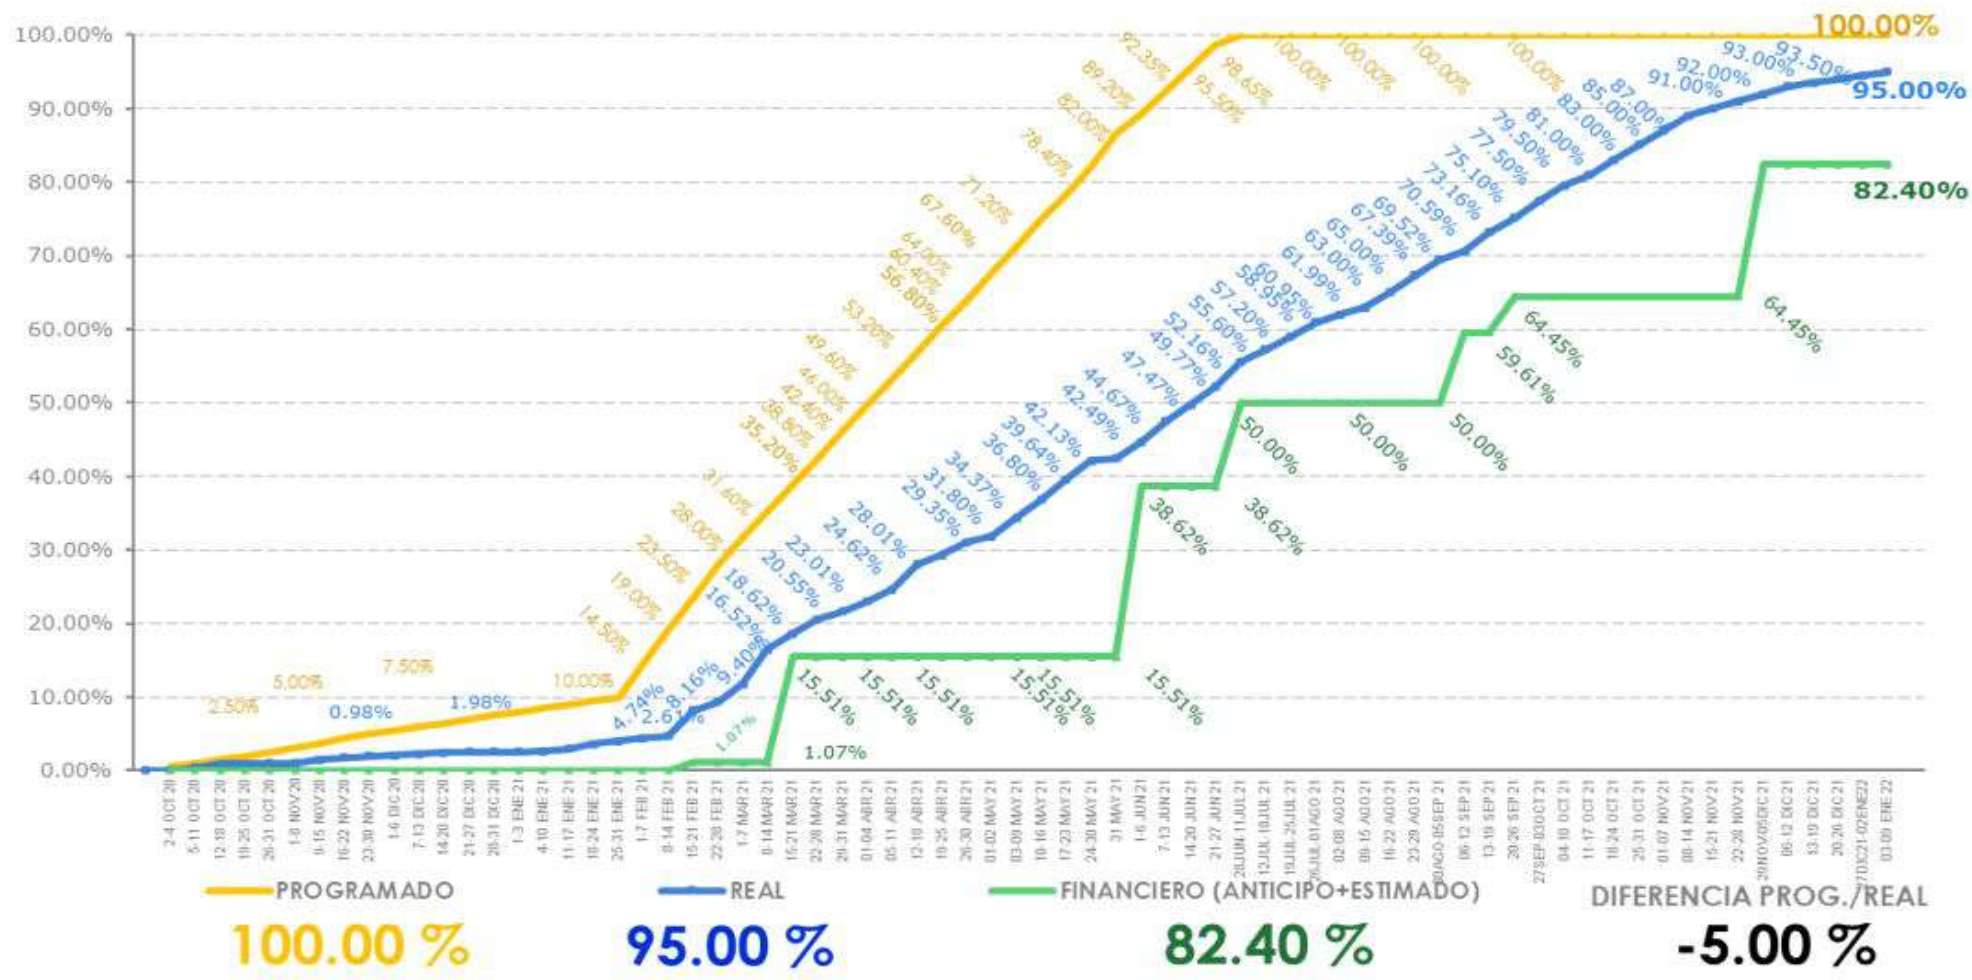

SOS-DGCOP | Reporte fotográfico - Construcción de PILARES “La Pulga”

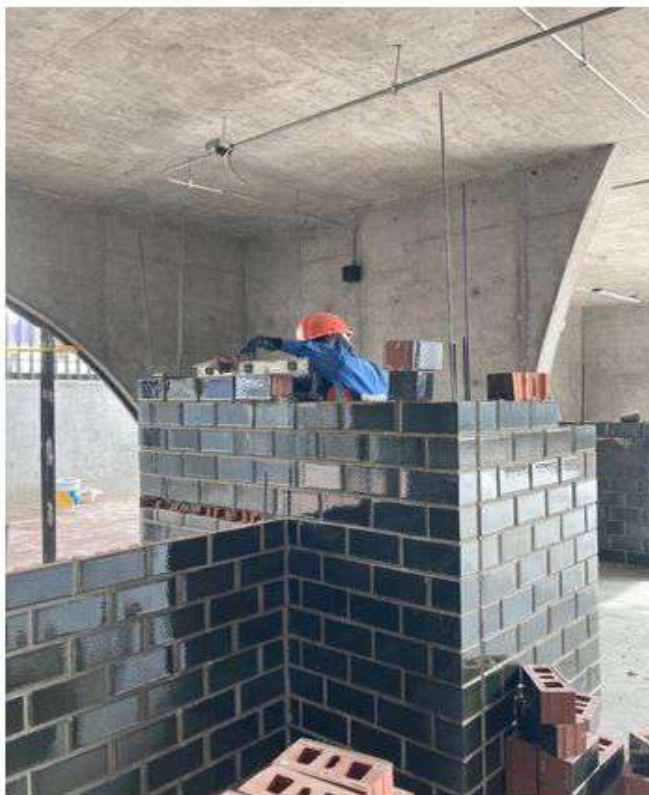

**ELABORACION DE MUROS INTERIORES DE LA PLANTA BAJA Y NIVEL PRIMERO
A BASE DE TABIQUE ESMALTADO SANTA JULIA 10X10X20CM. COLOR VERDE PLATA
EN AREAS DE ACCESO (EJES 1/B-C) Y SITE (EJES C/3-4)**

SOS-DGCOP | Reporte fotográfico - Construcción de PILARES “La Pulga”




**CONFORMACIÓN DE NIVELES EN JARDÍN Y HUERTO
CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN (EJES 7-8/E-F)**

SOS-DGCOP | Reporte fotográfico - Construcción de PILARES “La Pulga”



TRABAJOS DE RELLENO CON MATERIA PRODUCTO DE EXCAVACION EN AREAS DE COMERCIO (EJES 7-B Y F-2)

SOS-DGCOP | Reporte fotográfico - Construcción de PILARES “La Pulga”

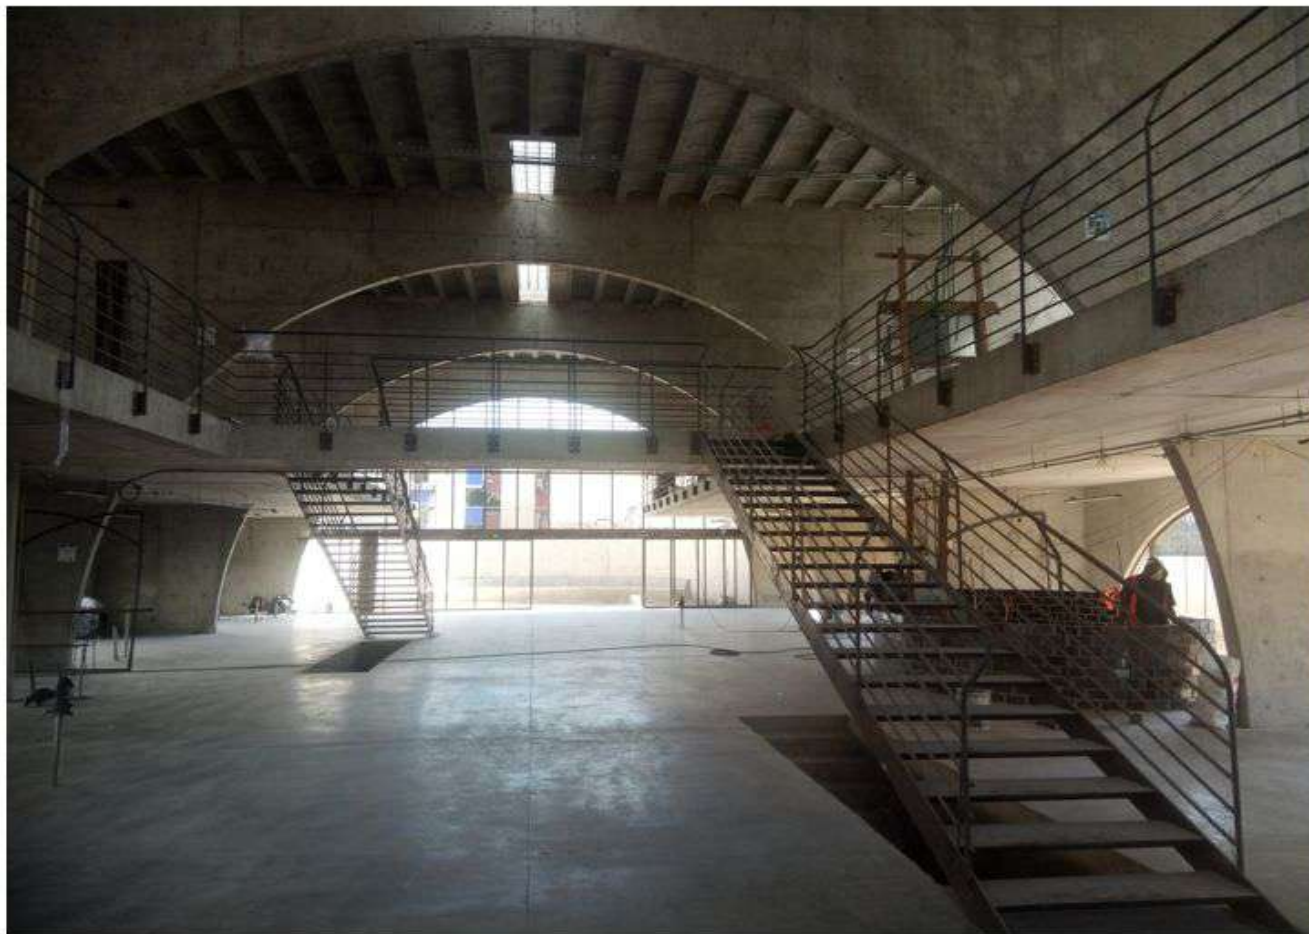

**VISTA INTERIOR
PLANTA BAJA DEL EDIFICIO**

SOS-DGCOP | Reporte fotográfico - Construcción de PILARES “La Pulga”



**VISTA INTERIOR
NIVEL PRIMERO DEL EDIFICIO**

SOS-DGCOP | Reporte fotográfico - Construcción de PILARES “La Pulga”



**VISTA
NIVEL AZOTEA DEL EDIFICIO**

SOS-DGCOP | Reporte fotográfico - Construcción de PILARES “La Pulga”



VISTA PANORAMICA NORESTE



VISTA PANORAMICA NOROESTE

SOS-DGCOP | Reporte fotográfico - Construcción de PILARES “La Pulga”



VISTA PANORAMICA SURESTE



VISTA PANORAMICA SUROESTE

SOS-DGSUS Alumbrado Público | Indicadores

Tema	Indicador	Periodicidad	Semana 53 Al 31 de diciembre	Semana 01 Al 7 de enero	Próximo reporte
Alumbrado Público	Número de luminarias reparadas en vías del PA del CH	Semanal	57	46	25 de enero
				Total 103	



SOS-DGSUS Alumbrado Público | Anexo de indicadores

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA 53

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLINIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Francisco I. Madero	Isabel la Católica y Palma	CENTRO	1	Reconexión de líneas	Luminaria apagada
Plaza de la Constitución	Calle Francisco I. Madero y Calle 5 de Mayo	CENTRO	24	Reconexión de líneas	Circuito apagado
	Monte de Piedad y 16 de Septiembre	CENTRO	2	Reconexión de líneas	Luminaria apagada
Av. Juárez	Humboldt y Av. Balderas	CENTRO	2	Reconexión de líneas	Luminaria apagada
	Iturbide y Humboldt	CENTRO	14	Cambio de fotocelda.	Circuito encendido de día
		SUBTOTAL	43		

SOS-DGSUS Alumbrado Público | Anexo de indicadores

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA 53

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLINIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Av. Juárez	López y Eje central Lázaro Cárdenas	CENTRO	1	Cambio de lampara	Luminaria apagada
Francisco I Madero	Condesa y Filomeno Mata	CENTRO	1	Reconexión de líneas	Luminaria apagada
Alameda Central	Av. Hidalgo y Av. Juárez	CENTRO	4	Cambio de balastro y reconexión de líneas	Luminarias apagadas
	Av. Hidalgo y Av. Juárez	CENTRO	8	Se realiza reconexión de líneas de alimentación.	Circuito Apagado
		SUBTOTAL	14		
		TOTAL	57		

SOS-DGSUS Alumbrado Público | Anexo de indicadores

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA 01



DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLINIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Av. Juárez	Av. Balderas y Calle Doctor Mora	CENTRO	1	cambio de lámpara	Luminaria Apagada
	Av. Balderas y Av. Azueta	CENTRO	25	Reconexión de líneas	Circuito Apagado
	Calle Humboldt y Av. Balderas	CENTRO	11	Reconexión de líneas	Circuito 24 horas.
Av. Hidalgo	Calle Dr. Mora y Calle Ángela Peralta	CENTRO	1	Cambio de balastro	Luminaria Apagada
Plaza de la Constitución	Calle Francisco I. Madero y Av. 5 de mayo	CENTRO	7	Reprogramación de control	Reflectores Apagados
Av. José María Pino Suárez	Calle Corregidora y Calle Venustiano Carranza	CENTRO	1	Cambio de lámpara	Luminaria Apagada
		TOTAL	46		

CALLE FRANCISCO I. MADERO



SE RECONECTAN LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN.

PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN

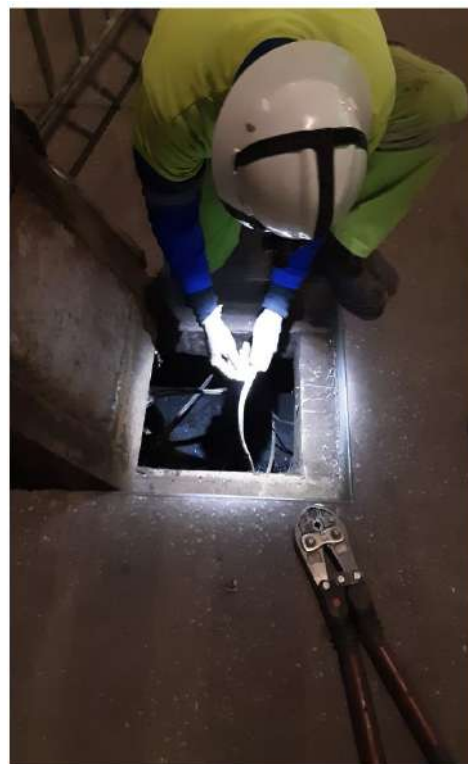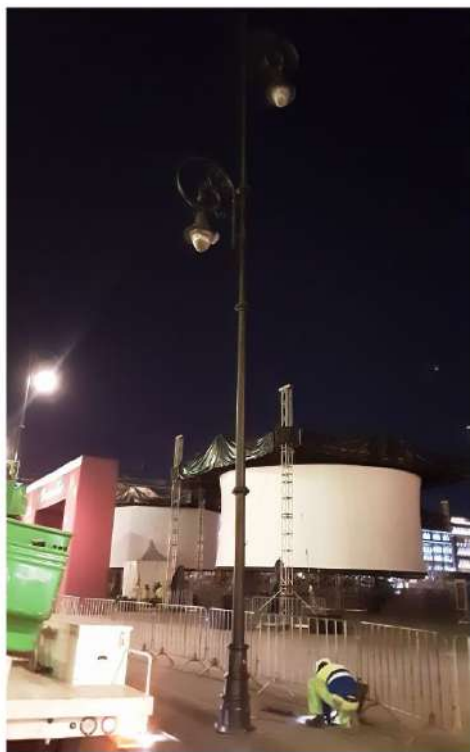

SE RECONECTAN LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN.

PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN



SE RECONECTAN CIRCUITO DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN.

AV. JUÁREZ



SE REALIZA RECONEXIÓN DE LINEAS

AV. JUÁREZ





SE REALIZA RECONEXIÓN DE LINEAS EN CIRCUITO.

ALAMEDA CENTRAL





SE REALIZA EL CAMBIA BALASTRO; RECONECTAN LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN.

ALAMEDA CENTRAL

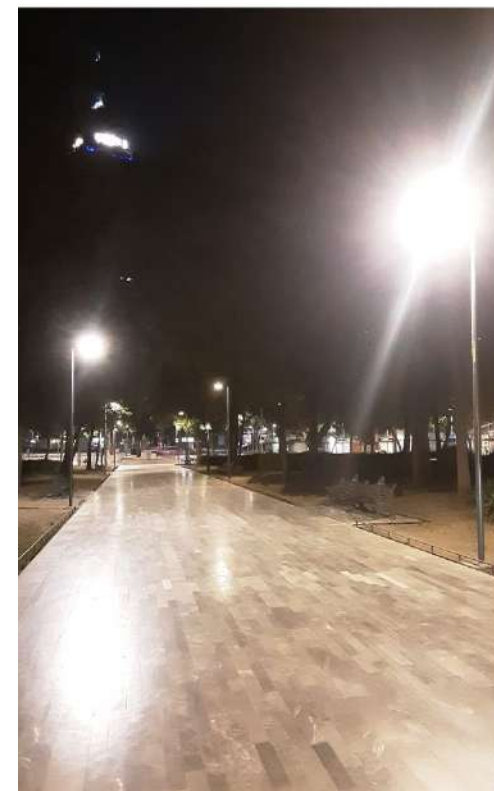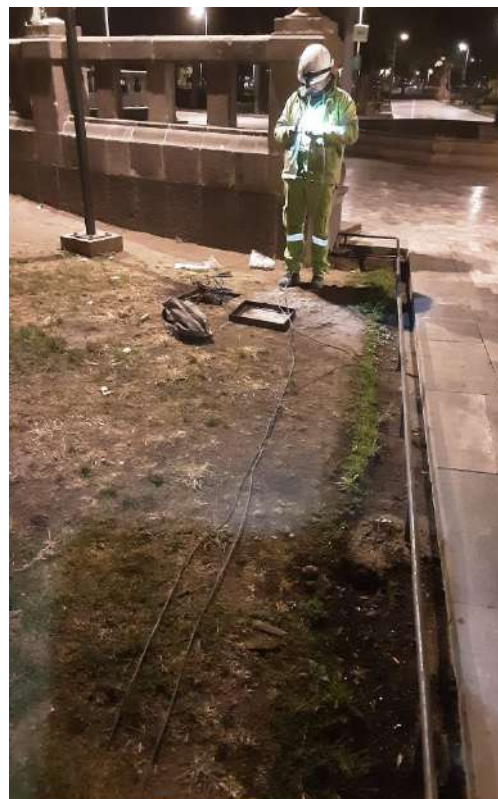

SE RECONECTAN LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN.

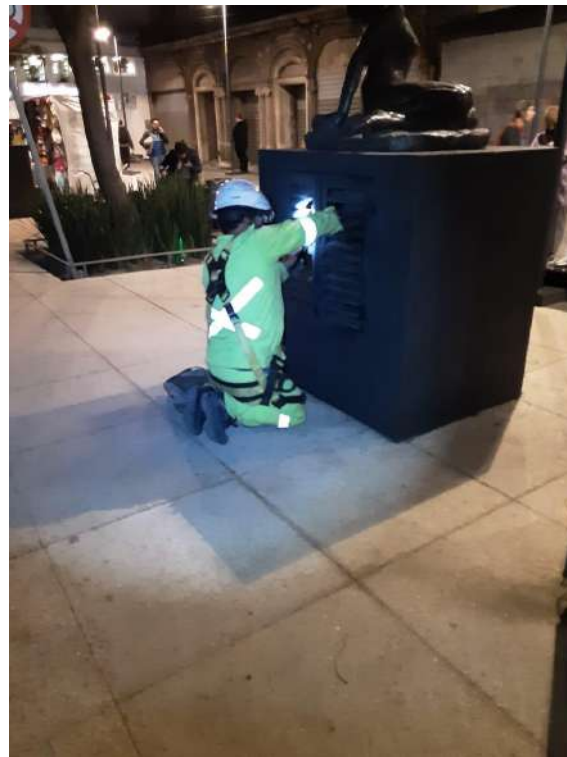AV. JUÁREZ

SE RECONECTAN LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN.

SOS-DGSUS Alumbrado Público | Gráficas de Indicadores

SEMANA 54

AV. HIDALGO



SE REALIZA CAMBIO DE BALASTRO

SOS-DGSUS Alumbrado Público | Gráficas de Indicadores

SEMANA 01


Av. JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ




SE REALIZA CAMBIO DE LÁMPARA



Secretaría de Obras y Servicios



Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad
Subdirección de Parques B I



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Indicadores

Tema	Indicador	Periodicidad	13/12 AL 26/12	27/12 AL 09/01	Próximo reporte
Limpieza	Kilómetros Barridos de guarnición en el perímetro "A" del Centro Histórico	Quincenal	12,312.160 Km	12,312.160 Km	25 de enero
Limpieza	Metros cuadrados Barridos de Banquetas en el perímetro "A" del Centro Histórico	Quincenal	23,955,400 m2	23,955,400 m2	
Limpieza	Metros Cuadrados Barridos de Plazas y Corredores en el perímetro "A" del Centro Histórico	Quincenal	12,711,468 m2	12,711,468 m2	

SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Indicadores

Tema	Indicador	Periodicidad	13/12 AL 26/12	27/12 AL 09/01	Próximo reporte
Limpieza	Kilómetros de Barrido Mecánico en el perímetro "A" del Centro Histórico	Quincenal	1,279.040 km	1,279.040 km	25 de enero
Limpieza	Metros cúbicos de residuos sólidos levantados en tiraderos clandestinos y recolección de residuos producto del barrido en el perímetro "A" del Centro Histórico	Quincenal	9,754 m3	9,884 m3	
Recolección de tierra	Metros cúbicos de tierra recolectada en el perímetro "A" del Centro Histórico	Quincenal	123.00 m3	113.25 m3	

SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Indicadores

Tema	Indicador	Periodicidad	13/12 AL 26/12	27/12 AL 09/01	Próximo reporte
Lavado de papeleras	Piezas de papeleras lavadas en el perímetro "A" del Centro Histórico	Quincenal	1,120 piezas	1,120 piezas	25 de enero
Lavado	Metros cuadrados lavados en Plazas, Calles, Corredores peatonales y semipeatonales en el perímetro "A" del Centro Histórico	Quincenal	619,939 m2	645,582 m2	
Lavado de sitios críticos	Sitios críticos lavados en el perímetro "A" del Centro Histórico	Quincenal	18 Sitios (255 promedio en la quincena)	18 Sitios (255 promedio en la quincena)	

SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Indicadores

Tema	Indicador	Periodicidad	13/12 AL 26/12	27/12 AL 09/01	Próximo reporte
Recolección tiraderos clandestinos	Recolección diaria de 25 tiraderos clandestinos en el Perímetro "A" del Centro Histórico	Quincenal	25 Tiraderos (350 promedio en la quincena)	25 Tiraderos (350 promedio en la quincena)	25 de enero
Retiro de chicles	Piezas de Chicles retiradas en el Corredor Madero y Plaza de la Constitución	Quincenal	8,603 piezas	3,659 piezas (Madero)	
Eliminación de grafiti	Metros Cuadrados de grafiti eliminado en el Perímetro "A" el Centro Histórico	Quincenal	325 m2	235 m2	

SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Indicadores

Tema	Indicador	Periodicidad	13/12 AL 26/12	27/12 AL 09/01	Próximo reporte
Retiro de propaganda	Piezas retiradas de propaganda en el Perímetro "A" el Centro Histórico	Quincenal	2,107 piezas	2,163 piezas	25 de enero
Desratización	Desratización en el Perímetro "A" y "B" del Centro Histórico		Colocación 3,900 Racumin pasta en una superficie de 135,240 m2, Rodilón Block 66, en una superficie de 1,310 m2 fumigación en un área de 7,080 m2 y colocación de 117 trampas Bell en un área de 4,130 m2		

SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Gráficas - Acciones preventivas con el personal por COVID-19

- Toma la temperatura todos los días en los tres turnos.
- Entrega de caretas, cubrebocas y guantes a toda la gente para su protección.




SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

ELIMINACIÓN DE GRAFITI

VIALIDAD	Cantidad	U.M.
SAN JERÓNIMO DE CORREO MAYOR A ALDACO	26	m2
DONCELES DE EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS A REPÚBLICA DE BRASIL	29	m2
CIRCUITO PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN FRENTE A PALACIO NACIONAL (PROTESTA)	180	m2
TOTAL	235	m2


SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

ELIMINACIÓN DE 55 M2 DE GRAFITI VANDALICO Y 180 M2 DE GRAFITI DE PROTESTA

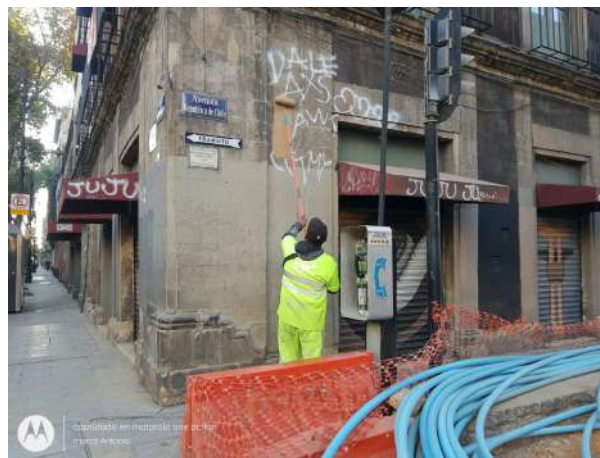

SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES REALIZADAS CON MOTIVO DE LA VERBENA NAVIDEÑA EN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

LAVADO INTEGRAL DE PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN CON MOTIVO DEL RETIRO DE LA VERBENA NAVIDEÑA




SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

OPERATIVO DE LIMPIEZA CON MOTIVO DEL DÍA DE REYES




SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Gráficas de indicadores

LAVADO

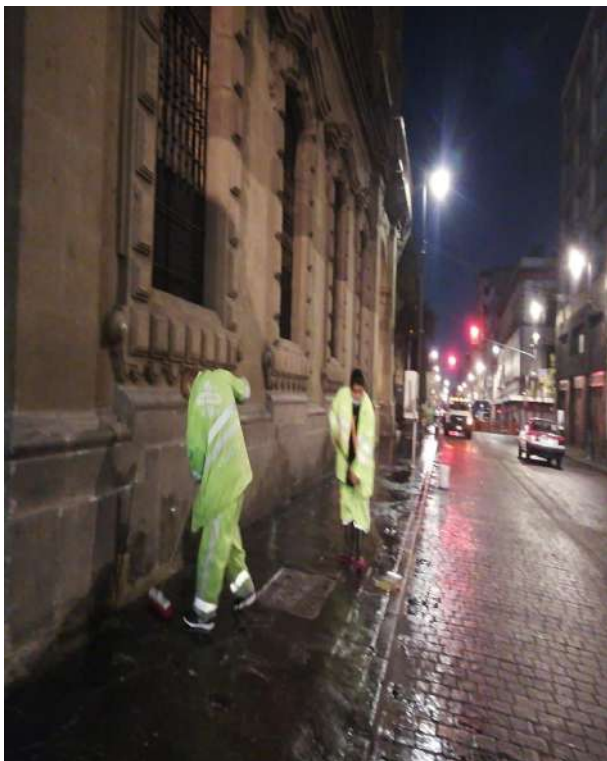

SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Gráficas de indicadores

BARRIDO MANUAL

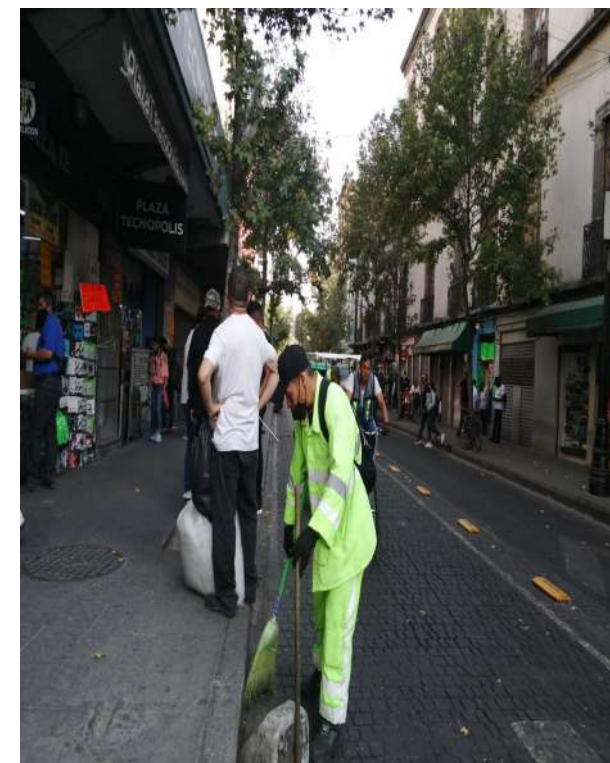

SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Gráficas de indicadores

RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Gráficas de indicadores

RECOLECCIÓN DE TIRADEROS CLANDESTINOS



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Gráficas de indicadores

LAVADO DE PAPELERAS





RETIRO DE PROPAGANDA



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Gráficas de indicadores

RETIRO DE CHICLES

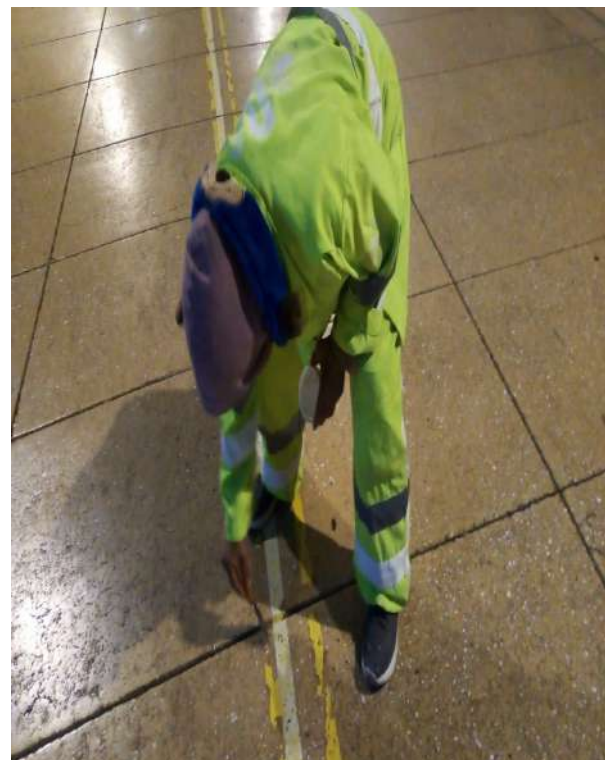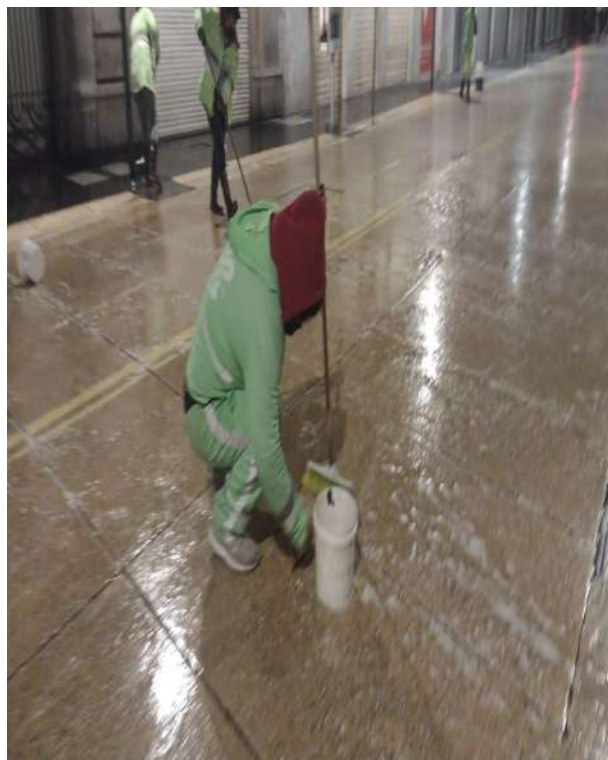



Sistema de Transporte Colectivo

Metro

STC Metro | Indicadores

Indicador	Periodicidad	22/12-21 al 4/1-22	Próximo reporte
75 Escaleras eléctricas en las 29 estaciones del Centro Histórico	Quincenal	3 escalera detenida (en mantenimiento)	25 de enero
19 Elevadores en estaciones del Centro Histórico		0 elevador detenido	



Metrobús

Metrobús | Corredor Centro Histórico Inaugurada el 1 de abril del 2012
| Cuenta con 62 parabuses y 3 terminales.




CONCEPTO	PENDIENTES	REALIZADOS
Rehabilitación de Guarnición y Recinto en para bus.	18 ESTACIONES	97%
Rehabilitación de Estelas informativas.	57 PIEZAS	100%
Suministro de Estelas informativas.	6 PIEZAS	100%
Colocación de Bolardos .	49 PIEZAS	82%
Colocación de Elementos de Confinamiento.	5880 PIEZAS	98 %
Balizamiento general	73,795.15 ml	82%

Metrobús | Parabus al 100% .



Delegación Cuauhtémoc
México Tenochtitlán
Plaza de la República
Defensoría Pública
Glorieta de Colón
Vocacional 5
Juárez
Eje Central
Museo de San Carlos

Metrobús | Parabus al 100% .

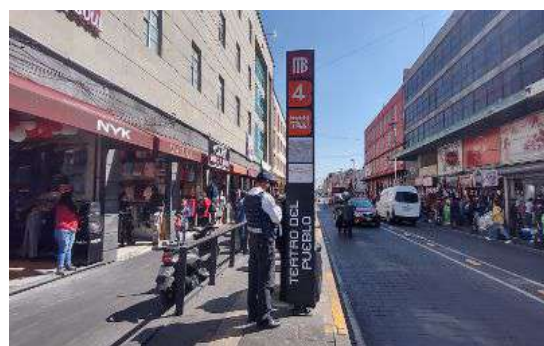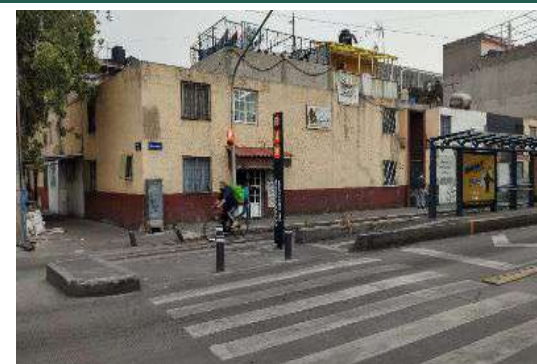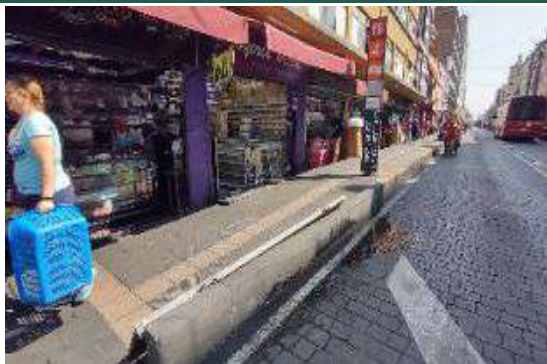

Rep. de Argentina
Teatro Blanquita
Ferrocarril de Cintura
Rep. de Chile
Hidalgo
Bellas Artes
Pino Suárez
Teatro del Pueblo
Isabel La Católica

Metrobús | Parabus pendientes con un avance menor al 95% .



Mercado San Juan




Mixcalco

Morelos

Cecilio Robelo



Metrobús | Balizamiento (Bucareli y José María Pino Suárez).

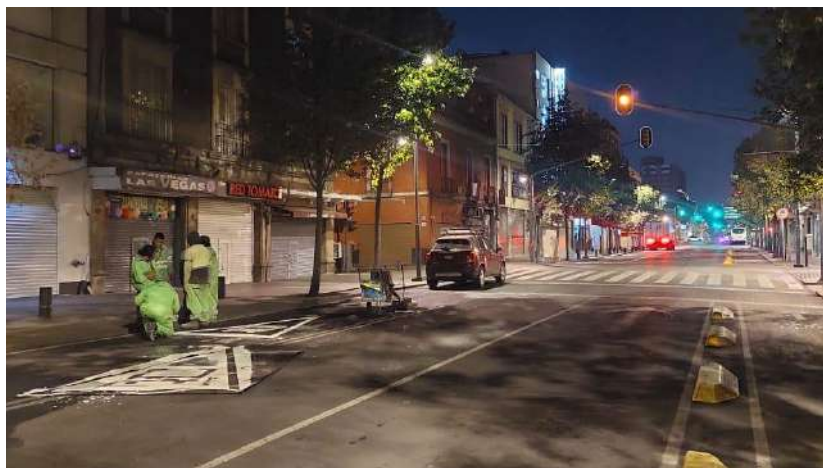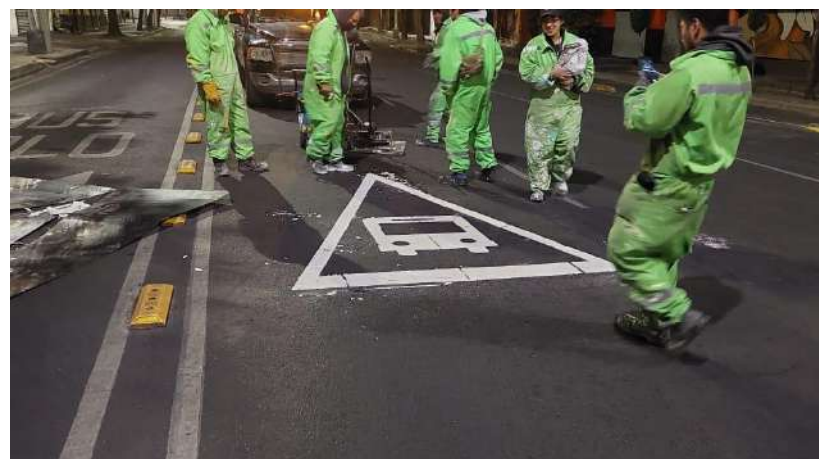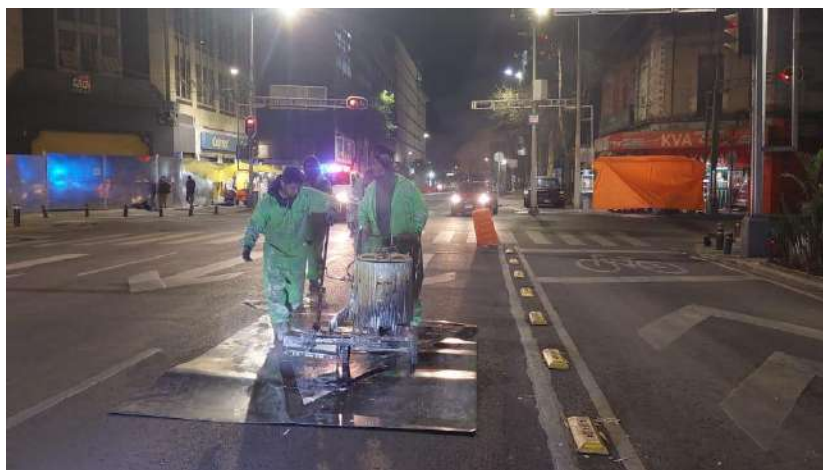



Comisión Federal de Electricidad

Comisión Federal de Electricidad | Indicadores

Tema	Indicador	Periodicidad	Quincena del 28 diciembre al 11 de enero 2022	Próximo reporte
Mantenimiento a infraestructura	Número de siniestros de robo registrados de elementos de infraestructura	Quincenal	0	
	Número de bóvedas atendidas con acciones de desagüe	Quincenal	21	
	Número de atenciones a fallas en el suministro de energía eléctrica	Quincenal	13	25 de enero 2022
	Número de tapas de registros y/o bóvedas reparadas	Quincenal	1	
	Número de obras de mantenimiento que impliquen rompimiento en vía pública	Quincenal	5	

Comisión Federal de Electricidad | Anexo de indicadores

Anexo 1. Detalle de ubicaciones

Número de siniestros de robo registrados de elementos de infraestructura

DIRECCION	ENTRE CALLES		NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
				TOTAL	0	



Comisión Federal de Electricidad | Anexo de indicadores

Anexo 2. Detalle de ubicaciones Número de bóvedas atendidas con acciones de desagüe

DIRECCION	ENTRE CALLES	NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	
FRAY SERVANDO	EJE CENTRAL	TLAXCOAQUE	SIN DATO	COL.CENTRO	7	INSPECCIÓN DESAGÜE Y LIMPIEZA DE BOVEDAS
CHIMALPOPOCA	EJE CENTRAL	5 DE FEBRERO	SIN DATO	COL.CENTRO	5	INSPECCIÓN DESAGÜE Y LIMPIEZA DE BOVEDAS
NEZAHUALCOYOLT	EJE CENTRAL	CORREO MAYOR	SIN DATO	COL.CENTRO	9	INSPECCIÓN DESAGÜE Y LIMPIEZA DE BÓVEDAS
				TOTAL	21	

Comisión Federal de Electricidad | Anexo de indicadores

Anexo 3. Detalle de ubicaciones

Número de atenciones a fallas en el suministro de energía eléctrica

DIRECCION	ENTRE CALLES		NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
REP. DE COLOMBIA 77	DEL CARMEN	GIRON	SIN DATO	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
CHIMALPOPOCA 1	EJE CENTRAL	CDA. DE CHIMALPOPOCA	SIN DATO	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
SIMÓN BOLÍVAR 8	TACUBA	5 DE MAYO	SIN DATO	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
REP. DE COLOMBIA 50,55,58	DEL CARMEN	REP. DE ARGENTINA	SIN DATO	COL.CENTRO	3	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
REP. DE PERÚ 132	REP. DE ARGENTINA	REP. DE BRASIL	SIN DATO	COL.CENTRO	1	2SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
PLAZA GARIBALDI 4	REP. DE PERÚ	REP. DE HONDURAS	SIN DATO	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
SAN PABLO 63	SANTO TOMAS	ROLDAN	SIN DATO	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
SAN PABLO 32	TOPACIO	ROLDAN	SIN DATO	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
LAZARIN DEL TORO 22,17	REP. DE CHILE	ALLENDE	SIN DATO	COL.CENTRO	2	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
REP. DE COLOMBIA 7	REP. DE BRASIL	REP. DE ARGENTINA	SIN DATO	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
				TOTAL	13	

Comisión Federal de Electricidad | Anexo de indicadores

Anexo 4. Detalle de ubicaciones

Número de tapas de registros y/o bóvedas reparadas






DIRECCION	ENTRE CALLES		NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
ACADEMIA	SOLEDAD	CORREGIDORA	SIN DATO	COL. CENTRO	1	REPARACIÓN DE TAPA EN BÓVEDA
				TOTAL	1	

Comisión Federal de Electricidad | Anexo de indicadores

Anexo 5. Detalle de ubicaciones

Número de obras de mantenimiento que impliquen rompimiento en vía pública

DIRECCION	ENTRE CALLES		NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
REP. DE PERÚ 132	REP. DE ARGENTINA	REP. DE BRASIL	SIN DATO	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
LAZARIN DEL TORO 22,17	REP. DE CHILE	ALLENDE	SIN DATO	COL.CENTRO	2	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
CHIMALPOPOCA 1	EJE CENTRAL	CDA. DE CHIMALPOPOCA	SIN DATO	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
REP. DE COLOMBIA 50	DEL CARMEN	REP. DE ARGENTINA	SIN DATO	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
				TOTAL	5	



Instituto Nacional de Antropología e Historia

Instituto Nacional de Antropología e Historia | Indicadores

Tema	Indicador	Quincena del 29/11 al 10/12	Próximo reporte
Obras	Número de trámites de solicitud de autorización de obra en inmuebles	01	
Programa Ciudad al Aire Libre	Número de trámites de solicitud de autorización de colocación de enseres	0	28 de diciembre
Obras	Número de autorizaciones de obras emitidas en inmuebles	10	
Programa Ciudad al Aire Libre	Número de autorizaciones emitidas para la colocación de enseres	01	

Instituto Nacional de Antropología e Historia | Anexo de indicadores

Solicitudes de autorización de obra

Fecha de Ingreso	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
04/01/2022	MOTOLINIA	38	CENTRO HISTÓRICO	Arreglo de cortina metálica de establecimiento para asegurarla y darle mantenimiento sin tocar fachada del inmueble	Obra menor

Autorizaciones de Colocación de enseres Programa Ciudad al Aire Libre

Autorización	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
531/21	INDEPENDENCIA	30	CUAUHTÉMOC	COLOCACIÓN DE ENSERES	Obra menor



Instituto Nacional de Antropología e Historia | Anexo de indicadores

Autorizaciones de obra

AUTORIZACIÓN	DOMICILIO	MOTIVO	TIPO
528/21	REPÚBLICA DE BRASIL 33	MANTENIMIENTO EN EL ESPACIO ANEXO AL PATIO DE PIEDRA.	OBRA MENOR
529/21	SAN ILDEFONSO 30	MANTENIMIENTO EN FACHADA PRINCIPAL.	OBRA MENOR
533/21	RIVA PALACIO (COL. GUERRERO) 46	RESARCIMIENTO DE DAÑOS POR SISMO.	OBRA MAYOR
535/21	MONEDA 2	MANTENIMIENTO EN TORREÓN Y BAJADA PLUVIAL EN LA AZOTEA.	OBRA MENOR
536/21	MINA (COL. GUERRERO) 52	TRABAJOS DE ADECUACIÓN.	OBRA MAYOR
537/21	REPÚBLICA DE BOLIVIA 17	ELIMINACIÓN DE HUMEDADES.	OBRA MENOR
541/21	ISABEL LA CATÓLICA 25	TRABAJOS DE ADECUACIÓN.	OBRA MAYOR
542/21	5 DE MAYO 19	MANTENIMIENTO DE ANUNCIO.	OBRA MENOR
545/21	EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS 74	REMODELACIÓN DE SEGUNDO NIVEL.	OBRA MAYOR

Instituto Nacional de Antropología e Historia | Anexo de indicadores

Autorizaciones de obra

AUTORIZACIÓN	DOMICILIO	MOTIVO	TIPO
546/21	REPÚBLICA DE CHILE	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO.	OBRA MENOR



Fideicomiso Centro Histórico




FCH | Gráficas de obras en proceso.

EJERCICIO 2020 – 2021.

CONVENIO DE COORDINACIÓN INAH - FCHCM	AVANCE FISICO ANTERIOR (%)	AVANCE FÍSICO ACTUAL (%)	TERMINACIÓN PROGRAMADA
PROYECTO INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN, RECUPERACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL MONUMENTO INMUEBLE CONOCIDO COMO TEMPLO SAN JUAN DE DIOS	75	75 Suspensión temporal	DICIEMBRE 2021
PROYECTO INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN, RECUPERACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL MONUMENTO INMUEBLE CONOCIDO COMO TEMPLO DE SANTA CATARINA	69	75 Se reanudaron trabajos 16/nov/2021	DICIEMBRE 2021

FCH | Obras en Proceso. CONVENIO DE COORDINACIÓN INAH - FCHCM.

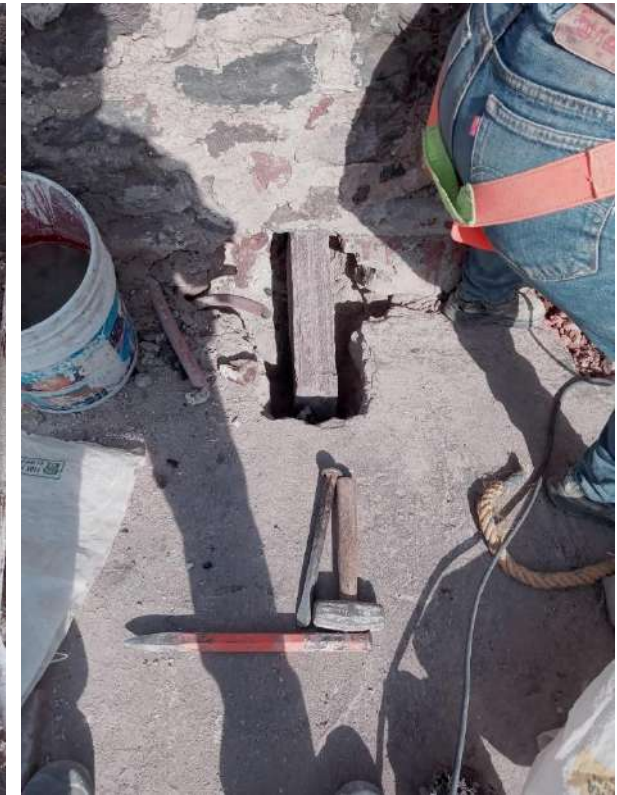

Trabajos de consolidación de grietas en bóveda principal y en muros.

TEMPLO DE SANTA CATARINA

FCH | Gráficas de obras en proceso.

EJERCICIO 2020 – 2021.

CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA FIDEICOMISO F/54 Y EL FCHCM	AVANCE FISICO ANTERIOR (%)	AVANCE FÍSICO ACTUAL (%)	TERMINACIÓN PROGRAMADA
REHABILITACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL ESPACIO PÚBLICO Y CULTURAL 'JARDÍN REGINA' . REGINA No. 40, CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	95 En espera de pago	95 En espera de pago	JULIO 2021
SEÑALÉTICA PARA EL CENTRO HISTÓRICO, PERÍMETRO B.	80	85	ENERO 2022

FCH | Obras en Proceso. Convenio de Participación Conjunta Fideicomiso F/54 - FCHCM.



Por parte de la empresa se tiene en taller el troquelado y serigrafiado de elementos de mapas de gran formato, estelas peatonales para el barrio universitario así como la fabricación de marcadores en piso listos para su instalación, los gráficos para estelas peatonales se encuentran en proceso de diseño por parte del FCHCM.

SEÑALÉTICA PARA EL CENTRO HISTÓRICO, PERÍMETRO B




NACIONAL
CENTRO
HISTÓRICO

FCH | Gráficas de obras en proceso.

EJERCICIO 2020 – 2021.

REHABILITACIÓN DE ESPACIOS ARQUEOLÓGICOS FCHCM - AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO	AVANCE FISICO ANTERIOR (%)	AVANCE FÍSICO ACTUAL (%)	TERMINACIÓN PROGRAMADA
CONSTRUCCIÓN DE NUEVA REJA PERIMETRAL EN EL TEMPLO MAYOR.	70	70	DICIEMBRE 2021

FCH | Obras en Proceso. REHABILITACIÓN DE ESPACIOS ARQUEOLÓGICOS FCHCM - AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO

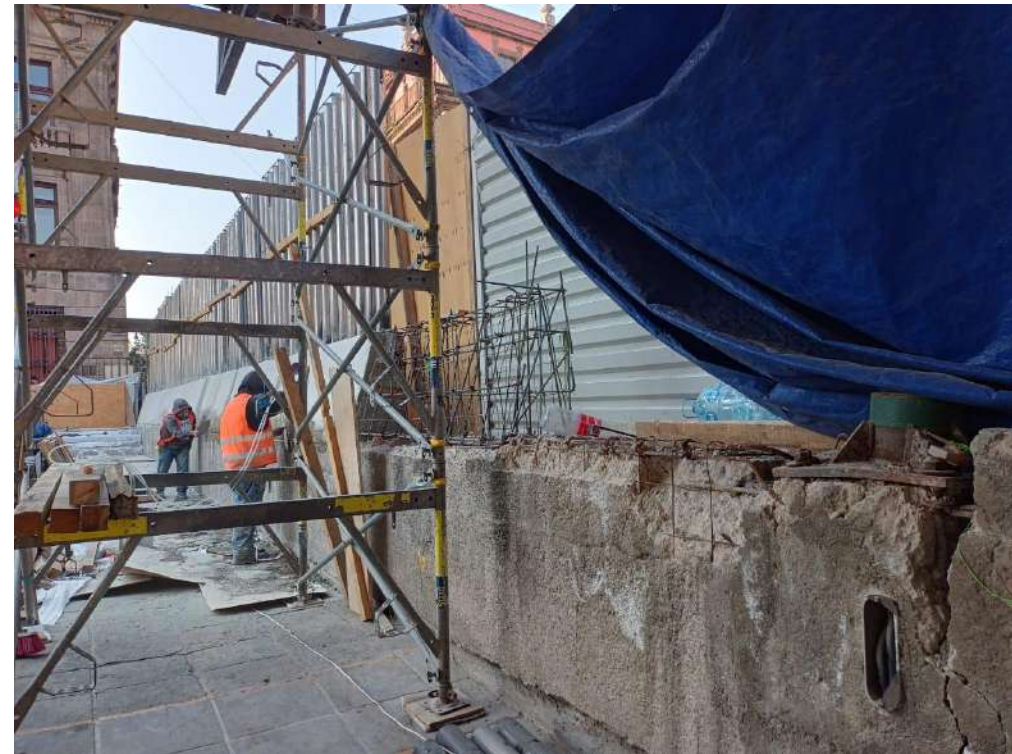

REJA PERIMETRAL DEL TEMPLO MAYOR

FCH | Gráficas de obras en proceso.

EJERCICIO 2020 – 2021.

APOYO A LAS CIUDADES MEXICANAS PATRIMONIO MUNDIAL.	AVANCE FISICO ANTERIOR (%)	AVANCE FÍSICO ACTUAL (%)	TERMINACIÓN PROGRAMADA
<p>“ARREGLO DE FACHADAS EN SANTA MARÍA LA REDONDA, REPÚBLICA DE BRASIL Y BARRIO LAGUNILLA, SEGUNDA ETAPA”</p> <p>(Bloque A): REPUBLICA DE BRASIL No. 29 y No. 46 y REPÚBLICA DE PARAGUAY No. 44</p> <p>(Bloque B): República de Brasil No. 44, 43, 62, 63 y 64 y República de Ecuador 95.</p>	<p>95</p> <p>90</p>	<p>99</p> <p>97</p>	<p>DICIEMBRE 2021</p>



SECRETARÍA DE CULTURA
CENTRO HISTÓRICO

FCH | Obras en Proceso. ACMPM.



República de Brasil No. 46.
Completada.



República de Brasil No. 29.
Completada.



República de Paraguay No. 44.
Remoldeo de cornisas de cantera.

FCH | Obras en Proceso. ACMPM.



República de Brasil No.63. Aplicación de pintura vinílica.



República de Brasil No.64. Tratamiento integral de viguetas metálicas.




República de Brasil No.44. Tratamiento integral de herrerías.



República de Brasil No.62. Remoldeo de elementos de cantera y perfilado de juntas.



República de Ecuador No. 95. Tratamiento integral de herrerías.







FCH | Gráficas de obras en proceso.

EJERCICIO 2020 – 2021.

PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN EJERCICIO 2021.	AVANCE FISICO ANTERIOR (%)	AVANCE FÍSICO ACTUAL (%)	TERMINACIÓN PROGRAMADA
CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON SECRETARÍA DE CULTURA SC/DGSMPC/COLAB/01957/21 y SC/DGSMPC/COLAB/01971/21.			
REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DE “CASA CONDE DE REGLA”, TERCERA ETAPA.	0	3	JUNIO 2022
REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DE “CASA TALAVERA”, TERCERA ETAPA.	0	1	ABRIL 2022
RECONSTRUCCIÓN DEL INMUEBLE “SOCIEDAD MEXICANA DE GEOGRAFÍA Y ESTADÍSTICA”, SEGUNDA ETAPA.	0	3	ABRIL 2022
REHABILITACIÓN DE LA “CAPILLA DE LA EXPIRACIÓN”, SEGUNDA ETAPA.	0	6	FEBRERO 2022
PARROQUIA DE SAN PABLO APOSTOL (EL NUEVO)	0	1	ABRIL 2022



FCH | Obras en Proceso. PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN EJERCICIO 2021.

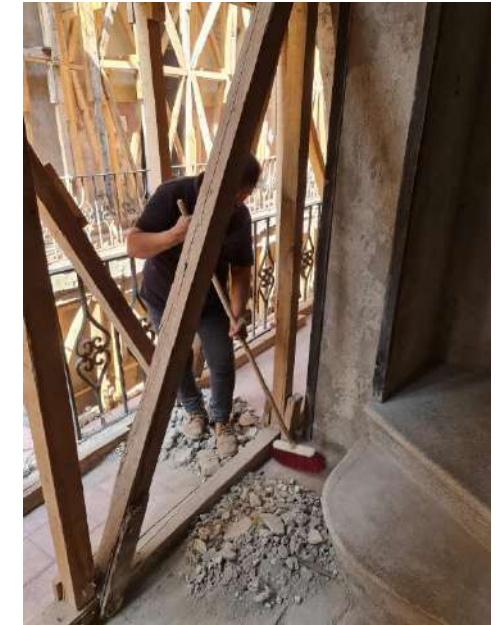

Trabajos preliminares, movimiento de elementos a resguardo.

Rehabilitación Estructural de “Casa Conde de Regla”,
Tercera Etapa.

FCH | Obras en Proceso. PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN EJERCICIO 2021.



Coordinación de trabajos con arqueólogo a resguardo del museo de sitio.



Medición de elementos pétreos a sustituir.



Movimiento de materiales y equipos a zona de resguardo designada por UACM.



Rehabilitación Estructural de “Casa Talavera”, Tercera Etapa.

FCH | Obras en Proceso. PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN EJERCICIO 2021.



Trabajos de limpiezas, preliminares, demoliciones y habilitado de tapiales y protecciones.

FCH | Obras en Proceso. PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN EJERCICIO 2021.



Preliminares, apuntalamientos, movimiento de mobiliario a zona de resguardo, colocación de protecciones.

REHABILITACIÓN DE LA “CAPILLA DE LA EXPIRACIÓN”, SEGUNDA ETAPA.

FCH | Obras en Proceso. PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN EJERCICIO 2021.




Trabajos de levantamiento arquitectónico, fotográfico y de deterioros del inmueble.

PARROQUIA DE SAN PABLO APOSTOL (EL NUEVO).




Agencia Digital de Innovación Pública ADIP



ADIP | Indicadores

Tema	Indicador	Periodicidad	Reporte del 01/01	Reporte al 11/01	Próximo reporte
Conectividad e Infraestructura de Telecomunicaciones	Ducto Maestro Rep. De Chile	Quincenal	83%	87%	25 de enero

ADIP | Indicadores

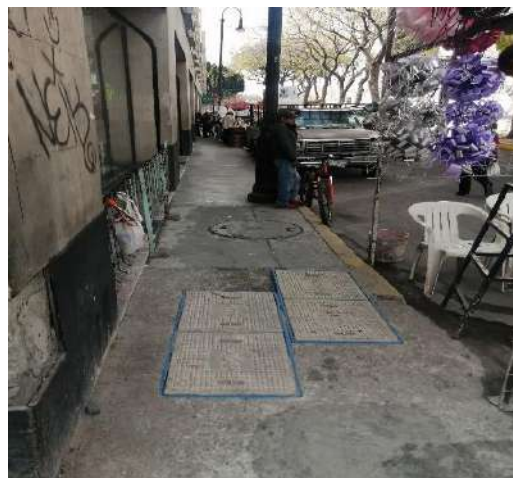



INFRAESTRUCTURA INMERSIONADA EN LA VIALIDAD

META

TRAYECTORIA	ML
RED TRONCAL	8812.08
RED DISTRIBUCIÓN	783.36
RADIALES Y ACOMETIDA	5024.72

87% avance

ADIP | Indicadores

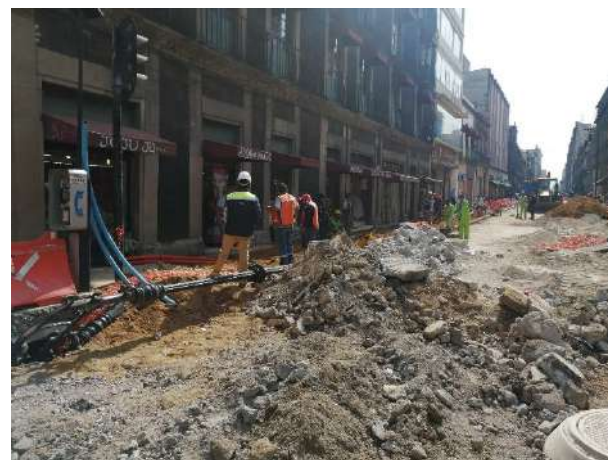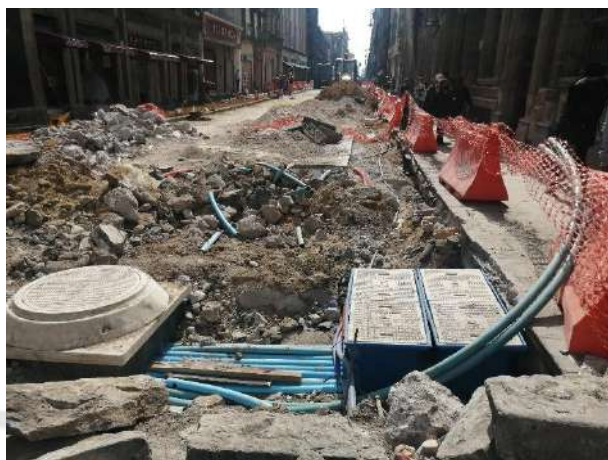

ADIP | Indicadores

Tema	Indicador	Periodicidad	Reporte del 01/01	Reporte al 11/01	Próximo reporte
Conectividad e Infraestructura de Telecomunicacion es	Ducto Maestro San Fernando	Mensual	90%	94%	25/01/2022

ADIP | Indicadores



INFRAESTRUCTURA INMERSIONADA EN LA VIALIDAD

META

TRAYECTORIA	ML
RED TRONCAL	1503.3
RED DISTRIBUCIÓN	33.44
RADIALES Y ACOMETIDA	668.5

94 % avance

ADIP | Indicadores

Tema	Indicador	Periodicidad	Reporte del 01/01	Reporte al 11/01	Próximo reporte
Conectividad e Infraestructura de Telecomunicaciones	Ducto Maestro Niños Héroes	Mensual	80%	85%	25/01/2022

ADIP | Indicadores



INFRAESTRUCTURA INMERSIONADA EN LA VIALIDAD

META

TRAYECTORIA	ML
RED TRONCAL	4970.22
RED DISTRIBUCIÓN	123.68
RADIALES Y ACOMETIDA	1828.98

85 % avance

ADIP | Indicadores

Tema	Indicador	Periodicidad	Reporte del 01/01	Reporte al 11/01	Próximo reporte
Conectividad e Infraestructura de Telecomunicacion es	Ducto Maestro Mina	Mensual	84%	91%	11/01/2022

ADIP | Indicadores



INFRAESTRUCTURA INMERSIONADA EN LA VIALIDAD

META

TRAYECTORIA	ML
RED TRONCAL	5055
RED DISTRIBUCIÓN	289.84
RADIALES Y ACOMETIDA	2493.48



91 % avance

ADIP | Indicadores

Tema	Indicador	Periodicidad	Reporte del 01/01	Reporte al 11/01	Próximo reporte
Conectividad e Infraestructura de Telecomunicaciones	Ducto Maestro Violeta	Mensual	90%	94%	25/01/2022

ADIP | Indicadores



INFRAESTRUCTURA INMERSIONADA EN LA VIALIDAD

META

TRAYECTORIA	ML
RED TRONCAL	5111.7
RED DISTRIBUCIÓN	375.2
RADIALES Y ACOMETIDA	3134.98

94 % avance

ADIP | Indicadores

Tema	Indicador	Periodicidad	Reporte del 01/01	Reporte al 11/01	Próximo reporte
Conectividad e Infraestructura de Telecomunicaciones	Ducto Maestro Av. Hidalgo	Mensual	80%	85%	25/01/2022


ADIP | Indicadores







INFRAESTRUCTURA INMERSIONADA EN LA VIALIDAD

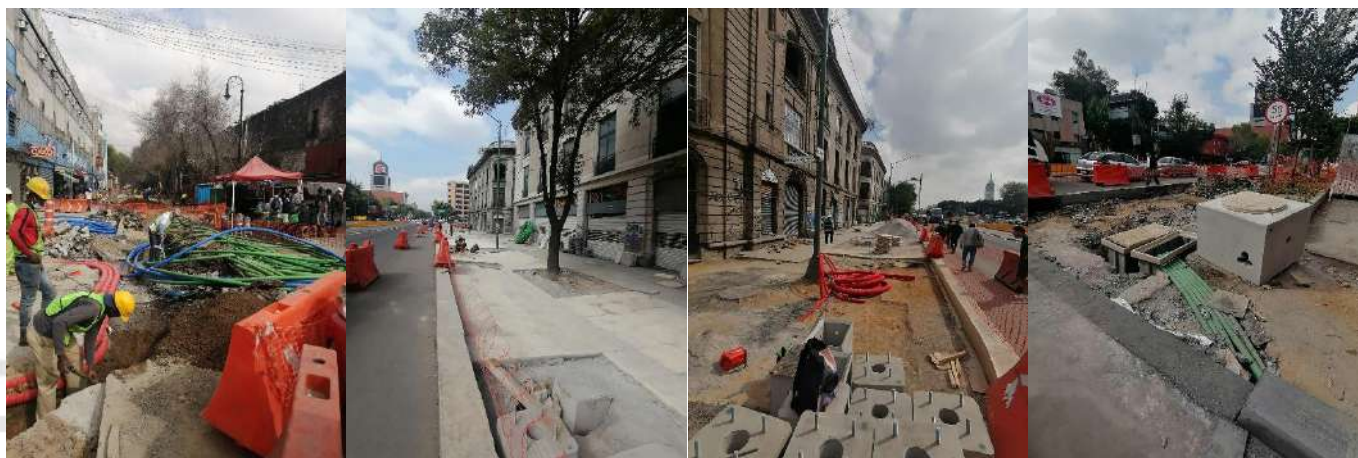META

TRAYECTORIA	ML
RED TRONCAL	878.22
RED DISTRIBUCIÓN	131.28
RADIALES Y ACOMETIDA	152.84



85 % avance



Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5)

C5 | Indicadores

Indicador	Periodicidad	24/12 al 07/01	Próximo reporte
No. cámaras con falla o intermitencia		15 cámaras	
	Quincenal		25 de enero
Número de obras de mantenimiento y/o reparación de atención a la infraestructura		01 cámara	

NOTA: Los datos proporcionados son extraídos de los Reportes de mesa de ayuda de C5



SSC Tránsito

SSC Tránsito | Indicadores

Tema	Unidad de medida	Periodicidad	1 al 10/01	Próximo reporte
Semáforos	Número de semáforos con mantenimiento correctivo	Quincenal	21	25 de enero
	Número de semáforos con mantenimiento preventivo		0	
Cámaras	Número de cámaras con mantenimiento preventivo		0	
	Número de cámaras con mantenimiento correctivo		0	




SSC Tránsito | Anexo de Indicadores

CORRECTIVO

ACOMETIDA	1
AISLADA	1
APAGADO	3
CABLE DE COMUNICACIÓN DAÑADO	2
CORTO	4
FOCO FUNDIDO	1
FY-CINTILANTE	1
PUERTA ABIERTA	1
ST-DESCONECTADO / FUERA DE COMUNICACIÓN	7
TOTAL GENERAL	21

MANTENIMIENTO SEMAFORICO

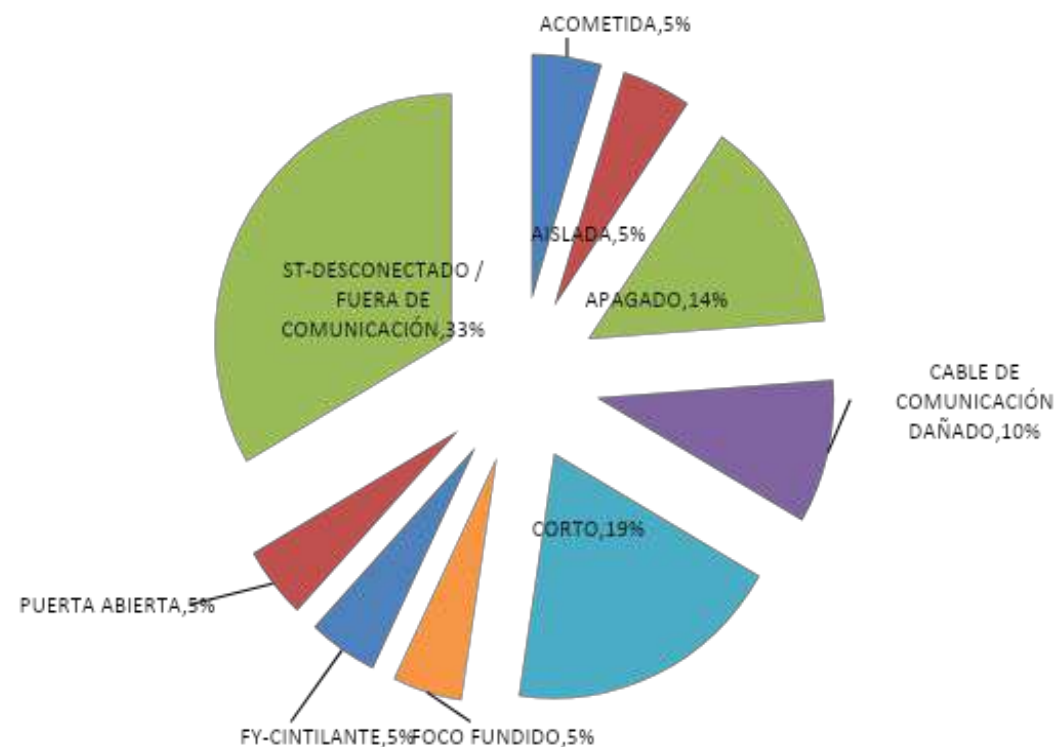

Reportes

Turnos e incidencias urbanas

Asuntos generales

Acuerdos

Asistencia

ACH | Matriz de seguimiento a turnos - enero 2022

**28%
atención**

Matriz de Turnos	ESTATUS			Suma total
	Atendido	En proceso	Pendiente	
ATIENDE				
Al. Cuauhtémoc	1	2	1	4
CFE	1			1
COMISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN			1	1
SOS-DGSUS		1		1
Suma total	2	3	2	7

ACH | Seguimiento a turnos **ATENDIDOS**

CLAVE	FECHA DE MESA	SOLICITANTE	SOLICITUD	ATIENDE	FECHA DE ATENCIÓN	EVIDENCIA	ESTATUS	OBSERVACIONES
TCH-100	28/10/2021	V4 - Alameda-Sector Financiero	Reposición de coladera rota en la banqueta en Allende esquina Tacuba, frente a las maletas	CFE			Atendido	Se solicitó a CFE el cambio de la tapa, esta en proceso Mario Meraz comentó que ya quedó atendida pendiente de mandar foto
TCH-116	28/12/2021	ACH	Poda del árbol de Tacuba 15	Al. Cuauhtémoc			Atendido	SE LLEVÓ ACABO EL 5 DE ENERO CON APOYO DE LA ALCALDÍA

ACH | Seguimiento a turnos **EN PROCESO**

CLAVE	FECHA DE MESA	SOLICITANTE	SOLICITUD	ATIENDE	FECHA DE ATENCIÓN	EVIDENCIA	ESTATUS	OBSERVACIONES
TCH-092	15/10/2021	ACH	Limpieza y retiro de escombro en el predio de Jaime Nuno s/n, col. Morelos	SOS-DGSUS			En proceso	La Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad efectuó jornada de limpieza el miércoles 3 de noviembre, solicita retiro del agua que aún queda en el predio para concluir con la limpieza. Ya se solicitó a Sacmex. 9 de dic. se empieza con el desalojo de agua, se llevará 3 días en turnos de 8 horas, AVANCE DEL 100 % al 17 dic. Falta que DGSUS saque la basura y ACH coloque el tapial. Hugo Estrada realizará la limpieza la primera semana de enero. Para posteriormente poner el tapial
TCH-108	3/11/2021 11/01/2022	ACH	Retome turno pendiente de apuntalamiento del predio de Violeta número 62. (ACH compartirá el acuse del oficio)	Al. Cuauhtémoc			En proceso	El miércoles 8 de agosto se contactó a la vecina -Se generó folio SUAC -ACH compartió el reporte al Ing. Fernando Corso del Área de Protección Civil de la Alcaldía -El dictamen está en proceso. La vecina Ma. Cristina tuvo cita el lunes 27/09 -Se realizó la solicitud a la Alcaldía por oficio (Patricia Ramiro Administración Néstor Núñez) -Se retoma el turno con nuevo enlace de la alcaldía en la 22a MIO -Se compartirá acuse de oficio que se remitió a la alcaldía, para que nuevo enlace apoye con el seguimiento -25a. MIO - Roxana de la O indicó que se turnó el oficio a la Dirección General de Obras, compartirá la respuesta a ACH y dará seguimiento -1a. MIO-2022, mencionó Roxana de la O que el viernes lo reactiva con Protección Civil y Obras de Alcaldía para concretarlo.
TCH-111	13/11/2021	Gestión en territorio	Baches sobre arroyo vehicular (Carpeta asfáltica)En Tizapán, que sale por Izazaga como callejón de la igualdad.	Al. Cuauhtémoc			En proceso	LA ALCALDÍA LO PROGRAMARA PARA SU ATENCIÓN. MTRA. DLD ENVÍO OFICIO A LA ALCALDESA DE CUAUHTÉMOC: ACH/CG/302/2021 A SOLICITUD DE VECINOS DE TIZAPÁN 8 PARA SUSTITUCIÓN DE DRENAJE Y PAVIMENTACIÓN

ACH | Seguimiento a turnos **PENDIENTES**

CLAVE	FECHA DE MESA	SOLICITANTE	SOLICITUD	ATIENDE	FECHA DE ATENCIÓN	EVIDENCIA	ESTATUS	OBSERVACIONES
TCH-109	13/11/2021	Gestión en territorio	Problemas de inundaciones en la calle por falta del funcionamiento de la atarjea que esta dañada. En Tizapán, que sale por Izazaga como callejón de la igualdad	Al. Cuauhtémoc			Pendiente	LA ALCALDÍA LO PROGRAMARÁ PARA SU ATENCIÓN, SE REQUIERE OBRA MAYOR, REALIZARON DESAZOLVE MTRA. DLD ENVÍO OFICIO A LA ALCALDESA DE CUAUHTÉMOC: ACH/CG/302/2021 A SOLICITUD DE VECINOS DE TIZAPÁN 8 PARA SUSTITUCIÓN DE DRENAJE
TCH-117	28/12/2021	ACH	Comparta el estatus de Callejón de la Igualdad	COMISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN			Pendiente	

ACH | Matriz de seguimiento a incidencias urbanas - enero 2022

**12%
atención**

Matriz de Incidencias <i>Dependencia</i>	ESTATUS			Suma total
	Atendido	En Proceso	Pendiente	
ACH			12	12
Al. Cuauhtémoc	4		57	61
C5	1		2	3
CFE	5		50	55
Sacmex	2	3	42	47
SGIRyPC			1	1
SOS-AP	1			1
SOS-DGOIV	27	2	118	147
SOS-DGSUS	5		46	51
Telmex	1		14	15
Suma total	46	5	342	393

Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 29 de diciembre 2021 al 10 de enero 2022

Número	REPORTA	FECHA DE REPORTE	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ESTATUS
IUCH-772	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	17/8/2021	Baches	República de Perú	Eje Central			SaCMEX			Atendido
IUCH-1156	V6 - Antigua Merced-Mixcalco	7/10/2021	Desperfectos en banquetas	Eje 1 Oriente (Circunvalación)	Manzanares						Atendido
IUCH-1363	V4 - Alameda-Sector Financiero	28/12/2021	Poda de árboles	Tacuba			15	Al Cuauhtémoc			Atendido
IUCH-920	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	18/9/2021	Desperfectos en banquetas	República de Perú	Eje Central	Ignacio Altende		CFE			Atendido


Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 29 de diciembre 2021 al 10 de enero 2022

Número	REPORTA	FECHA DE REPORTE	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ESTATUS
IUCH-919	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	18/9/2021	Desperfectos en banquetas	República de Perú	Eje Central	Ignacio Allende	Frente Plaza Montero	CFE			Atendido
IUCH-1131	Estructura de Supervisión ACH	12/10/2021	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Tacuba	Ignacio Allende			CFE			Atendido
IUCH-1026	Estructura de Supervisión ACH	21/9/2021	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	República de Chile	República de Cuba			SOS-DGOIV			Atendido
IUCH-1214	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	25/10/2021	Mal estado de cables o equipamiento	Ignacio Allende	Donceles	República de Cuba		TELMEX			Atendido

Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 29 de diciembre 2021 al 10 de enero 2022

Número	REPORTA	FECHA DE REPORTE	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ESTATUS
IUCH-672	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	27/7/2021	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	República de Chile			70	CFE			Atendido
IUCH-700	V8 - San Pablo	4/1/2022	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	Carretones	Puente de Santo Tomás	Roldán		Al. Cuauhtémoc	video	video	Atendido
IUCH-702	V8 - San Pablo	4/1/2022	Falta de luz al interior de los inmuebles	Topacio	Carretones	San Pablo		CFE	M2133477889	sin imagen	Atendido
IUCH-703	V8 - San Pablo	7/1/2022	Fallas de alerta sísmica	San Jerónimo			114	CS	video		Atendido

Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 29 de diciembre 2021 al 10 de enero 2022

Número	REPORTA	FECHA DE REPORTE	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ESTATUS
IUCH-704	V6 - Antigua Merced-Mixcalco	4/1/2022	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	Corregidora	Academia	Correo Mayor		SOS-AP	sin imagen	sin imagen	Atendido
IUCH-707	V6 - Antigua Merced-Mixcalco	9/1/2022	Falta de luz al interior de los inmuebles	Eje 1 Oriente (Circunvalación)	Ramón Corona		No. 605	CFE	El reporte es M 2133479475	sin imagen	Atendido
V2-022	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	9/10/2021	Baches	Eje Central	Eje 1 Norte	República de Ecuador	Bacheo en arroyo vehicular	SOS-DGSUS			Atendido
V2-026	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	9/10/2021	Baches	República de Perú	Eje Central	Ignacio Allende	Bacheo en arroyo vehicular	SACMEX			Atendido

Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 29 de diciembre 2021 al 10 de enero 2022

Número	REPORTA	FECHA DE REPORTE	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ESTATUS
V3-005	V3 - Santo Domingo	11/10/2021	Baches	Belisario Domínguez	República de Chile	Palma	Frente al 78	SOS-DGOIV			Atendido
V3-006	V3 - Santo Domingo	11/10/2021	Baches	Belisario Domínguez	República de Chile		Intersección	SOS-DGOIV			Atendido
V3-007	V3 - Santo Domingo	11/10/2021	Baches	Belisario Domínguez	Palma		Intersección	SOS-DGOIV			Atendido
V3-008	V3 - Santo Domingo	11/10/2021	Baches	República de Venezuela	El Carmen		Intersección	SOS-DGOIV			Atendido

Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 29 de diciembre 2021 al 10 de enero 2022

Número	REPORTA	FECHA DE REPORTE	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ESTATUS
V3-015	V3 - Santo Domingo	11/10/2021	Baches	República de Argentina	República de Bolivia		Intersección	SOS-DGOIV			Atendido
V3-016	V3 - Santo Domingo	11/10/2021	Baches	República de Argentina	República de Bolivia		Intersección	SOS-DGOIV			Atendido
V3-017	V3 - Santo Domingo	11/10/2021	Baches	República de Argentina	República de Bolivia		Intersección	SOS-DGOIV			Atendido
V3-022	V3 - Santo Domingo	11/10/2021	Baches	República de Argentina	Apartado		Intersección	SOS-DGOIV			Atendido



Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 29 de diciembre 2021 al 10 de enero 2022

Número	REPORTA	FECHA DE REPORTE	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ESTATUS
V3-024	V3 - Santo Domingo	11/10/2021	Baches	República de Argentina	República de Perú	República de Nicaragua	Frente al 77	SOS-DGOIV			Atendido
V3-026	V3 - Santo Domingo	11/10/2021	Baches	República de Argentina	República de Perú	República de Nicaragua	Frente al 77	SOS-DGOIV			Atendido
V3-056	V3 - Santo Domingo	11/10/2021	Baches	José Joaquín Herrera	Eje 1 Oriente (Circunvalación)	Manuel Doblado		Al Cuauhtémoc			Atendido
V3-067	V3 - Santo Domingo	11/10/2021	Baches	República de Bolivia	Torres Quintero	Callejón Girón		SOS-DGOIV			Atendido

Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 29 de diciembre 2021 al 10 de enero 2022

Número	REPORTA	FECHA DE REPORTE	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ESTATUS
V3-068	V3 - Santo Domingo	11/10/2021	Baches	República de Bolivia	Torres Quintero	Callejón Girón		SOS-DGOIV			Atendido
V3-069	V3 - Santo Domingo	11/10/2021	Baches	República de Bolivia	Torres Quintero	Callejón Girón		SOS-DGOIV			Atendido
V3-070	V3 - Santo Domingo	11/10/2021	Baches	República de Bolivia	Torres Quintero	Callejón Girón		SOS-DGOIV			Atendido
V3-071	V3 - Santo Domingo	11/10/2021	Baches	República de Bolivia	Callejón Girón	El Carmen		SOS-DGOIV			Atendido

Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 29 de diciembre 2021 al 10 de enero 2022

Número	REPORTA	FECHA DE REPORTE	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ESTATUS
V3-072	V3 - Santo Domingo	11/10/2021	Baches	República de Bolivia	Callejón Girón	El Carmen		SOS-DGOIV			Atendido
V5-002	V5 - Zócalo	8/10/2021	Baches	República del Salvador	José María Pino Suárez	José María Pino Suárez	cruce peatonal, lado ote.	SOS-DGSUS			Atendido
V5-003	V5 - Zócalo	8/10/2021	Baches	República del Salvador	Correo Mayor		Salvador esq correo mayor, lado pte	SOS-DGSUS			Atendido
V5-004	V5 - Zócalo	8/10/2021	Baches	República del Salvador	José María Pino Suárez	20 de noviembre	Bacheo en arroyo vehicular.	SOS-DGOIV			Atendido

Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 29 de diciembre 2021 al 10 de enero 2022

Número	REPORTA	FECHA DE REPORTE	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ESTATUS
V5-005	V5 - Zócalo	8/10/2021	Baches	República del Salvador	20 de noviembre	José María Pino Suárez	frente al #110, bache en concreto hidráulico,	SOS-DGSUS			Atendido
V5-006	V5 - Zócalo	11/10/2021	Baches	República del Salvador	José María Pino Suárez	5 de febrero	frente al # 100D	SOS-DGSUS			Atendido
V6-005	V6 - Antigua Merced-Mixcalco	11/10/2021	Baches	República de Guatemala			frente al 145	SOS-DGOIV			Atendido
V6-006	V6 - Antigua Merced-Mixcalco	11/10/2021	Baches	República de Guatemala	Manuel Doblado	Margil		SOS-DGOIV			Atendido

Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 29 de diciembre 2021 al 10 de enero 2022

Número	REPORTA	FECHA DE REPORTE	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ESTATUS
V6-008	V6 - Antigua Merced-Mixcalco	11/10/2021	Baches	República de Guatemala			Frente al 118	SOS-DGOIV			Atendido
V6-017	V6 - Antigua Merced-Mixcalco	11/10/2021	Baches	Jesús María			Afuera de la Iglesia de Jesús María	SOS-DGOIV			Atendido
V6-019	V6 - Antigua Merced-Mixcalco	11/10/2021	Baches	Manzanares	Eje 1 Oriente (Circunvalación)		Esquina	SOS-DGOIV			Atendido
V6-020	V6 - Antigua Merced-Mixcalco	11/10/2021	Baches	Manzanares	Eje 1 Oriente (Circunvalación)		Esquina	SOS-DGOIV			Atendido

Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 29 de diciembre 2021 al 10 de enero 2022

Número	REPORTA	FECHA DE REPORTE	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ESTATUS
V6-021	V6 - Antigua Merced-Mixcalco	11/10/2021	Baches	Manzanares	Alhóndiga	Roldán		SOS-DGOIV			Atendido
V6-047	V6 - Antigua Merced-Mixcalco	25/10/2021	Baches	Manuel Doblado	San Antonio Tomatlán	Mixcalco		SOS-DGOIV			Atendido
V6-048	V6 - Antigua Merced-Mixcalco	25/10/2021	Baches	Manuel Doblado	Mixcalco		Esquina	SOS-DGOIV			Atendido
V6-050	V6 - Antigua Merced-Mixcalco	25/10/2021	Baches	Loreto	Justo Sierra	República de Guatemala		SOS-DGOIV			Atendido

Atención VIPPSC | Incidencias **EN PROCESO** - del 29 de diciembre 2021 al 10 de enero 2022

Número	REPORTA	FECHA DE REPORTE	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ESTATUS
IUCH-1176	Estructura de Supervisión ACH	20/10/2021	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	República de Honduras	República de Chile						En Proceso
V6-007	V6 - Antigua Merced-Mixcalco	11/10/2021	Baches	República de Guatemala			frente al jardín de niños Tonatiuh	SOS-DGOIV			En Proceso
V6-052	V6 - Antigua Merced-Mixcalco	25/10/2021	Baches	Loreto	Justo Sierra	República de Guatemala		SOS-DGOIV			En Proceso

Atención VIPPSC | Incidencias **PENDIENTES** - del 29 de diciembre 2021 al 10 de enero 2022

Número	REPORTA	FECHA DE REPORTE	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ESTATUS
IUCH-1394	Estructura de Supervisión ACH	28/12/2021	Desperfectos en banquetas	Alameda Central	Dr. Mora						Pendiente
IUCH-673	V6 - Antigua Merced-Mixcalco	6/1/2022	Desperfectos en banquetas	Jesús María	Talavera		frente al 166	CFE			Pendiente
IUCH-674	V6 - Antigua Merced-Mixcalco	6/1/2022	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Talavera	República de Uruguay			CFE			Pendiente
IUCH-675	V6 - Antigua Merced-Mixcalco	6/1/2022	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Roldán	República de Uruguay			CFE			Pendiente

Atención VIPPSC | Incidencias **PENDIENTES** - del 29 de diciembre 2021 al 10 de enero 2022

Número	REPORTA	FECHA DE REPORTE	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ESTATUS
IUCH-676	V6 - Antigua Merced-Mixcalco	6/1/2022	Desperfectos en banquetas	Roldán	República de Uruguay						Pendiente
IUCH-677	V6 - Antigua Merced-Mixcalco	6/1/2022	Desperfectos en banquetas	República de Uruguay	Roldán	Zdo Callejon Manzanares					Pendiente
IUCH-678	V6 - Antigua Merced-Mixcalco	6/1/2022	Desperfectos en banquetas	República de Uruguay	Santo Tomás						Pendiente
IUCH-679	V6 - Antigua Merced-Mixcalco	6/1/2022	Desperfectos en banquetas	República de Uruguay	Roldán	Zdo Callejon Manzanares	acera norte				Pendiente

Atención VIPPSC | Incidencias **PENDIENTES** - del 29 de diciembre 2021 al 10 de enero 2022

Número	REPORTA	FECHA DE REPORTE	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ESTATUS
IUCH-680	V6 - Antigua Merced-Mixcalco	6/1/2022	Desperfectos en banquetas	República de Uruguay	Roldán	2do Callejon Manzanares	acera norte frente al 206				Pendiente
IUCH-681	V6 - Antigua Merced-Mixcalco	6/1/2022	Desperfectos en banquetas	República de Uruguay	Eje 1 Oriente (Circunvalación)		casi esquina frente al 214				Pendiente
IUCH-682	V6 - Antigua Merced-Mixcalco	6/1/2022	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	República de Uruguay	Eje 1 Oriente (Circunvalación)		casi esquina frente al 219	SACMEX			Pendiente
IUCH-683	V6 - Antigua Merced-Mixcalco	6/1/2022	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	República de Uruguay	Eje 1 Oriente (Circunvalación)		casi esquina frente al 214	SACMEX			Pendiente

Atención VIPPSC | Incidencias **PENDIENTES** - del 29 de diciembre 2021 al 10 de enero 2022

Número	REPORTA	FECHA DE REPORTE	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ESTATUS
IUCH-684	V6 - Antigua Merced-Mixcalco	6/1/2022	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	2do Callejon Manzanares				SACMEX			Pendiente
IUCH-685	V6 - Antigua Merced-Mixcalco	6/1/2022	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	2do Callejon Manzanares				SACMEX			Pendiente
IUCH-686	V6 - Antigua Merced-Mixcalco	6/1/2022	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	2do Callejon Manzanares				SACMEX			Pendiente
IUCH-687	V6 - Antigua Merced-Mixcalco	6/1/2022	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	2do Callejon Manzanares				SACMEX			Pendiente




Atención VIPPSC | Incidencias **PENDIENTES** - del 29 de diciembre 2021 al 10 de enero 2022

Número	REPORTA	FECHA DE REPORTE	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ESTATUS
IUCH-688	V6 - Antigua Merced-Mixcalco	6/1/2022	Desperfectos en banquetas	República de Uruguay	Santo Tomás	Roldán	casi esquina frente al 182	ACH			Pendiente
IUCH-689	V6 - Antigua Merced-Mixcalco	6/1/2022	conexiones irregulares	República de Uruguay	Roldán		casi esquina	CFE			Pendiente
IUCH-690	V6 - Antigua Merced-Mixcalco	6/1/2022	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	República de Uruguay	Jesús María	Roldán	frente al 166 acera norte	CFE			Pendiente
IUCH-691	V6 - Antigua Merced-Mixcalco	6/1/2022	Desperfectos en banquetas	República de Uruguay	Las Cruces		casi esquina a mitad de la banqueta				Pendiente

Atención VIPPSC | Incidencias **PENDIENTES** - del 29 de diciembre 2021 al 10 de enero 2022

Número	REPORTA	FECHA DE REPORTE	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ESTATUS
IUCH-692	V6 - Antigua Merced-Mixcalco	6/1/2022	Desperfectos en banquetas	República de Uruguay	Las Cruces		casi esquina a mitad de la banqueta frente al 158				Pendiente
IUCH-693	V6 - Antigua Merced-Mixcalco	6/1/2022	Desperfectos en banquetas	Las Cruces	República del Salvador		casi esquina				Pendiente
IUCH-694	V6 - Antigua Merced-Mixcalco	6/1/2022	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	República del Salvador	Las Cruces		casi esquina	SACMEX			Pendiente
IUCH-695	V6 - Antigua Merced-Mixcalco	6/1/2022	Desperfectos en banquetas	República del Salvador	Correo Mayor		casi esquina frente al 152, plaza Balbanera				Pendiente

Atención VIPPSC | Incidencias **PENDIENTES** - del 29 de diciembre 2021 al 10 de enero 2022

Número	REPORTA	FECHA DE REPORTE	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ESTATUS
IUCH-696	V6 - Antigua Merced-Mixcalco	6/1/2022	Desperfectos en banquetas	República del Salvador	Correo Mayor		casi esquina frente a los baños				Pendiente
IUCH-698	V6 - Antigua Merced-Mixcalco	6/1/2022	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Talavera	Mesonés		frente a la Plaza La Aguilita	CFE			Pendiente
IUCH-701	V8 - San Pablo	4/1/2022	Poda de árboles	Jesús María	Mesonés			Al. Cuauhtémoc			Pendiente
IUCH-705	V6 - Antigua Merced-Mixcalco	9/1/2022	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Academia			frente al No. 28	CFE			Pendiente

Atención VIPPSC | Incidencias **PENDIENTES** - del 29 de diciembre 2021 al 10 de enero 2022

Número	REPORTA	FECHA DE REPORTE	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ESTATUS
IUCH-706	V8 - San Pablo	9/1/2022	Desperfectos en banquetas	Roldán	Ramón Corona	Misioneros	frente al 59 el daño es ocasionado por el poco espacio que dejan los carros que se estacionan en batería y camiones pesados pasan por la banqueta	ACH			Pendiente
IUCH-708	V6 - Antigua Merced-Mixcalco	10/1/2022	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Alhóndiga	Soledad	Corregidora		SACMEX			Pendiente
V3-125	V3 - Santo Domingo	4/1/2022	Baches	M. Peña y Peña	Torres Quintero	Florida		SOS-DGOIV			Pendiente
V3-126	V3 - Santo Domingo	4/1/2022	Baches	M. Peña y Peña	Torres Quintero	Florida	Frente al 20	SOS-DGOIV			Pendiente

Atención VIPPSC | Incidencias **PENDIENTES** - del 29 de diciembre 2021 al 10 de enero 2022

Número	REPORTA	FECHA DE REPORTE	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ESTATUS
V3-127	V3 - Santo Domingo	4/1/2022	Baches	M. Peña y Peña	Torres Quintero		Frente al 11	SOS-DGOIV			Pendiente
V3-128	V3 - Santo Domingo	4/1/2022	Baches	M. Peña y Peña	Torres Quintero		Intersección	SOS-DGOIV			Pendiente
V3-129	V3 - Santo Domingo	4/1/2022	Baches	M. Peña y Peña	Torres Quintero		Intersección	SOS-DGOIV			Pendiente
V3-130	V3 - Santo Domingo	4/1/2022	Baches	M. Peña y Peña	Torres Quintero		Frente al 11	SOS-DGOIV			Pendiente

Atención VIPPSC | Incidencias **PENDIENTES** - del 29 de diciembre 2021 al 10 de enero 2022

Número	REPORTA	FECHA DE REPORTE	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ESTATUS
V3-131	V3 - Santo Domingo	4/1/2022	Baches	República de Costa Rica	República Dominicana		Intersección	SOS-DGOIV			Pendiente
V3-132	V3 - Santo Domingo	4/1/2022	Baches	República de Costa Rica	República Dominicana	República de Argentina	Frente al 5	SOS-DGOIV			Pendiente
V3-133	V3 - Santo Domingo	4/1/2022	Baches	República de Costa Rica	República Dominicana		Intersección	SOS-DGOIV			Pendiente
V3-134	V3 - Santo Domingo	4/1/2022	Baches	República de Costa Rica	República Dominicana	República de Argentina	Frente al 29	SOS-DGOIV			Pendiente

Reportes

Turnos e incidencias urbanas

Mesas de trabajo

Asuntos generales

Acuerdos

Asistencia
