



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
CULTURA  
CENTRO  
HISTÓRICO



## MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

### **Evaluación enero - agosto**

Inicio de la transmisión en vivo  
03 de septiembre de 2019



## Orden del día

Reportes

Turnos e incidencias urbanas

Mesas de trabajo

Asuntos generales

Acuerdos

Asistencia

**\*Transmisión en vivo\***



# ACH

Tema	Indicador	Periodicidad	Semana al 26/08	Semana al 02/09	Próximo reporte
Tiraderos clandestinos	Metros cúbicos de residuos sólidos levantados en tiraderos clandestinos en el perímetro de ACH	Semanal	1,086 m <sup>3</sup>	1,023 m <sup>3</sup>	10 de Septiembre
Limpieza	Metros cúbicos de basura recolectada en el Perímetro de la ACH (Producto de Barrido)	Semanal	2,465 m <sup>3</sup>	2,437 m <sup>3</sup>	10 de Septiembre
Mantenimiento a infraestructura	Número de Incidencias de daño en infraestructura del Perímetro de la ACH reparadas y atendidas	Semanal	138	168	10 de Septiembre



# ACH | Eliminación de grafiti

**1,355**

**m<sup>2</sup> totales**

\*La mayoría son reincidencias

- calles atendidas **35**
- cortinas metálicas **91**
- fachadas **46**





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
CULTURA  
CENTRO  
HISTÓRICO

## Eliminación de grafiti en cantera

**ISABEL LA CATÓLICA, MOTOLINIA, DONCELES,  
REPÚBLICA DE CHILE, REPÚBLICA DE EL SALVADOR, BOLÍVAR**

Se han limpiado  
**671 m<sup>2</sup>**

Se inició en  
inmuebles que no  
son catalogados con  
**gel desincrustante.**



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS






GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

CENTRO HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

# REINCIDENCIAS DE GRAFITI DEL 23 AL 31 DE AGOSTO

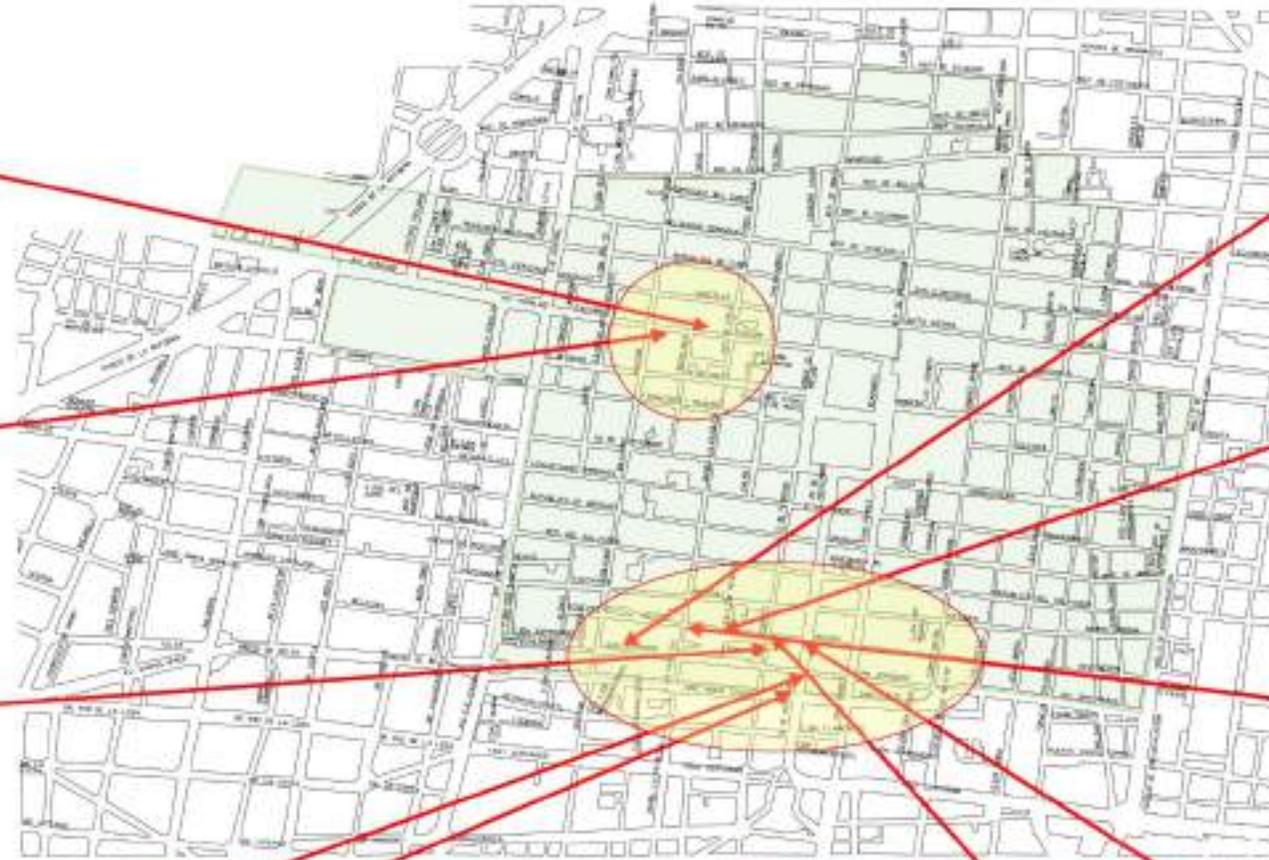

TACUBA



TACUBA



REGINA



20 DE NOVIEMBRE



20 DE NOVIEMBRE



REGINA



SAN JERÓNIMO



REGINA



REGINA



20 DE NOVIEMBRE





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
CULTURA  
CENTRO  
HISTÓRICO

## ACH | obras menores

Se realizaron trabajos en:

**Corregidora**  
**República de Guatemala**  
**Venustiano Carranza**  
**Correo Mayor**  
**Tacuba**  
**y Dolores de Av. Juárez a**  
**Ayuntamiento**

Los trabajos realizados consistieron en **reparación de piezas de recinto** en banqueta de Corregidora, **reparación de registro** en República de Guatemala, **reparación de banquetas** en Venustiano Carranza, **reparación de arroyo vehicular** en Correo Mayor, **reparación de registro** en Tacuba y **reposición de 160 tapas de dren** en la calle Dolores de Av. Juárez a Ayuntamiento



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



CENTRO  
HISTÓRICO




MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

## EL SÁBADO 31 DE AGOSTO REALIZAMOS "TEQUIO" EN EL BARRIO CHINO

con la participación Vecinos y empresarios de la Asociación de Comerciantes, desarrollando las siguientes acciones:

- Limpieza de calles y andadores peatonales
- Reforestación
- Limpieza de grafiti con pintura en muros
- Limpieza de grafiti con pintura en cortinas metálicas
- Colocación de tapas en drenaje pluvial
- Mantenimiento en mobiliario urbano

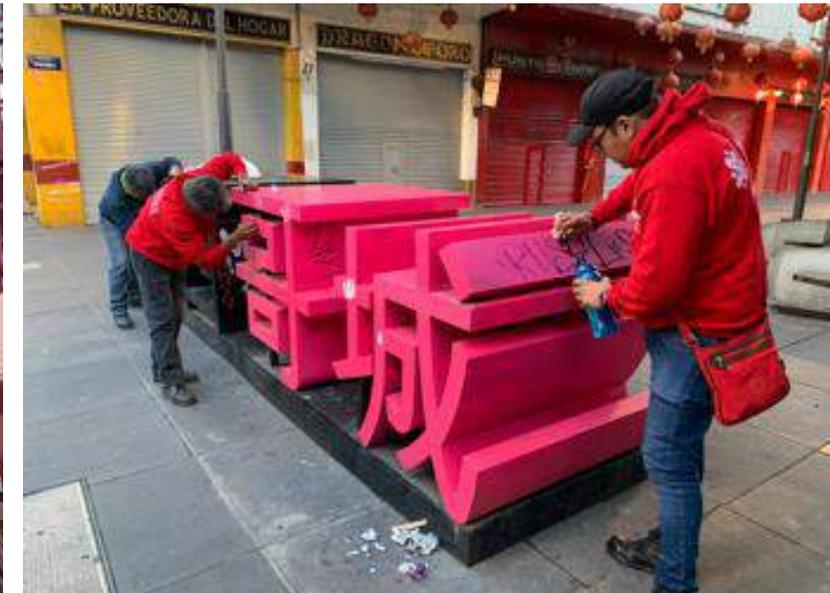



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



CENTRO HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

# ACH | ene - ago


Acciones de limpieza ACH

## 78,083 m<sup>3</sup>

Basura recolectada por barrido en perímetro ACH

## 47,241 m<sup>3</sup>

Residuos sólidos levantados de tiraderos clandestinos del perímetro ACH

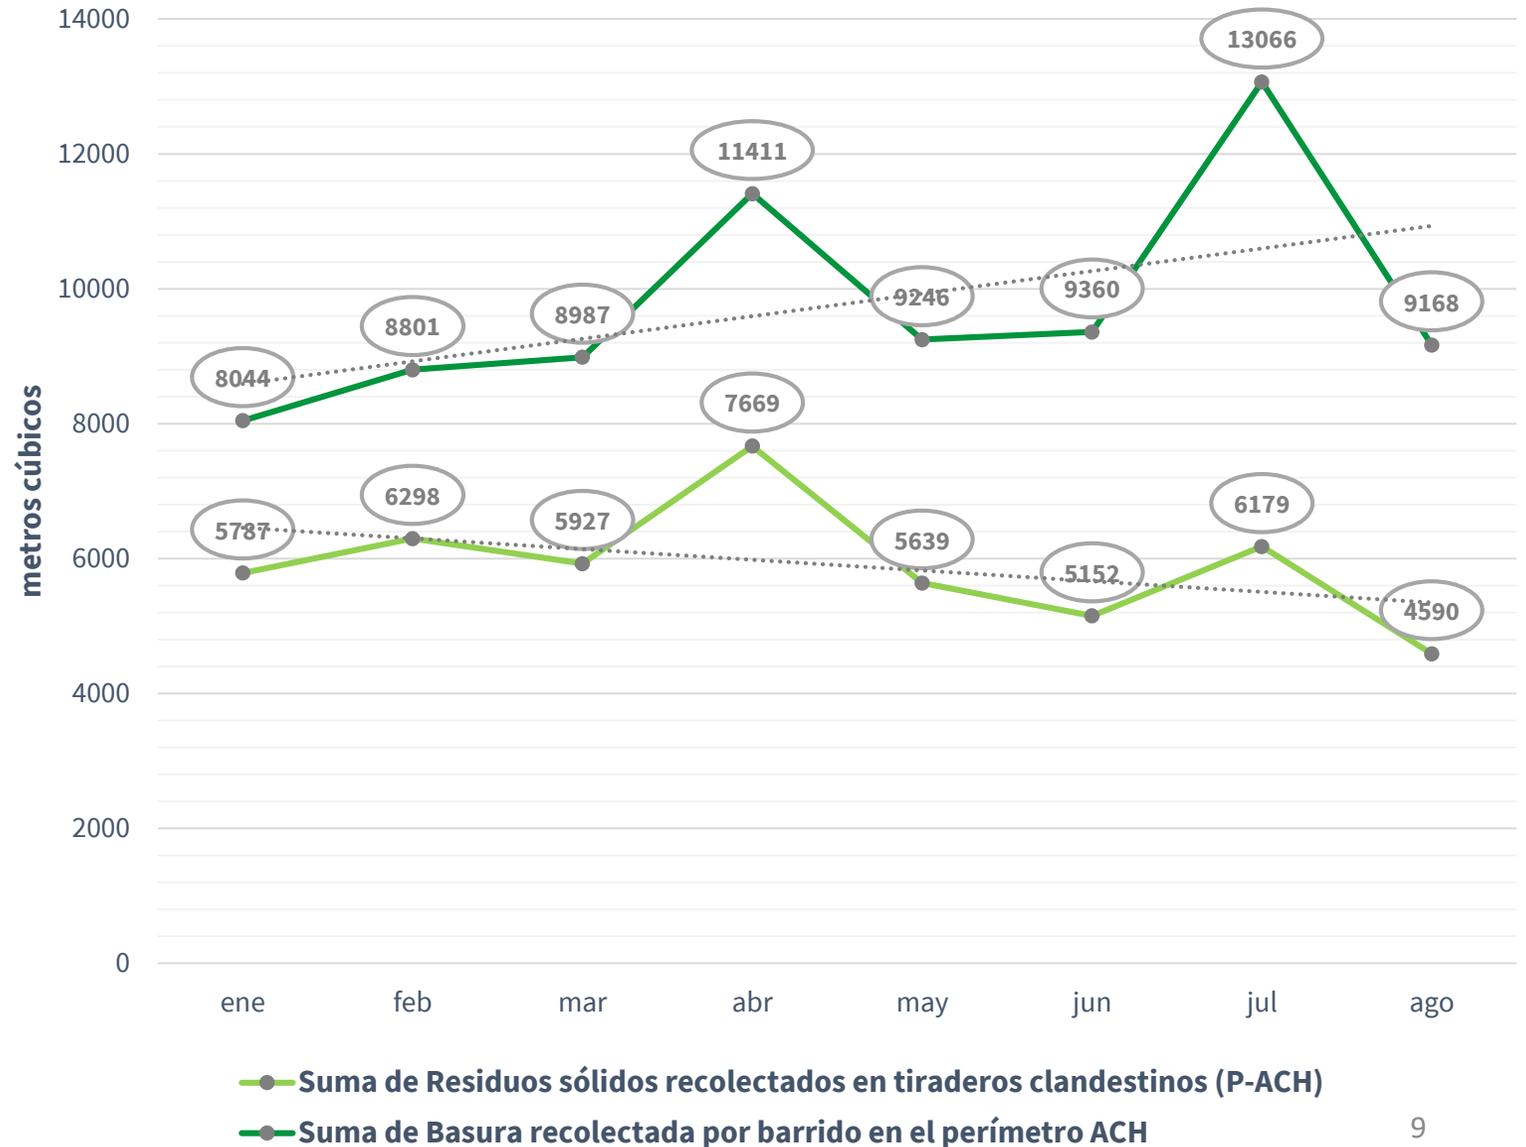




# ACH | ene - ago

## Incidencias atendidas

# 640

Incidencias de daño en infraestructura del Perímetro de la ACH reparadas y atendidas\*

(\*) de una meta de 2,190 incidencias, representando un avance del 30%

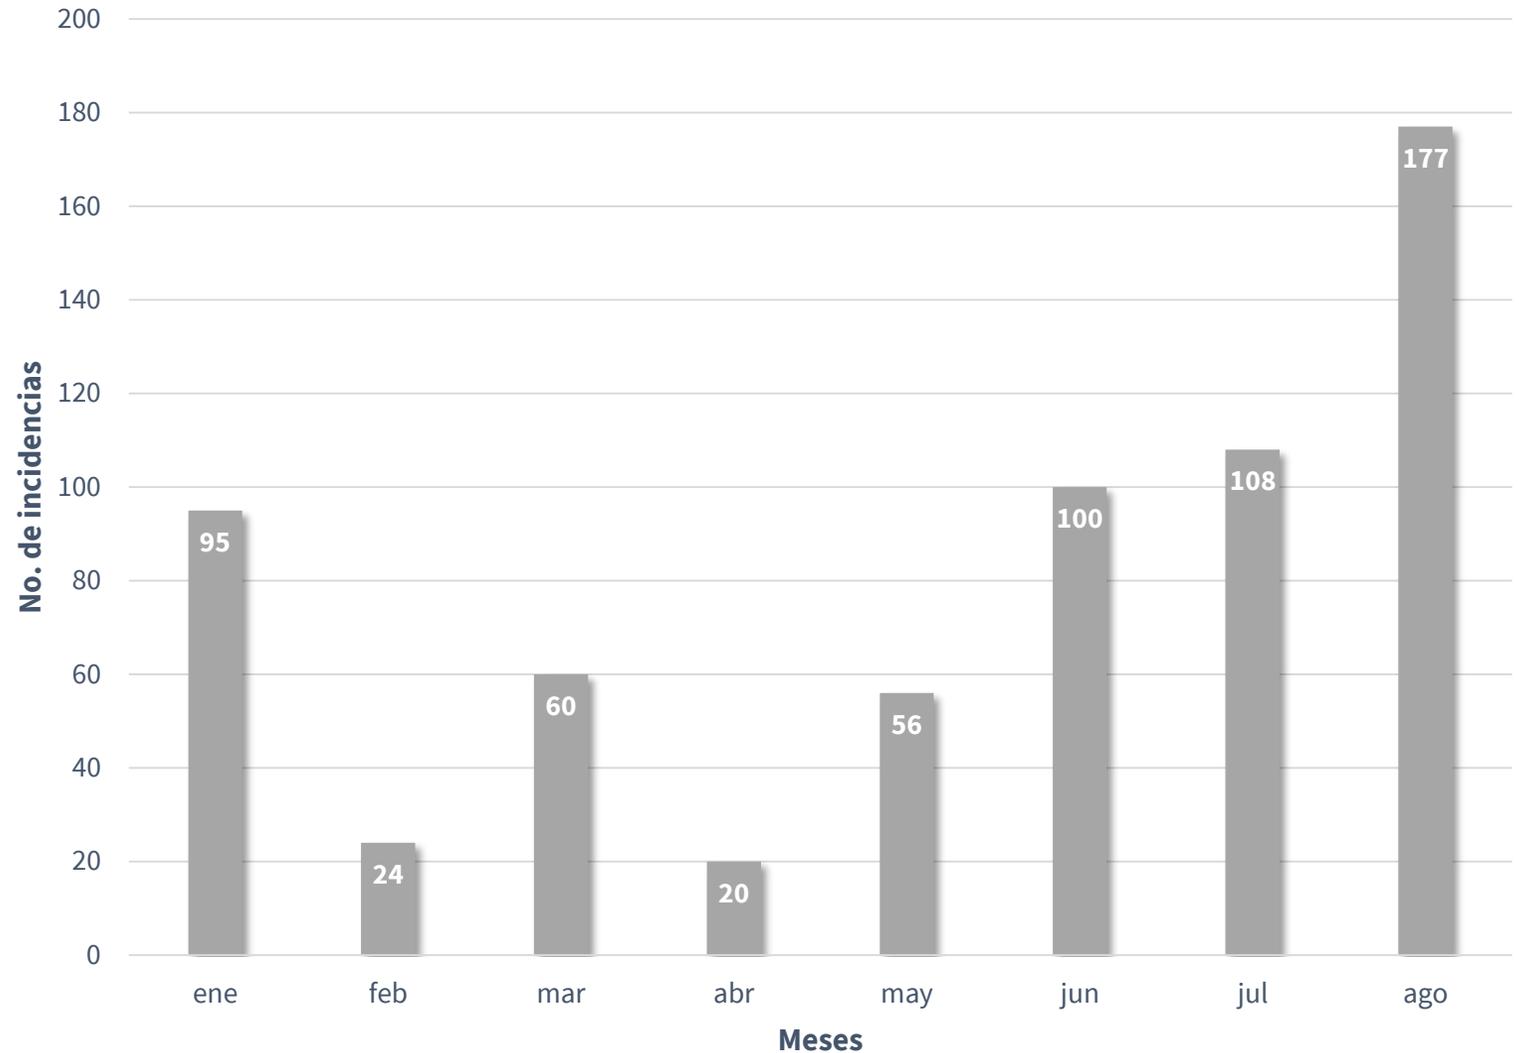



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



CENTRO HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

# ACH | feb- ago


## Eliminación de grafiti

# 18,052 m<sup>2</sup>

### De cortinas limpias

# 8,901 m<sup>2</sup>

### De fachadas limpias

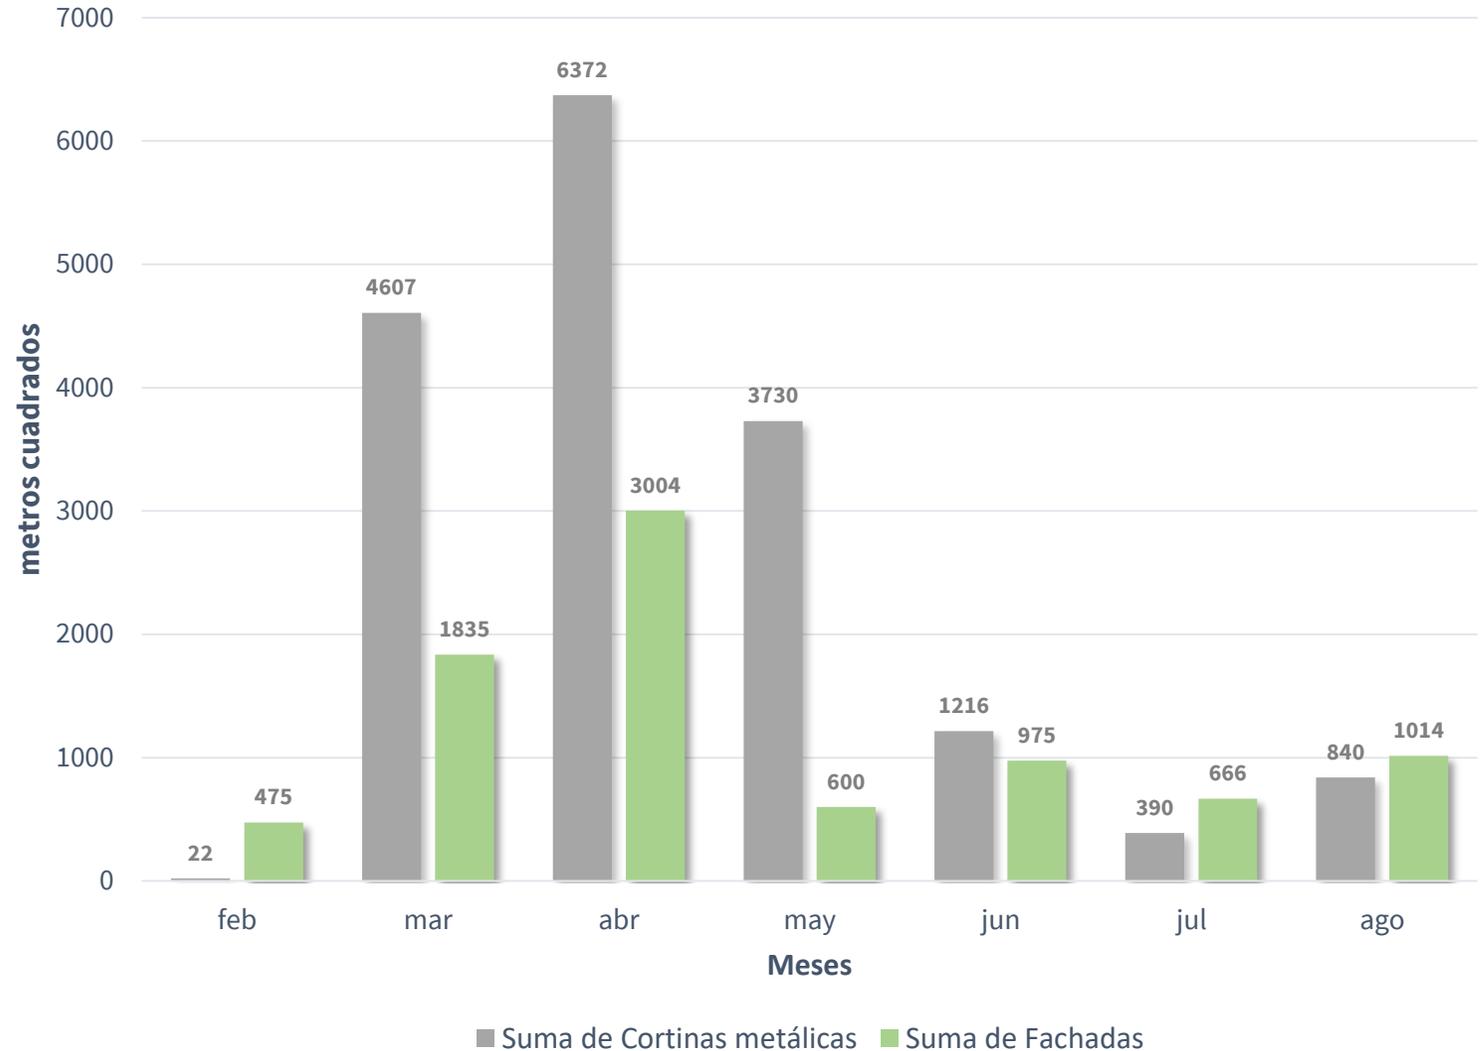



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



CENTRO HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

# ACH | feb- ago

## Eliminación de grafiti

# 2,371 m2


### De thinner utilizado

# 499 m2

### De antigrafiti utilizado

# 671 m2

### De gel utilizado

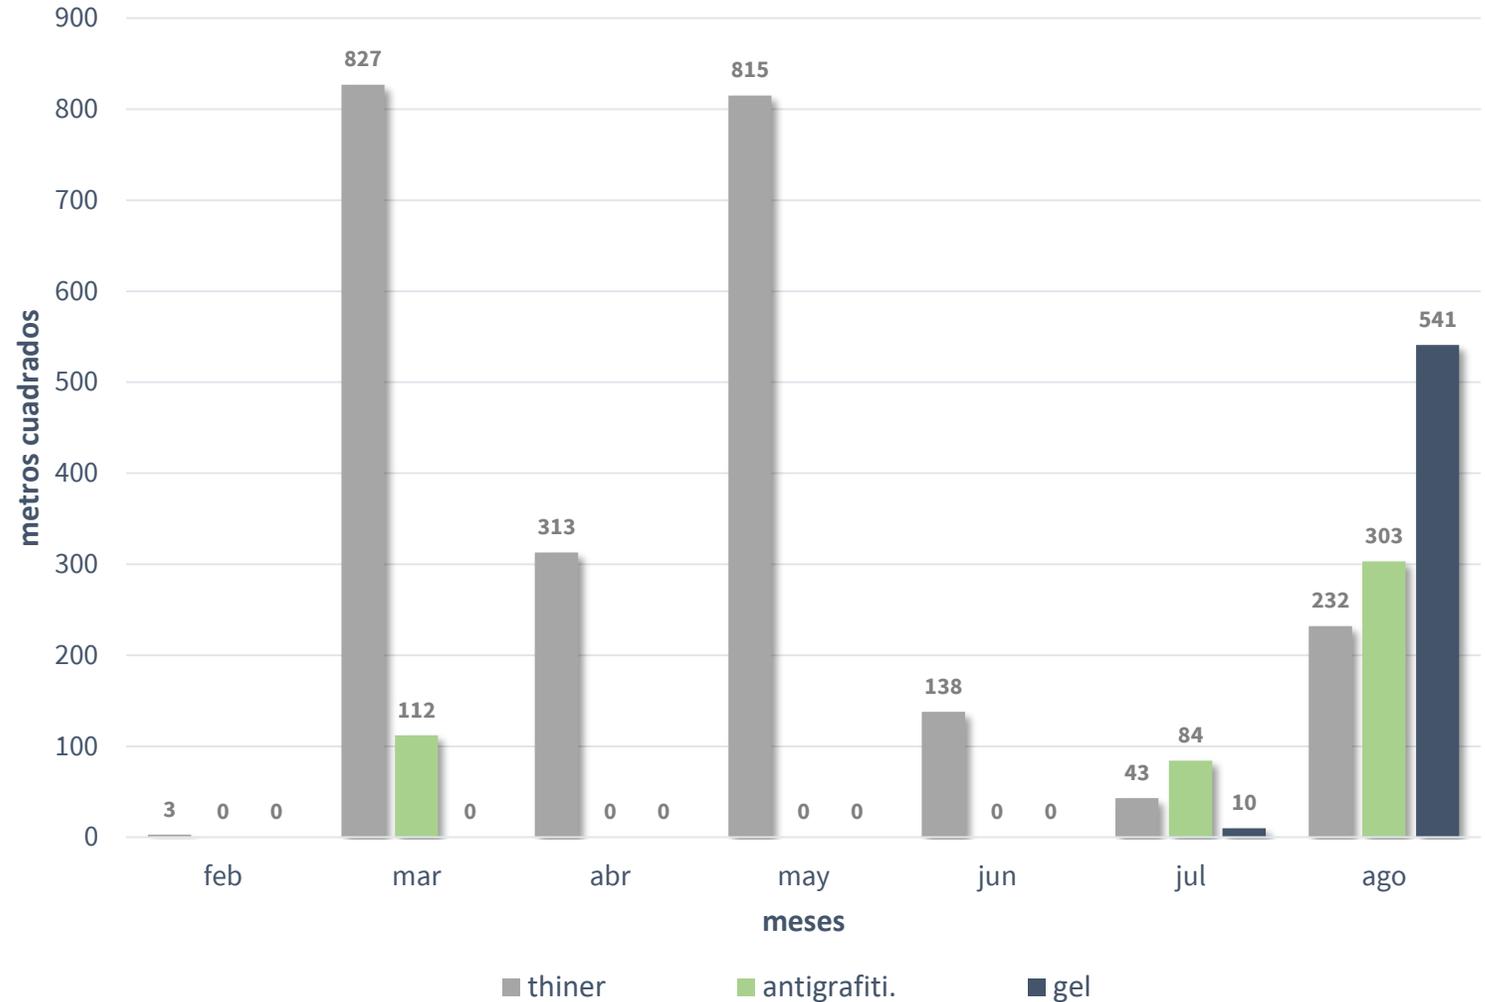



# Alc. Cuauhtémoc

Tema	Indicador	Periodicidad	Semana al 26/08	Semana al 02/09	Próximo reporte	Observaciones
Luminarias	Número de Luminarias reparadas en vías secundarias en PB de Cuauhtémoc	Quincenal	111	38	17 de septiembre	Se realizó la revisión a 149 Luminarias. Anexo 1
Poda	Número de sujetos forestales podados	Quincenal	1	8	17 de septiembre	Se realizó la poda a 9 sujetos forestales. Anexo 1



# Alc. Cuauhtémoc

Tema	Indicador	Periodicidad	Semana al 26/08	Semana al 02/09	Próximo reporte	Observaciones
Desazolve	Red de drenaje desazolvada en PB de Cuauhtémoc (m lineales)	Quincenal	58	60	17 de septiembre	Se realizó el desazolve de 118 metros lineales, 3 rejillas de piso, 34 coladeras de banqueta y 6 registros. Anexo 1
Limpia (Colecta de solidos)	Escuelas limpias y toque de campana	Quincenal	274	269	17 de septiembre	Se recolectaron 543 m3 de residuos sólidos (48 m3 de residuos orgánicos y 495 m3 de inorgánicos)



# Alc. Cuauhtémoc | Anexo 1

REPORTE DE LUMIARIAS REPARADAS EN LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC					
DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		COLONIA	CANTIDAD	MOTIVO
BUEN TONO	ERNESTO PUGIBET	ARCOS DE BELEN	CENTRO ALAMEDA	17	
DOLORES # 2	JUAREZ	INDEPENDENCIA	CENTRO ALAMEDA	21	
INDEPENDENCIA	LOPEZ	LUIS MOYA	CENTRO ALAMEDA	14	
DELICIAS	LOPEZ	EJ E LAZARO CARDENAS	CENTRO ALAMEDA	11	
ARANDA	VICTORIA	AYUNTAMIENTO	CENTRO ALAMEDA	6	
LOPEZ	INDEPENDENCIA	ART. 1 2 3	CENTRO ALAMEDA	8	
AYUNTAMIENTO # 59	LUIS MOYA	LAZRO CARDENAS	CENTRO ALAMEDA	26	
VIZCAINAS	LOPEZ	EJE CENTRAL	CENTRO ALAMEDA	11	
				111	
				LUMINARIAS	

REPORTE DE LUMIARIAS REPARADAS EN LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC					
DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		COLONIA	CANTIDAD	MOTIVO
MANZANARES	JESUS MARIA	ROLDAN	CENTRO MERCED	13	
RAMON CORONA	CIRCUNVALACION	SANTO TOMAS	CENTRO MERCED	13	
ALDACO	VIZCAINAS	PLAZA VIZCAINAS	CENTRO CENTRO	9	
ROLDAN # 127	FRAY SERVANDO	PUENTE DE SANTO TOMAS	CENTRO MERCED	3	
				TOTAL	38
					LUMINARIAS



# Alc. Cuauhtémoc | Anexo 1

REPORTE DE PODAS REALIZADOS EN LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC					
DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		COLONIA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
BOLIVAR # 35 DÉPTO 301	SAN SALVADOR EL SECO	FRAY SERVANDO	CENTRO CENTRO	1	
				1 SUJETO FORESTAL	

REPORTE DE PODAS REALIZADOS EN LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC					
DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		COLONIA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
PLAZA SANTOS DEGOLLADO	DOLORES	REVILLAGIGEDO	CENTRO ALAMEDA	8	
ALFONSO REYES	ESQ. ENSENADA			11	
			TOTAL	8 SUJETOS FORESTALES	



# Alc. Cuauhtémoc | Anexo 1

REPORTE DE DESAZOLVES REALIZADOS EN LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC					
DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		COLONIA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
LEANDRO VALLE # 8	APARTADO	VENEZUELA	CENTRO NORTE	12 MTS	
VIDAL ALDÓCER	EJE 1 NORTE	REP. COSTA RICA	CENTRO NORTE	8 MTS	
FRAY SERVANDO # 112	ESQ ISABEL LA CATOLICA		CENTRO CENTRO	3 MTS	
DOLORES # 50	VICTORIA	AYUNTAMIENTO	CENTRO ALAMEDA	30 MTS	
LUIS MOYA # 46	ART 123	INDEPENDENCIA	CENTRO ALAMEDA	5 MT	
				58 MTS	


REPORTE DE DESAZOLVES REALIZADOS EN LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC					
DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		COLONIA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
APARTADO	REP. BOLIVIA		CENTRO ORIENTE	60 MTS	
			TOTAL	60 MTS	



# Al. Cuauhtémoc | ene - ago


## 2, 247

### Luminarias Reparadas

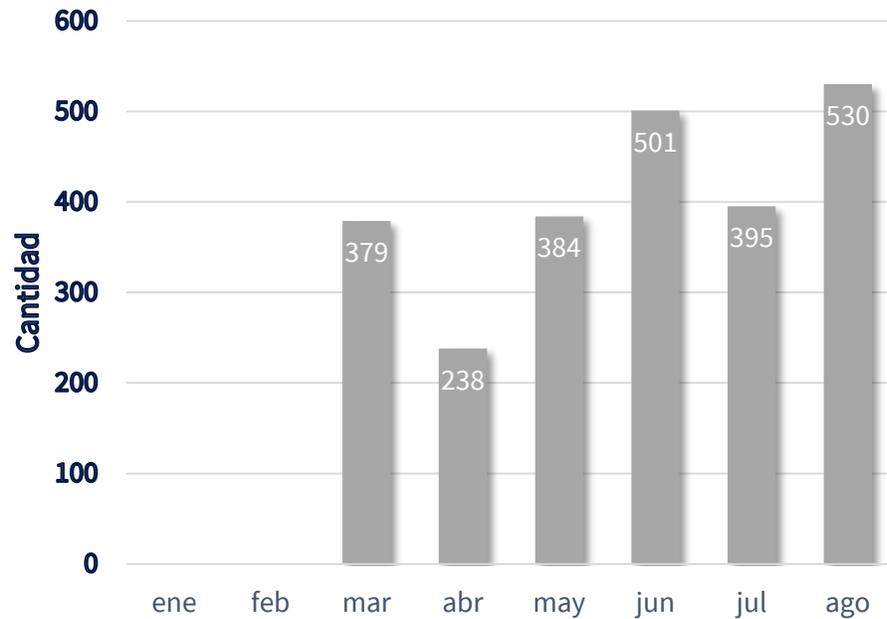

## 566

### Sujetos Forestales Podados

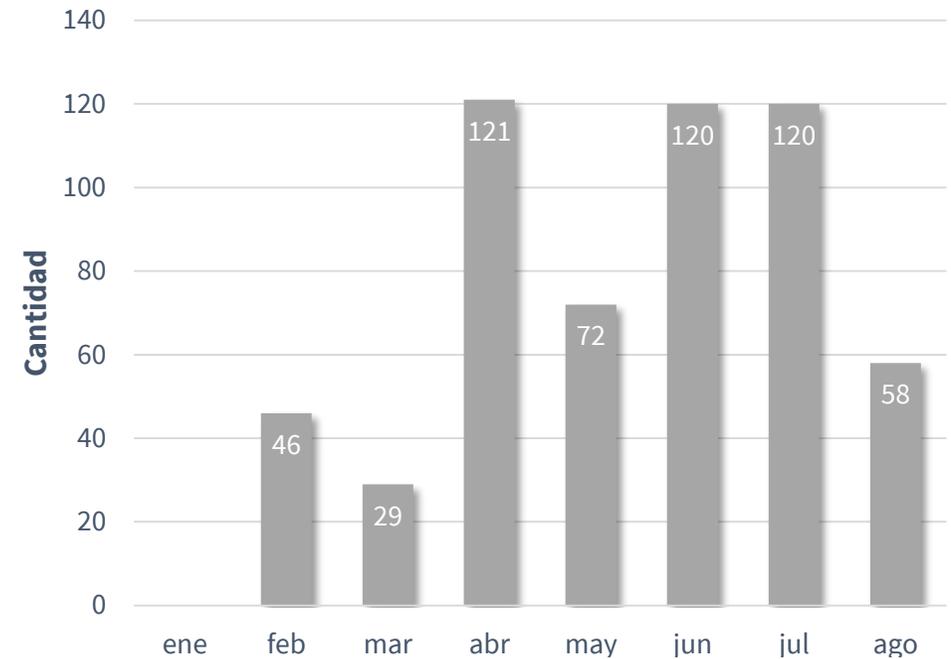




# Al. Cuauhtémoc | ene - ago


## 4,689 m

### Drenaje Desazolvado

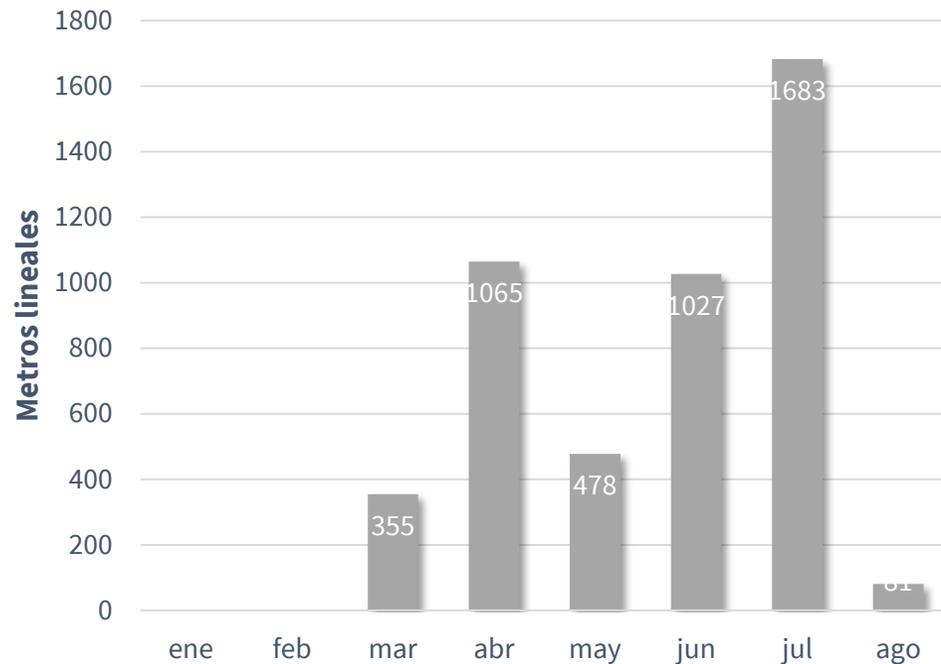

## 5, 415 m<sup>3</sup>

### Residuos Sólidos Recolectado

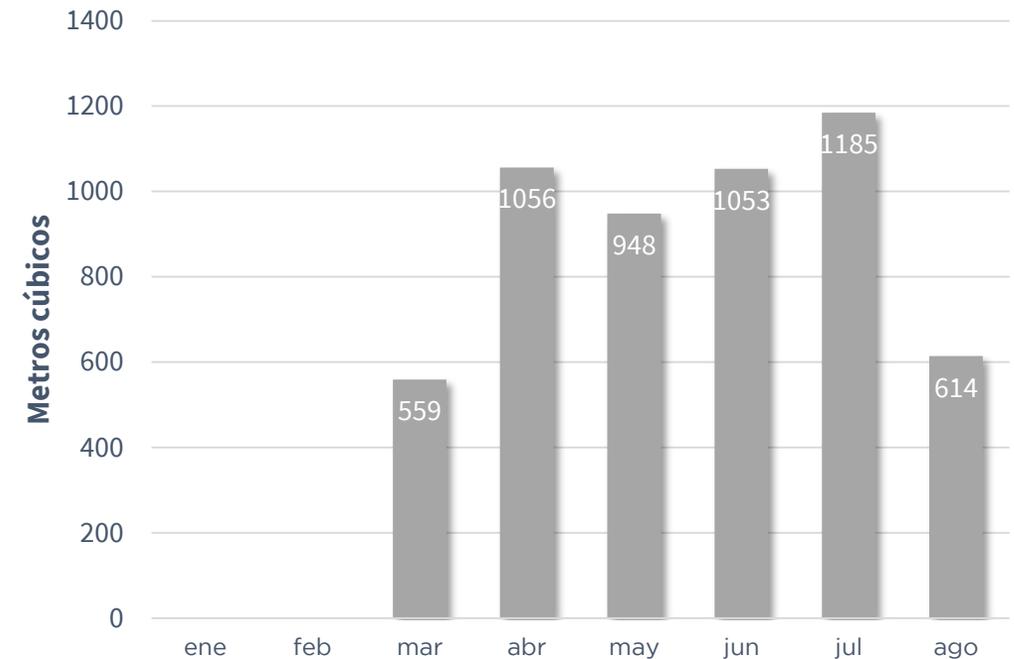



# Alc. Venustiano Carranza

Tema	Indicador	Periodicidad	Semana al 26/08	Semana al 02/09	Próximo reporte	Observaciones
Luminarias	Número de Luminarias reparadas en vías secundarias	Semanal	0	16	10 de septiembre	Se detalla la ubicación y la causa en el Anexo
Tiraderos clandestinos	Toneladas de residuos solidos recolectados de tiraderos clandestinos en el PB de VC (línea base: 26 tiraderos) m3	Semanal	26 (477.4 m3)	26 (492.8 m3)	10 de septiembre	32 toneladas diariamente de Residuos Sólidos



# Alc. Venustiano Carranza | Anexo 1

REPORTE DE LUMIARIAS REPARADAS EN EL PERÍMETRO B EN LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA					
DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		COLONIA	CANTIDAD	MOTIVO
F C INTEROCENICO	HEROE DE NACUZARI	PENITENCIARIA	AMPL. PENITENCIARIA	15	MANTENIMIENTO
F C DE CINTURA	CENTRAL DE PINTORES	CIRCUNVALACION	EMILIO CARRANZA	1	RECONEXIÓN DE LINEAS
			TOTAL	16	



# Alc. Venustiano Carranza | Anexo 1

RELACION DE TIRADEROS CLANDESTINOS				
Nº. CONSECUTIVO	UBICACIÓN	TIPO DE RESIDUOS SÓLIDOS %	CANTIDAD TONS	SECTOR
01	MIGUEL DOMINGUEZ Y PENITENCIARIA COL. AMPLIACIÓN PENITENCIARIA	90% BASURA 10% CASCAJO	1.5	5-1
02	EJE 1 NORTE Y HORTELANOS COL. MORELOS	90% BASURA 10% CASCAJO	2.5	5-1
03	AV. CIRCUNVALACIÓN ENTRE HÉROES DE NACOZARI Y SAN ANTONIO TOMATLAN	85% BASURA 15% CASCAJO	1	5-2
04	ZAPATA ESQ. AV. CIRCUNVALACIÓN	85% BASURA 15% CASCAJO	1	5-2
05	NACIONAL ESQ. VIDAL ALCOCER	85% BASURA 15% CASCAJO	1.5	5-2
06	COSTA RICA ESQ. VIDAL ALCOCER	85% BASURA 15% CASCAJO	1.5	5-2
07	PEÑA Y PEÑA ESQ. VIDAL ALCOCER	85% BASURA 15% CASCAJO	0.5	5-2
08	VIDAL ALCOCER Y BERRIOZABAL COL. MORELOS	85% BASURA 15% CASCAJO	2	5-2
09	AV. CIRCUNVALACIÓN Y G. PEDRAZA (MERCADO DULCES I) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	2	5-9
10	AV. CIRCUNVALACIÓN Y CARRIZAL (MERCADO DE FLORES) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	1.5	5-9
11	AV. CIRCUNVALACIÓN Y CARRETONES (METRO MERCED) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	1	5-9
12	JUAN DE LA GRANJA Y CORREGIDORA (LAS CANCHAS) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.2	5-9
13	SANTA ESCUELA Y CUADRANTE DE LA SOLEDAD COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.5	5-9


RELACION DE TIRADEROS CLANDESTINOS				
Nº. CONSECUTIVO	UBICACIÓN	TIPO DE RESIDUOS SÓLIDOS %	CANTIDAD TONS	SECTOR
14	ROSARIO ESQ. PLAZA SAN LAZARO (ATRÁS DE LA IGLESIA) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.5	5-9
15	AV. CIRCUNVALACIÓN Y SOLEDAD COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	2	5-9
16	AV. CIRCUNVALACIÓN Y MANZANARES COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	2	5-9
17	JUAN PABLO ESQ. CORREGIDORA COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.5	5-9
18	CONGRESO DE LA UNIÓN ESQ. GENERAL ANAYA COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.2	5-9
19	GENERAL ANAYA ESQ. JUAN DE LA GRANJA COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.3	5-9
20	JUAN DE LA GRANJA ESQ. SAN CIPRIAN COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	2.5	5-9
21	CORREGIDORA Y SAN SIMÓN COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	0.2	5-9
22	PLAZA DE LA SOLEDAD, SAN SIMÓN Y SANTA ESCUELA COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	0.5	5-9
23	TOLVA 2 COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	2.6	5-9
24	TOLVA 3 COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	3	5-9
25	AV. CIRCUNVALACIÓN Y CARRETONES COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	0.5	5-9
26	JUAN DE LA GRANJA ESQ. SAN CIPRIAN COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	0.5	5-9



# Al. V. Carranza | ene - ago


## 721

### Luminarias Reparadas

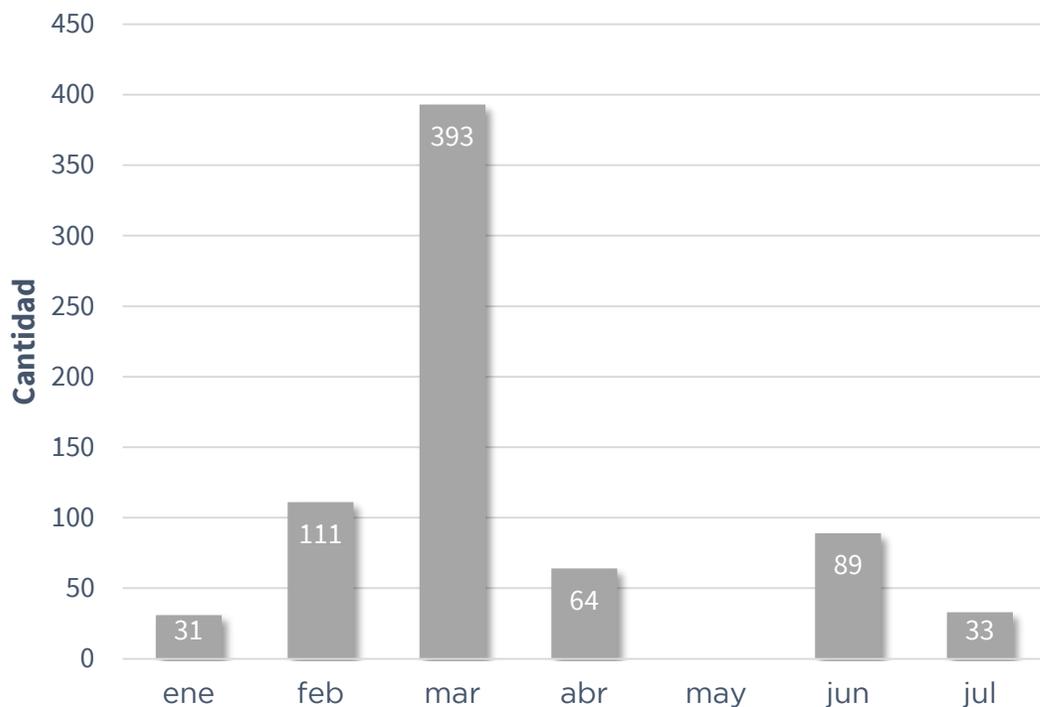

## 8,060 m<sup>3</sup>

### Residuos Sólidos Recolectado

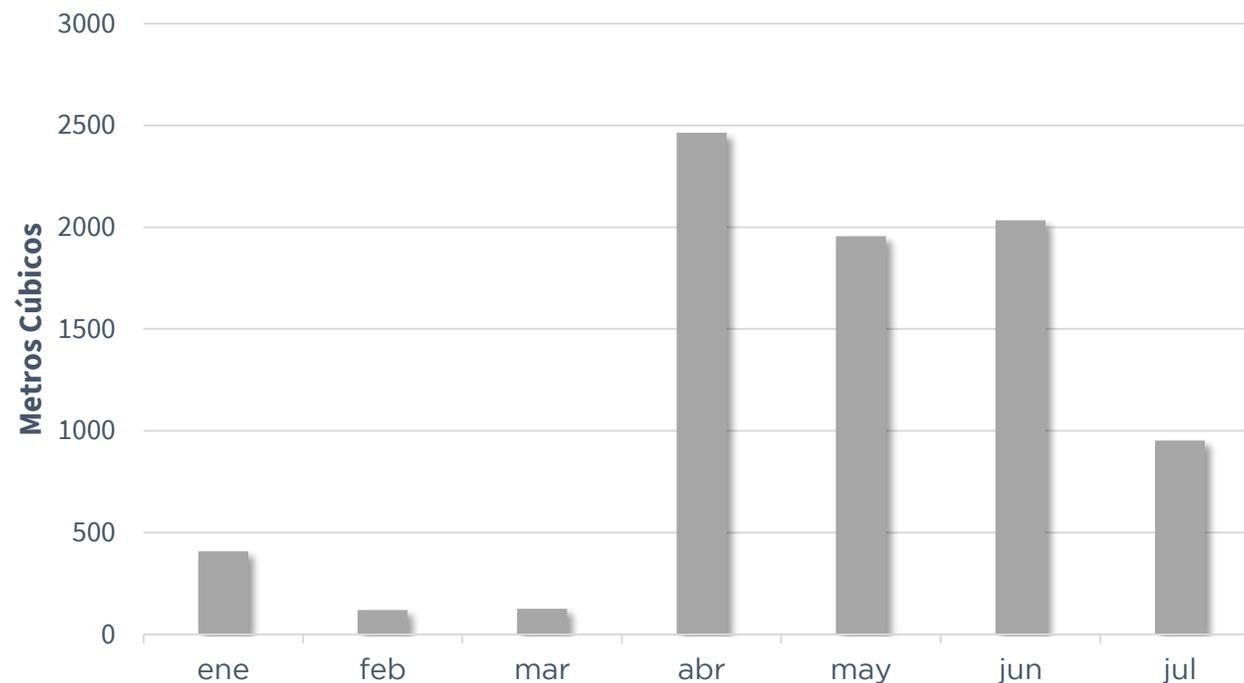

# Sacmex

## AGUA POTABLE

Sustitución de tubería de 152 mm. (6") de diámetro de Agua Potable y Sustitución de tuberías de 0.38, 0.45 y 0.61 m. de diámetro de Drenaje de polietileno de alta densidad, sobre las calles Santa Veracruz, 2º y 3er. Callejón San Juan de Dios, Valerio Trujano, Plaza 2 de Abril, Andador Teatro Blanquita y Pensador Mexicano, Colonia Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc.



Avance Físico Reprogramado	83.17 %	Tubería Existente		1217.00 m.
Avance Físico Real:	79.05 %	Tubería Instalada		1014.80 m.

# Sacmex

## DRENAJE

Sustitución de tubería de 152 mm. (6") de diámetro de agua potable y Sustitución de tuberías de 0.38, 0.45 y 0.61 m. de diámetro de drenaje de polietileno de alta densidad, sobre las calles Santa Veracruz, 2º y 3er. Callejón San Juan de Dios, Valerio Trujano, Plaza 2 de Abril, Andador Teatro Blanquita y Pensador Mexicano, Colonia Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc.



Avance Físico Reprogramado 83.17 %  
Avance Físico Real: 79.05 %

Tubería Existente		1268.00 m.
Tubería Instalada		1035.00 m.

# Sacmex

## AGUA POTABLE

Sustitución de tubería de 305 mm. (12"), 152 mm. (6") y 101 mm. (4") de diámetro de agua potable y Sustitución de tuberías de 0.38, 0.45 y 0.61 m. de diámetro de drenaje de polietileno de alta densidad, sobre las calles Mina, Galeana, Riva Palacio y Violeta, Colonia Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc.



Avance físico reprogramado: 90.05 %  
Avance físico real: 86.70 %

Tubería Existente		1108.00 m.
Tubería Instalada		729.00 m.

# Sacmex

## DRENAJE

Sustitución de tubería de 305 mm. (12"), 152 mm. (6") y 101 mm. (4") de diámetro de agua potable y Sustitución de tuberías de 0.38, 0.45 y 0.61 m. de diámetro de drenaje de polietileno de alta densidad, sobre las calles Mina, Galeana, Riva Palacio y Violeta, Colonia Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc.



Avance físico reprogramado: 90.05 %  
**Avance físico real:** 86.70 %

Tubería Existente		852.00 m.
Tubería Instalada		688.80 m.




# Sacmex | ene - ago

## Metraje de red secundaria de drenaje desazolvada

**27,669 m**  
Albañal desazolvado

**319,177 m**  
Atarjeas desazolvadas

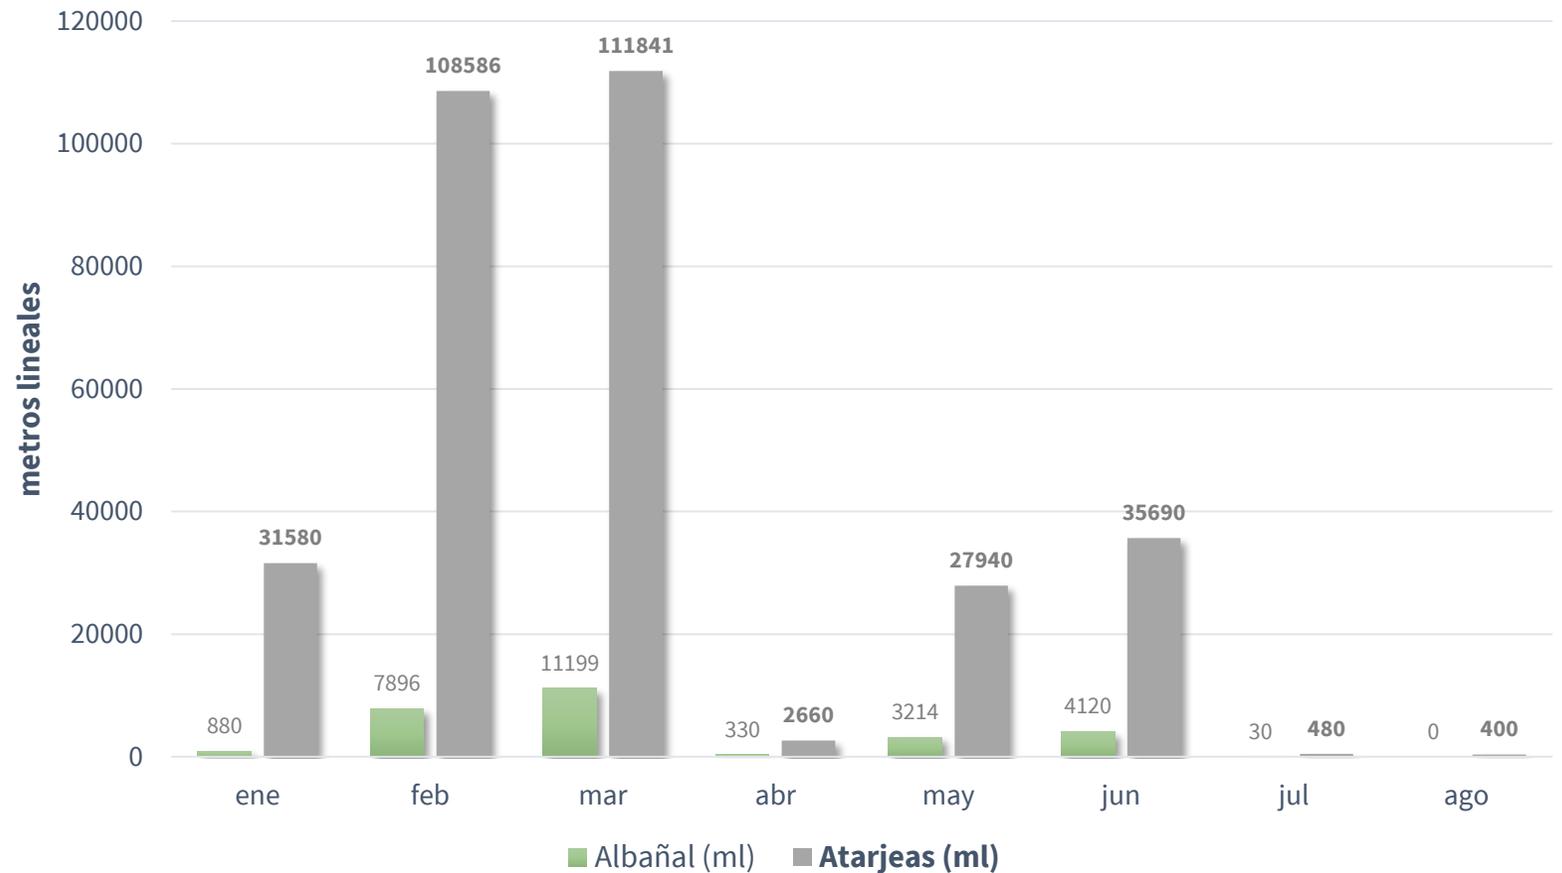




# Sacmex | ene - ago


## 7,688

### Coladeras pluviales

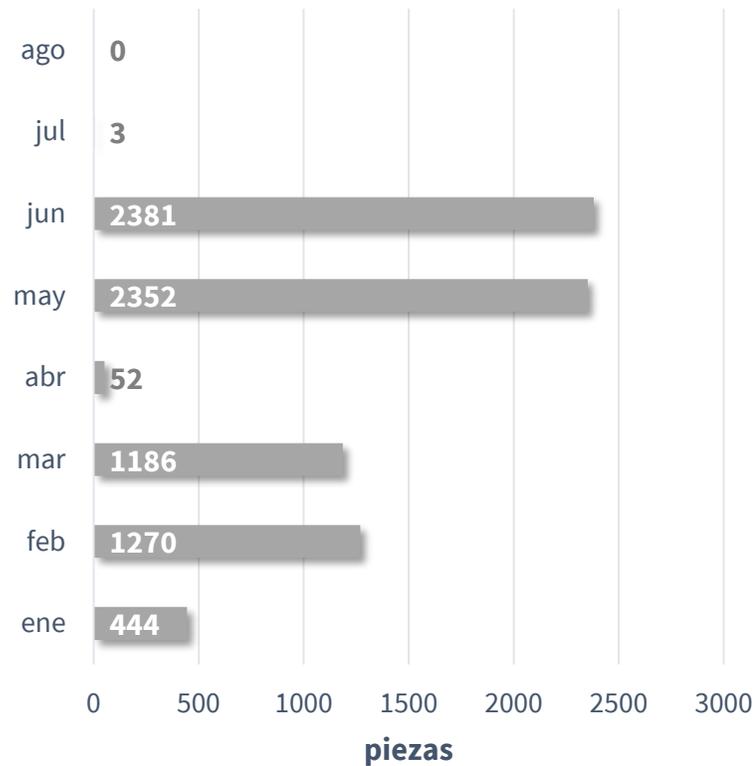


## 3,881

### Rejillas de piso

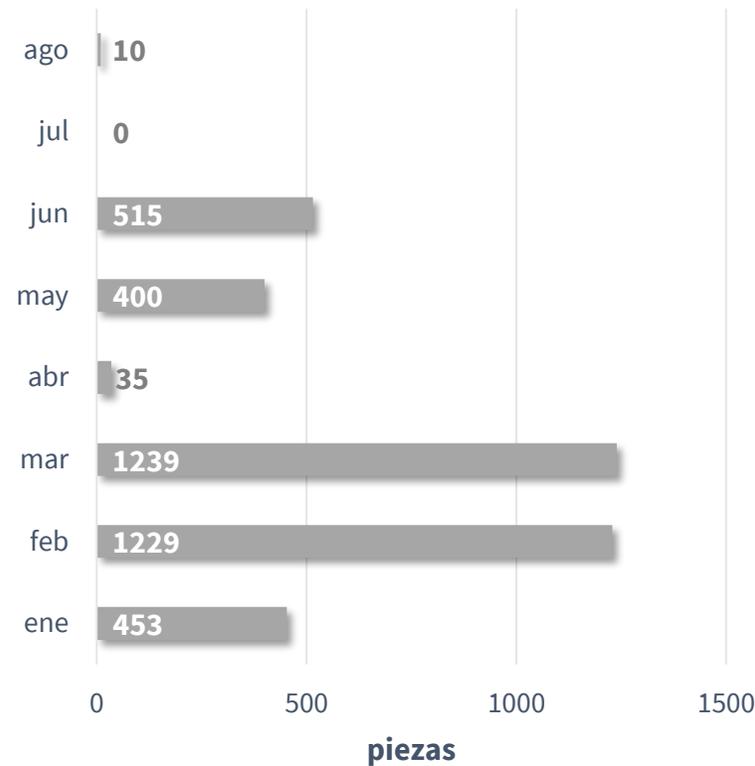

## 6,090

### Pozos de visita

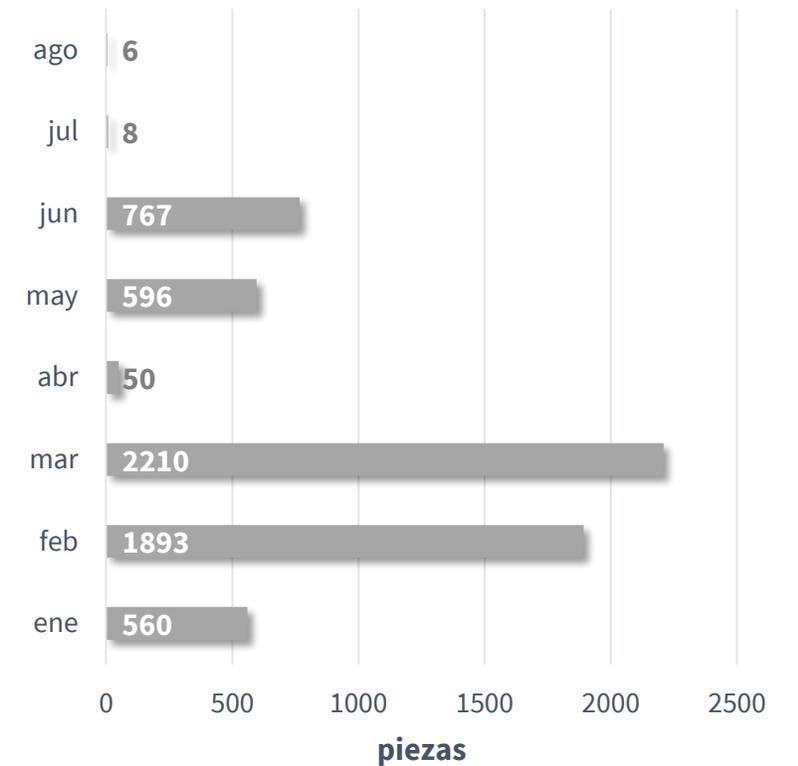



Sacmex | ene - ago

**100%**  
de los trabajos en  
la Antigua Merced  
concluidos\*

(\*) restitución de tubería de  
agua potable y drenaje

**1,111 m** de tubería nueva de agua potable

**1,028 m** de tubería nueva de drenaje

En las siguientes calles:

- **Calle Leona Vicario**

entre las calles de Gral. Miguel Alemán y Soledad

**539 m de tubería de agua potable**

**499 m de tubería de drenaje**

- **Calle Soledad**

entre las calles de Correo Mayor y eje 1 Ote.

**572 m de tubería de agua potable**

**529 m de tubería de drenaje**



# SOS – Alumbrado Público

Tema	Indicador	Periodicidad	Semana al 26/08	Semana al 02/09	Próximo reporte
Alumbrado Público	Número de luminarias reparadas en vías del PA del CH	Semanal	54	59	10 de septiembre
Alumbrado Público	Número de luminarias reparadas en vías del PA del CH	Semanal	01	0	10 de septiembre




# SOS – Alumbrado Público | Anexo 1

## Reporte de luminarias reparadas en Centro Histórico Perímetro A

Dirección	Entre calles	Colonia	Cantidad	Motivo	Incidencia	
República de Perú	Allende	República de Chile	Centro	1	Se restablece itm	Circuito apagado
Museo de la Estampa	Primer callejón	San Juan de Dios	Centro	20	Se realiza trabajo de reparación de proyectores	Proyectores apagados
Eje Central	16 de septiembre	Av. Juárez	Centro	5	Se realiza cambio de fotocelda	Luminarios en 24 hrs
Francisco I. Madero	Isabel la católica	Palma	Centro	3	Se realiza cambio de fotocelda	Luminario apagado
República del Salvador	Isabel la católica	Bolívar	Centro	1	Se cambia lámpara	Luminario apagado
República del Salvador	Las Cruces	Jesús María	Centro	2	Se cambia balastro	Luminario apagado
Comonfort	República de Honduras	República de Paraguay	Centro	3	Se realiza reconexión de líneas de alimentación	Luminario apagado
5 de mayo	Motolinía	Bolívar	Centro	1	Se realiza reconexión de líneas de alimentación	Luminario apagado
Venustiano Carranza	20 de noviembre	José María Pino Suárez	Centro	1	Se cambia lámpara	Luminario apagado
Corregidora	Academia	Jesús María	Centro	18	Se restablece itm	Luminario apagado
Alameda Central	Av. Hidalgo	Av. Juárez	Centro	3	Se realiza reconexión de líneas de alimentación	Luminario apagado
República de Colombia	Carmen	Callejón de Girón	Centro	1	Se realiza reconexión de líneas de alimentación	Luminario apagado
			<b>TOTAL</b>	<b>59</b>		



# SOS-AP | ene - ago

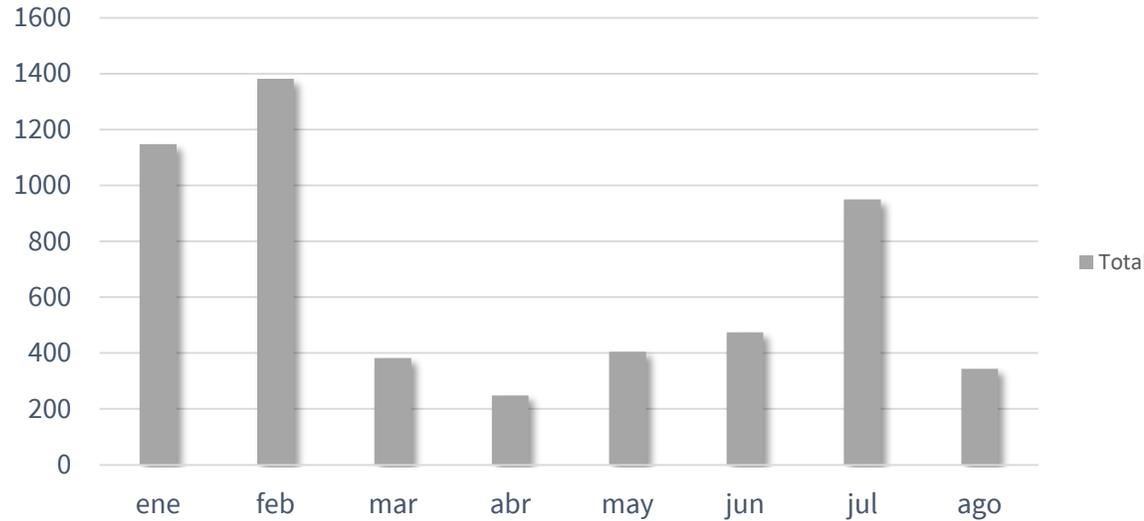


## Perímetro A

# 5,333

## Luminarias reparadas en PA

Luminarias reparadas en PB

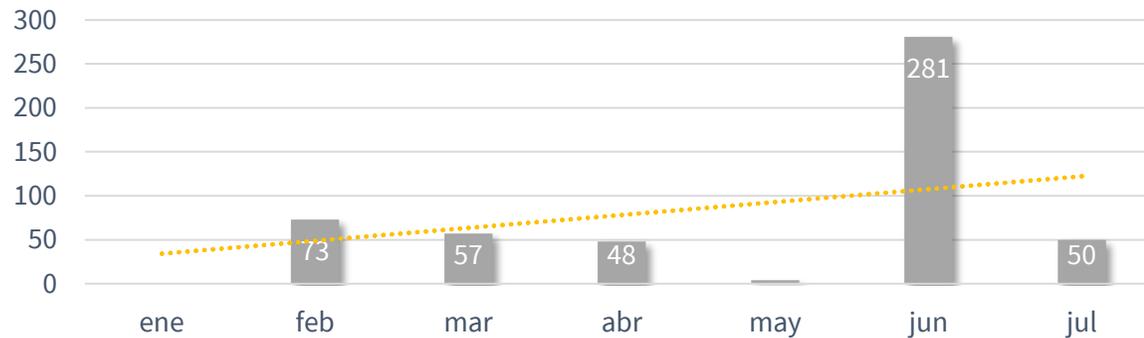

## Perímetro B

# 513

## Luminarias reparadas en PB

# SOS-DGOIV

## Rehabilitación y mantenimiento vial - antiguo barrio San Pablo Zoquiapan

Frente de trabajo	Ubicación vialidad y tramo	Empresa	Concepto	Avance real	Avance programado	Programa de obra	Medidas de mitigación
4	Trabajos de rehabilitación y mantenimiento vial del antiguo barrio <b>San Pablo Zoquiapan</b> , en las calles de <b>Soledad y Leona Vicario</b>	Impulsora de Desarrollo Integral, S. A. de C. V. (IDINSA)	Rehabilitación y mantenimiento vial	<a href="#">5.55%</a>	<a href="#">28.74%</a>	<a href="#">Secuencias</a>	



# SOS-DGOIV

## Rehabilitación y mantenimiento vial - Plaza Loreto-Jardín del Obispo y calle Valerio Trujano

Frente de trabajo	Ubicación vialidad y tramo	Empresa	Concepto	Avance real	Avance programado	Programa de obra	Medidas de mitigación
3	Trabajos de rehabilitación y mantenimiento vial en la <b>Plaza Loreto, Jardín del Obispo, Valerio Trujano</b>	Consortio de ingenieros constructores y consultores, s. A de c. V. (CICSA )	Rehabilitación y mantenimiento vial Loreto	<a href="#">4.80%</a>	<a href="#">31.11%</a>	<a href="#">Secuencias</a>	



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL  
CENTRO  
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

# SOS-DGOIV

## Rehabilitación y mantenimiento vial - calles de Galeana, Soledad, Pedro Moreno, Fco. Javier Mina, Santísima, Margil y Leona Vicario

Frente de trabajo	Ubicación vialidad y tramo	Empresa	Concepto	Avance real	Avance programado	Programa de obra	Medidas de mitigación
5	Trabajos de rehabilitación y mantenimiento vial de las calles de <b>Galeana</b> , calle <b>Riva Palacio</b> y <b>Violeta</b>	Arte y Diseño en Arquitectura s. A. De c. V.	Rehabilitación y mantenimiento vial	<a href="#">6.60%</a>	<a href="#">31.11%</a>	<a href="#">Secuencias</a>	



# STC-METRO


Tema	Línea base	Periodicidad	Semana al 02/09	Próximo reporte	Observaciones
Infraestructura	Número de escaleras electromecánicas con falla o algún problema (línea base: 75 escaleras en 29 estaciones)	Quincenal	5 escaleras en mantenimiento	10 de septiembre	- 70 equipos están funcionando
Infraestructura	Número de elevadores en reparación (línea base: 19 elevadores en 29 estaciones)	Quincenal	0 elevadores detenidos	02 de septiembre	- 19 equipos están funcionando



# STC-METRO | ene - ago


## 51

### Reparaciones en escaleras electromecánicas

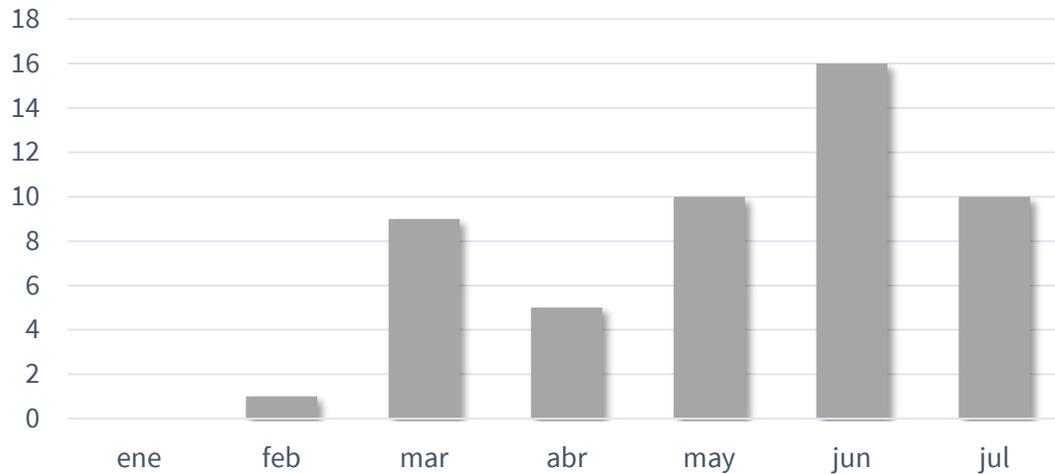

## 23

### Reparaciones en elevadores

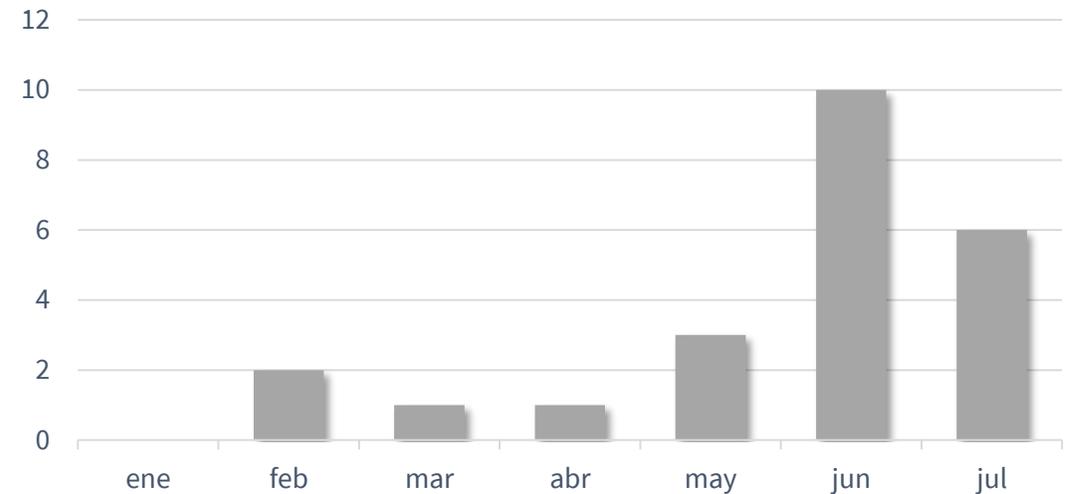



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



CENTRO  
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

# ADIP

<b>Tema</b>	<b>Indicador</b>	<b>Periodicidad</b>	<b>Reporte al 26/08</b>	<b>Reporte al 02/09</b>	<b>Próximo reporte</b>
Conectividad e Infraestructura Tecnológica	Número de puntos de conexión wifi habilitados en postes de C5 (Línea base: 589)	Quincenal	205	222	10 de septiembre



# ADIP

589 registros

Filtros activos ✕ Borrar todo

geometría: Área dibujada en el mapa  
ESTATUS CONECTIVIDAD: SIN WIFI  
ESTATUS CONECTIVIDAD: WIFI GRATUITO\_ACTIVO

Filtros

Buscar registros...

### COLONIA

- CENTRO 207
- GUERRERO 16
- ZONA CENTRO 47
- MORELOS 41
- DOCTORES 22
- EL PARQUE 11
- + MÁS

### ALCALDIA

- CUAJALTEPEC 400
- VENUSTIANO CARRANZA 29

### BOTON

- CON BOTON 425
- SIN BOTON 131
- N/A 23

### ALTAVOZ

- CON ALTAVOZ 454
- SIN ALTAVOZ 112
- N/A 23

### ESTATUS CONECTIVIDAD

- SIN WIFI 387
- WIFI GRATUITO\_ACTIVO 202

## Ubicación de puntos de acceso gratuito a internet WiFi vía infraestructura C5 (actuales y próximos)

Información Tabla Mapa Exportar API



Compartir Imprimir Widget

[https://datos.cdmex.gob.mx/explora/mbod/datacat/ubicacion-acceso-gratuito-internet-wifi-c5/map?query=estatus\\_conectividad&geoFilter=polygon=\[19.446347358159413,-89.14865011354777\],\[19.435683806715573,-89.151010457\]](https://datos.cdmex.gob.mx/explora/mbod/datacat/ubicacion-acceso-gratuito-internet-wifi-c5/map?query=estatus_conectividad&geoFilter=polygon=[19.446347358159413,-89.14865011354777],[19.435683806715573,-89.151010457])



# ADIP | 25 jun - ago


Puntos de conexión WI-FI habilitados

# 205

## Puntos de conexión WI-FI

## habilitados\*

(\*) de una meta de 589 puntos, representando un avance del 34.8%

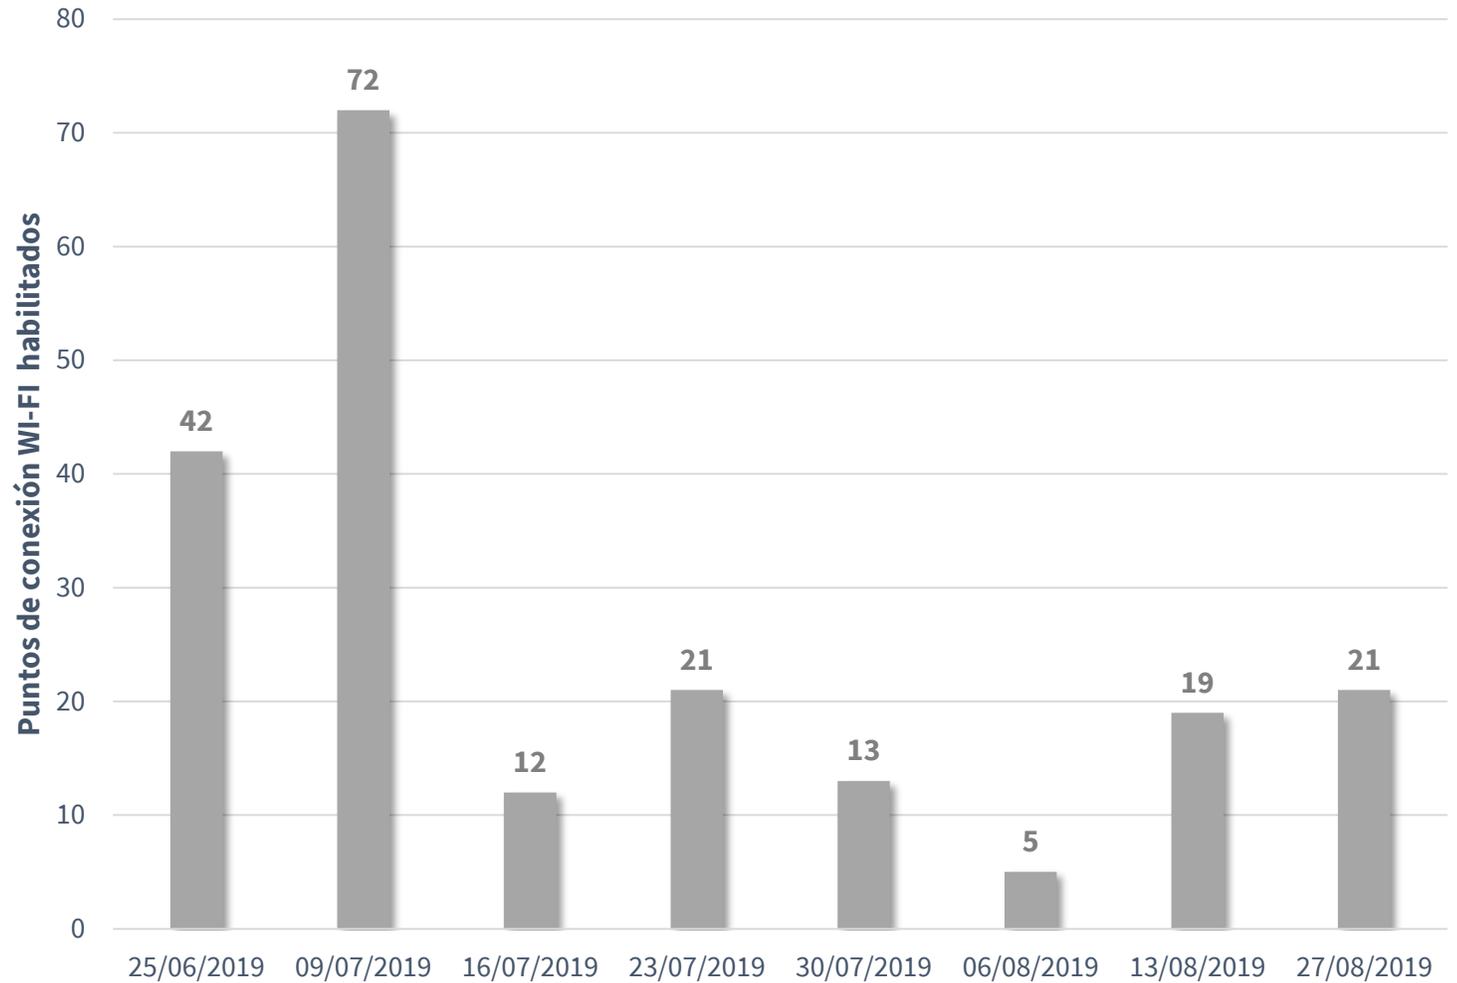



# ILIFE

Tema	Indicador	Periodicidad	Mes de Julio	Mes de Agosto	Próximo reporte
Sismo 19S	Porcentaje de avance de escuelas con daños del Sismo 19S en 3 escuelas*	Mensual	77.33%	77.66%	13 de septiembre
Mantenimiento de escuelas	Porcentaje de avances de escuelas con el programa de mantenimiento normal del Instituto en 20 escuelas*	Mensual	58.00%	65.39%	13 de septiembre



## ILIFE | Inmuebles escolares en proceso de atención 2018 -2019 en Centro Histórico

No.	PLANTEL	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES
1	ESCUELA PRIMARIA MIGUEL SERRANO	100.00 %	ENTREGADA JUNIO
2	ESCUELA SECUNDARIA ADRIANA GARCIA CORRAL	37.00 %	
3	ESCUELA SECUNDARIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ SEC TEC No. 6	100.00 %	ENTREGADA ABRIL
4	ESCUELA PRIMARIA REPÚBLICA DE BOLIVIA	100.00 %	ENTREGADA ABRIL
5	ESCUELA PRIMARIA ALFREDO E. URUCHURTU	100.00 %	ENTREGADA ABRIL
6	ESCUELA PRIMARIA PABLO MORENO	75.11 %	
7	ESCUELA PRIMARIA REPÚBLICA DE ARGENTINA	100.00 %	ENTREGADA ABRIL
8	ESCUELA NACIONAL PARA CIEGOS LIC. IGNACIO TRIGUEROS	64.97 %	
9	TELESECUNDARIA NO. 91	69.59 %	
10	ESCUELA PRIMARIA SARA MANZANO	89.27 %	
11	ESCUELA PRIMARIA MARCELINO DÁVALOS	59.47 %	
12	ESCUELA PRIMARIA REPÚBLICA DE PANAMÁ	67.74 %	



## ILIFE | Inmuebles escolares en proceso de atención 2018 -2019 en Centro Histórico

No.	PLANTEL	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES
13	ESCUELA SECUNDARIA JOSÉ MANUEL RAMOS	97.68 %	
14	ESCUELA PRIMARIA ABRAHAM CASTELLANOS	100.00 %	ENTREGADA ABRIL
15	ESCUELA SECUNDARIA ÁNGEL TRÍAS ÁLVAREZ	66.47 %	
16	JARDÍN DE NIÑOS CADETES DE LA NAVAL	40.98 %	
17	ESCUELA SECUNDARIA NO. 1 CÉSAR A. RUÍZ	95.00 %	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE BARRA POR FUNDACIÓN BOSCH
18	JARDÍN DE NIÑOS ENRIQUE PESTALOZZI	94.05 %	
19	ESCUELA PRIMARIA FRAY PEDRO DE GANTE	83.05 %	
20	ESCUELA PRIMARIA JOAQUÍN GARCÍA ICAZBALCETA	11.07 %	
21	JARDÍN DE NIÑOS JUAN JACOBO ROUSSEAU	75.38 %	
22	ESCUELA PRIMARIA LIC. PONCIANO ARRIAGA	75.86 %	
23	ESCUELA PRIMARIA REPÚBLICA DE LÍBANO	97.91 %	



INAH

**Tramites de solicitudes de autorización de obra en inmuebles ubicados en el "Centro Histórico de la Ciudad de México" ingresados en la Ventanilla Única del 16 al 30 de agosto de 2019.**

Fecha de ingreso	Ubicación	Nº	Tipo de Obras	Dictamen	Nombre del inmueble
16-Aug-19	JESUS MARIA	112-4	TOLDOS	APROBADO 21-08-19	
20-Aug-19	ARTICULO 123	90	REMODELACION	APROBADO 29-08-19	
20-Aug-19	JUAREZ	70	REMODELACION	APROBADO 29-08-19	
20-Aug-19	PALMA	45	ANUNCIO	ATENDIDO 23-08-19	
20-Aug-19	16 DE SEPTIEMBRE	69	ANUNCIO	APROBADO 20-08-19 ATENDIDO 26-08-19	
20-Aug-19	VIZCAINAS	16	MANTENIMIENTO		
20-Aug-19	REP URUGUAY	107	T/O	APROBADO 30-08-19	
21-Aug-19	REP VENEZUELA	45	ANUNCIO		
21-Aug-19	PALMA	35	ANUNCIO		
21-Aug-19	FRANCISCO I MADERO	17	PENDONES		
21-Aug-19	SOLEDAD, SAN JERONIMO, REP URUGUAY, REP CUBA	S/N	MANTENIMIENTO FACHADAS		
22-Aug-19	SEMINARIO	8	PRORROGA DE LICENCIA		
23-Aug-19	URUGUAY ESQ CORREO MAYOR	131 Y 71	MANTENIMIENTO		
23-Aug-19	PORTAL SANTO DOMINGO	4	MANTENIMIENTO		
23-Aug-19	SAN JERONIMO	47	PRORROGA LICENCIA	APROBADO 30-08-19	
26-Aug-19	ISABEL LA CATOLICA	35	SUSTITUCION CRISTAL DE APARADOR		
26-Aug-19	BUCARELI	58	MANTENIMIENTO	ATENDIDO 30/8/19	
27-Aug-19	RODRIGUEZ PUEBLA	25 AA	COLOCACION DE LONA PARA TOLDO		
27-Aug-19	MONEDA	16	CAMBIO LAMPARAS Y CONTACTOS		
27-Aug-19	REP VENEZUELA	72	MANTENIMIENTO		MERCADO ABELARDO L RODRIGUEZ
29-Aug-19	EJE CENTRAL LAZARO CARDENAS	30	OBRA NUEVA		
30-Aug-19	ISABEL LA CATOLICA	108	MANTENIMIENTO		
30-Aug-19	CORREGIDORA	75	REPARACION DE CORTINA METALICA		
30-Aug-19	DONCELES	75	MANTENIMIENTO		
30-Aug-19	LORETO	S/N	RESTAURACION		



# INAH

## Tramites de obra en inmuebles ubicados en el "Centro Histórico de la Ciudad de México" autorizados del 16 al 30 de agosto de 2019.

Ubicación	N°	Tipo de obra	Nombre del inmueble	Autorización
REGINA	11	CONSTRUCCIÓN DE ESCALERA	ESCUELA SECUNDARIA DIURNA N° 1 "CÉSAR RUÍZ"	386/19
REPÚBLICA DE BRASIL	53	PRÓRROGA. MANTENIMIENTO.		387/19
16 DE SEPTIEMBRE	43	REFORZAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL.		389/19
RIVA PALACIO	51	SUSTITUCIÓN DE LOSA.		394/19
AV. JUÁREZ	38	SUSTITUCIÓN DE PUERTAS.		395/19
REPÚBLICA DE ARGENTINA	33	MANTENIMIENTO.		397/19
REPÚBLICA DE URUGUAY	90	REHABILITACIÓN.		398/19



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
CULTURA  
CENTRO  
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

# Secretaría de Cultura

Tema	Indicador	Periodicidad	Semana al 02/09
Infraestructura	Actividades realizadas en infraestructura cultural	Semanal	1- Colocación de maqueta del Dr. Rafael Lucio Nájera en Avenida Paseo de la Reforma entre Avenida de la República y Lafragua  2-Se inició por parte de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural del INAH, la limpieza de las esculturas ubicadas en Paseo de la Reforma.




# SEDEMA | 09 abril - ago

## Sujetos forestales plantados

# 156

## Sujetos forestales plantados\*

(\*) de una meta de 162 sujetos, representando un avance del 96.2%

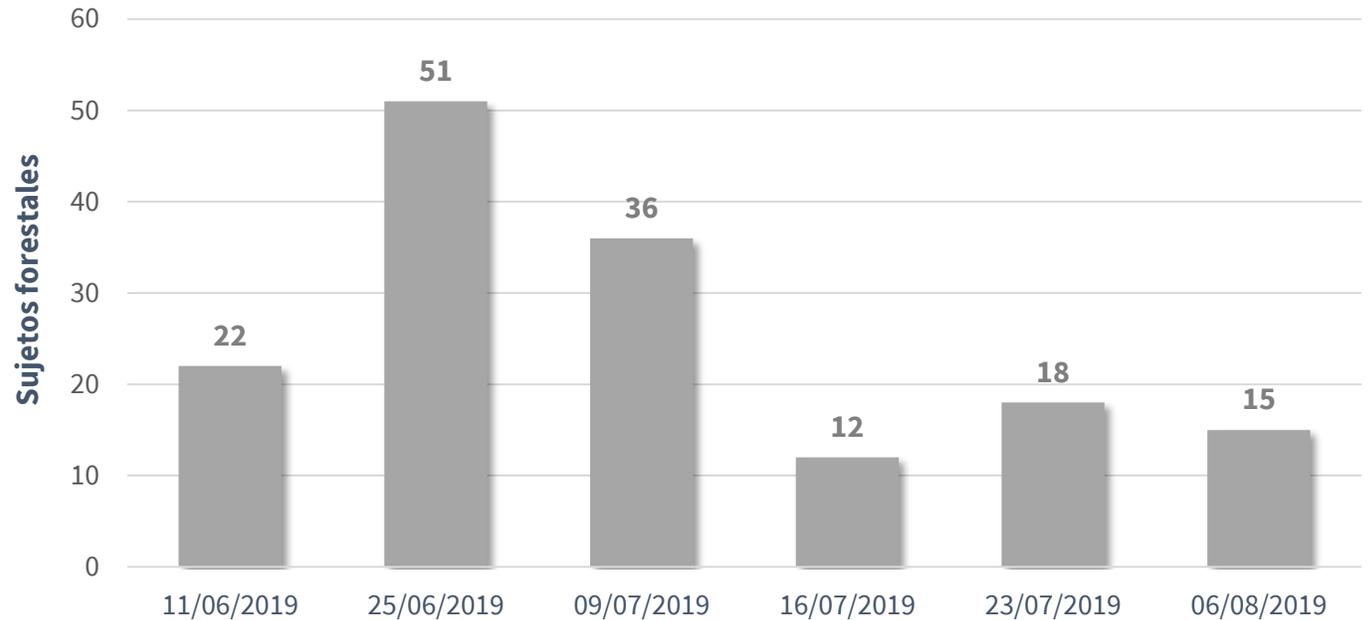

### ¿Dónde?

1. Tacuba
2. Venustiano Carranza
3. República de Uruguay
4. Mesones
5. Palma
6. Francisco I. Madero
7. 5 de mayo



### MESAS DE TRABAJO DE LA AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO 2019 INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR SEDECO



# SEDECO

Ciudad de México, a 3 de septiembre de 2019

#### Conservación y Mantenimiento de los Mercados Públicos:

Con la finalidad de fomentar la conservación y mantenimiento que propicien las mejores condiciones de seguridad, operación e higiene en los Mercados Públicos del perímetro "A" "y B" del centro histórico de la CDMX, a partir del 14 de enero de año en curso a la fecha, se han visitado un total de 28 mercados públicos.

De lo anterior, se derivó la identificación de diversas necesidades y prioridades de atención, principalmente de infraestructura, las cuales fueron informadas a las Alcaldías respectivas. Se recibió copia de seguimiento por parte de la Dirección de Mercados y Vías Pública de la Alcaldía Cuauhtémoc. Se sigue esperando respuesta por parte de la Dirección General de Gobierno de la Alcaldía Venustiano Carranza o bien por su Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano.

#### OTRAS NECESIDADES IDENTIFICADAS:

##### PROTECCIÓN CIVIL:

Conjuntamente con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, se está desarrollando el "Acuerdo por el que se establecen los comités de gestión integral de riesgos y protección civil en los mercados Públicos de la Ciudad de México", se elaborará el "Protocolo de abasto ante emergencias en los mercados públicos".

##### SEGURIDAD EN LOS MERCADOS PÚBLICOS:

Conjuntamente con la Dirección General de Administración Operativa del C5, se está trabajando a fin de que los mercados públicos cuentan con videocámaras (circuitos cerrados) instaladas al interior y puedan ser enlazados al C2 y C5.

Elaboró:

Lic. Elsa Iris Rueda Salgado  
JED de Modernización e Infraestructura

Autorizó:

Lic. Alberto Birrichaga Membrillo  
Director de Proyectos para el Desarrollo Económico de los Canales de Abasto, Comercio y Distribución



# SEDECO

## Obra de restitución y reconstrucción de mercados (siniestrados por incendio en febrero 2013)

Alcaldía	Mercado	NO. OFICIAL	ACCIONES REALIZADAS		
			TEMA	PERÍODO	OBSERVACIONES
Venustiano Carranza	Merced Nave Mayor	102	- Levantamiento de censo de locatarios que serán afectados por la obras.	Del 6 agosto, al 3 de septiembre del 2019	En coordinación con la Alcaldía, la Subsecretaría de Programas de Alcaldías de la Secretaría de Gobierno y SEDECO, se continúa seguimiento a la desocupación de la calle de Rosario, para la colocación de carpas donde se reubicarán los locatarios que serán afectados por obras. Se están realizando MESAS DE DIÁLOGO con representaciones y la comisión del mercado de la zona afectada para la distribución de locales de las carpas de la reubicación temporal (última reunión 2 de septiembre del 2019).
Venustiano Carranza	Merced Banquetón	109	- Reubicación de locatarios		CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA EL PROYECTO DE NAVE MAYOR: Se encuentra en firma por las SOBSE, SEDECO, SSPARVP y ALCALDIA VENUSTIANO CARRANZA.

Elaboró: Lic. Elsa Rueda Salgado

JUD de Modernización

Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública

Autorizó: Lic. Alberto Birrichaga Membrillo  
Director de Proyectos para el Desarrollo de los Canales de Abasto.



# SEDECO

Reconstrucción y/o rehabilitación del Mercado San Juan Curiosidades, afectado por el Sismo del 19 de septiembre del 2017.

Alcaldía	Mercado	NO. OFICIAL	ACCIONES REALIZADAS		
			TEMA	PERÍODO	OBSERVACIONES
Cuauhtémoc	San Juan curiosidades		Inicio de obra y reubicación de comerciantes permanentes.	Del 6 agosto, al 3 de septiembre del 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La SEDECO a través del Programa para el Fomento y Mejoramiento de los Mercados Públicos de la Ciudad de México apoyará a la Alcaldía de Cuauhtémoc, con 20 millones que corresponden al 60% según programa y la Alcaldía cubrirá el 40 % restante equivalente en este caso a 13.33 millones. Este recurso fue transferido el 31 de mayo del 2019.</li> <li>• Ya se inició obra en este mercado. La Alcaldía deberá presentar informe de avances al respecto.</li> </ul>

  
 Elaboró: Lic. Elsa Iris Rueda Salgado  
 JUD de Modernización

  
 Autorizó: Lic. Alberto Berrchaga Membrillo  
 Director de Proyectos para el Desarrollo de los Canales de Abasto.



# SEDECO

## Programa para el Fomento y Mejoramiento de los Mercados Públicos de la Ciudad de México

ESTATUS AL 3 DE SEPT, 2019

Alcaldía	Mercado	ESTATUS DE TRANSFERENCIA DE RECURSO				OBRA	
		CLAVE PRESUPUESTAL NO ENTREGADA POR LA ALCALDÍA	CLAVE PRESUPUESTAL EN DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	FECHA DE TRANSFERENCIA	OBSERVACIONES	PUBLICACIÓN DE BASES	POSIBLE INICIO DE OBRA
Cuauhtémoc	San Camilito			31/05/2019	Recurso Transferido	25/06/2019	De acuerdo a último reporte de la Alcaldía, ya iniciaron obra en estos mercados. Se relizará visita de seguimiento por parte de SEDECO, próximo mes.
Cuauhtémoc	Lagunilla Ropa y Telas			31/05/2019			
Cuauhtémoc	San Juan Curiosidades			31/05/2019			

**NOTA:**

El mercado San Juan Curiosidades, fue afectado por el sismo del 19 de septiembre del 2017

Elaboró: Lic. Elisa Iris Rueda Salgado  
J.U.D. de Modernización

Autorizó: Lic. Alberto Birrichaga Membrillo  
Director de Proyectos para el Desarrollo de los Canales de Abasto



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO




AUTORIDAD DEL  
CENTRO  
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

C5

### INCIDENCIAS CAPTADAS POR CÁMARA DE C5 JUNIO-AGOSTO

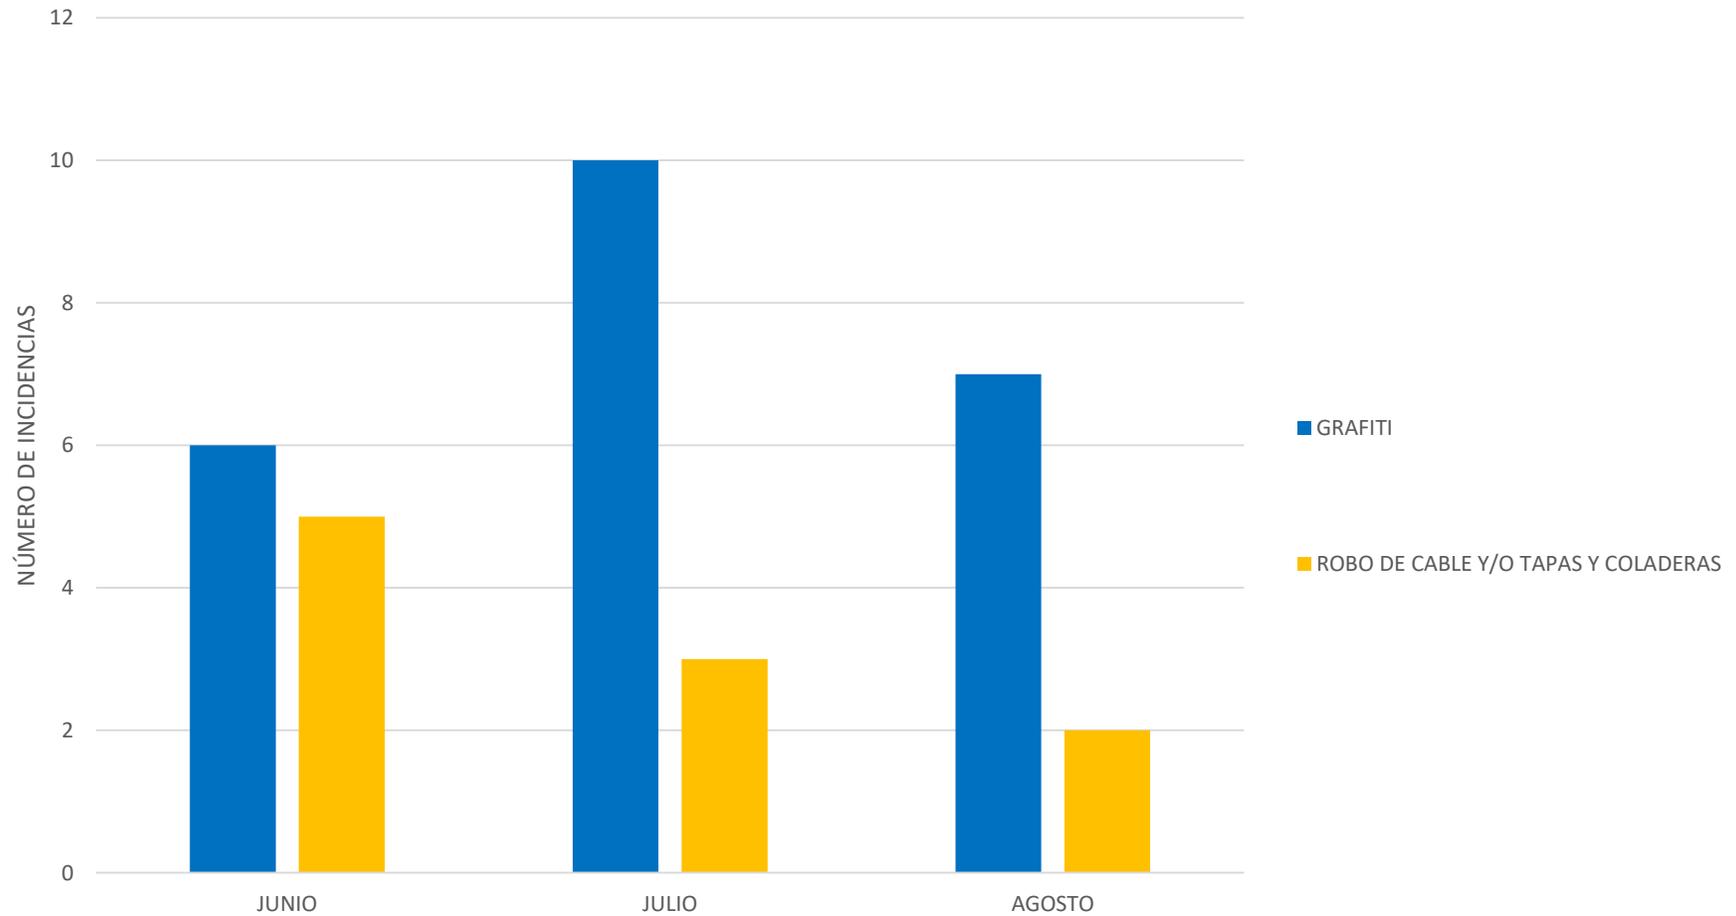



# PGJ


Tema	Línea base	Periodicidad	Semana al 02/09	Próximo reporte
Infraestructura	Número de delitos en robo de medidor	Semanal	1	10 de septiembre
	Incidencia delictiva en robos de herrería		1	
	Incidencia delictiva en robos de cableado		1	

No. Carpeta de investigación	Fecha y hora	Delito	Calle	Colonia	Síntesis de los hechos
CI-FCH/CUH-4/UI-1SD/1106/08-2019	29/08/2019 9 09:16	Robo de objetos		Centro de la ciudad de México área 9	Refiere que al salir ya no esta su medidor de agua
CI-FCH/CUH-2/UI-1CD/6389/09-2019	02/09/2019 9 03:06	Robo de objetos		Centro de la ciudad de mexico area 1	Policía remitente pone a disposición al imputado mismo que es señalado como el mismo que desprendía molduras de la puerta principal de un edificio de la SEP
CI-FCH/CUH-6/UI-2SD/1639/08-2019	27/08/2019 9 13:46	Robo de objetos		Centro de la ciudad de mexico area 1	Se recibe folio 5109/19 el cual manifiesta el agraviado que es el administrador del tribunal superior de justicia de la cdmx el cual manifiesta que personal de mantenimiento le indicó que se robaron cable del deposito de aire sin saber quién lo robó



PGJ

## Reporte de Indicadores de enero a agosto

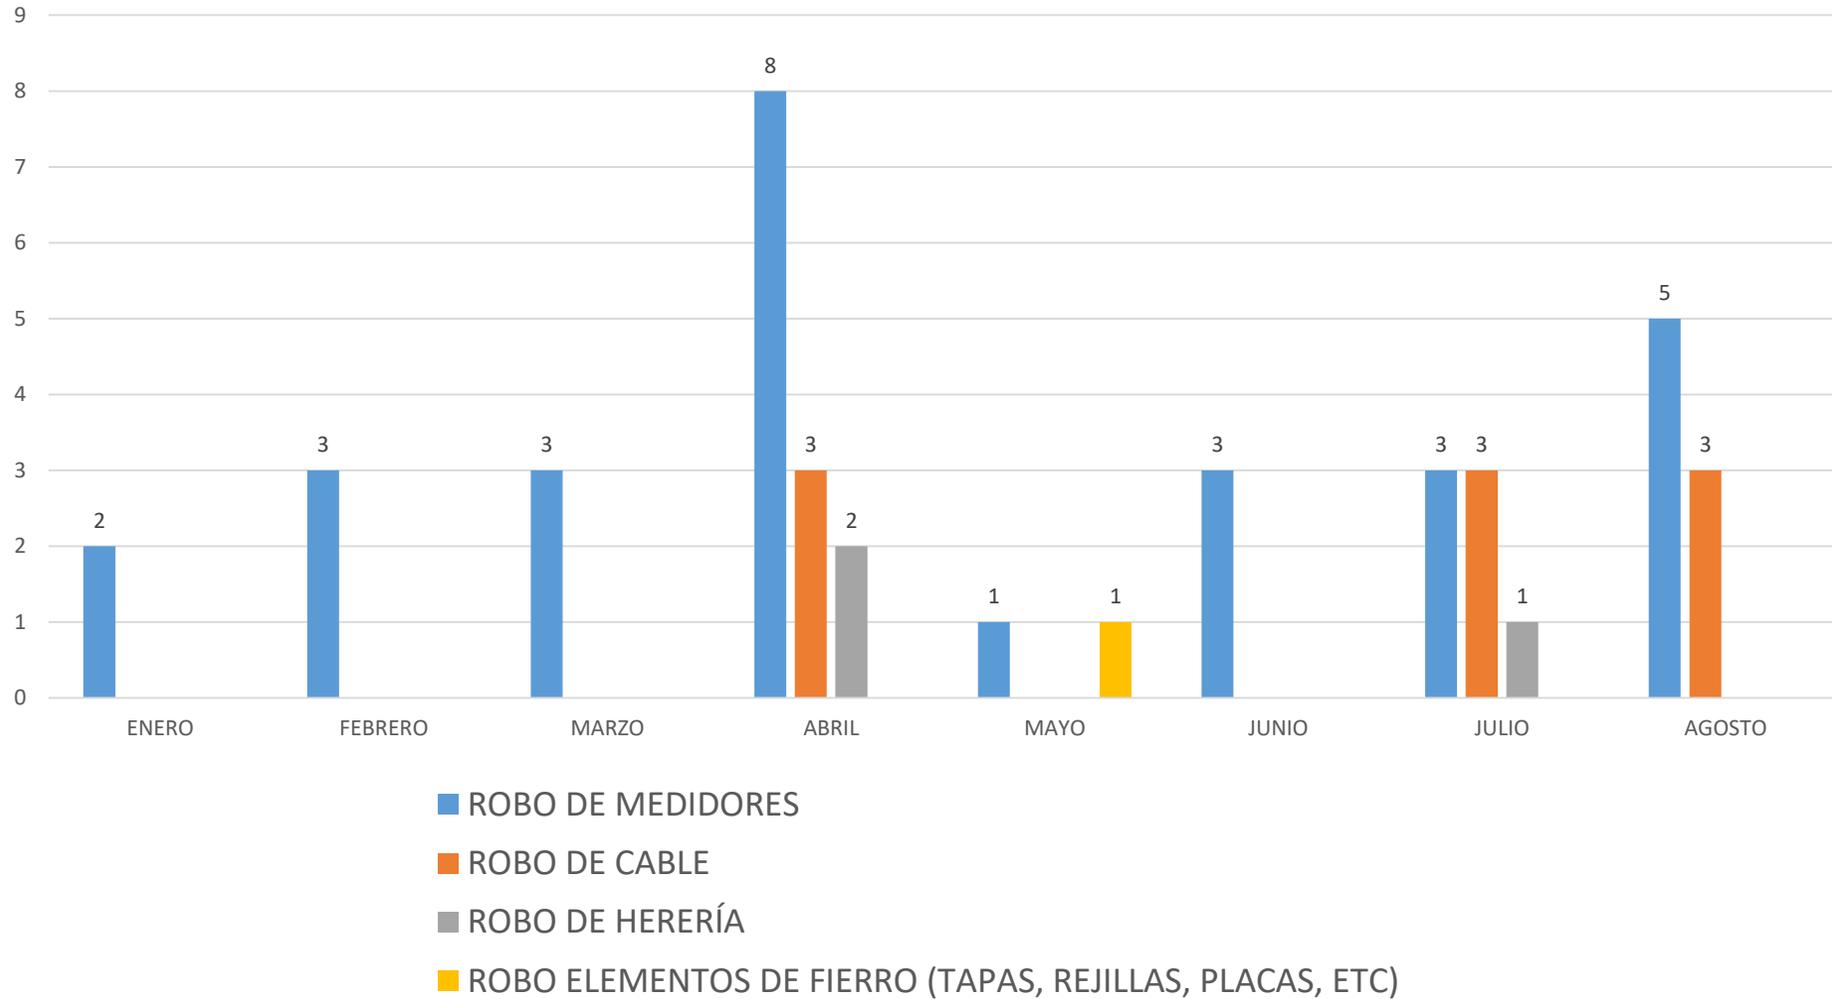



# SSC – SCT – DSOT (Tránsito)


Tema	Unidad de medida	Periodicidad	Del 21 de agosto al 2 de septiembre	Próximo reporte
Semáforos (162)	Número de semáforos con mantenimiento preventivo	Quincenal	34	17 de septiembre
	Número de semáforos con mantenimiento correctivo		82	
Cámaras (10)	Número de cámaras con mantenimiento preventivo		13	
	Número de cámaras con mantenimiento correctivo		5	



# SSC-SCT-DSOT

CORRECTIVO	
AISLADA	1
APAGADO	1
CABLE DE COMUNICACIÓN	3
CINTILANTE	14
CONEXION	1
CORTO	6
DERRIBADO	3
DESCONECTADO	18
DESINSTALACION	1
DESORIENTADO	1
FALSO CONTACTO	5
FOCO FUNDIDO	7
FUENTE DAÑADA	1
INSTALACION	10
INTERMITENTE	1
ORIENTA SEMAFORO	2
PEATON APAGADO	2
PUERTA ABIERTA	1
TARJETA DAÑADA	2
VISERA ROTA	2
PREVENTIVO	
TOTAL	116

## MANTENIMIENTO

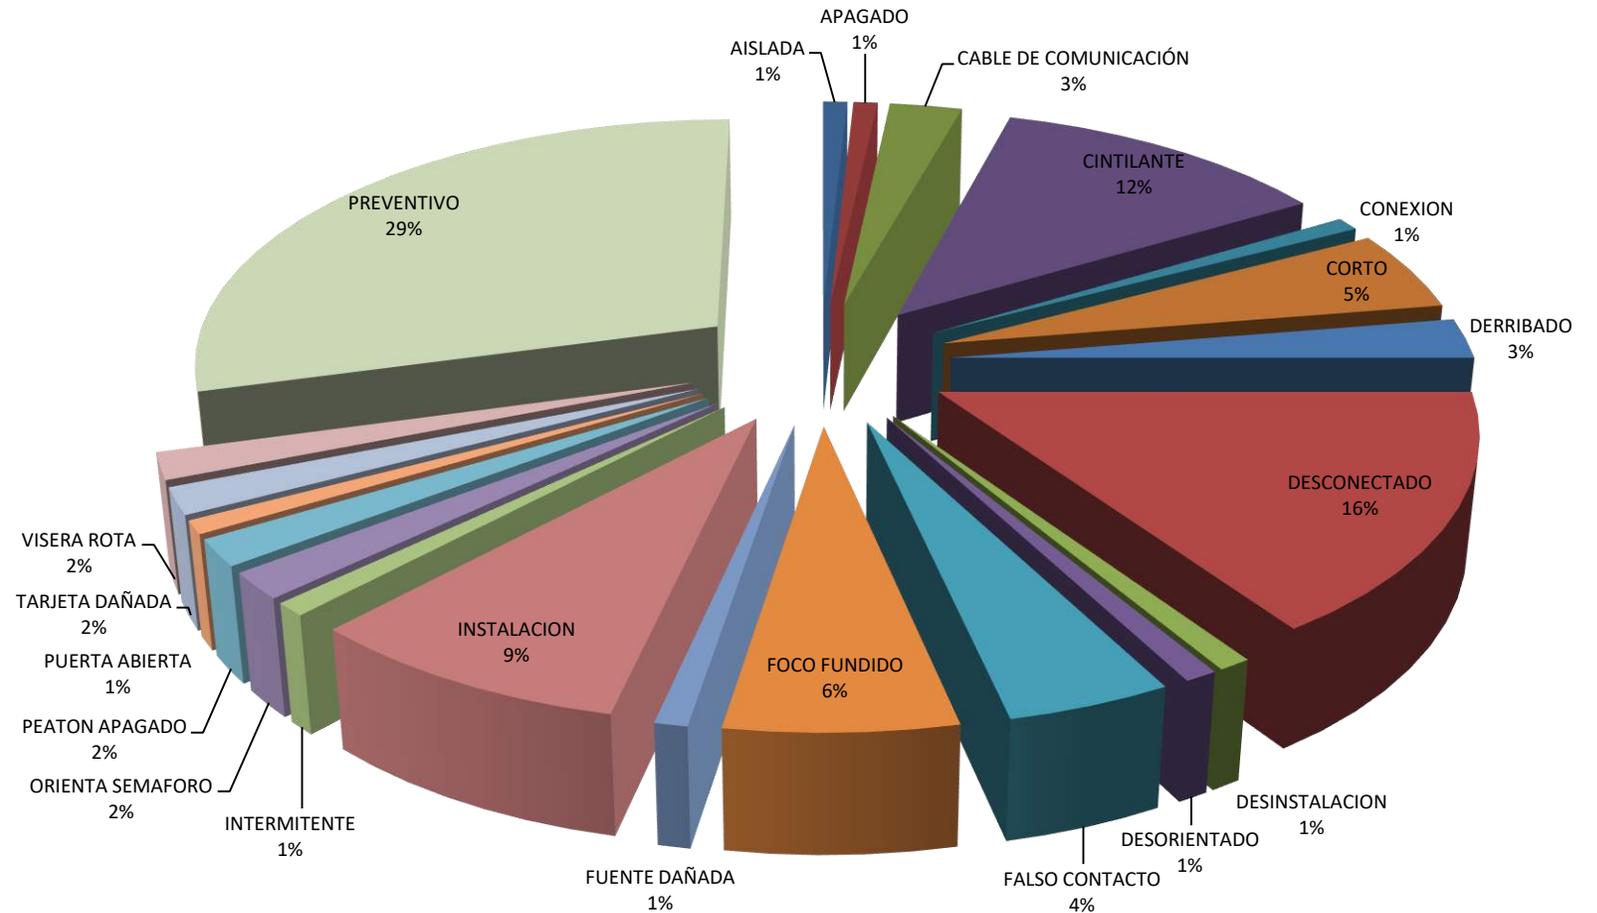

# SSC-SCT-DSOT


## CORRECTIVOS

CORTO	4
SISTEMA SPRIT	1

## PREVENTIVOS


	13
<b>TOTAL</b>	<b>18</b>

## MANTENIMIENTO DE CAMARAS TRANSITO

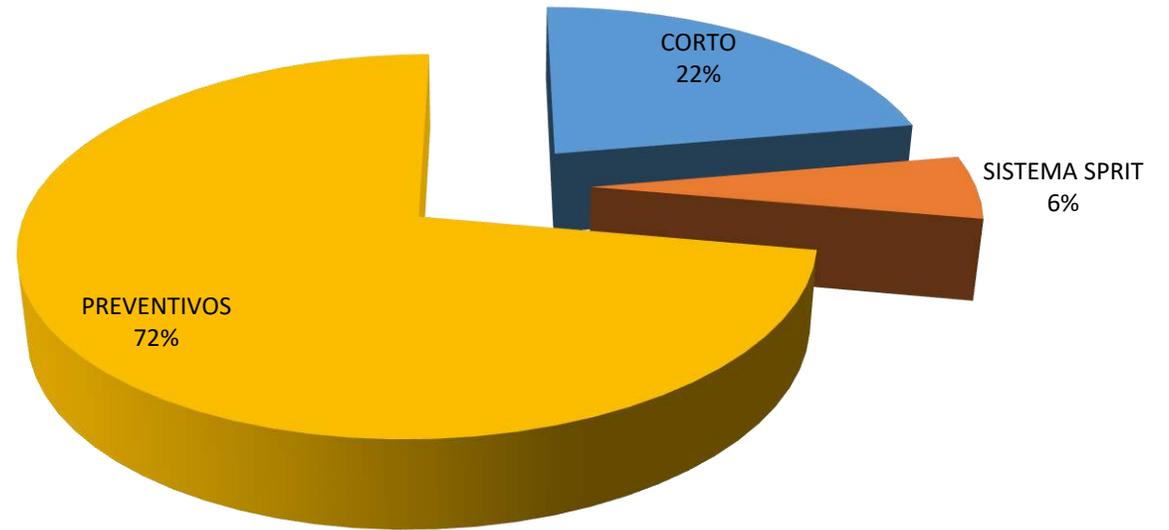

## Subsecretaría de Control de Tránsito

### Reporte de indicadores junio a agosto

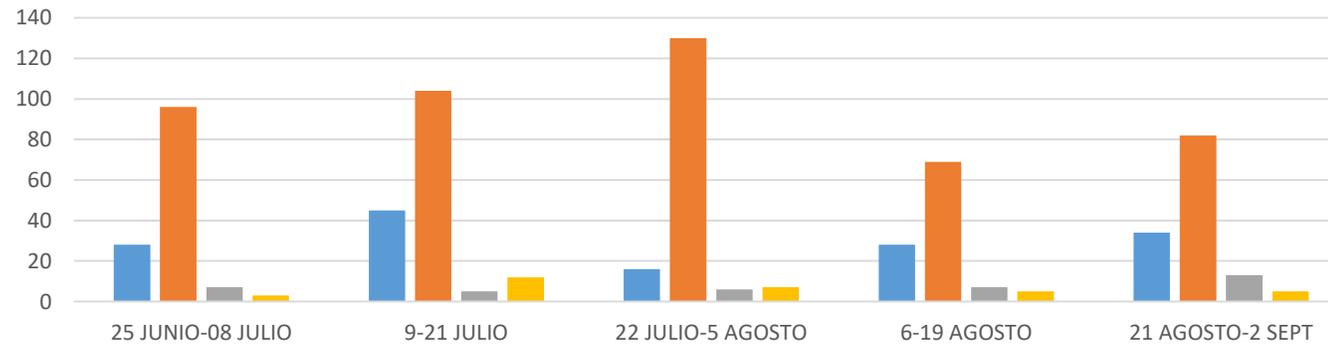

■ Número de semáforos con mantenimiento preventivo

■ Número de semáforos con mantenimiento correctivo por falla

■ Número de cámaras con mantenimiento preventivo

■ Número de cámaras con mantenimiento correctivo por falla



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
CULTURA  
CENTRO  
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

## Orden del día

Reportes

### **Turnos e incidencias urbanas**

Mesas de trabajo

Asuntos generales

Acuerdos

Asistencia

**\*Transmisión en vivo\***



## Matriz de seguimiento a turnos compilado



Dependencia	Atendido	Proceso	Total general
ACH	25		25
ADIP	1		1
Al. Cuauhtémoc	10	1	11
Al. Venustiano Carranza	3		3
AL.Venustiano Carranza	1		1
C5	5		5
CFE	4		4
INAH	3		3
Metrobús	1		1
PGJ	2		2
SACMEX	3	1	4
SEDEMA	4		4
SGIRyPC	1	1	2
SOS-AP	3		3
SOS-DGOIV	2		2
SOS-DGSUS	2		2
SSC	8		8
STC-METRO	1		1
TELMEX		1	1
Telmex	1		1
Tránsito	3	1	4
<b>Total general</b>	<b>83</b>	<b>5</b>	<b>88</b>



# TURNOS ATENDIDOS

## Del 20 de agosto al 02 de septiembre



CLAVE	FECHA DE REPORTE	SOLICITANTE	SOLICITUD	ATIENDE	ESTATUS	FECHA DE ATENCIÓN	OBSERVACIONES
TCH-089	20/08/2019	Metrobús	Atienda registro sin tapa en la esquina de Circunvalación y San Pablo en la parada "Merced".	Telmex	Atendido	22/08/2019	Se atendió la incidencia
TCH-090	20/08/2019	Metrobús	Solicite en el Comité de Usuarios del Subsuelo que se atienda tapa de acero mal anclada que al parecer es de Total Play, ubicada sobre Eje Central entre Avenida Hidalgo y Calle Santa Veracruz.	ACH	Atendido		La reparación de la tapa se realizará el próximo martes 03 de septiembre en horario nocturno
TCH-091	20/08/2019	PAOT	Realice visita de verificación al inmueble ubicado en Donceles 52.	Al. Cuauhtémoc	Atendido	23/08/2019	Se envió oficio con solicitud de visita ACH/DEPPMCCH/237/2019
TCH-093	20/08/2019	ACH	Solicita que hable con los liderazgos de los libreros de Plaza Santa Veracruz para reubicarlos en el Callejón de San Juan y evitar que estén en zona de riesgo	Al. Cuauhtémoc	Atendido		



# TURNOS EN PROCESO

## Del 20 de agosto al 02 de septiembre



CLAVE	FECHA DE REPORTE	SOLICITANTE	SOLICITUD	ATIENDE	ESTATUS	FECHA DE ATENCIÓN	OBSERVACIONES
TCH-092	20/08/2019	PAOT	Realice visita de verificación al inmueble ubicado en Donceles 52.	SGIRyPC	Proceso		Se atiende en la semana del 26 al 30 de agosto



## Matriz de seguimiento a incidencias



Dependencia	Atendido	Pendiente	Proceso	Total general
ACH	37	31	3	71
Al. Cuauhtémoc	17	15	3	35
Al. Venustiano Carranza	4			4
C-5	2			2
CFE	71	35	12	118
CUS		1		1
IUSACELL		2		2
MCM TELECOM		1		1
SACMEX	66	18	3	87
SEDEMA			2	2
SGIRyPC	1			1
SOS-AP	59	7		66
SOS-DGOIV	4	24		28
SOS-DGOP		1		1
SOS-DGSUS		6		6
STC-METRO	3			3
TELMEX	28	2	4	34
TOTAL PLAY			1	1
Tránsito	19	2	1	22
(en blanco)				
<b>Total general</b>	<b>311</b>	<b>145</b>	<b>29</b>	<b>485</b>



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO




MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

# Atención chats VIPPSC Incidencias Urbanas

Del 20 de agosto al 02 de septiembre

**10**  
Incidencias



<b>4</b>	<b>6</b>
<b>Incidencias urbanas atendidas</b>	<b>Incidencias urbanas pendientes</b>
<p>Tránsito: 1 SOS-AP:1 Sacmex: 2</p>	<p>SACMEX:2 ACH:1 CFE:1 SOS-AP: 1 TELMEX: 1</p>



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL  
CENTRO  
HISTÓRICO

# INCIDENCIAS ATENDIDAS

Del 20 de agosto al 02 de septiembre



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

FECHA DE REPORTE	IDENTIFICA	SOLICITUD	UBICACION	FOTOGRAFIA ANTES	FOTOGRAFIA DESPUES	ATIENDE	ESTATUS	FECHA DE ATENCIÓN	OBSERVACIONES
20/08/2019	VIPP 6 Antigua Mercad Mixcalco	Poste de semáforo dañado con riesgo de caerse	LORETO			Tránsito	Atendido	20/08/2019	Loreto / Venezuela Revisión general se desinstala semáforo peatonal dinámico, semáforo ménsula 3 asp con pantalla de leds, se retira poste de ménsula chocado
25/08/2019	VIPP 4 Alameda Sector Financiero	Patateo alumbrado público	ALAMEDA CENTRAL			SOS-AP	Atendido	25/08/2019	
26/08/2019	FCH	Registros en mal estado	TACUBA			Tránsito	Atendido	27/08/2019	



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL  
CENTRO  
HISTÓRICO

# INCIDENCIAS ATENDIDAS

Del 20 de agosto al 02 de septiembre



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

FECHA DE REPORTE	IDENTIFICA	SOLICITUD	UBICACIÓN	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS	FECHA DE ATENCIÓN	OBSERVACIONES
26/08/2019	FCH	Registros en mal estado	TACUBA			Tránsito	Atendido	27/08/2019	
26/08/2019	ACH	Retiro de caseta telefónica	VENUSTIANO CARRANZA			TELMEX	Atendido	26/08/2019	
27/08/2019	ACH	Semaforo dañado	REPÚBLICA DEL SALVADOR			Tránsito	Atendido	27/08/2019	



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL  
CENTRO  
HISTÓRICO

# INCIDENCIAS ATENDIDAS

Del 20 de agosto al 02 de septiembre



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

FECHA DE REPORTE	IDENTIFICA	SOLICITUD	UBICACIÓN	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS	FECHA DE ATENCIÓN	OBSERVACIONES
28/08/2019	VIPP 2 Callejón del 57 Plaza de la Concepción	Falta de tapa de valvulas	REPÚBLICA DE BRASIL			SACMEX	Atendido	29/08/2019	
29/08/2019	VIPP 4 Alameda Sector Financiero	Tapa de registro dañada	TACUBA			SACMEX	Atendido	30/08/2019	
31/08/2019	ACH	Caseta telefónica en mal estado	MESONES			TELMEX	Atendido	01/09/2019	



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL  
CENTRO  
HISTÓRICO

# INCIDENCIAS EN PROCESO

Del 20 de agosto al 02 de septiembre



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

FECHA DE REPORTE	IDENTIFICA	SOLICITUD	UBICACIÓN	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS	FECHA DE ATENCIÓN	OBSERVACIONES
30/08/2019	Metrobús	Falta tapa de registro	EJE CENTRAL (LÁZARO CARDENAS)			TOTAL PLAY	Proceso	02/09/2019	El 02 de septiembre se realizará reposición de tapa metálica, para posterior reparación integral



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL  
CENTRO  
HISTÓRICO

# INCIDENCIAS PENDIENTES

Del 20 de agosto al 02 de septiembre



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

FECHA DE REPORTE	IDENTIFICA	SOLICITUD	UBICACIÓN	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATENDE	ESTATUS	FECHA DE ATENCIÓN	OBSERVACIONES
20/08/2019	VIPP 8 San Pablo	Fuera de agua	SAN PABLO			SACHEX	Pendiente		
21/08/2019	VIPP 7 Viciainas Corredor Cultural Regina	Bache	8 DE FEBRERO			ACH	Pendiente		
22/08/2019	Secretaría de Cultura	Falta de tapa a rejilla de piso	10 DE SEPTIEMBRE			SACHEX	Pendiente		
24/08/2019	VIPP 2 Callejón del 37 Plaza de la Constitución	Falta en el suministro de energía eléctrica	REPÚBLICA DE HONDURAS			CPE	Pendiente		
26/08/2019	Al Cuauhtémoc	Falta de suministro de agua	SAN LUCAS			SACHEX	Pendiente		el predo cuenta con 27 depots
26/08/2019	ACH	Falta tapa de coladero	MINA			SACHEX	Pendiente		



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL  
CENTRO  
HISTÓRICO

# INCIDENCIAS PENDIENTES

Del 20 de agosto al 02 de septiembre



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

FECHA DE REPORTE	IDENTIFICA	SOLICITUD	UBICACIÓN	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS	FECHA DE ATENCIÓN	OBSERVACIONES
27/08/2019	Al. Cuauhtémoc	Tapa de registro de drenaje rota	DOLORES			SACMEX	Pendiente		
30/08/2019	Al. Cuauhtémoc	Semaforo dañado	EMILIO DÓNDE			Tránsito	Pendiente		
30/08/2019	Al. Cuauhtémoc	Desazolve por colector principal saturado	BOLÍVAR			SACMEX	Pendiente		
31/08/2019	ACH	Soldadura de tapa de nicho de alumbrado público	DOLORES			SOS-AP	Pendiente		



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL  
CENTRO  
HISTÓRICO

# INCIDENCIAS PENDIENTES

Del 20 de agosto al 02 de septiembre



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

FECHA DE REPORTE	IDENTIFICA	SOLICITUD	UBICACIÓN	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS	FECHA DE ATENCIÓN	OBSERVACIONES
31/08/2019	VIPP 4 Alameda Sector Financiero	Alcantarilla rota	TACUBA			SACMEX	Pendiente		
31/08/2019	VIPP 3 Santo Domingo	Falla en alumbrado público	CALLEJÓN ECUADOR			SOS-AP	Pendiente		
02/09/2019	VIPP 2 Callejón del 57 Plaza de la Concepción	Falta tapa de registro	REPÚBLICA DE PERÚ			TELMEX	Pendiente		



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL  
CENTRO  
HISTÓRICO

# INCIDENCIAS PENDIENTES

Del 20 de agosto al 02 de septiembre



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

FECHA DE REPORTE	IDENTIFICA	SOLICITUD	UBICACIÓN	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS	FECHA DE ATENCIÓN	OBSERVACIONES
02/09/2019	ACH	Falla en alumbrado público	MONTE DE PIEDAD			SOS-AP	Pendiente		



## Orden del día

Reportes

Turnos e incidencias urbanas

Mesas de trabajo

Asuntos generales

## Acuerdos

Asistencia

**\*Corte de transmisión\***



## Orden del día

Reportes

Turnos e incidencias urbanas

Mesas de trabajo

Asuntos generales

Acuerdos

## Asistencia

**\*Corte de transmisión\***



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
CULTURA  
CENTRO  
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

# PRÓXIMA SESIÓN

17 de septiembre de 2019

## A las 10:30 horas

**\*Transmisión en vivo\***
