



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
CULTURA
CENTRO
HISTÓRICO



**MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS**

44ta. Mesa

Reporte del 29 de octubre - 11 de noviembre

Inicio de la transmisión en vivo
Martes 12 de noviembre de 2019



Orden del día

Reportes

Turnos e incidencias urbanas

Mesas de trabajo

Asuntos generales

Acuerdos

Asistencia

Transmisión en vivo



ACH

Tema	Indicador	Periodicidad	Semana al 04/11	Semana al 11/11	Próximo reporte
Tiraderos clandestinos	Metros cúbicos de residuos sólidos levantados en tiraderos clandestinos en el perímetro de ACH	Semanal	951 m3	1,015 m3	19 de noviembre
Limpieza	Metros cúbicos de basura recolectada en el Perímetro de la ACH (Producto de Barrido)	Semanal	2,327 m3	2,510 m3	19 de noviembre
Mantenimiento a infraestructura	Número de Incidencias de daño en infraestructura del Perímetro de la ACH reparadas y atendidas	Semanal	42	33	19 de noviembre



ACH | Eliminación de grafiti

231

m² totales

*La mayoría son reincidencias

calles atendidas **37**
cortinas metálicas **10**
fachadas **13**

101
m²
de cortinas



94
m²
de fachadas



36
m²
antigrafiti





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

CENTRO
HISTÓRICO

Eliminación de grafiti en cantera

**PLAZA JUAN JOSÉ BAZ / PLAZA DE LA AGUILITA,
DONCELES Y BOLÍVAR**

Se han limpiado
1,332 m²

Se inició en
inmuebles que no
son catalogados con
gel desincrustante.



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
CULTURA Y
PATRIMONIO
HISTÓRICO

ACH | obras menores

Se realizaron trabajos en:

Belisario Domínguez
República de Chile
Bolívar

Banqueta de Palacio Nacional
Donceles
Jesús María
5 de Febrero

Los trabajos realizados consistieron en **colocación de 25 bolardos** en Belisario Domínguez entre Allende y Palma, **reparación de tapa de registro** en República de Chile , **reparación de tapa de registro** en Venustiano Carranza y Bolívar, **colocación de 01 bolardo y retiro de barandal en mal estado** en banqueta de Palacio Nacional, **reparación de banqueta** en Jesús María y Corregidora, **reparación de 02 tramos de banqueta** en 5 de Febrero y San Jerónimo.



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS





Alc. Cuauhtémoc

Tema	Indicador	Periodicidad	Semana al 04/11	Semana al 11/11	Próximo reporte	Observaciones
Luminarias	Número de Luminarias reparadas en vías secundarias en PB de Cuauhtémoc	Semanal	62	50	26 de noviembre	Se realizó la revisión de 112 luminarias. Ver anexo.
Poda	Número de sujetos forestales podados	Semanal	15	25	26 de noviembre	Se realizó la poda de 40 sujetos forestales. Ver anexo.



Alc. Cuauhtémoc

Tema	Indicador	Periodicidad	Semana al 04/11	Semana al 11/11	Próximo reporte	Observaciones
Desazolve	Red de drenaje desazolvada en PB Cuauhtémoc (m lineales)	Semanal	76	20	26 de noviembre	Se realizó el desazolve de 96 metros lineales. Ver anexos.
Limpia (colecta de sólidos)	Escuelas limpias y toque de campana	Semanal	245	260	26 de noviembre	Se recolectaron 505 m3 de residuos sólidos (40 m3 de residuos orgánicos y 465 m3 de inorgánicos).



REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN EL PERÍMETRO B EN LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC					
DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		COLONIA	CANTIDAD	MOTIVO
MANUEL DOBLADO	LECUMBERRI	MIGUEL ALEMAN	CENTRO ORIENTE	1	
CARRETONES # 10 LOC -22	TOPACIO	ROLDAN	CENTRO MERCED	3	
LAZARIN DEL TORO	ALLENDE	REP. DE CHILE	CENTRO NORTE	36	
EMILIANO ZAPATA	SAN MARCOS	SANTISIMA	CENTRO MERCED	22	
			TOTAL	62	LUMINARIAS

LUMINARIAS REPARADAS EN EL PERÍMETRO B EN LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC					
DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		COLONIA	CANTIDAD	MOTIVO
ZAPATA S/N	SAN MARCOS	MARGIL	CENTRO MERCED	3	
PLAZA DEL AGUILITA	MISIONEROS	RAMON CORONA	CENTRO MERCED	23	
FRAY SERVANDO # 230	PLAZA SAN LUCAS	SAN MIGUEL	CENTRO MERCED	18	
TOPACIO	FRAY SERVANDO	SAN PABLO	CENTRO MERCED	2	
TOPACIO	ROLDAN		CENTRO MERCED	4	
			TOTAL	50	LUMINARIAS

REPORTE DE PODAS REALIZADOS EN EL PERÍMETRO B EN LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC					
DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		COLONIA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
COSTA RICA # 132	MANUEL DOBLADO	VIDAL ALCOCER	CENTRO ORIENTE	1	
RAYON	COMONFORT	CENDI	CENTRO NORTE	1	
REGINA # 86	20 DE NOVIEMBRE	PINO SUAREZ	CENTRO CENTRO	12	
INCAS # 7	HONDURAS	PERU	CENTRO NORTE	1	
			TOTAL	15	PODAS

REPORTE DE PODAS REALIZADOS EN EL PERÍMETRO B EN LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC					
DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		COLONIA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
ECUADOR # 82,94,93	BRASIL	PALMA NORTE	CENTRO NORTE	3	
BRASIL # 99	ECUADOR	RAYON	CENTRO NORTE	1	
BRASIL # 82	PARAGUAY	ECUADOR	CENTRO NORTE	1	
BRASIL (A UN COSTADO ESC. SEC. ANGEL FRIAS)	ECUADOR	PARAGUAY	CENTRO NORTE	3	
COMONFORT S/N	EJE 1 NORTE		CENTRO NORTE	4	
PINO SUAREZ #17 Y 19	URUGUAY	VENUSTIANO CARRANZA	CENTRO CENTRO	7	
PINO SUAREZ S/N	SALVADOR	MESONES	CENTRO CENTRO	3	
PINO SUAREZ # 27	SALVADOR	URUGUAY	CENTRO CENTRO	3	
			TOTAL	PODAS 25	



REPORTE DE DESAZOLVES REALIZADOS EN EL PERÍMETRO B EN LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC					
DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		COLONIA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
LECUMBERRI # 16	LEONA VICARIO	MANUEL DOBLADO	CENTRO ORIENTE	30 MTS	
SAN MARCOS # 29	ZAPATA	SOLEDAD	CENTRO MERCED	8 MTS	
EL CARMEN # 6	JUSTO SIERRA	GUATEMALA	CENTRO ORIENTE	20 MTS	
LECUMBERRI # 19	MANUEL DOBLADO	LEONA VICARIO	CENTRO ORIENTE	20 MTS	
			TOTAL	76 MTS SONDEADOS	

REPORTE DE DESAZOLVES REALIZADOS EN EL PERÍMETRO B EN LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC					
DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		COLONIA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
REP, DE PERU # 43	REP, DE CHILE	ALLENDE	CENTRO NORTE	10 MTS	
ERNESTO PUGIBET # 47	REVILLAGIGEDO	LUIS MOYA	CENTRO ALAMEDA	10 MTS	
			TOTAL	20 MTS	



Trabajos de Intervención en Av. Hidalgo y Eje Central Lázaro Cárdenas



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



SACMEX

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Sustitución de la Red de Agua Potable

Av. Hidalgo



Avance físico programado global: 22.60 %
Avance físico real global: **26.58 %**

Fecha de inicio
24 Octubre 2019

Red de Agua Potable

Longitud= 612 metros.

Diámetro= 6"

Material: Polietileno de alta densidad.

Tubería Existente		612.00 m.
Tubería Instalada		47.00 m.



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Sustitución de la Red de Drenaje

Av. Hidalgo y Eje Central



Avance físico programado global: 22.60 %
Avance físico real global: **26.58 %**

Fecha de inicio
24 Octubre 2019

Red de Drenaje

Longitud= 588 metros.

Diámetro= 0.30, 0.38, 0.45 m.

Material: Polietileno corrugado de alta densidad.

Tubería Existente		588.00 m.
Tubería Instalada		318.00 m.



SOS – Alumbrado Público

Tema	Indicador	Periodicidad	Semana al 04/11	Semana al 11/11	Próximo reporte
Alumbrado Público	Número de luminarias reparadas en vías del PA del CH	Semanal	69	67	19 de noviembre
Alumbrado Público	Número de luminarias reparadas en vías del PB del CH	Semanal	0	0	19 de noviembre



SOS – Alumbrado Público | Anexo 1

Reporte de luminarias reparadas en Centro Histórico Perímetro A

Dirección	Entre calles	Colonia	Cantidad	Motivo	Incidencia	
Corregidora	José Pino Suárez	Correo Mayor	CENTRO	1	SE REALIZA CAMBIO DE LAMPARA	LUMINARIO APAGADO
Lecumberri	Leona Vicario	Manuel Doblado	CENTRO	1	SE REALIZA RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN	LUMINARIO APAGADO
República de Guatemala	Margil	San Marcos	CENTRO	1	SE REALIZA RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN	LUMINARIO APAGADO
Bolívar	Venustiano Carranza	República de Uruguay	CENTRO	2	SE REALIZA RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN	LUMINARIO APAGADO
República de Uruguay	Anillo de Circunvalación	Callejón de Manzanares	CENTRO	1	SE REALIZA RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN	LUMINARIO APAGADO
República de Perú	República de Chile	Leandro Valle	CENTRO	1	SE REALIZA CAMBIO DE LAMPARA	LUMINARIO APAGADO
Carmen	Justo Sierra	República de Guatemala	CENTRO	1	SE REALIZA RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN	LUMINARIO APAGADO
Misioneros	Roldán	Talavera	CENTRO	1	SE REALIZA CAMBIO DE LAMPARA	LUMINARIO APAGADO
Santo Tomás	República del Salvador	Ramón Corona	CENTRO	1	SE REALIZA RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN	LUMINARIO APAGADO
Museo De La Caricatura	Donceles	República de Argentina	CENTRO	4	SE REALIZA CAMBIO DE LAMPARA	LUMINARIO APAGADO
República de Honduras	Altuna	República de Brasil	CENTRO	1	SE REALIZA CAMBIO DE LAMPARA	LUMINARIO APAGADO
República de Ecuador	República Dominicana	República Dominicana	CENTRO	2	SE REALIZA RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN	LUMINARIO APAGADO
Moneda	De la Santísima	Jesús María	CENTRO	2	SE REALIZA CAMBIO DE LAMPARA	LUMINARIO APAGADO
Emiliano Zapata	De la Santísima	Margil	CENTRO	1	SE REALIZA CAMBIO DE LAMPARA	LUMINARIO APAGADO



SOS – Alumbrado Público | Anexo 1

Reporte de luminarias reparadas en Centro Histórico Perímetro A

Dirección	Entre calles	Colonia	Cantidad	Motivo	Incidencia	
Teatro de la Ciudad	Donceles	Allende	CENTRO	8	SE REALIZA CAMBIO DE BALASTRO	LUMINARIO APAGADO
Peña y Peña	Callejón Gregorio Torres Quintero	Callejón Girón	CENTRO	1	SE REALIZA CAMBIO DE LAMPARA	LUMINARIO APAGADO
Donceles	República de Chile	Allende	CENTRO	1	SE REALIZA RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN	LUMINARIO APAGADO
República de Colombia	Callejón Girón	Rodríguez Puebla	CENTRO	6	SE REALIZA RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN	LUMINARIO APAGADO
República de Argentina	República de Bolivia	República de Colombia	CENTRO	1	SE REALIZA RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN	LUMINARIO APAGADO
República de Argentina	República de Venezuela	San Ildefonso	CENTRO	1	SE REALIZA CAMBIO DE LAMPARA	LUMINARIO APAGADO
Casa de los Condes de Heras y Soto	Donceles	República de Chile	CENTRO	3	SE REALIZA CAMBIO DE LAMPARA	LUMINARIO APAGADO
República de Cuba	Eje Central	Callejón del 57	CENTRO	3	SE REALIZA CAMBIO DE LAMPARA	LUMINARIO APAGADO
República de Perú	República de Chile	Leandro Valle	CENTRO	1	SE REALIZA CAMBIO DE BALASTRO	LUMINARIO APAGADO
De la Santísima	Emiliano Zapata	República de Guatemala	CENTRO	1	SE REALIZA RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN	LUMINARIO APAGADO
República de Bolivia	Callejón Girón	Rodríguez Puebla	CENTRO	1	SE REALIZA RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN	LUMINARIO APAGADO
República de Paraguay	República de Brasil	República de Argentina	CENTRO	1	SE REALIZA RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN	LUMINARIO APAGADO
República de Nicaragua	República de Brasil	República de Argentina	CENTRO	1	SE REALIZA RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN	LUMINARIO APAGADO
ALAMEDA CENTRAL	Cara Av. Hidalgo	Av. Juárez	CENTRO	14	SE REALIZA RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN	CIRCUITO APAGADO
PLAZA SEMINARIO	Moneda	República de Guatemala	CENTRO	1	SE REALIZA CAMBIO DE LAMPARA	LUMINARIO APAGADO
Marconi	Donceles	Tacuba	CENTRO	1	SE REALIZA CAMBIO DE LAMPARA	LUMINARIO APAGADO
Meave	Eje Central Lázaro	Aldaco	CENTRO	2	SE REALIZA CAMBIO DE LAMPARA	LUMINARIO APAGADO
			TOTAL	67		

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL

2019




GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS



SOS - DGOIV

VIOLETA, GALEANA Y RIVA PALACIO

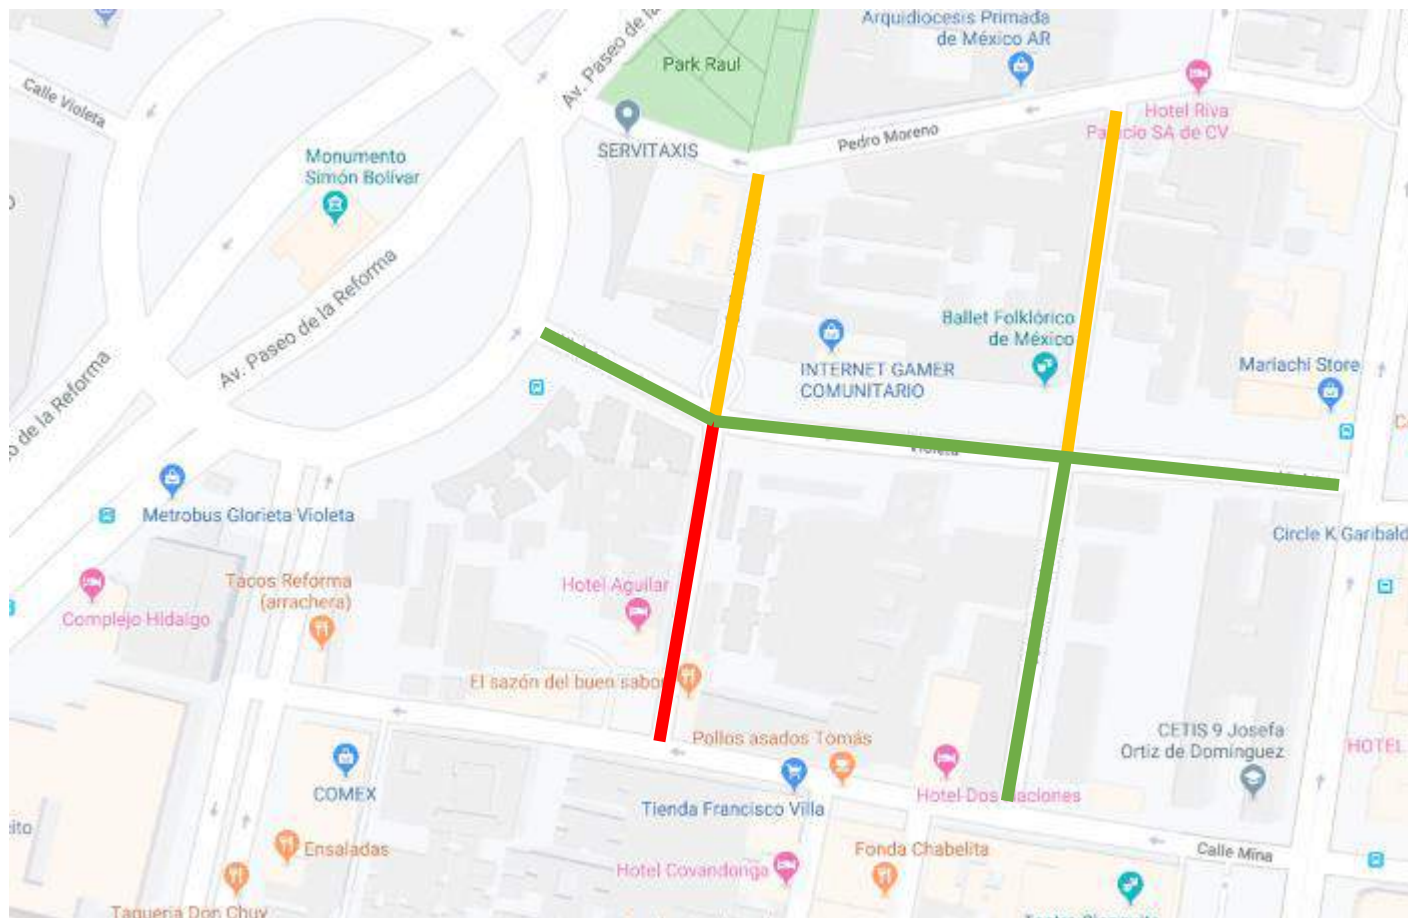


- **Calle Violeta avance de obra 77%**
Colocación de recinto en áreas peatonales, colado de guarniciones del tramo de Galeana a Paseo de la Reforma, colocación de bolardos y colocación de luminarias.



- **Calle Riva Palacio Sur avance de obra 90%**
Colocación de bolardos y trabajos canalización de media tensión



- **Calle Riva Palacio Norte avance de obra 23%**
Colocación de base de relleno fluido y colocación de recinto.



- **Calle Galeana Norte avance del 12%**
Colado de Relleno fluido y colocación de recinto.



- **Calle Galeana Sur avance del 10%**
Colado de Relleno fluido y canalización de media tensión



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

VIOLETA, GALEANA Y RIVA PALACIO



Paso peatonal en Galeana Sur



Colado de MR-45 en Riva Palacio Sur



Avance Calle Violeta



Colado de Relleno Fluido en Galeana Sur



Colocación de Bolardos Calle Violeta y Eje
Central



Alumbrado en Calle Violeta



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

VIOLETA, GALEANA Y RIVA PALACIO



Avance Galeana Norte



Avance en Calle Violeta



Avance Galeana Sur



Colocación de bolardo en Riva Palacio Sur



Colocación de recinto en Riva Palacio Norte



Avance en Calle Violeta




GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

VIOLETA, GALEANA Y RIVA PALACIO

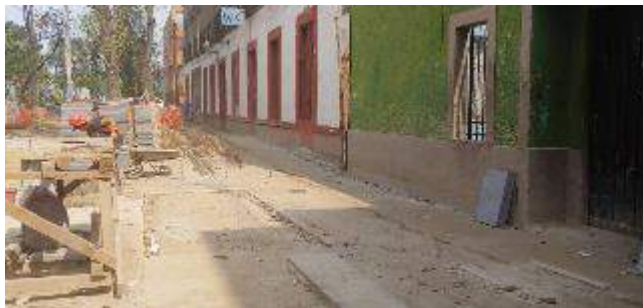

Colocación de recinto Calle Galeana Norte



Armado de guarnición en Calle Violeta



Colocación de recinto en Calle Violeta




Avance Calle Violeta



Avance Calle Violeta



ANTIGUO BARRIO SAN PABLO DE ZOQUIAPAN

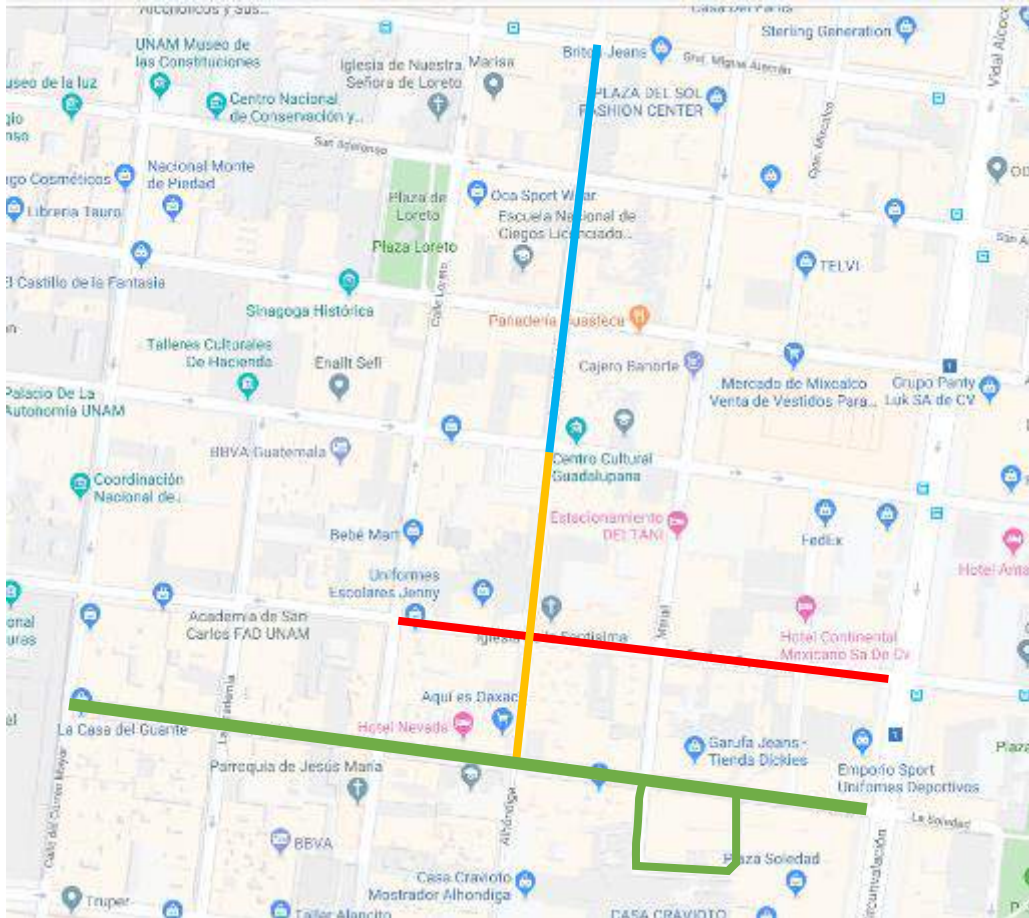

- Calle Soledad avance de obra 73%**
Se realizan trabajos de demolición, colado de MR45, colocación de recinto en áreas peatonales y colado de guarniciones.
- Callejón de Lecheras avance de obra 98%**
Colocación de luminarias
- Calle de la Santísima avance de obra 12%**
Colocación de recinto
- Leona Vicario avance de obra 12%**
Trabajos de demolición en vialidad
- Emiliano Zapata avance de obra 0%**
Sin Intervención



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

ANTIGUO BARRIO SAN PABLO DE ZOQUIAPAN



Retiro de residuos de la construcción
en Calle Leona Vicario



Avance de obra en Leona Vicario



Cimbrado de guarnición en Calle
República de Guatemala



Colocación de recinto en Calle
Soledad



Colado de MR45 en Calle Soledad



Trabajos de demolición en Calle
Santísima




PLAZA LORETO, JARDIN DEL OBISPO Y VALERIO TRUJANO



Plaza Loreto



Jardín del Obispo

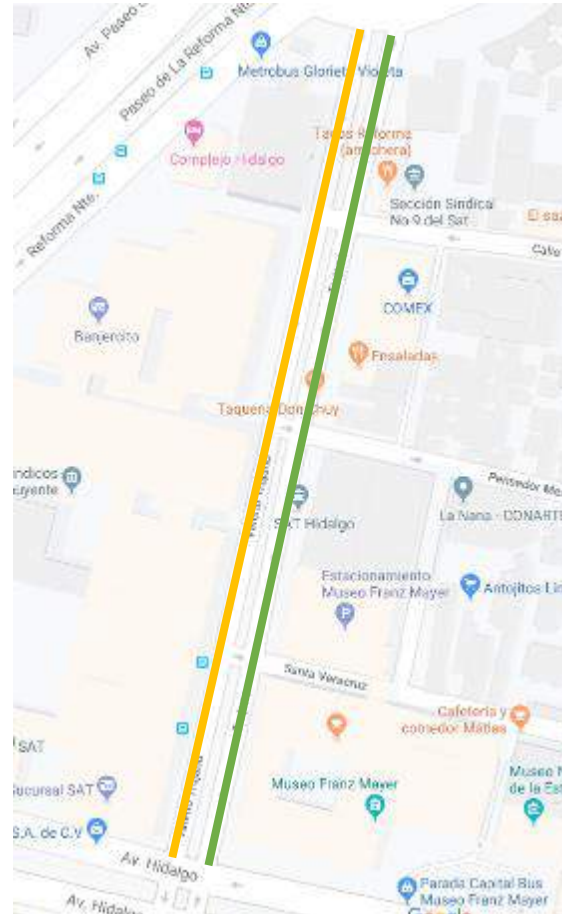

Calle Valerio Trujano



- **Calle Valerio Trujano Oriente avance de obra 92%**

Colocación de placas para jardineras y colocación de recinto en tramo de calle Javier Mina- Paseo de la Reforma



- **Calle Valerio Trujano acera Poniente avance de obra 40%**

Colado de MR45 en vialidad



- **Plaza Loreto avance de obra 14%**

Colado de relleno fluido y de guarniciones, colocación de recinto en andadores peatonales y trabajos de demolición.

- **Jardín del Obispo avance de obra 51%**

Colocación de recinto en andadores peatonales



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

PLAZA LORETO, JARDIN DEL OBISPO Y VALERIO TRUJANO



Colocación de recinto en Jardín del Obispo



Plaza Loreto

Habilitado de acero para guarniciones y excavación de cepas para guarniciones en Calle San Ildefonso, colado de relleno fluido y colocación de recinto en andadores.



PLAZA LORETO, JARDIN DEL OBISPO Y VALERIO TRUJANO



Habilitado de acero para recibir MR45 en
Valerio Trujano



Detalles en banquetas en Valerio Trujano



Colado de MR45 en Valerio Trujano




MR45 en Valerio Trujano



Colocación de placas de jardineras en Valerio
Trujano



BARRIO DE SANTA MARÍA LA REDONDA

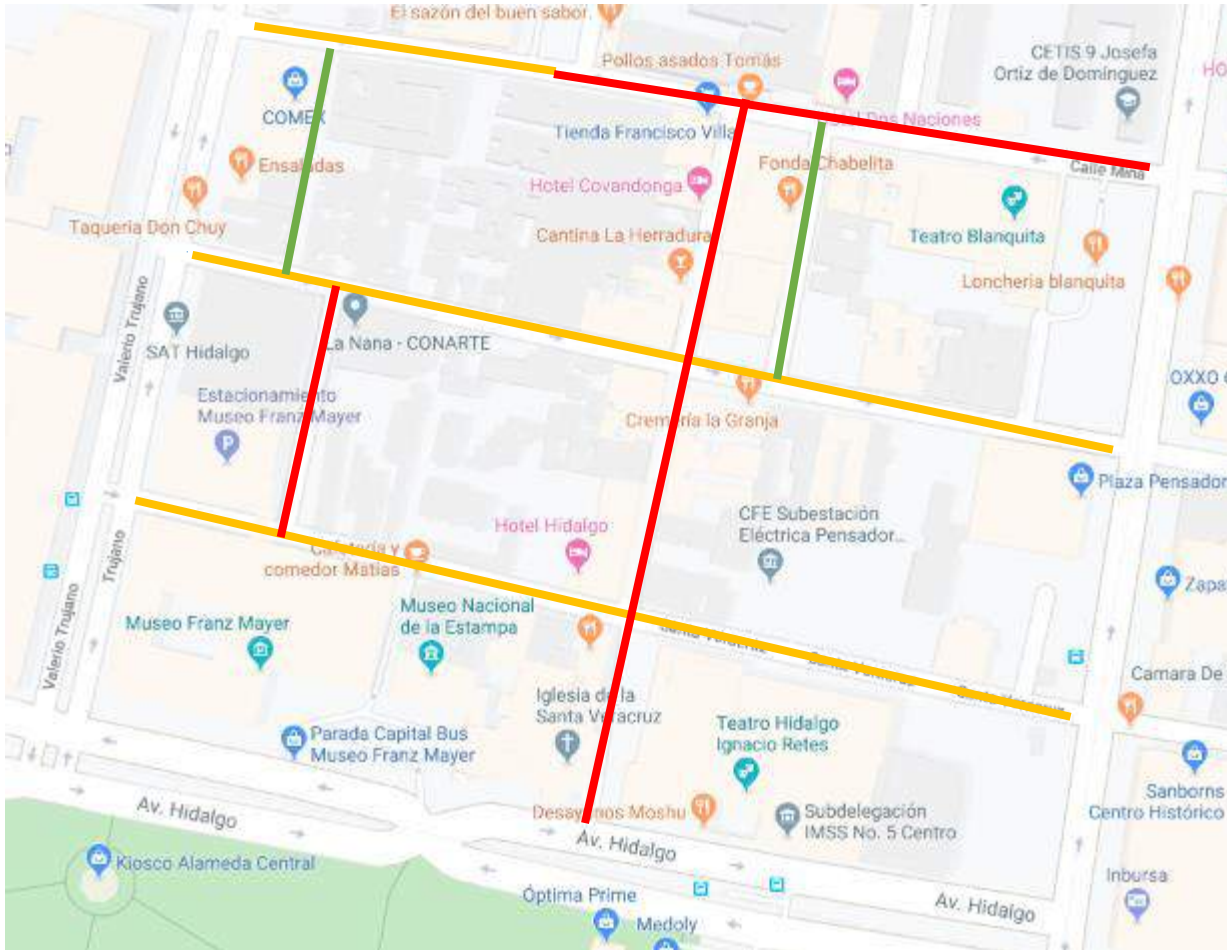

- **3er Callejón de San Juan de Dios avance de obra 50%**

Colocación de recinto en áreas peatonales

- **Plaza 2 de Abril avance de obra 66%**

Colocación de recinto

- **Calle Mina avance de obra 13%**

Trabajos de demolición y cimbrado de guarniciones

- **Calle Santa Veracruz avance de obra 21%**

Trabajos de demolición de arrollo vehicular del tramo de 1er callejón de San Juan de Dios a Calle 2 de abril

- **Calle Pensador Mexicano avance de obra 23%**

Colocación de recinto y colado de guarnición

- **Calle Mina**
Intervención de trabajos de baja y media tensión con un avance del 60%

- **2do Callejón de San Juan de Dios**
Retiro de pre colados en banqueta Oriente

- **Calle 2 de Abril**
Sin intervención




GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS


BARRIO DE SANTA MARÍA LA REDONDA

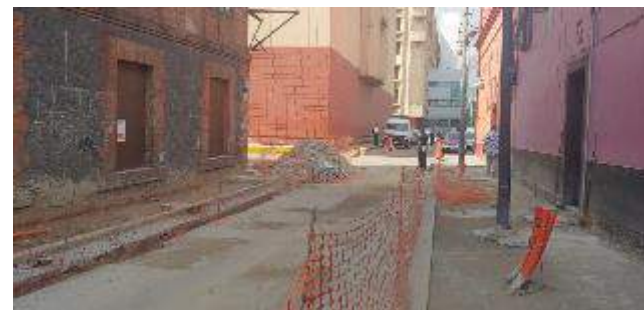

Avance de Obra en Calle Javier Mina, 3er Callejón de San Juan de Dios, Pensador Mexicano y Santa Veracruz.



EJE CENTRAL

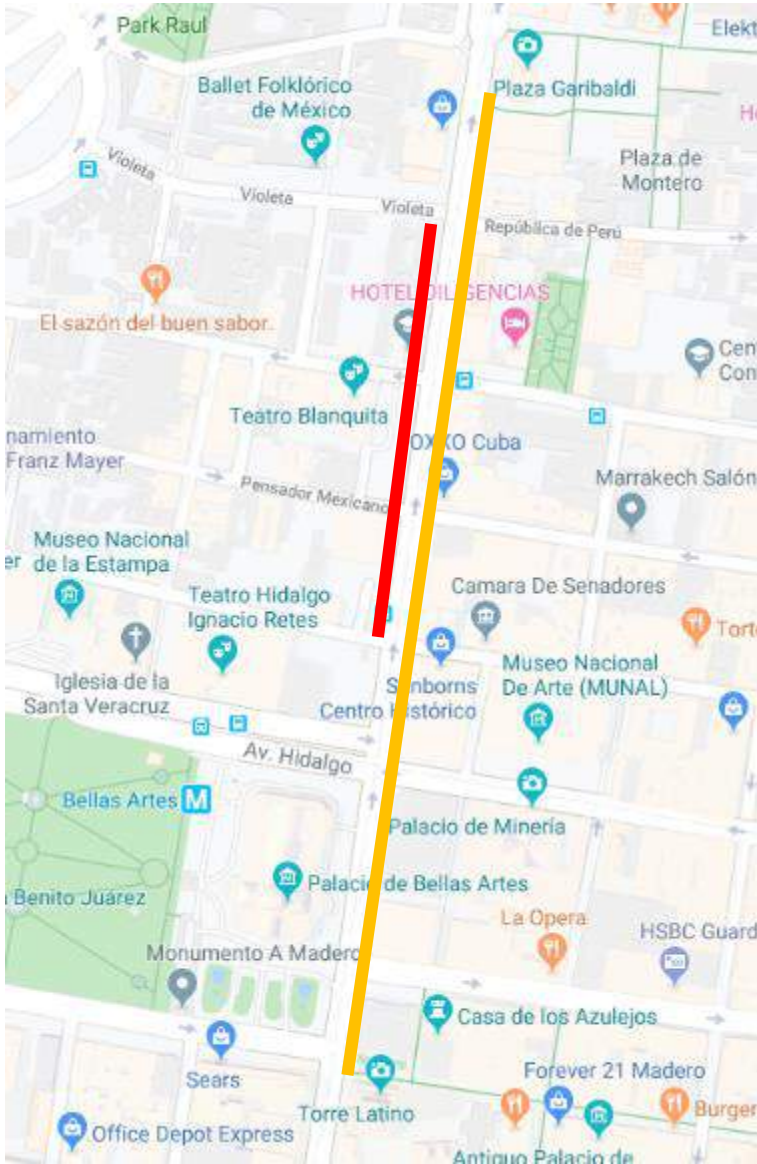

Eje Central acera Oriente avance de obra 8%

- Trabajos de colocación de recinto en Calle 5 de Mayo a Calle Tacuba
- Demolición y colocación de relleno fluido de Calle Tacuba a Calle Donceles
- Demolición de guarnición y banquetas, colado de relleno fluido en Calle República de Cuba a Calle Belisario Domínguez

Eje Central acera Poniente 1%

Trabajos de demolición de calle Violeta a Javier Mina



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

EJE CENTRAL



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS



Trabajo de excavación



Colado de relleno fluido



Paso Peatonal



Personal de apoyo en Paso Peatonal



Confinamiento de áreas de trabajo



Trabajos de Demolición




GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

AV. HIDALGO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

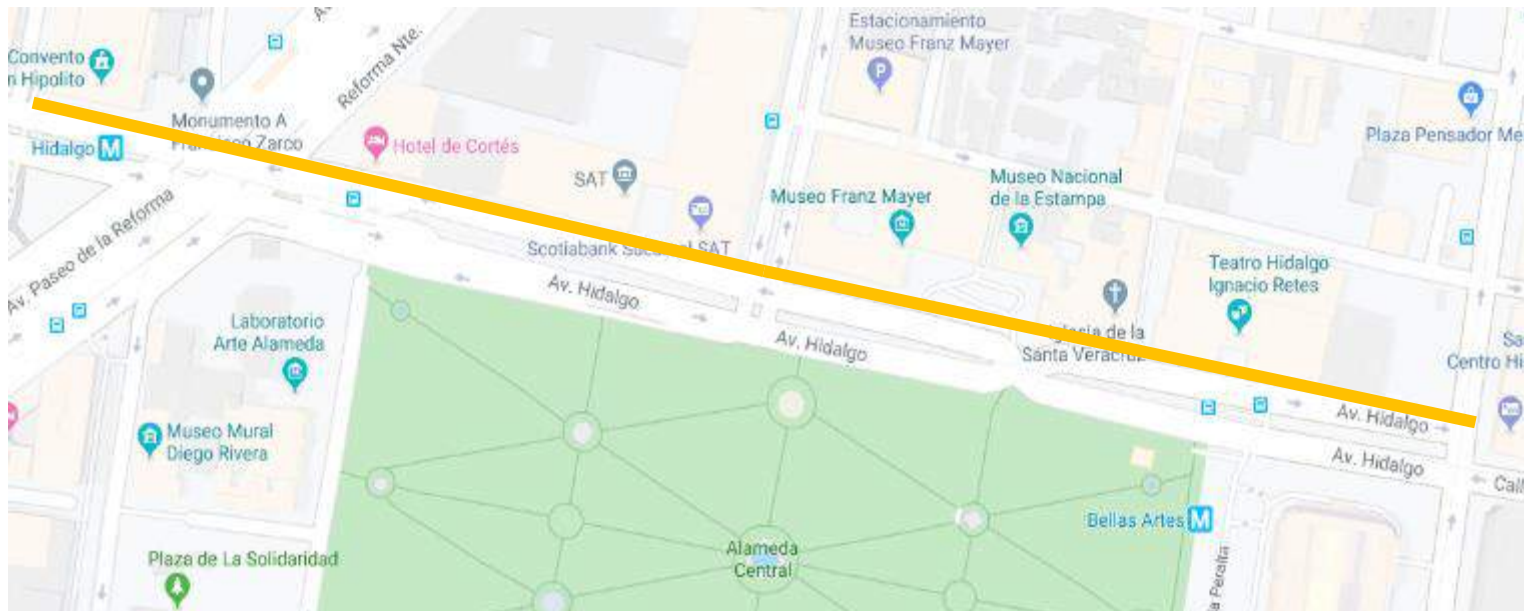

- **Av. Hidalgo avance de obra 21%**
-Fresado de carpeta asfáltica, colado de relleno fluido, colocación de recinto, demolición de banquetas y guarniciones a mano.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

AV. HIDALGO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS



Confinamiento área de trabajo



Fresado de carpeta asfáltica



Fresado de carpeta asfáltica



Fresado de carpeta asfáltica



Trabajos de excavación



Confinamiento área de trabajo



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

AV. HIDALGO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS



Estación provisional Metrobús Bellas Artes



Fresado de carpeta asfáltica



Demolición de banqueta y limpieza de zona de
intervención



STC-METRO

Tema	Indicador	Periodicidad	Quincena al 29/10	Quincena al 11/11	Próximo reporte
Infraestructura	Número de escaleras electromecánicas con falla o algún problema (línea base: 75 escaleras en 29 estaciones)	Quincenal	2 escaleras en mantenimiento	8 escaleras detenidas	26 de noviembre
Infraestructura	Número de elevadores en reparación (línea base: 19 elevadores en 29 estaciones)	Quincenal	0 elevadores detenidos	0 equipo con fallas	26 de noviembre



INVI

No. PREDIO	COLONIA	ALCALDÍA	PROGRAMA COLUMNA MAESTRA	AVANCE DEL PROYECTO	AVISO DE OBRA	ESTATUS	PERÍMETRO	PORCENTAJE DE AVANCE
1 2 DE ABRIL No. 42	GUERRERO	CUAUHTÉMOC	EXPROPIADO	PROYECTO EJECUTIVO LIBERADO	A-039/DOUL/62/11	OBRA EN PROCESO	A	42.20 %
2 ACADEMIA No. 33	CENTRO	CUAUHTÉMOC	EXPROPIADO	PROYECTO EJECUTIVO LIBERADO	A-028/DOUL/62/14	OBRA EN PROCESO	A	48.46 %
3 ARCOS DE BELEN No. 49	CENTRO	CUAUHTÉMOC	EXPROPIADO	PROYECTO EJECUTIVO LIBERADO	A-038/DOUL/62/17	OBRA EN PROCESO	B	90.00 %
4 EJE 1 PONIENTE GUERRERO No. 164	GUERRERO	CUAUHTÉMOC	EXPROPIADO	PROYECTO EJECUTIVO LIBERADO	A-007/DIUL/62/10	OBRA EN PROCESO	B	86.92 %
5 EJE 1 PONIENTE GUERRERO No. 110	CENTRO	CUAUHTÉMOC	EXPROPIADO	PROYECTO EJECUTIVO LIBERADO	A-085/DOUL/62/11	OBRA EN PROCESO	B	90.81 %
6 MAGNOLIA No. 12 (ANTES No. 12 y 16)	GUERRERO	CUAUHTÉMOC	PROGRAMA NORMAL	PROYECTO EJECUTIVO LIBERADO	A-069/DOUL/62/14	OBRA EN PROCESO	B	76.80 %
7 REPÚBLICA DE ARGENTINA No. 58	CENTRO	CUAUHTÉMOC	EXPROPIADO	PROYECTO EJECUTIVO LIBERADO	A-012/DOUL/62/14	POR INICIAR	A	0.00 % 35



INVI

No. PREDIO	COLONIA	ALCALDÍA	PROGRAMA COLUMNA MAESTRA	AVANCE DEL PROYECTO	AVISO DE OBRA	ESTATUS	PERÍMETRO	PORCENTAJE DE AVANCE
8 REPÚBLICA DE ARGENTINA No. 87	CENTRO	CUAUHTÉMOC	EXPROPIADO	PROYECTO EJECUTIVO LIBERADO	A-079/DOUL/62/12	OBRA EN PROCESO	A	86.81 %
9 REPÚBLICA DE PERÚ No. 40	CENTRO	CUAUHTÉMOC	PROGRAMA NACIONAL	PROYECTO EJECUTIVO LIBERADO	A-009/DOUL/62/2017	OBRA EN PROCESO	B	93.20 %
10 ALLENDE No. 46	CENTRO	CUAUHTÉMOC	EXPROPIADO	PROYECTO EJECUTIVO LIBERADO	A-073/DOUL/62/12	OBRA EN PROCESO	A	100.00 %
11 LERDO No. 12	GUERRERO	CUAUHTÉMOC	EXPROPIADO	PROYECTO EJECUTIVO LIBERADO	A-006/DOUL62/13	POR INICIAR	B	0.00 %
12 PEDRO MORENO No. 154	GUERRERO	CUAUHTÉMOC	EXPROPIADO	PROYECTO EJECUTIVO LIBERADO	A-062/DOUL/62/11	POR INICIAR	B	0.00 %
13 TALAVERA No. 24	CENTRO	CUAUHTÉMOC	EXPROPIADO	PROYECTO EJECUTIVO LIBERADO	A-056/DOUL/62/16	POR INICIAR	A	0.00 %



INVI

No. PREDIO	COLONIA	ALCALDÍA	PROGRAMA COLUMNA MAESTRA	AVANCE DEL PROYECTO	AVISO DE OBRA	ESTATUS	PERÍMETRO	PORCENTAJE DE AVANCE
14 VIOLETA No. 15	GUERRERO	CUAUHTÉMOC	EXPROPIADO	PROYECTO EJECUTIVO LIBERADO	A-024/DOUL/62/12	POR INICIAR	B	0.00 %
15 PEDRO MORENO No. 156	GUERRERO	CUAUHTÉMOC	EXPROPIADO	PROYECTO EJECUTIVO LIBERADO	A-064/DIUL/62/10	POR INICIAR	B	0.00 %
16 LECUMBERRI No. 66	ZONA CENTRO	CUAUHTÉMOC	PROGRAMA NORMAL	PROYECTO EJECUTIVO LIBERADO	A-022/DOUL/62/17	OBRA EN PROCESO	B	100.00 %
17 BELISARIO DOMINGUEZ No. 78	CENTRO	CUAUHTÉMOC	EXPROPIADO	PROYECTO EJECUTIVO LIBERADO	A-059/DOUL/62/17	OBRA EN PROCESO	A	71.45 %
18 NACIONAL No. 57	MORELOS	VENUSTIANO CARRANZA	CDI- CONVENIO DE COORDINACIÓN N 2013	PROYECTO EJECUTIVO LIBERADO	A-022/DOUL/62/15	OBRA EN PROCESO	B	85.11 %



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
CULTURA
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

INVI | Lecumberri No.66



FACHADA PRINCIPAL



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
CULTURA
CENTRO
HISTÓRICO

INVI | Lecumberri No.66



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS



ACABADOS AL INTERIOR




GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
CULTURA Y
PATRIMONIO
HISTÓRICO

INVI | Lecumberri No.66



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

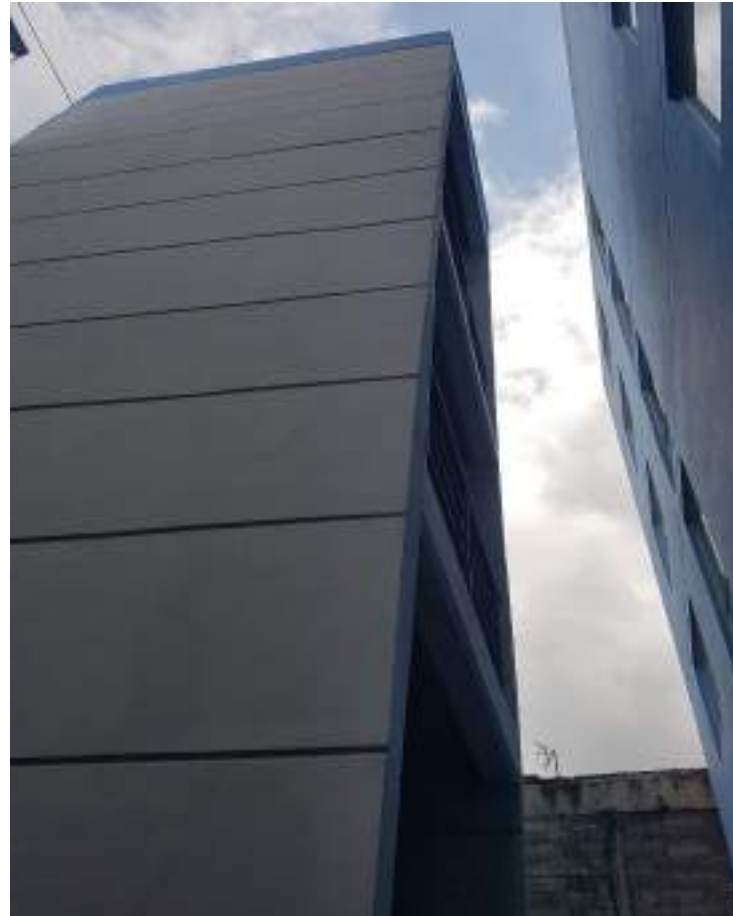

ACABADOS EN PASILLOS




INVI | Lecumberri No.66



CALENTADORES SOLARES Y TINACOS



PROSOC

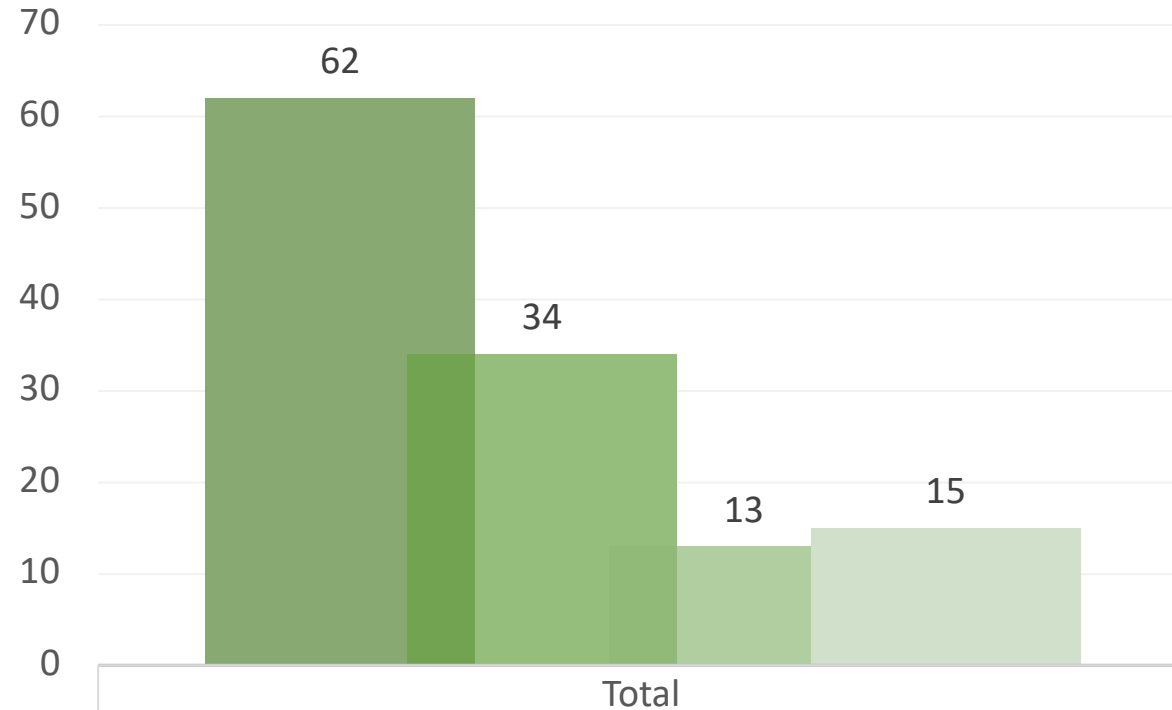


- OBRAS.
- POR INICIAR.
- EN PROCESO.
- TERMINADAS.

■ OBRAS.	62
■ POR INICIAR.	34
■ EN PROCESO.	13
■ TERMINADAS.	15



PROSOC

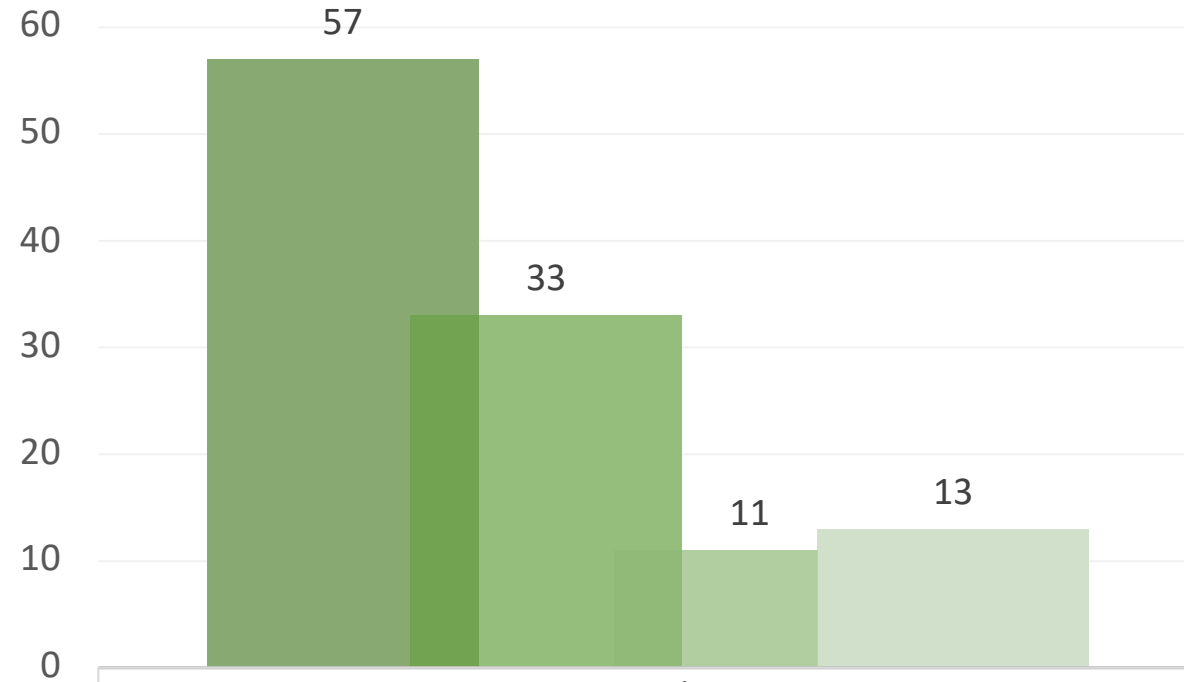


- OBRAS.
- POR INICIAR.
- Cuenta de EN PROCESO
- Cuenta de TERMINADA

	Total
■ OBRAS.	57
■ POR INICIAR.	33
■ Cuenta de EN PROCESO	11
■ Cuenta de TERMINADA	13



PROSOC

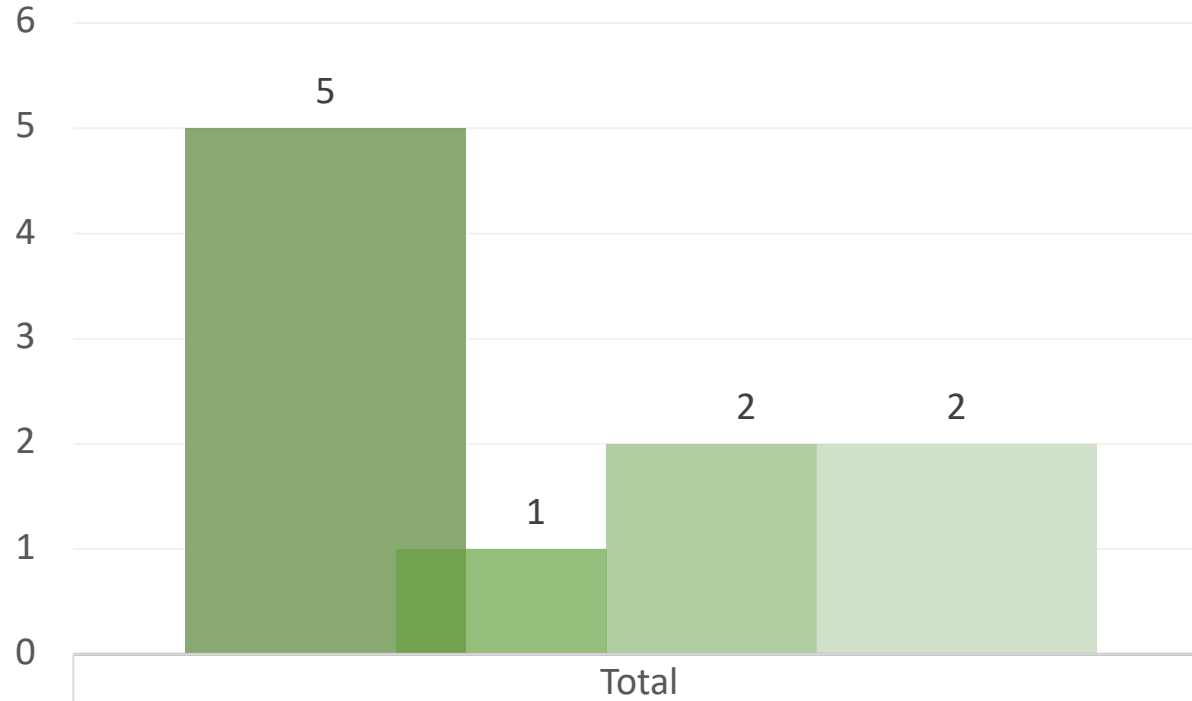

- OBRAS.
- POR INICIAR.
- EN PROCESO.
- TERMINADA.

■ OBRAS.	5
■ POR INICIAR.	1
■ EN PROCESO.	2
■ TERMINADA.	2



PROSOC

NO.	PREDIO	COLONIA	ALCALDIA	PROYECTO	ESTATUS	PORCENTAJE DE AVANCE	PERÍMETRO	CATALOGACIÓN
1	TIZAPAN 8	CENTRO	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA SANITARIA	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADO
2	SAN CAMILITO 25	CENTRO	CUAUHTEMOC	IMPERMEABILIZACION	EN PROCESO	80%	B	NO CATALOGADO
3	ROSARIO 32	CENTRO	VENUSTIANO CARRANZA	ESCALERAS	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADO
4	REPUBLICA DEL SALVADOR 206	CENTRO	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA SANITARIA	EN PROCESO	40%	A	CATALOGADO
5	REPUBLICA DE PERU 32	CENTRO	CUAUHTEMOC	IMPERMEABILIZACION	EN PROCESO	20%	A	CATALOGADO
6	REPUBLICA DE PERU 28	CENTRO	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	POR INICIAR	0%	B	NO CATALOGADO



PROSOC

NO.	PREDIO	COLONIA	ALCALDIA	PROYECTO	ESTATUS	PORCENTAJE DE AVANCE	PERÍMETRO	CATALOGACIÓN
7	REPUBLICA DE COSTA RICA 129	CENTRO	CUAUHTEMOC	IMPERMEABILIZACION	EN PROCESO	15%	B	NO CATALOGADO
8	REPUBLICA DE COSTA RICA 125	CENTRO	CUAUHTEMOC	HERRERIA	EN PROCESO	20%	A	NO CATALOGADO
9	REPUBLICA DE CHILE 49	CENTRO	CUAUHTEMOC	CALLES Y ANDADORES	POR INICIAR	0%	A	NO CATALOGADO
10	REPUBLICA DE CHILE 47	CENTRO	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	POR INICIAR	0%	A	CATALOGADO
11	PLAZA SAN LAZARO B-16	CENTRO	VENUSTIANO CARRANZA	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	POR INICIAR	0%	B	NO CATALOGADO
12	ORGANO 17	CENTRO	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	POR INICIAR	0%	B	NO CATALOGADO
13	ORGANO 16-18	CENTRO	CUAUHTEMOC	ESCALERAS	POR INICIAR	0%	B	NO CATALOGADO



PROSOC

NO.	PREDIO	COLONIA	ALCALDIA	PROYECTO	ESTATUS	PORCENTAJE DE AVANCE	PERÍMETRO	CATALOGACIÓN
14	NEZAHUALCOYOTL 136	CENTRO	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA SANITARIA	POR INICIAR	0%	B	NO CATALOGADO
15	MISIONEROS 9	CENTRO	CUAUHTEMOC	ALBAÑILERIA	TERMINADA	100%	A	CATALOGADO
16	MANUEL TOLSA 56	CENTRO	CUAUHTEMOC	ESTRUCTURA	POR INICIAR	0%	B	NO CATALOGADO
17	MANUEL DOBLADO 140	CENTRO	CUAUHTEMOC	HERRERIA	POR INICIAR	0%	B	NO CATALOGADO
18	LAZARIN DEL TORO 26	CENTRO	CUAUHTEMOC	HERRERIA	POR INICIAR	0%	A	CATALOGADO
19	JOSE JOAQUIN HERRERA 28-32	CENTRO	CUAUHTEMOC	ESCALERAS	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADO
20	JOSE JOAQUIN HERRERA 2-4	CENTRO	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA SANITARIA	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADO



PROSOC

NO.	PREDIO	COLONIA	ALCALDIA	PROYECTO	ESTATUS	PORCENTAJE DE AVANCE	PERÍMETRO	CATALOGACIÓN
21	JOSE JOAQUIN HERRERA 17	CENTRO	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	POR INICIAR	0%	B	NO CATALOGADO
22	JOSE JOAQUIN HERRERA 10 Y 12	CENTRO	CUAUHTEMOC	ESCALERAS	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADO
23	ISABEL LA CATOLICA 134	CENTRO	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	POR INICIAR	0%	B	NO CATALOGADO
24	FRAY SERVANDO TERESA DE MIER 142	CENTRO	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA SANITARIA	POR INICIAR	0%	B	NO CATALOGADO
25	EJE CENTRAL LAZARO CARDENAS 17	CENTRO	CUAUHTEMOC	IMPERMEABILIZACION	POR INICIAR	0%	B	NO CATALOGADO
26	ECUADOR 23 (ANTES ALLENDE 82 Y 86)	CENTRO	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	POR INICIAR	0%	B	NO CATALOGADO
27	CORREGIDORA 148	CENTRO	VENUSTIANO CARRANZA	ESCALERAS	EN PROCESO	20%	B	NO CATALOGADO



PROSOC

NO.	PREDIO	COLONIA	ALCALDIA	PROYECTO	ESTATUS	PORCENTAJE DE AVANCE	PERÍMETRO	CATALOGACIÓN
28	CORREGIDORA 140	CENTRO	VENUSTIANO CARRANZA	ESCALERAS	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADO
29	CERRADA FRAY SERVANDO 59	CENTRO	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	POR INICIAR	0%	B	NO CATALOGADO
30	CALLEJON MONTERO 7	CENTRO	CUAUHTEMOC	CALLES Y ANDADORES	POR INICIAR	0%	B	NO CATALOGADO
31	ANILLO DE CIRCUNVALACION 40	CENTRO	VENUSTIANO CARRANZA	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	EN PROCESO	20%	B	NO CATALOGADO
32	ALDACO 8	CENTRO	CUAUHTEMOC	IMPERMEABILIZACION	POR INICIAR	0%	A	CATALOGADO
33	5 DE FEBRERO 93	CENTRO	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA SANITARIA	POR INICIAR	0%	B	NO CATALOGADO
34	1RA. CERRADA FRAY SERVANDO 57	CENTRO	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA SANITARIA	POR INICIAR	0%	B	NO CATALOGADO



PROSOC

NO.	PREDIO	COLONIA	ALCALDIA	PROYECTO	ESTATUS	PORCENTAJE DE AVANCE	PERÍMETRO	CATALOGACIÓN
35	CHIMALPOPOCA 51	OBRERA	CUAUHTEMOC	PINTURA	POR INICIAR	0%	B	NO CATALOGADA
36	FLORIDA 57	MORELOS	CUAUHTEMOC	CALLES Y ANDADORES	POR INICIAR	0%	B	NO CATALOGADA
37	FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS 29	MORELOS	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA SANITARIA (DRENAJE)	POR INICIAR	0%	B	NO CATALOGADA
38	JESUS CARRANZA 20	MORELOS	CUAUHTEMOC	ESCALERAS Y HERRERIA	POR INICIAR	0%	B	NO CATALOGADA
39	LIBERTAD 21 A1	MORELOS	CUAUHTEMOC	IMPERMEABILIZACION	EN PROCESO	95%	B	NO CATALOGADA
40	LIBERTAD 21 B2	MORELOS	CUAUHTEMOC	HERRERIA (ESCALERAS)	POR INICIAR	0%	B	NO CATALOGADA
41	LIBERTAD 21 C3	MORELOS	CUAUHTEMOC	ESCALERAS	POR INICIAR	0%	B	NO CATALOGADA
42	LIBERTAD 21 D4	MORELOS	CUAUHTEMOC	CALLES Y ANDADORES	EN PROCESO	95%	B	NO CATALOGADA



PROSOC

NO.	PREDIO	COLONIA	ALCALDIA	PROYECTO	ESTATUS	PORCENTAJE DE AVANCE	PERÍMETRO	CATALOGACIÓN
43	BOLIVAR 158	OBRERA	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	POR INICIAR	0%	B	NO CATALOGADA
44	SEGUNDA CERRADA DE CHIMALPOPOCANO.16	OBRERA	CUAUHTEMOC	BASE DE TINACOS	POR INICIAR	0%	B	NO CATALOGADA
45	CERRADA FRAY SERVANDO 42	TRANSITO	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA (CABLEADO)	POR INICIAR	0%	B	NO CATALOGADA
46	CHIMALPOPOCA 294	TRANSITO	CUAUHTEMOC	IMPERMEABILIZACION	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
47	MINA 167	BUENAVISTA	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	POR INICIAR	0%	B	NO CATALOGADA
48	MOCTEZUMA 199	BUENAVISTA	CUAUHTEMOC	HERRERIA	POR INICIAR	0%	B	NO CATALOGADA
49	MOCTEZUMA 33	GUERRERO	CUAUHTEMOC	HERRERIA	POR INICIAR	0%	B	NO CATALOGADA
50	VIOLETA 104	BUENAVISTA	CUAUHTEMOC	HERRERIA (ESCALERAS)	EN PROCESO	80%	B	NO CATALOGADA



PROSOC

NO.	PREDIO	COLONIA	ALCALDIA	PROYECTO	ESTATUS	PORCENTAJE DE AVANCE	PERÍMETRO	CATALOGACIÓN
51	AVENIDA NIÑOS HEROES 51	DOCTORES	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y HERRERIA (ESCALERA MARINA)	EN PROCESO	80%	B	NO CATALOGADA
52	DR. ANDRADE 14	DOCTORES	CUAUHTEMOC	IMPERMEABILIZACION, INFRAESTRUCTURA SANITARIA, INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
53	DR. ANDRADE 15	DOCTORES	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA SANITARIA	POR INICIAR	0%	B	NO CATALOGADA
54	CALZADA DE LA VIGA 16	ESPERANZA	CUAUHTEMOC	IMPERMEABILIZACION	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
55	CALZADA DE LA VIGA 18	ESPERANZA	CUAUHTEMOC	IMPERMEABILIZACION	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
56	CALZADA DE LA VIGA 30	ESPERANZA	CUAUHTEMOC	PINTURA	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
57	PENSADOR MEXICANO 47	GUERRERO	CUAUHTEMOC	IMPERMEABILIZACION	POR INICIAR	0%	B	NO CATALOGADA



PROSOC

NO.	PREDIO	COLONIA	ALCALDIA	PROYECTO	ESTATUS	PORCENTAJE DE AVANCE	PERÍMETRO	CATALOGACIÓN
58	SANTA VERACRUZ 47	GUERRERO	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
59	VIOLETA 58	GUERRERO	CUAUHTEMOC	HERRERIA (ESCALERAS)	EN PROCESO	20%	B	NO CATALOGADA
60	GALEANA 36	GUERRERO	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA (BOMBA)	EN PROCESO	95%	B	NO CATALOGADA
61	HEROES 54	GUERRERO	CUAUHTEMOC	ESTRUCTURAS	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
62	HEROES 68	GUERRERO	CUAUHTEMOC	ESCALERAS	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA



ADIP

Tema	Indicador	Periodicidad	Reporte al 04/11	Reporte al 11/11	Próximo reporte
Conectividad e Infraestructura Tecnológica	Número de puntos de conexión wifi habilitados en postes de C5 (Línea base: 589)	Semanal	327	366	19/11/2019

589 registros

Ubicación de puntos de acceso gratuito a internet WiFi vía infraestructura C5 (actuales y próximos)

Twitter Facebook LinkedIn

Filtros activos ● Borrar todo

geopoint Área dibujada en el mapa

ESTATUS CONECTIVIDAD WIFI

GRATUITO_ACTIVO

ESTATUS CONECTIVIDAD SIN WIFI

Filtros

Buscar registros...

COLONIA

- CENTRO 297
- GUERRERO 55
- ZONA CENTRO 47
- MORELOS 41
- DOCTORES 22
- EL PARQUE 17
- y Más

ALCALDIA

- CUAUHTEMOC 460
- VENUSTIANO CARRANZA 129

BOTON

- CON BOTON 435
- SIN BOTON 181
- N/A 23

ALTAVOZ

- CON ALTAVOZ 454
- SIN ALTAVOZ 112
- N/A 23

ESTATUS CONECTIVIDAD

- WIFI GRATUITO_ACTIVO 366
- SIN WIFI 223

Información Tabla Mapa Exportar API



Editar en modo avanzado

Compartir Incrustar Widget

[https://datos.cdmx.gob.mx/explore/embed/dataset/ubicacion-acceso-gratuito-internet-wifi-c5/map/?disjunctive=estatus_conectividad&geofilter=polygon=\[\(19.446347259159413,-99.14865011354777\),\(19.435683806715573,-99.15101045](https://datos.cdmx.gob.mx/explore/embed/dataset/ubicacion-acceso-gratuito-internet-wifi-c5/map/?disjunctive=estatus_conectividad&geofilter=polygon=[(19.446347259159413,-99.14865011354777),(19.435683806715573,-99.15101045)



INBAL

Tema	Indicador	Periodicidad	Reporte del 20/09 al 27/10	Observaciones
Obras y proyectos de intervención urbana	Número de permisos para la realización de obras y proyectos de intervención urbana	Mensual	39 solicitudes ingresadas	30 Solicitudes de información 9 Solicitud de obras menores 0 Solicitud de obras mayores 20 Inmuebles incluidos



INBAL

Nº.	CALLE	NÚMERO	COLONIA	DELEGACIÓN	RESPUESTA	FOLIO	COLINDANTE	TIPO	TRABAJOS	VIGENCIA	IMAGEN
1	AV. 10 DE NOVIEMBRE	82	CENTRO	CUAUHTÉMOC	TRABAJOS AUTORIZADOS	2083	INCLUIDO	INBA 02-006	IMPERMEABILIZACIÓN	UN AÑO	
2	DOLORES	30	CENTRO	CUAUHTÉMOC	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	2109	COLINDANTE	INBA 02-002	NO APLICA	UN AÑO	
3	DOLORES	30	CENTRO	CUAUHTÉMOC	TRABAJOS AUTORIZADOS	2130	COLINDANTE	INBA 02-006	SUSTITUCIÓN DE LAMPARAS EN AREA DE VENTAS Y SERVICIOS, SUSTITUCIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y ELECTRICO	UN AÑO	
4	DONCELES	75	CENTRO	CUAUHTÉMOC	TRABAJOS AUTORIZADOS	2146	COLINDANTE	INBA 02-006	TRABAJOS A REALIZAR EN LOS CUERPOS DEL INTERIOR DEL INMUEBLE	UN AÑO	



INBAL

Nº.	CALLE	NÚMERO	COLONIA	DELEGACIÓN	RESPUESTA	FOLIO	COORDINANTE	TIPO	TRABAJOS	VIGENCIA	IMAGEN
5	DONCELES	75	CENTRO	CUAUHTÉMOC	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	2147	COORDINANTE	INBA-02-003	NO APLICA	UN AÑO	
6	FRANCISCO I. MADERO	30	CENTRO	CUAUHTÉMOC	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	2158	INCLUIDO	INBA-02-003	NO APLICA	UN AÑO	
7	REPÚBLICA DE URUGUAY	73-BIS	CENTRO	CUAUHTÉMOC	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	2172	NO INCLUIDO	INBA-02-003	NO APLICA	UN AÑO	



INBAL

No.	CALLE	NÚMERO	COLONIA	DELEGACIÓN	RESPUESTA	FOUO	COORDINANTE	TIPO	TRABAJO	VIGENCIA	IMAGEN
8	DOLORES	22	CENTRO	CUAUHTÉMOC	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	2175	INCLUIDO	INBA-02-003	NO APLICA	UN AÑO	
9	PALMA	54	CENTRO	CUAUHTÉMOC	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	2176	COORDINANTE	INBA-02-003	NO APLICA	UN AÑO	
19	TACUBA	53	CENTRO	CUAUHTÉMOC	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	2180	INCLUIDO	INBA-02-003	NO APLICA	UN AÑO	



INBAL

Nº.	CALLE	NÚMERO	COLONIA	DELEGACIÓN	RESPUESTA	FOLIO	COLINDANTE	TIPO	TRABAJO	VIGENCIA	IMAGEN
11	VENUSTIANO CARRANZA	63	CENTRO	CUAUHTÉMOC	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	2185	INCLUIDO	INBA 02-003	NO APLICA	UNAÑO	
12	REPÚBLICA DE URUGUAY	307	CENTRO	CUAUHTÉMOC	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	2186	NO INCLUIDO	INBA 02-003	NO APLICA	UNAÑO	
13	AV. 5 DE MAYO	2	CENTRO	CUAUHTÉMOC	TRABAJO AUTORIZADO	2191	INCLUIDO	INBA 02-006	PINTURA EN EXTERIORES E INTERIORES, REPOSICIÓN DE APLACADOS EN EXTERIORES E INTERIORES, LIMPIEZA DE FACHADA, INCLUYENDO ELEMENTOS DE CANTERA, TABICADO ALGÚN OTRO MATERIAL PÉTREO	UNAÑO	
14	REGINA	165	CENTRO	CUAUHTÉMOC	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	2194	COLINDANTE	INBA 02-003	NO APLICA	UNAÑO	



INBAL

No.	CALLE	NÚMERO	COLONIA	DELEGACIÓN	RESPUESTA	FOLIO	COLINDANTE	TIPO	TRABAJO	VIGENCIA	IMAGEN
15	EJE CENTRAL LAZARO CARDENAS	45	CENTRO	CUAUHTÉMOC	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	1200	COLINDANTE	INBA 02-005	NO APLICA	UN AÑO	
16	CORRED MAJOR	69	CENTRO	CUAUHTÉMOC	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	1211	INCLUIDO	INBA 02-005	NO APLICA	UN AÑO	
17	JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	36-38	CENTRO	CUAUHTÉMOC	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	1215	INCLUIDO	INBA 02-005	NO APLICA	UN AÑO	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
CULTURA Y
PATRIMONIO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

INBAL

Nº.	CALLE	NÚMERO	COLOIA	DELEGACIÓN	RESPUESTA	FOLIO	COLINDANTE	TIPO	TRABAJOS	VIGENCIA	IMAGEN
28	VENUSTIANO CARRANZA	64	CENTRO	CUALHTEMOC	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	1224	INCLUIDO	INBA 02-003	NO APLICA	UN AÑO	
29	VENUSTIANO CARRANZA	64	CENTRO	CUALHTEMOC	TRABAJOS AUTORIZADOS	1226	INCLUIDO	INBA 02-006	DECORACIÓN NAVIDEÑA CON ILUMINACIÓN TIPO LED	UN AÑO	
30	ISABEL LA CATÓLICA	29	CENTRO	CUALHTEMOC	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	1226	INCLUIDO	INBA 02-008	NO APLICA	UN AÑO	



INBAL

Nº.	CALLE	NÚMERO	COLONIA	DELEGACIÓN	RESPUESTA	POSO	COLINDANTE	TIPO	TRABAJO	VIGENCIA	IMAGEN
21	ISABEL LA CATÓLICA	33	CENTRO	CUAUHTÉMOC	TRABAJO AUTORIDAD	2257	INCLUIDO	INBA 02-005	PINTURA EN EXTERIORES E INTERIORES, REPOSICIÓN DE APLANADOS EN EXTERIORES E INTERIORES, LIMPIEZA DE FACHADA, INCLUYENDO ELEMENTOS DE CANTERA, TABIQUE O ALGÚN OTRO MATERIAL PÉTREO.	UN AÑO	
22	JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	44	CENTRO	CUAUHTÉMOC	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	2251	NO INCLUIDO	INBA 02-003	NO APLICA	UN AÑO	
23	RELISARIO DOMÍNGUEZ	42	CENTRO	CUAUHTÉMOC	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	2252	INCLUIDO	INBA 02-002	NO APLICA	UN AÑO	




INBAL

No.	CALLE	NÚMERO	COLONIA	DELEGACIÓN	RESPUESTA	FOLIO	COLINDANTE	TIPO	TRABAJOS	VIGENCIA	IMAGEN
24	ALLENDE	48	CENTRO	DUALHÉVOC	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	2254	COLINDANTE	IMBA 02-003	NO APLICA	UN AÑO	
25	BEUSARIO DOMÍNGUEZ	80	CENTRO	DUALHÉVOC	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	2278	INCLUIDO	IMBA 02-003	NO APLICA	UN AÑO	
26	SABEL LA CATÓLICA	71	CENTRO	DUALHÉVOC	TRABAJOS AUTORIZADOS	2264	COLINDANTE	IMBA 02-005	PINTURA EN EXTERIORES E INTERIORES. REPOSICIÓN DE PISOS ORIGINALES	UN AÑO	
27	FRAY SERVAÑO TERESA DE MIER	122	CENTRO	DUALHÉVOC	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	2290	NO INCLUIDO	IMBA 02-003	NO APLICA	UN AÑO	



INBAL

Nº.	CALLE	NÚMERO	COLOMIA	DELEGACIÓN	RESPUESTA	FOLIO	COLINDANTE	TIPO	TRABAJO	VIGENCIA	IMAGEN
28	FRAY SERVAUDO TERESA DE MIER	171	CENTRO	CUAUHTEMOC	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	2282	NO INCLUIDO	INBA 02-001	NO APLICA	UN AÑO	
29	JOSÉ MARÍA GAZZAGA	65	CENTRO	CUAUHTEMOC	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	2284	NO INCLUIDO	INBA 02-001	NO APLICA	UN AÑO	
30	REPÚBLICA DE GUATEMALA	24	CENTRO	CUAUHTEMOC	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	2290	NO INCLUIDO	INBA 02-001	NO APLICA	UN AÑO	
32	AYUNTAMIENTO	51	CENTRO	CUAUHTEMOC	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	2278	INCLUIDO	INBA 02-001	NO APLICA	UN AÑO	



INBAL

No.	CALLE	NÚMERO	COLONIA	DELEGACIÓN	RESPUESTA	FOLIO	COLINDANTE	TIPO	TRABAJS	VIGENCIA	IMAGEN
33	INDEPENDENCIA	24	CENTRO	CUAUHTÉMOC	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	2329	INCLUIDO	INBA-02-003	NO APLICA	UN AÑO	
34	PALMA	34	CENTRO	CUAUHTÉMOC	TRABAJS AUTORIZADOS	2321	COLINDANTE	INBA-02-006	PINTURA EN INTERIORES, REPOSICIÓN DE CANCELERÍAS EN PUERTAS Y VENTANAS, REPOSICIÓN DE PISOS ORIGINALES EN INTERIORES, ARRREGLO Y REPOSICIÓN DE INSTALACIONES HIDRÁULICA, SANITARIA, AIRE ACONDICIONADO Y OTRAS ESPECIALES EXISTENTES	UN AÑO	
35	EMRICOMARTÍNEZ	35	CENTRO	CUAUHTÉMOC	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	2328	INCLUIDO	INBA-02-003	NO APLICA	UN AÑO	
36	LECUMBERRI	34	CENTRO	CUAUHTÉMOC	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	2225	NO INCLUIDO	INBA-02-003	NO APLICA	UN AÑO	



INBAL

No.	CALLE	NÚMERO	COLONIA	DELEGACIÓN	RESPUESTA	FOJO	CONDICIÓN	TIPO	TRABAJO	VIGENCIA	IMAGEN
37	INDEPENDENCIA	40	CENTRO	CUAUHTÉMOC	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	2336	INCLUIDO	IMBA 02-003	NO APLICA	UN AÑO	
38	DR. MORA	11	CENTRO	CUAUHTÉMOC	TRABAJO AUTORIZADO	2356	INCLUIDO	IMBA 02-005	PINTURA EN EXTERIORES E INTERIORES, REPOSICIÓN DE APLANADOS EN EXTERIORES E INTERIORES, LIMPIEZA DE FACHADA, INCLUYENDO ELEMENTOS DE CANTERA, TABIQUE O ALGÚN OTRO MATERIAL PÉTREO	UN AÑO	
39	JOSÉ MARÍA PIND SUÁREZ	25	CENTRO	CUAUHTÉMOC	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	2391	NO INCLUIDO	IMBA 02-003	NO APLICA	UN AÑO	



ILIFE | Inmuebles escolares en proceso de atención 2018 -2019 en Centro Histórico

No.	Plantel	Porcentaje de avance	Observaciones
1	ESCUELA PRIMARIA MIGUEL SERRANO	100.00 %	ENTREGADA JUNIO
2	ESCUELA SECUNDARIA ADRIANA GARCIA CORRAL	42.08 %	
3	ESCUELA SECUNDARIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ SEC TEC No. 6	100.00 %	ENTREGADA ABRIL
4	ESCUELA PRIMARIA REPÚBLICA DE BOLIVIA	100.00 %	ENTREGADA ABRIL
5	ESCUELA PRIMARIA ALFREDO E. URUCHURTU	100.00 %	ENTREGADA ABRIL
6	ESCUELA PRIMARIA PABLO MORENO	100.00 %	
7	ESCUELA PRIMARIA REPÚBLICA DE ARGENTINA	100.00 %	ENTREGADA ABRIL
8	ESCUELA NACIONAL PARA CIEGOS LIC. IGNACIO TRIGUEROS	100.00 %	ENTREGADA OCTUBRE
9	TELESECUNDARIA NO. 91	88.35 %	
10	ESCUELA PRIMARIA SARA MANZANO	100.00 %	ENTREGADA SEPTIEMBRE
11	ESCUELA PRIMARIA MARCELINO DÁVALOS	62.30 %	
12	ESCUELA PRIMARIA REPÚBLICA DE PANAMÁ	67.80 %	



ILIFE | Inmuebles escolares en proceso de atención 2018 -2019 en Centro Histórico

No.	Plantel	Porcentaje de avance	Observaciones
13	ESCUELA SECUNDARIA JOSÉ MANUEL RAMOS	100.00 %	ENTREGADA OCTUBRE
14	ESCUELA PRIMARIA ABRAHAM CASTELLANOS	100.00 %	ENTREGADA ABRIL
15	ESCUELA SECUNDARIA ÁNGEL TRÍAS ÁLVAREZ	86.50 %	
16	JARDÍN DE NIÑOS CADETES DE LA NAVAL	100.00 %	ENTREGADA OCTUBRE
17	ESCUELA SECUNDARIA NO. 1 CÉSAR A. RUÍZ	100.00 %	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE BARRA POR FUNDACIÓN BOSCH
18	JARDÍN DE NIÑOS ENRIQUE PESTALOZZI	100.00 %	ENTREGADA OCTUBRE
19	ESCUELA PRIMARIA FRAY PEDRO DE GANTE	100.00 %	ENTREGADA OCTUBRE
20	ESCUELA PRIMARIA JOAQUÍN GARCÍA ICAZBALCETA	22.38 %	
21	JARDÍN DE NIÑOS JUAN JACOBO ROUSSEAU	100.00 %	ENTREGADA OCTUBRE
22	ESCUELA PRIMARIA LIC. PONCIANO ARRIAGA	100.00 %	ENTREGADA OCTUBRE
23	ESCUELA PRIMARIA REPÚBLICA DE LÍBANO	100.00 %	ENTREGADA OCTUBRE



ESCUELAS CONCLUIDAS EN OCTUBRE 2019

ILIFE



ESCUELA NACIONAL PARA CIEGOS LIC. IGNACIO TRIGUEROS



ESCUELAS CONCLUIDAS EN OCTUBRE 2019

ILIFE



ESCUELA SECUNDARIA No. 7 JOSÉ MANUEL RAMOS

ESCUELAS CONCLUIDAS EN OCTUBRE 2019

ILIFE



ESCUELA PRIMARIA REPÚBLICA DE LÍBANO



ESCUELAS CONCLUIDAS EN OCTUBRE 2019

ILIFE



JARDÍN DE NIÑOS JUAN JACOBO ROUSSEAU



ESCUELAS CONCLUIDAS EN OCTUBRE 2019

ILIFE



JARDÍN DE NIÑOS CADETES DE LA NAVAL



ESCUELAS CONCLUIDAS EN OCTUBRE 2019

ILIFE



JARDÍN DE NIÑOS ENRIQUE PESTALOZZI



ESCUELAS CONCLUIDAS EN OCTUBRE 2019

ILIFE



ESCUELA PRIMARIA LIC. PONCIANO ARRIAGA



ESCUELAS CONCLUIDAS EN OCTUBRE 2019

ILIFE



ESCUELA PRIMARIA FRAY PEDRO DE GANTE



Ciudad de México, a 12 de noviembre de 2019



SEDECO

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS MERCADOS PÚBLICOS:

Con la finalidad de fomentar la conservación y mantenimiento que propicien las mejores condiciones de seguridad, operación e higiene en los Mercados Públicos del perímetro “A” “y B” del centro histórico de la CDMX, a partir del 14 de enero al 17 de septiembre del año en curso, se han visitado un total de 30 mercados públicos.

De lo anterior, se derivó la identificación de diversas necesidades y prioridades de atención, principalmente de infraestructura, las cuales fueron informadas a las Alcaldías respectivas. Se ha recibido copia de seguimiento por parte de la Dirección de Mercados y Vías Pública de la Alcaldía Cuauhtémoc. A la Alcaldía Venustiano Carranza, mediante oficio SEDECO/ACD/2019, se envió un reiterativo solicitándole informar de las acciones realizadas, entre estas lo relativo a las diversas mercedes, que forman parte del Centro Histórico.

OTRAS NECESIDADES IDENTIFICADAS:

SEGURIDAD EN LOS MERCADOS PÚBLICOS:

Conjuntamente con la Dirección General de Administración Operativa del C5, se está trabajando a fin de que los mercados públicos cuenten con videocámaras (circuitos cerrados) instaladas al exterior y puedan ser enlazadas al C2 y C5 en caso de alguna contingencia delictiva.

A fin de valorar si los mercados que actualmente cuentan con equipos de videocámaras son compatibles para ser enlazados al C2 y/o C5. Conjuntamente con personal de la Dirección de Misión Crítica se realizaron 4 visitas muestra, a los mercados:

ALCALDÍA	Nº OFICINA	MERCADO	DIRECCIÓN	FECHA DE VISITA
GUAYAMA MADERO	803	SUBBLANCO	CONGRESO DE LA UNIÓN ENTRE EL PRESENTE Y OROESTE S.L. COLONIA MARTINES DE BORDABLANCO, DELEGACIÓN GUAYAMA A. MADRID	21-Oct-19
CUALTITZACO	009	SAN JUAN ARCOS DE BILEY	ARCOS DE BILEY Y LOPEZ ENTRE DE CENTRAL Y LOPEZ, COLONIA CENTRO, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC	21-Oct-19
GUAYAMA MADERO	000	FRANCA	MALINCHI ENTRE MONTE DE LAS CRUCES Y POPocatepetl, COLONIA LA PRADEIRA, DELEGACIÓN GUAYAMA A. MADRID	22-Oct-19
INDEP. MEDICAL	001	4 MARCELA ZONA	TLALOC INDEP ATEA Y CAL Y PUELA REAL DELA, COLONIA TLALPANA, DELEGACIÓN VEGETAL MEDICAL	23-Oct-19

La finalidad fue hacer un levantamiento de datos para continuar con el proceso de documentar la condición que guardan los mercados públicos que pretenden enlazar su video vigilancia en C5. FALTA ACTUALIZAR



SEDECO

Obra de restitución y reconstrucción de mercados (siniestrados por incendio en febrero 2013)

Alcaldía	Mercado	NO. OFICIAL	ACCIONES REALIZADAS		
			TEMA	PERÍODO	OBSERVACIONES
Venustiano Carranza	Merced Nave Mayor	102	- Reubicación de locatarios	Del 30 al 12 de noviembre del 2019	En coordinación con la Alcaldía, la Subsecretaría de Programas de Alcaldías de la Secretaría de Gobierno y SEDECO, se continúan realizando MESAS DE DIÁLOGO con representaciones y la comisión del mercado de la zona afectada para la distribución de locales en las carpas de la reubicación temporal.
Venustiano Carranza	Merced Banquetón	109			Estatus actual: El día de ayer se recorrió tapial de locales, que ya tienen lugar designado. Dando acompañamiento a la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo (STYFETyfe, se esta recibiendo la documentación para el apoyo de seguro de desempleo. Así mismo, SEDECO apoya a la Subsecretaria de Programas de Alcaldías, que ha habilitado una carpa en la calle de Rosario para continuar con la reubicación de loctarios.


Elaboró: Lic. Elsa Iris Rueda Salgado
JUD de Modernización


Autorizó: Lic. Alberto Birrichaga Membrillo
Director de Proyectos para el Desarrollo de los Canales de Abasto.



SEDECO

Programa para el Fomento y Mejoramiento de los Mercados Públicos de la Ciudad de México

Estatus al 12 de noviembre 2019

Alcaldía	Mercado	Obra y Servicio	Fecha de inicio	Fecha término	AVANCE		Importe del Contrato	Avance físico	
					Empresa				
Cuauhtémoc	San Camilito	REHABILITACIÓN	01/08/2019	21/12/2019	COMERCIALIZADORA Y DESARROLLO INMOBILIARIO VILALVA, S.A. DE C.V.		6,669,870.46	38.88%	20.42 %
Cuauhtémoc	Lagunilla Ropa y Telas	REHABILITACIÓN	01/08/2019	21/12/2019	PROYECCIÓN Y DISEÑO EN CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.		13,307,986.69	30.42%	1.57 %
Cuauhtémoc	San Juan Curiosidades	REHABILITACIÓN	30/07/2019	21/12/2019	DESARROLLO E INGENIERÍA DE OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V.		32,346,718.04	10.73%	6.01 %

NOTA: El mercado San Juan Curiosidades, fue afectado por el sismo del 19 de septiembre de 2017



SEDECO

RESTAURACIÓN DEL MURAL “INFLUENCIA DE LAS VITAMINAS” EN EL MERCADO ABELARDO L. RODRÍGUEZ:

A fin de formalizar apoyo financiero de SEDECO a la Autoridad del Centro Histórico, el 5 de noviembre del 2019, se firmó CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA TRANSFERIR RECURSOS PRESUPUESTALES A LA AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO, PARA RESTAURAR LA OBRA MURAL “INFLUENCIA DE LAS VITAMINAS” DEL MERCADO ABELARDO L. RODRÍGUEZ, por la cantidad de \$120,000.00 (CIENTO VEINTE MIL PESOS 00/100 M. N. IVA INCLUIDO)

USO Y APROVECHAMIENTO DE GRASAS Y ACEITES RESIDUALES DE ORIGEN ANIMAL Y VEGETAL, EN LOS MERCADOS PÚBLICOS:

La propuesta presentada para inclusión a los LINEAMIENTOS PARA LA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS MERCADOS PÚBLICOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, se encuentra en revisión del Área jurídica de la SEDECO.

PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS MERCADOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

Se anexa cuadro con avance de obra de los mercados públicos: San Camilito, Lagunilla ropa y telas y San Juan Curiosidades.

OBRA DE RESTITUCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE MERCADOS (SINIESTRADOS POR INCENDIO EN FEBRERO 2013)

Se anexa cuadro con avance Merced Nave Mayor y Merced Banquetón.

Elaboró:

Lic. Elsa Iris Rueda Salgado
JUD de Modernización e Infraestructura

Autorizó:

Lic. Alberto Birrichaga Membrillo
Director de Proyectos para el Desarrollo
Económico de los Canales de Abasto,
Comercio y Distribución.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

C5

Tema	Línea base	Periodicidad	Semana del 30/10 al 05/11	Semana del 06 al 12/11	Próximo reporte
Cámaras de video-vigilancia	No. cámaras con falla o intermitencia	Semanal	21	28	26 de noviembre



INCIDENTES DE GRAFITI Y ROBO DE COLADERAS

Perímetros A y B

Período: 5 de diciembre de 2018 al 10 de noviembre de 2019



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

C5

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS


II. INCIDENTES POR PINTAS DE GRAFITI Y ROBO DE CABLE Y/O COLADERAS

Colonia	Pinta de Grafitis						Total	
	Diciembre 2018	1er trimestre 2019	2do trimestre 2019	3er trimestre 2019	Octubre 2019	Noviembre 2019	Incidentes	Proporción
Centro	3	15	8	22	5	3	56	68%
Doctores	0	2	3	3	1	2	11	13%
Penitenciaría	0	1	1	1	1	0	4	5%
Guerrero	0	1	1	1	0	0	3	4%
Juárez	0	1	0	2	0	0	3	4%
El Parque	1	0	0	0	0	0	1	1%
Morales	0	1	0	0	0	0	1	1%
Obrera	1	0	0	0	0	0	1	1%
Tránsito	1	0	0	0	0	0	1	1%
Roma Norte	0	0	1	0	0	0	1	1%
Mercad Belbuena	0	0	0	0	0	0	0	0%
Candelaria de los Patos	0	0	0	0	0	0	0	0%
Total	6	21	14	29	7	5	82	100%

Colonia	Robo de Cables o Coladeras						Total	
	Diciembre 2018	1er trimestre 2019	2do trimestre 2019	3er trimestre 2019	Octubre 2019	Noviembre 2019	Incidentes	Proporción
Centro	0	3	5	6	1	0	15	54%
Guerrero	0	1	2	1	1	0	5	18%
Doctores	2	1	0	0	0	0	3	11%
Mercad Belbuena	0	0	1	1	0	0	2	7%
Penitenciaría	0	0	0	1	0	0	1	4%
Candelaria de los Patos	0	0	1	0	0	0	1	4%
Tránsito	0	0	0	0	1	0	1	4%
El Parque	0	0	0	0	0	0	0	0%
Juárez	0	0	0	0	0	0	0	0%
Morales	0	0	0	0	0	0	0	0%
Obrera	0	0	0	0	0	0	0	0%
Roma Norte	0	0	0	0	0	0	0	0%
Total	2	6	9	9	3	0	28	100%

En total se registraron 110 incidentes, 82 de ellos corresponden a pintas de grafiti, mientras que 28 corresponden a robo de coladeras.

Destaca el caso de la colonia Centro en la cual se han suscitado más de 68% de los incidentes analizados.

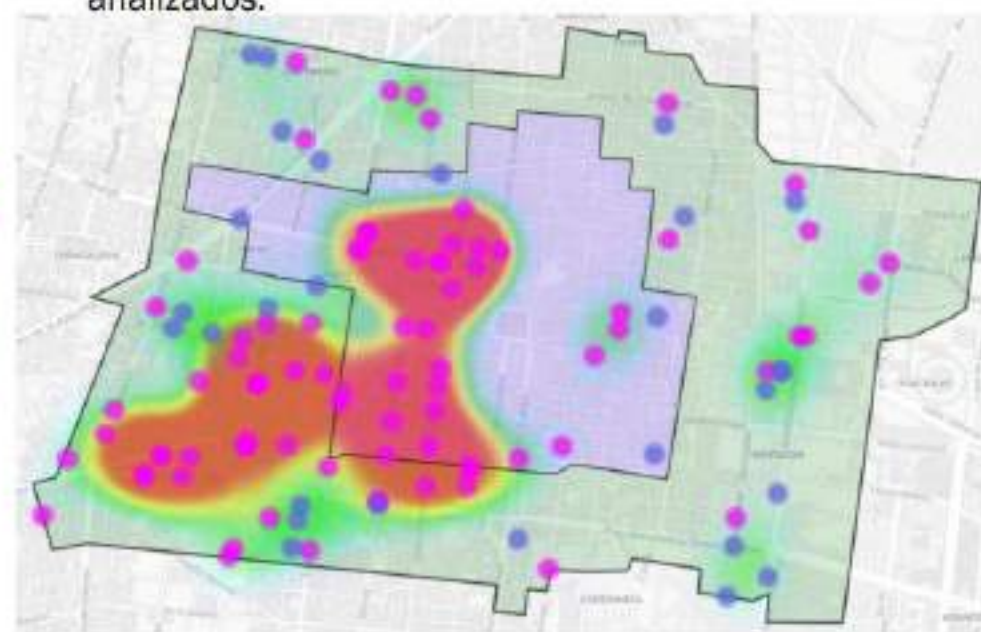

- Perímetro A
- Perímetro B
- Robo de cable o coladera
- Pinta de grafiti



Incidentes por pintas de grafiti y robo de cable y/o coladeras de C5, del 5 de diciembre de 2018 al 10 de noviembre de 2019.

II. DISTRIBUCIÓN DE INCIDENTES POR TIPO DE ENTRADA Y DÍA DE LA SEMANA

Incidentes C5

HORA	BOTÓN DE AUXILIO	CÁMARA	LLAMADA DEL 911	RADIO
00:00		5	5	
01:00	1	5	7	
02:00		4	17	1
03:00		5	8	
04:00		7	4	1
05:00		2	1	
06:00		1		
07:00		1	1	
08:00			1	
09:00				
10:00				
11:00		1	1	
12:00				
13:00		1	1	
14:00			1	
15:00			1	
16:00			4	
17:00			2	
18:00			1	
19:00		1		
20:00			4	
21:00	1		1	
22:00		1	4	1
23:00		3	4	
Total	2	37	68	3

Porcentaje de Incidentes

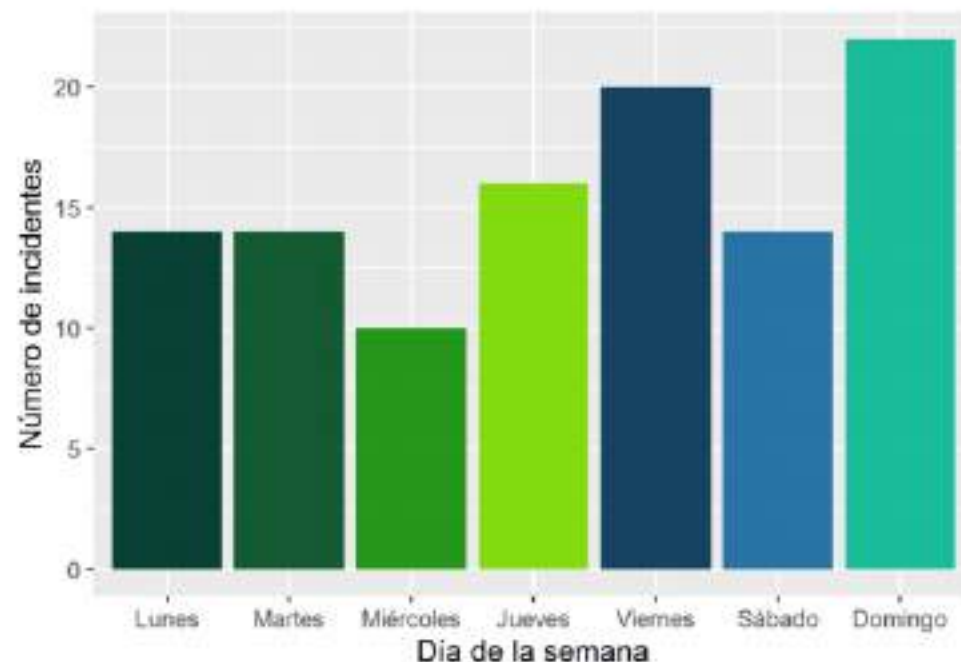

Los incidentes analizados fueron registrados con mayor frecuencia los días **viernes y domingo**.

El día **miércoles** muestra una menor frecuencia en comparación con el resto de los días.



SSC – SCT – DSOT (Tránsito)

Tema	Unidad de medida	Periodicidad	Del 30/10 al 10/11	Próximo reporte
Semáforos (162)	Número de semáforos con mantenimiento preventivo	Quincenal	51	26 de noviembre
	Número de semáforos con mantenimiento correctivo		104	
Cámaras (10)	Número de cámaras con mantenimiento preventivo		3	
	Número de cámaras con mantenimiento correctivo		4	



SSC-SCT-DSOT


CORRECTIVO

APAGADO	4
CABLE DE COMUNICACIÓN	2
CINTILANTE	38
CLOSTER DAÑADO	1
CORTO	7
DESAHOGO DE REGISTRO	1
DESCONECTADO	23
FALSO CONTACTO	2
FOCO FUNDIDO	10
INSTALACION	1
OBRA CIVIL	1
ORIENTA SEMAFORO	1
REINSTALACION	2
TARJETA DAÑADA	5
VISERA ROTA	6

PREVENTIVO

	51
Total general	155


MANTENIMIENTO

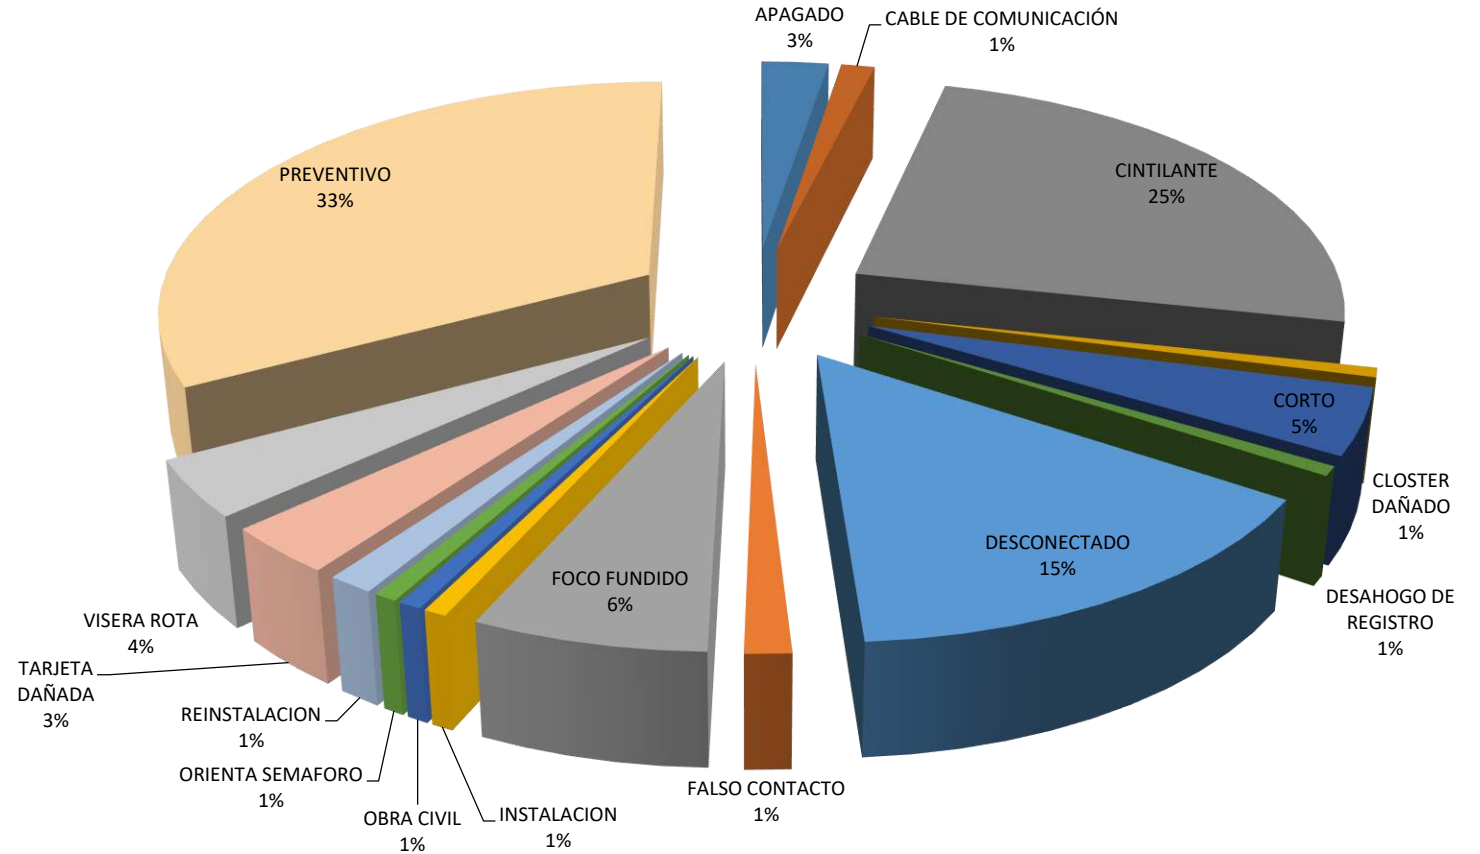

SSC-SCT-DSOT

MANTENIMIENTO DE CAMARAS TRANSITO

CORRECTIVOS	
CORTO	3
SISTEMA SPRIT	1
PREVENTIVOS	
	3
TOTAL	7

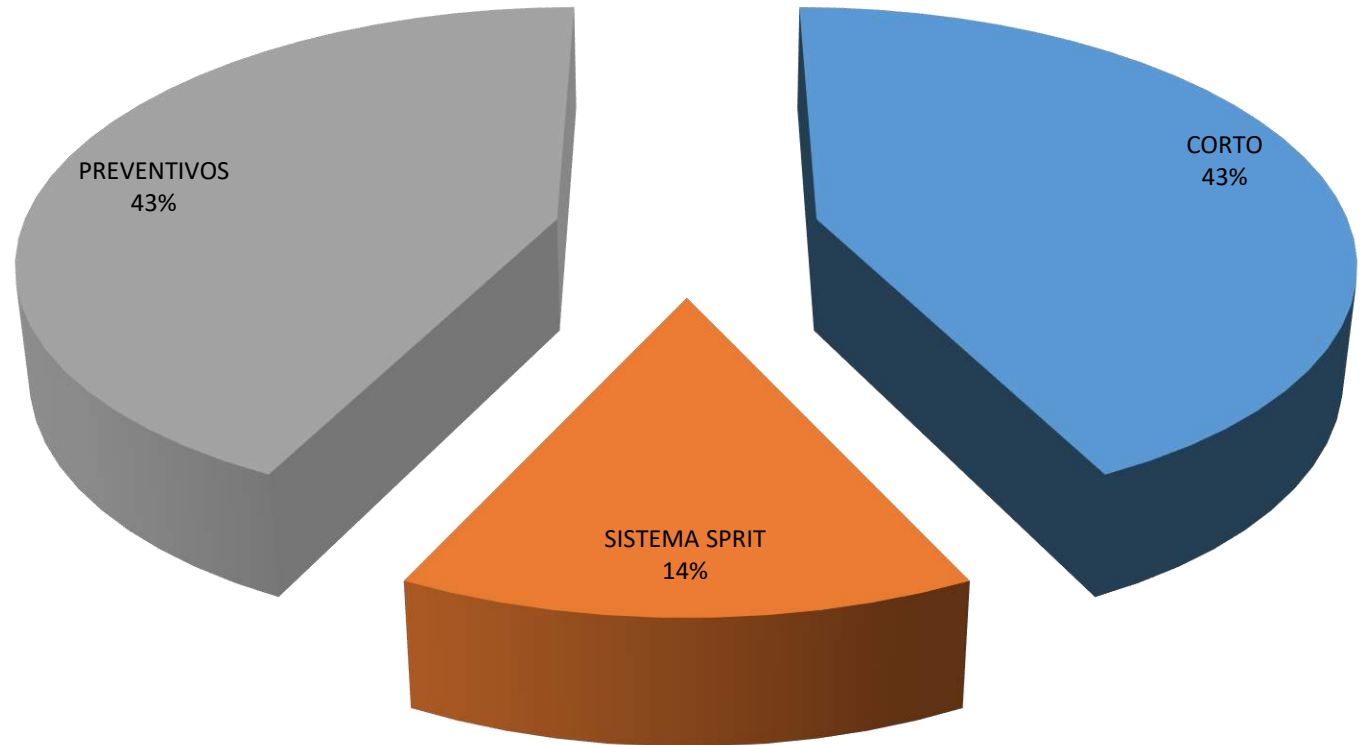



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
CULTURA
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Orden del día

Reportes

Turnos e incidencias urbanas

Mesas de trabajo

Asuntos generales

Acuerdos

Asistencia

Transmisión en vivo



Matriz de seguimiento a turnos compilado Enero - Noviembre



Dependencia	Atendido	Proceso	Pendiente	Total general
ACH	26	3		29
ADIP	1			1
Al. Cuauhtémoc	11	4	1	16
Al. Venustiano Carranza	5	1	1	7
C5	6	1		7
CFE	6		1	7
ILIFE	1			1
INAH	3			3
Metrobús	1			1
PGJ	3			3
SACMEX	8	1		9
SEDEMA	5	3		8
SEMOVI	1			1
SGIRPC	1			1
SOS-AP	4	1		5
SOS-DGOIV	5	1		6
SOS-DGSUS	2			2
SSC	8			8
STC-METRO	1			1
TELMEX	3			3
Tránsito	4			4
Total general	105	15	3	123



Turnos nuevos

Del 29 de octubre al 11 de noviembre



FECHA DE REPORTE	SOLICITANTE	SOLICITUD	ATIENDE	ESTATUS
04/11/2019	ACH	Refuerce iluminación provisional en zona de obra de la Antigua Merced	SOS-DGOIV	Proceso
05/11/2019	ACH	Sugiera la propuesta de un mercado que pueda recibir un contenedor de grasas como punto de recolección	Al. Venustiano Carranza	Pendiente
05/11/2019	ACH	Sugiera la propuesta de un mercado que pueda recibir un contenedor de grasas como punto de recolección	Al. Cuauhtémoc	Pendiente
05/11/2019	Al. Cuauhtémoc	Requieren opinión técnica de CFE respecto a reparación de mufa en Plaza de La Aguilita, para restablecer iluminación	CFE	Pendiente
08/11/2019	UNAM	El alumbrado público de San Ildefonso y Justo Sierra enciende a las 19:00 (horario anterior) se puede configurar para que encienda a las 17:30 cuando empieza a oscurecer. Además las pocas luminarias que encienden tiene una luz muy tenue; solicitan se revise la intensidad lumínica para definir si es posible que aumente	SOS-AP	Proceso



Turnos atendidos

Del 29 de octubre al 11 de noviembre



FECHA DE REPORTE	SOLICITANTE	SOLICITUD	ATIENDE	ESTATUS	FECHA DE ATENCIÓN	OBSERVACIONES
29/10/2019	ACH	Compartan calendarios de trabajo de sus obras y de atención permanente de la señalización y paso seguro de las zonas donde están en obras.	SOS-DGOIV	Atendido	11/11/2019	Se compartió vía chat en la zona de Santa María la Redonda. Para la Antigua Merced se actualizará el día 11 de noviembre
29/10/2019	ACH	Realizar reunión con vecinos de Santa María la Redonda, el miércoles a las 6:00 de la tarde.	SOS-DGOIV	Atendido	30/10/2019	Se llevó a cabo el miércoles 30 de octubre en La Nana
29/10/2019	ACH	Realizar reunión con vecinos de Santa María la Redonda, el miércoles a las 6:00 de la tarde.	SACMEX	Atendido	30/10/2019	Se llevó a cabo el miércoles 30 de octubre en La Nana



Turnos en proceso

Del 29 de octubre al 11 de noviembre



FECHA DE REPORTE	SOLICITANTE	SOLICITUD	ATIENDE	ESTATUS	OBSERVACIONES
29/10/2019	ACH	Compartan calendarios de trabajo de sus obras y de atención permanente de la señalización y paso seguro de las zonas donde están en obras.	SACMEX	Proceso	Se entregará el 11 de noviembre
29/10/2019	ACH	Reforestación en la calle de Victoria.	SEDEMA	Proceso	Informará sobre la diligencia el martes 12 de noviembre en la reunión de la Mesa de Infraestructura
29/10/2019	FCH	Retire árboles secos en la calle de República de Cuba en el tramo de República de Brasil a Eje Central Lázaro Cárdenas, particularmente el ubicado frente a la Antigua Escuela de Economía, Cuba 92.	SEDEMA	Proceso	Informará sobre la diligencia el martes 12 de noviembre en la reunión de la Mesa de Infraestructura
29/10/2019	SOS-AP	Gestione con Ordenamiento y SSC apoyo para que SOS realice trabajos en el Callejón Girón para reactivar alumbrado público	ACH	Proceso	Se realizará operativo para desmontar puestos de postes el día 12 de noviembre en compañía de SOS-AP y Secretaría de Gobierno a las 11:00 am
04/11/2019	ACH	Refuerce iluminación provisional en zona de obra de la Antigua Merced	SOS-DGOIV	Proceso	
08/11/2019	UNAM	El alumbrado público de San Ildefonso y Justo Sierra enciende a las 19:00 (horario anterior) se puede configurar para que encienda a las 17:30 cuando empieza a oscurecer. Además las pocas luminarias que encienden tiene una luz muy tenue; solicitan se revise la intensidad lumínica para definir si es posible que aumente	SOS-AP	Proceso	



Matriz de seguimiento a Incidencias del 01 de enero al 11 de noviembre



Dependencia	Atendido	Pendiente	Proceso	Total general
ACH	1188	22	2	1212
Al. Cuauhtémoc	23	28	2	53
Al. Venustiano Carranza	4			4
C-5	2	1		3
CFE	94	66	9	169
CIS		2		2
IUSACELL		2		2
MCM TELECOM		1		1
SACMEX	93	38	3	134
SEDEMA		1	2	3
SGIRyPC	1			1
SOS-AP	106	14		120
SOS-DGOIV	10	20		30
SOS-DGOP		1		1
SOS-DGSUS		6		6
STC-METRO	3			3
TELMEX	47	5	2	54
TOTAL PLAY			1	1
Tránsito	29	1		30
Total general	1600	208	21	1829



Atención VIPPSC



VIPP 2. PLAZA DE LA CONCEPCIÓN CALLEJÓN DEL 57

Peticiones atendidas vía chat del 29 de octubre al 11 de noviembre



TOTAL	TEMA	UBICACIÓN	CALLE	Y CALLE	ATENDIÓ
1	Reparación de suministro de energía eléctrica	República de Perú	Eje Central	Allende	CFE
1	Reposición de tapa de registro	República de Perú		Allende	TELMEX



VIPP 3. SANTO DOMINGO

Peticiones atendidas vía chat del 29 de octubre al 11 de noviembre



TOTAL	TEMA	UBICACIÓN	CALLE	Y CALLE	ATENDIÓ
4	Reparación de alumbrado público	San Ildefonso	República de Argentina	Del Carmen	SOS-AP
		San Ildefonso	República de Argentina	Del Carmen	
		Palma	Donceles	Belisario Domínguez	
		Donceles	República de Chile	República de Brasil	
1	Reposición de tapa de registro	Donceles		República de Chile	TELMEX



VIPP 4. ALAMEDA SECTOR FINANCIERO

Peticiones atendidas vía chat del 29 de octubre al 11 de noviembre



TOTAL	TEMA	UBICACIÓN	CALLE	Y CALLE	ATENDIÓ
1	Reparación de semáforo	5 de mayo	Bolívar		Tránsito
1	Reparación de alumbrado público	Allende	Tacuba	Donceles	SOS-AP



Atención VIPPSC



VIPP 5. ZÓCALO

Peticiones atendidas vía chat del 29 de octubre al 11 de noviembre



TOTAL	TEMA	UBICACIÓN	CALLE	Y CALLE	ATENDIÓ
6	Reparación de alumbrado público	República de Uruguay	20 de noviembre		SOS-AP
		Francisco I. Madero	Palma	Isabel la católica	
		Moneda	Correo mayor	Seminario	
		Correo mayor	Moneda	Corregidora	
		Moneda			
		San Ildefonso	República de Argentina	Del Carmen	
1	Reparación de semáforo	Isabel la católica		República de Uruguay	Tránsito
1	Reparación de bache	Pino Suárez		20 de noviembre	SOS-DGOIV



Atención VIPPSC



VIPP 6. ANTIGUA MERCED MIXCALCO

Peticiones atendidas vía chat del 29 de octubre al 11 de noviembre



TOTAL	TEMA	UBICACIÓN	CALLE	Y CALLE	ATENDIÓ
2	Reparación de alumbrado público	Corregidora	Correo Mayor	Jesús María	SOS-AP
		Las cruces	Venustiano Carranza	Regina	
1	Reparación de semáforo	Jesús María		Venustiano Carranza	Tránsito
1	Reposición de tapa de registro	Ex-convento de Jesús María			CFE




Atención VIPPSC



VIPP 8. SAN PABLO

Peticiones atendidas vía chat del 29 de octubre al 11 de noviembre

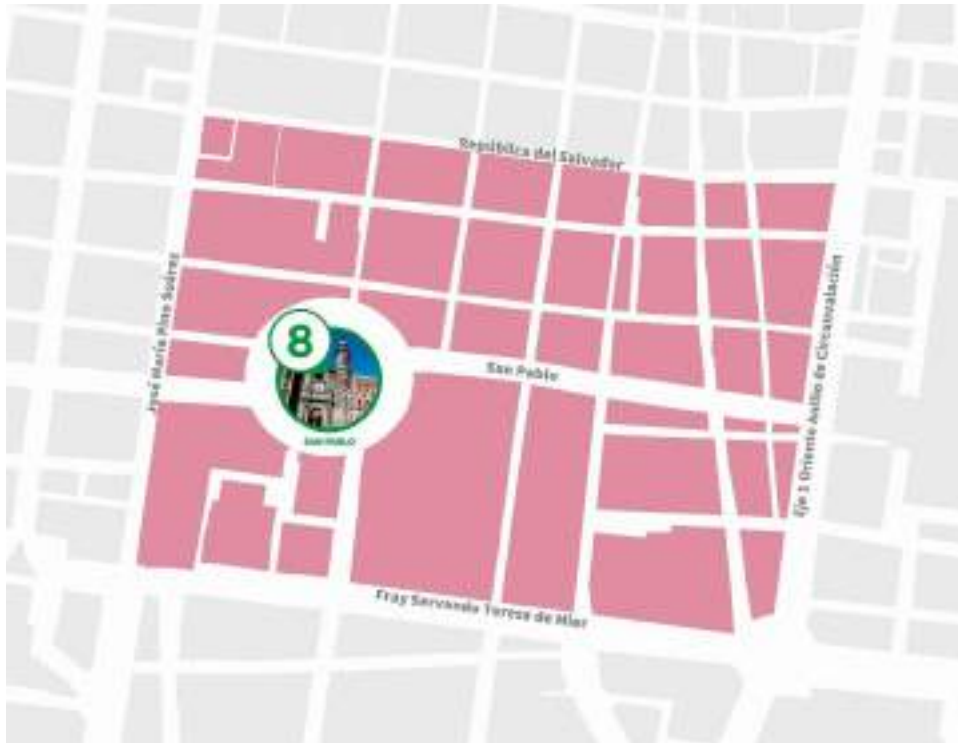

TOTAL	TEMA	UBICACIÓN	CALLE	Y CALLE	ATENDIÓ
1	Reparación de alumbrado público	Topacio	San Pablo	Fray Servando Teresa de Mier	Al. Cuauhtémoc



INCIDENCIAS ATENDIDAS

Del 29 de octubre al 11 de noviembre



FECHA DE REPORTE	IDENTIFICA	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	V CALLE	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATENDE	ESTATUS
30/10/2019	SEDEMA	Falla en suministro de energía eléctrica	TLAXCOAQUE			No.8			CPE	Atendido
30/10/2019	VIPP 5 Zocalo	Falla en alumbrado público	REPÚBLICA DE URUGUAY	20 DE NOVIEMBRE		ESQUINA			SOS-AD	Atendido
30/10/2019	VIPP 3 Santo Domingo	Falta tapa de registro	DONCELES	REPÚBLICA DE CHILE		Esquina			TELMEX	Atendido
31/10/2019	VIPP 6 Antigua Merced Mixcalco	Falta tapa de registro	JESÚS MARÍA			Trente al M 49			CPE	Atendido
31/10/2019	VIPP 2 Callejón del 57 Plaza de la Concepción	Falla en suministro de energía eléctrica	REPÚBLICA DE PERÚ	EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	ALLENDE				CPE	Atendido



INCIDENCIAS ATENDIDAS

Del 29 de octubre al 11 de noviembre



FECHA DE REPORTE	IDENTIFICA	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS
31/10/2019	ACH	Falla en alumbrado público	5 DE FEBRERO	VENUSTIANO CARRANZA	REPÚBLICA DEL SALVADOR				SOS-AP	Atendido
01/11/2019	VIPP 4 Alameda Sector Financiero	Mantenimiento de semáforo peatonal roto	5 DE MAYO	BOLIVAR		Esquina			Tránsito	Atendido



INCIDENCIAS ATENDIDAS

Del 29 de octubre al 11 de noviembre







FECHA DE REPORTE	IDENTIFICA	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS
02/11/2019	VIPP 5 Zocalo	Semáforo descompuesto	ISABEL LA CATÓLICA		REPUBLICA DE URUGUAY	ESQUINA			Tránsito	Atendido
02/11/2019	ACH	Retro de caseta telefónica	BOLIVAR		MESONES	Esquina			TELMEX	Atendido
03/11/2019	ACH	Caja de Telmex abierta	DONCELES			Frente al No. 75			TELMEX	Atendido



INCIDENCIAS ATENDIDAS

Del 29 de octubre al 11 de noviembre



FECHA DE REPORTE	IDENTIFICA	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS
03/11/2019	VIPP 3 Zocalo	Falla en alumbrado público	FRANCISCO I. MADERO	PALMA	ISABEL LA CATÓLICA				SOS-AP	Atendido
04/11/2018	ACH	Falla en alumbrado público	REPÚBLICA DE ARGENTINA	DONCELES	REPÚBLICA DE GUATEMALA				SOS-AP	Atendido



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



INCIDENCIAS ATENDIDAS

Del 29 de octubre al 11 de noviembre



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

FECHA DE REPORTE	IDENTIFICA	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS
04/11/2019	FCH	Falla en alumbrado público	REPÚBLICA DE BRASIL	REPÚBLICA DE HONDURAS	EJE 1 NORTE				SOS-AP	Atendido
05/11/2019	VIPP 8 San Pablo	Falla en alumbrado público	TOPACIO	SAN PABLO	FRAY SERVANDO TERESA DE MIER				AJ. Cuauhtémoc	Atendido
06/11/2019	FCH	Recolección de cascado	REPÚBLICA DE PERÚ		REPÚBLICA DE BRASIL	ESQUINA			ACH	Atendido



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



INCIDENCIAS ATENDIDAS

Del 29 de octubre al 11 de noviembre



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

FECHA DE REPORTE	IDENTIFICACION	SOLICITUD	UBICACION	ENTRE CALLE	Y CALLE	REFERENCIA	FOTOGRAFIA ANTES	FOTOGRAFIA DESPUES	ATIENDE	ESTATUS
06/11/2019	VIPP 5 Zocalo	Falla en alumbrado público	HONEDA	CORREO MAYOR	SEMINARIO				SOS-AP	Atendido
06/11/2019	VIPP 5 Zocalo	Falla en alumbrado público	CORREO MAYOR	HONEDA	CORREGIO CRA				SOS-AP	Atendido
06/11/2019	VIPP 5 Zocalo	Falla en alumbrado público	HONEDA						SOS-AP	Atendido



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO





SECRETARÍA DE
CULTURA
CENTRO HISTÓRICO

INCIDENCIAS ATENDIDAS

Del 29 de octubre al 11 de noviembre



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

FECHA DE REPORTE	IDENTIFICACION	SOLICITUD	UBICACION	ENTRE CALLE	Y CALLE	REFERENCIA	FOTOGRAFIA ANTES	FOTOGRAFIA DESPUES	ATIENDE	ESTATUS
07/11/2018	VIPP 3 Santo Domingo	Falta en alumbrado público	SAN ILDEFONSO						SOS-AP	Atendido
07/11/2018	VIPP 6 Antigua Merced Miscalco	Falta en alumbrado público	CORREGIDORA	CORREO MAYOR	JESUS MARIA				SOS-AP	Atendido
08/11/2018	VIPP 6 Antigua Merced Miscalco	Falta de semáforo	JESUS MARIA		VENUSTIANO CARRANZA	Esquina			Tránsito	Atendido



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO







INCIDENCIAS ATENDIDAS

Del 29 de octubre al 11 de noviembre



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS





FECHA DE REPORTE	IDENTIFICA	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS
08/11/2018	VIPP 5 Zocalo	Reparación de bache	PINO SUÁREZ		20 DE NOVIEMBRE	Esquina			SOS-DGOIV	Atendido
08/11/2018	VIPP 2 Callejón del 57 Plaza de la Concepción	Tapa de registro rota	REPÚBLICA DE PERÚ		ALLENDE	ESQUINA			TELMEX	Atendido



INCIDENCIAS ATENDIDAS

Del 29 de octubre al 11 de noviembre



FECHA DE REPORTE	IDENTIFICACION	SOLICITUD	UBICACION	ENTRE CALLE	Y CALLE	REFERENCIA	FOTOGRAFIA ANTES	FOTOGRAFIA DESPUES	ATIENDE	ESTATUS
08/11/2019	ACH	Falla en alumbrado público	PLAZA DE LA CONSTITUCION			FRENTE A CATEDRAL			SOS-AP	Atendido
08/11/2019	VISO 4 Alameda Sector Financiero	Falla en alumbrado público	ALLENDE	TACUBA	DONCELES				SOS-AP	Atendido



INCIDENCIAS ATENDIDAS

Del 29 de octubre al 11 de noviembre







FECHA DE REPORTE	IDENTIFICACION	SOLICITUD	UBICACION	ENTRE CALLE	Y CALLE	REFERENCIA	FOTOGRAFIA ANTES	FOTOGRAFIA DESPUES	ATIENDE	ESTATUS
08/11/2019	VIPP 3 Santa Domingo	Falla en alumbrado público	SAN ILDEFONSO						SOS-AP	Atendido
08/11/2019	VIPP 6 Antigua Merced Mixcalco	Falla en alumbrado público	LAS CRUCES	VENUSTIANO CARRANZA	REGINA				SOS-AP	Atendido



INCIDENCIAS ATENDIDAS

Del 29 de octubre al 11 de noviembre



FECHA DE REPORTE	IDENTIFICA	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS
10/11/2018	VIPP 3 Santo Domingo	Falla en alumbrado público	PALMA	DONCELES	BELISARIO DOMINGUEZ				SOS-AP	Atendido
10/11/2018	VIPP 3 Santo Domingo	Falla en alumbrado público	DONCELES	REPÚBLICA DE CHILE	REPÚBLICA DE BRASIL				SOS-AP	Atendido



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



INCIDENCIAS ATENDIDAS

Del 29 de octubre al 11 de noviembre



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

FECHA DE REPORTE	IDENTIFICA	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS
11/11/2019	VIPP 5 Zocalo	Falla en alumbrado público	SAN ILDEFONSO	REPÚBLICA DE ARGENTINA	DEL CARMEN				SOS-AP	Atendido



INCIDENCIAS PENDIENTES

Del 29 de octubre al 11 de noviembre



FECHA DE REPORTE	IDENTIFICA	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS
29/10/2019	VIPP 6 Antigua Merced Mexcalco	Tapa de registro dañada	CORREO MAYOR		SOLEDAD	ESQUINA			CFE	Pendiente
31/10/2019	Al Cuauhtémoc	Banqueta en mal estado	INCAS	REPÚBLICA DE PERÚ	REPÚBLICA DE HONDURAS	FRENTE AL # 10			CFE	Pendiente
31/10/2019	VIPP 3 Santo Domingo	Falta tapa de registro	REPÚBLICA DE PERÚ	ALTUNA	LEÓNORO VALLE	No 81 a un costado de la arena cobeco			CFE	Pendiente
31/10/2019	VIPP 3 Santo Domingo	Falla en suministro de energía eléctrica	REPÚBLICA DE VENEZUELA	RODRÍGUEZ PUEBLA	DEL CARMEN	TEATRO DEL PUEBLO			CFE	Pendiente
01/11/2019	VIPP 5 Zocalo	Suministro de agua potable	REPÚBLICA DE GUATEMALA	REPÚBLICA DE BRASIL	REPÚBLICA DE ARGENTINA	No. 30			SACMEX	Pendiente



INCIDENCIAS PENDIENTES

Del 29 de octubre al 11 de noviembre





FECHA DE REPORTE	IDENTIFICA	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS
01/11/2018	VIPP 5 Anábula Merced Mixcalco	Tapas de bóveda en mal estado	JESUS MARIA	SOLEDAD		CASI ESQUINA			CPE	Pendiente
02/11/2018	AGH	Desazolve	6 DE FEBRERO		REPÚBLICA DE URUGUAY				SACMEX	Pendiente
03/11/2018	AGH	Tapa de registro levantada	REPÚBLICA DE BRASIL		REPÚBLICA DE CUBA	Esquina			CPE	Pendiente



INCIDENCIAS PENDIENTES

Del 29 de octubre al 11 de noviembre



FECHA DE REPORTE	IDENTIFICA	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS
03/11/2019	VJPP 3 Santo Domingo	Acometida con cables expuestos	REPÚBLICA DE BRASIL		REPÚBLICA DE CUBA	Cas/esquina República de Brasil No.24			CFE	Pendiente
04/11/2019	ACH	Daño en poste de alumbrado público	REPÚBLICA DE BRASIL		BELISARIO ODOMINGUEZ	Casi esquina			Al. Cuauhtémoc	Pendiente



INCIDENCIAS PENDIENTES

Del 29 de octubre al 11 de noviembre



FECHA DE REPORTE	IDENTIFICA	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS
04/11/2019	VIPP 1 Santa María la Redonda	060020 00 0020 00 YKFA	VALERIO TRUJANO	PASO DE LA REFORMA	AV. HIDALGO	Frente a caseta de Trolebús			SACMEX	Pendiente
04/11/2019	VIPP 8 San Pablo	Falla en alumbrado público	PLAZA LA AGUILITA	MESONES	REGINA				Al. Cuauhtémoc	Pendiente
05/11/2019	VIPP 2 Santo Domingo	Fuga de agua	EJE 1 NORTE		REPUBLICA DE ARGENTINA	Esquina			SACMEX	Pendiente
05/11/2019	VIPP 5 Arroyo Mercedes Mexico	Desdove	EJE 1 ORIENTE (ANILLO DE CIRCUNVALACIÓN)	SAN ANTONIO TOMATLAN	MIXCALCO				SACMEX	Pendiente



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO






INCIDENCIAS PENDIENTES

Del 29 de octubre al 11 de noviembre



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

FECHA DE REPORTE	IDENTIFICA	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS
05/11/2018	VIPP 7 Vizcainas Corredor Cultural Regina	Coladera rota	MESONES	ISABEL LA CATÓLICA	BOLIVAR				SACHEX	Pendiente
05/11/2018	ACH	Retiro de caseta telefónica	5 DE FEBRERO	16 DE SEPTIEMBRE	VENUSTIANO CARRANZA	FRENTE A PALACIO DE HIERRO			TELMEX	Pendiente
06/11/2018	VIPP 2 Santo Domingo	Falta de tapa de registro	PALMA		REPÚBLICA DE CUBA	ESQUINA			CFE	Pendiente



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



INCIDENCIAS PENDIENTES

Del 29 de octubre al 11 de noviembre



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

FECHA DE REPORTE	IDENTIFICACION	SOLICITUD	UBICACION	ENTRE CALLE	Y CALLE	REFERENCIA	FOTOGRAFIA ANTES	FOTOGRAFIA DESPUES	ATIENDE	ESTATUS
06/11/2019	VIPP 4 Alameda Sector Financiero	Falta en alumbrado público	FRAY PEDRO DE GANTE	MADERO	16 DE SEPTIEMBRE				SOS-AP	Pendiente
07/11/2019	ACH	Retiro de caseta telefónica	ISABEL LA CATÓLICA	TACUBA	5 DE MAYO				TELMEX	Pendiente
07/11/2019	VIPP 3 Santo Domingo	Falta en alumbrado público	REPÚBLICA DE CHILE	REPÚBLICA DE PERÚ	REPÚBLICA DE HONDURAS				SOS-AP	Pendiente
07/11/2019	VIPP 3 Santo Domingo	Falta en alumbrado público	COMONFORT	REPÚBLICA DE HONDURAS	REPÚBLICA DE PARAGUAY				SOS-AP	Pendiente



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



INCIDENCIAS PENDIENTES

Del 29 de octubre al 11 de noviembre



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS


FECHA DE REPORTE	IDENTIFICA	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS
09/11/2018	VIPP 2 Callejón del 57 Plaza de la Concepción	Recolocar tapa de registro	ALLENDE		REPÚBLICA DE ECUADOR	Esquina			CFE	Pendiente
09/11/2018	VIPP 8 San Pablo	Falla en alumbrado público	PLAZA SAN LUCAS	JOSÉ MARÍA IZAZAGA	FRAY SERVANDO TERESA DE NIER				Al Cuarentémor	Pendiente
10/8/2018	ACH	Retiro de caseta telefónica	FRANCISCO I. MADERO	BOLÍVAR	MOTOLINÍA				TELMEX	Pendiente



INCIDENCIAS PENDIENTES

Del 29 de octubre al 11 de noviembre



FECHA DE REPORTE	IDENTIFICACION	SOLICITUD	UBICACION	ENTRE CALLE	Y CALLE	REFERENCIA	FOTOGRAFIA ANTES	FOTOGRAFIA DESPUES	ATIENDE	ESTATUS
10/11/2019	ACH	Reparación de banqueta.	PALMA	16 DE SEPTIEMBRE	FRANCISCO I. MADERO				CFE	Pendiente
11/11/2019	ACH	Tapa de registro en mal estado	REPÚBLICA DE CUBA	CALLEJÓN DEL 57	ALLENDE				CFE	Pendiente



Orden del día

Reportes

Turnos e incidencias urbanas

Mesas de trabajo

Asuntos generales

Acuerdos

Asistencia

Corte de transmisión



Mesa de Gestión Integral de Grasas, Aceites y Residuos Sólidos

- El martes 5 de noviembre SEDEMA, Alcaldía Cuauhtemoc, SACMEX, SEDECO y ACH, en colaboración con los representantes del Mercado 2 de abril y REOIL internacional, empresa recolectora certificada por SEDEMA realizaron el lanzamiento del Programa Piloto de Recolección Domiciliaria de Residuos Grasos de origen vegetal y/o animal en el Mercado 2 de Abril.
- Se contó con la asistencia de locatarios del mercado 2 de abril, vecinos de Santa María La Redonda y Medios de Comunicación.

- La prueba tendrá una duración de 8 semanas
- La empresa Reoil Internacional recolectará cada viernes la grasa y reportará a SEDEMA con copia a Alcaldía Cuauhtémoc, SEDECO, SACMEX y ACH

Próxima reunión propuesta jueves 14 a las 10:00 hrs



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
CULTURA
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Mesa de Gestión Integral de Grasas, Aceites y Residuos Sólidos



Mesa de Gestión Integral de Grasas, Aceites y Residuos Sólidos





Orden del día

Reportes

Turnos e incidencias urbanas

Mesas de trabajo

Asuntos generales

Acuerdos

Asistencia

Corte de transmisión



Orden del día

Reportes

Turnos e incidencias urbanas

Mesas de trabajo

Asuntos generales

Acuerdos

Asistencia

Corte de transmisión



Orden del día

Reportes

Turnos e incidencias urbanas

Mesas de trabajo

Asuntos generales

Acuerdos

Asistencia

Corte de transmisión



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
CULTURA
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

PRÓXIMA SESIÓN

Martes 26 de noviembre

A las 10:30 horas
