



UNIVERSIDAD DE LEÓN  
CENTRO  
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

# Mesa de Infraestructura y Obras

Inicio de la transmisión en vivo  
14 de enero de 2020

CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS

"2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"



UNIVERSIDAD DE LEÓN  
CENTRO  
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

## Orden del día

Reportes

Turnos e incidencias urbanas

Mesas de trabajo

Asuntos generales

Acuerdos

Asistencia

**\*Transmisión en vivo\***

CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS

"2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"



### Sesión de evaluación mensual



### Asistencia dependencias quincenal

- ACH
- ADIP
- AI. CUAUHTÉMOC
- AI. V. CARRANZA
- C5
- CFE
- FCH
- INAH
- SEDECO
- SGIRyPC
- SEDEMA
- SOS-DGSUS
- SOS-DGOIV
- TRÁNSITO
- SACMEX
- TELMEX



### Asistencia dependencias mensual

- FGJ
- INVI
- ILIFE
- PROSOC
- INBAL
- METROBÚS
- SECRETARÍA DE CULTURA
- SEDUVI
- SEMOVI
- STC-METRO
- COMISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN
- CIUDAD SOLAR

**26 Mesas de trabajo**

**12 Evaluaciones mensuales**

Enero

D	L	M	X	J	V	S
29	30	31	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8

Febrero

D	L	M	X	J	V	S
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
1	2	3	4	5	6	7

Marzo

D	L	M	X	J	V	S
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11

Abril

D	L	M	X	J	V	S
29	30	31	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	1	2
3	4	5	6	7	8	9

Mayo

D	L	M	X	J	V	S
26	27	28	29	30	1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31	1	2	3	4	5	6

Junio

D	L	M	X	J	V	S
31	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11

Julio

D	L	M	X	J	V	S
28	29	30	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8

Agosto

D	L	M	X	J	V	S
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31	1	2	3	4	5

Septiembre

D	L	M	X	J	V	S
30	31	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

Octubre

D	L	M	X	J	V	S
27	28	29	30	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7

Noviembre

D	L	M	X	J	V	S
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12

Diciembre

D	L	M	X	J	V	S
29	30	31	1	2	3	4
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31	1	2
3	4	5	6	7	8	9

**42**  
Indicadores  
activos  
en 2019



**49**  
Indicadores  
propuestos  
para 2020

**25**  
Instancias  
asistentes



.....→  
incorporación



COMISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

## Agencia Digital de Innovación Pública

### Indicadores 2019

- Número de puntos de conexión wifi habilitados en postes de C5 (línea base de 561).
- \*Periodicidad quincenal**

continúa  
.....→

**7**  
**Indicadores propuestos**

### Indicadores 2020

- Porcentaje de avance del programa de aprovechamiento del subsuelo de la CDMX **(feb)**
- \*Periodicidad quincenal**
- Porcentaje de avance del programa de despliegue de infraestructura de telecomunicaciones **(mzo)**
- \*Periodicidad quincenal**
- Porcentaje de avance del programa de retiro de infraestructura aérea de telecomunicaciones **(mzo)**
- \*Periodicidad quincenal**

- Porcentaje de avance del programa de incremento de velocidad a 100 Mbps en puntos WiFi gratuitos **(abr)**
- \*Periodicidad quincenal**
- Porcentaje de avance del programa de despliegue de infraestructura de Red LAN en espacios públicos **(jun)**
- \*Periodicidad quincenal**
- Número de puntos de conexión Wi-Fi de 20 Mbps habilitados **(jun)**
- \*Periodicidad quincenal**
- Número de tótems de conectividad habilitados **(nov)**
- \*Periodicidad quincenal**

**Asistencia a la mesa: Quincenal**

# Alcaldía Cuauhtémoc

continúa



# 3

## Indicadores propuestos



### Indicadores 2019

- Número de luminarias reparadas en vías secundarias  
**\*Periodicidad quincenal**
- Número de sujetos forestales podados en vías secundarias y/o plazas  
**\*Periodicidad quincenal**
- Número de acciones de bacheo en vías secundarias  
**\*Periodicidad quincenal**
- Número de metros cúbicos recolectados de residuos sólidos  
**\*Periodicidad quincenal**

- Número de metros lineales de la red de drenaje desazolvados  
**\*Periodicidad quincenal**
- Número de rejillas de piso desazolvadas  
**\*Periodicidad quincenal**
- Número de coladeras en banqueta desazolvadas  
**\*Periodicidad quincenal**

### Indicadores 2020

- Número de trámites de solicitud de autorización de obra  
**\*Periodicidad mensual**
- Número de autorizaciones de obra emitidas  
**\*Periodicidad mensual**
- Número de acciones de mantenimiento a mercados  
**\*Periodicidad quincenal**

**Asistencia a la mesa: Quincenal**

## Alcaldía Venustiano Carranza

### Indicadores 2019

- Número de luminarias reparadas en vías secundarias
- \*Periodicidad quincenal**
- Número de sujetos forestales podados en vías secundarias y/o plazas
- \*Periodicidad quincenal**
- Número de acciones de bacheo en vías secundarias
- \*Periodicidad quincenal**
- Número de metros cúbicos recolectados de residuos sólidos
- \*Periodicidad quincenal**

- Número de metros lineales de la red de drenaje desazolvados
- \*Periodicidad quincenal**
- Número de rejillas de piso desazolvadas
- \*Periodicidad quincenal**
- Número de coladeras en banqueta desazolvadas
- \*Periodicidad quincenal**

continúa



3

**Indicadores  
propuestos**




### Indicadores 2020

- Número de trámites de solicitud de autorización de obra
- \*Periodicidad mensual**
- Número de autorizaciones de obra emitidas
- \*Periodicidad mensual**
- Número de acciones de mantenimiento a mercados
- \*Periodicidad quincenal**

**Asistencia a la mesa: Quincenal**


## Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C-5)



**Asistencia a la mesa: Quincenal**



## Comisión Federal de Electricidad (CFE)

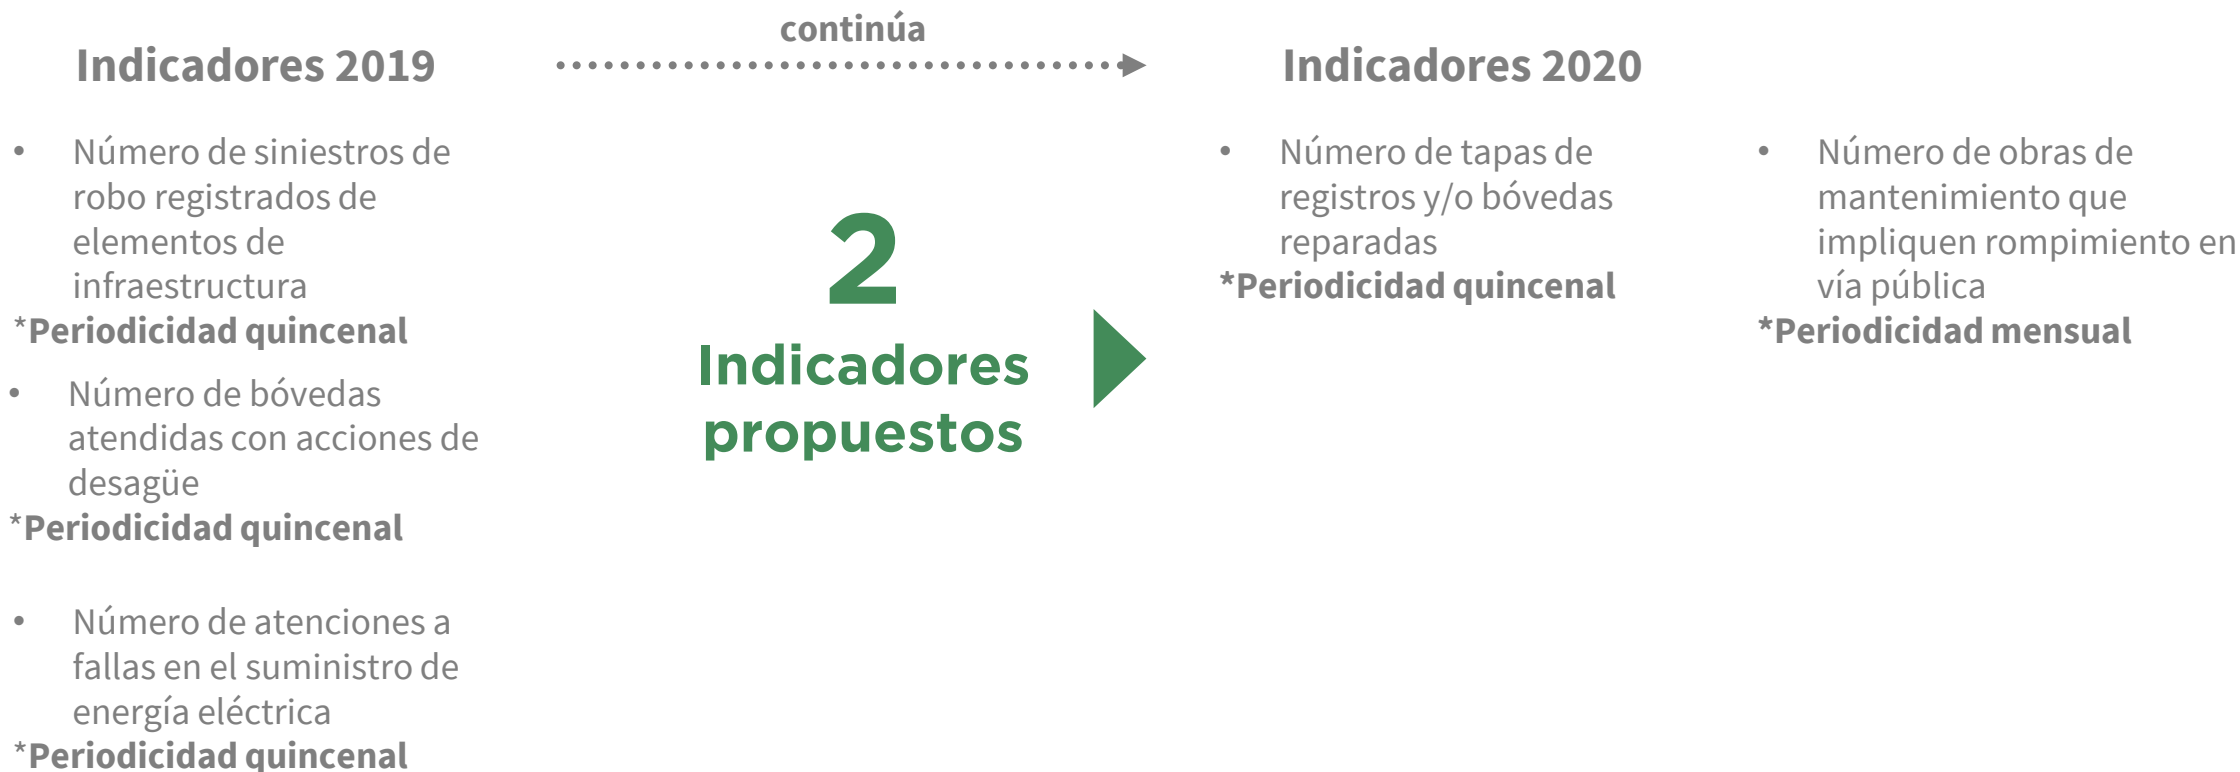

**Asistencia a la mesa: Quincenal**

## Fideicomiso Centro Histórico (FCH)

Indicadores 2019



3

Indicadores  
propuestos



Indicadores 2020

- Porcentaje de avance del programa de arreglo de fachadas

**\*Periodicidad quincenal**

- Número de cortinas intervenidas con arte urbano

**\*Periodicidad quincenal**

- Porcentaje de avance de obra en inmuebles

**\*Periodicidad quincenal**

Asistencia a la mesa: Quincenal

## Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ)

Indicadores 2019



Indicadores 2020

**2**  
**Indicadores  
propuestos**




- Número de denuncias recibidas por robo a elementos de la infraestructura urbana
- \*Periodicidad quincenal**

- Número de denuncias recibidas por robo y/o daño a esculturas
- \*Periodicidad quincenal**


**Asistencia a la mesa: Mensual**

## Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (INVI)




**Asistencia a la mesa: Mensual**

## Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa de la Ciudad de México (ILIFE)



**Asistencia a la mesa: Mensual**

## Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH)

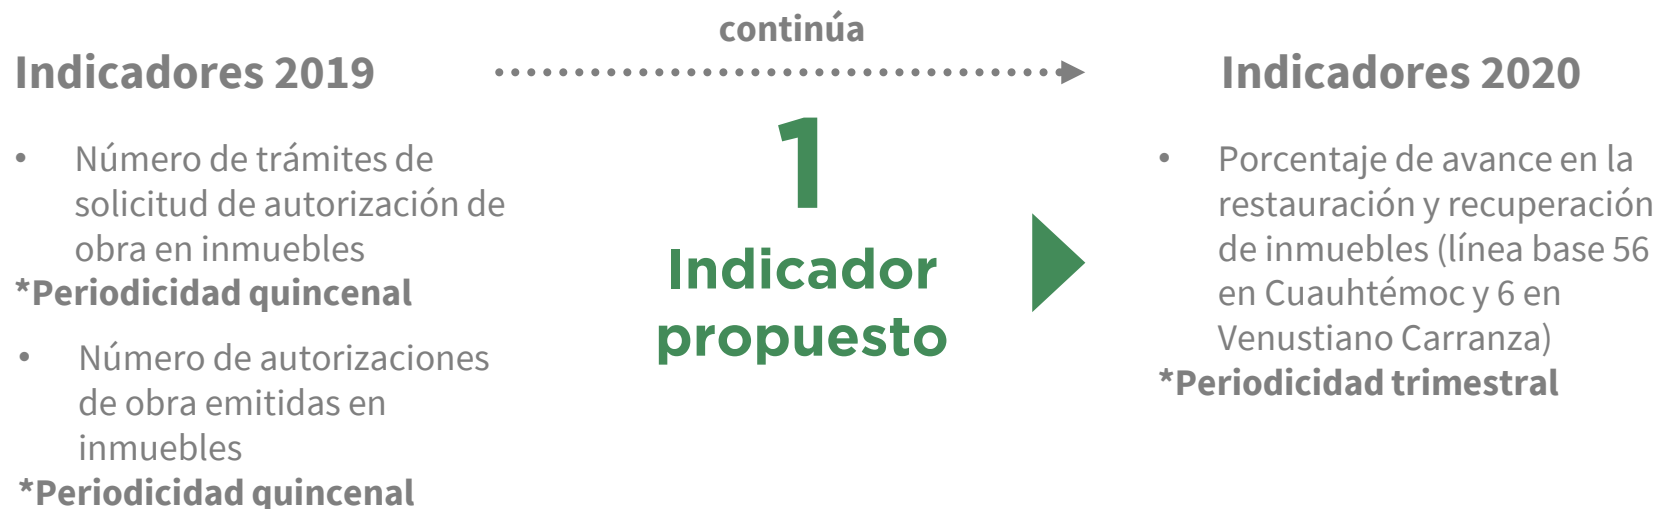

**Asistencia a la mesa: Quincenal**

## Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL)

### Indicadores 2019

- Número de solicitudes ingresadas para intervenciones diversas en inmuebles ubicados en el Centro Histórico
- \*Periodicidad mensual**



2

**Indicadores  
propuestos**



### Indicadores 2020

- Número de trámites de solicitud de autorización de obra en inmuebles
- \*Periodicidad mensual**
- Número de autorizaciones de obra emitidas en inmuebles
- \*Periodicidad mensual**

**Asistencia a la mesa: Quincenal**

## Metrobús

Indicadores 2019



Indicadores 2020

1  
Indicador  
propuesto



- Porcentaje de avance en acciones de mantenimiento a estaciones (Línea 3, 4, 5 y 7)
- \***Periodicidad trimestral**

**Asistencia a la mesa: Mensual**



## Procuraduría Social (PROSOC)

continúa

### Indicadores 2019

- Porcentaje de avance de rescate de unidades habitacionales (línea base: 62 )

**\*Periodicidad mensual**

### Indicadores 2020

- Porcentaje de avance de rescate de unidades habitacionales (línea base: por definir )

**\*Periodicidad mensual**

**Asistencia a la mesa: Mensual**

## Secretaría de Cultura

Indicadores 2019



2

Indicadores  
propuestos




Indicadores 2020

- Porcentaje de avance de obra de restauración de inmuebles del PNR  
**\*Periodicidad mensual**
- Número de acciones de conservación y mantenimiento de inmuebles  
**\*Periodicidad mensual**

Asistencia a la mesa: Mensual

## Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO)

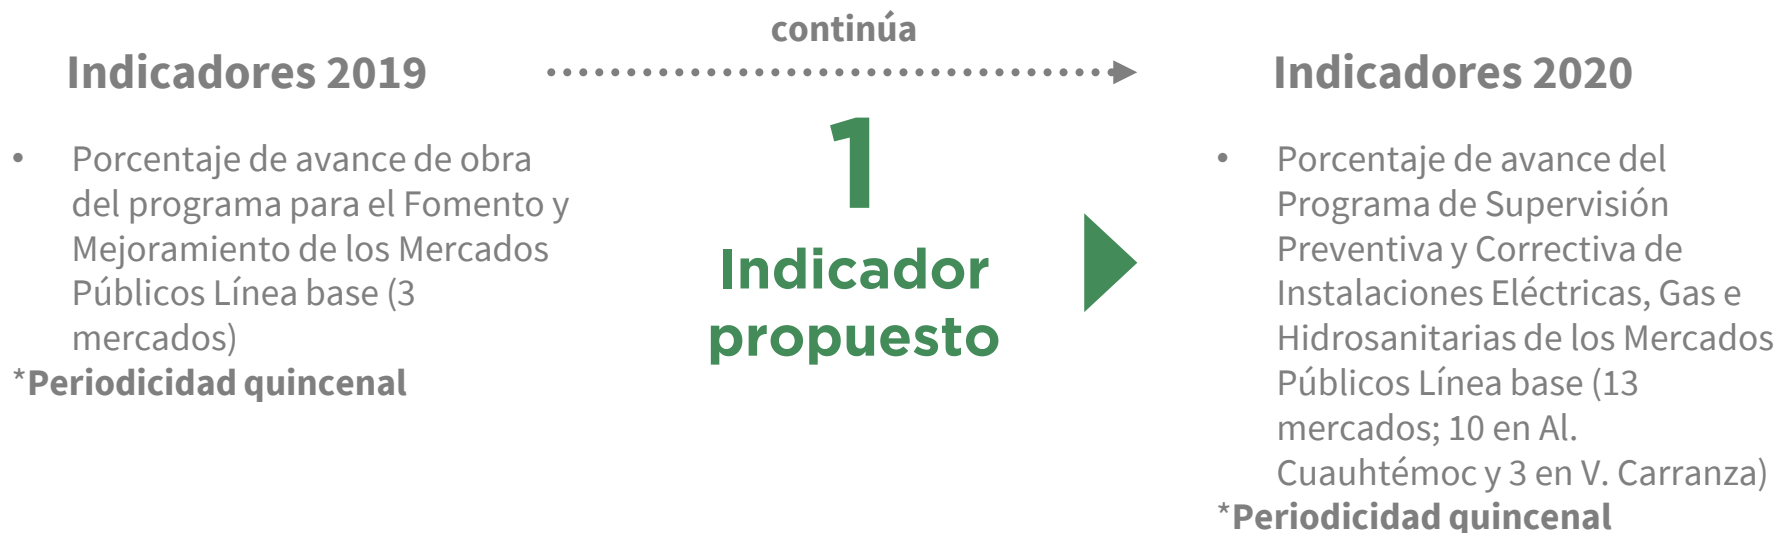

**Asistencia a la mesa: Quincenal**

## Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI)

Indicadores 2019



Indicadores 2020

2

Indicadores  
propuestos



- Número de trámites de solicitud de autorización de obra en inmuebles  
**\*Periodicidad mensual**
- Número de autorizaciones de obra emitidas en inmuebles  
**\*Periodicidad mensual**

**Asistencia a la mesa: Mensual**

## Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRYPC)

Indicadores 2019



Indicadores 2020

**1**  
**Indicador  
propuesto**



- Número de Opiniones Técnicas de Riesgo emitidas
- \*Periodicidad quincenal**

**Asistencia a la mesa: Quincenal**

## Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA)

### Indicadores 2019

- Número de autorizaciones de obra emitidas  
**\*Periodicidad mensual**
- Número de sujetos forestales plantados  
**\*Periodicidad quincenal**

continúa



### Indicadores 2020

- Número de autorizaciones de obra emitidas  
**\*Periodicidad mensual**
- Número de sujetos forestales plantados  
**\*Periodicidad quincenal**

**Asistencia a la mesa: Quincenal**

## Secretaría de Movilidad (SEMOVI)

Indicadores 2019



1

**Indicador  
propuesto**



Indicadores 2020

- Número de autorizaciones para carga y descarga de camiones unitarios revolvedoras, equipo de bombeo de concreto para la construcción y/o camiones de volteo

**\*Periodicidad quincenal**

**Asistencia a la mesa: Mensual**

## Secretaría de Obras y Servicios (SOS-DGSUS)

### Indicadores 2019

- Número de luminarias reparadas en vías primarias
- \*Periodicidad quincenal**



**4**  
**Indicadores  
propuestos**




### Indicadores 2020

- Número de metros cúbicos de residuos sólidos recolectados en tiraderos clandestinos
- \*Periodicidad quincenal**
- Número de metros cúbicos de basura recolectada producto de barrido
- \*Periodicidad quincenal**
- Número de sujetos forestales podados en vías primarias
- \*Periodicidad quincenal**
- Número de metros cuadrados eliminados de grafiti en inmuebles
- \*Periodicidad quincenal**

**Asistencia a la mesa: Quincenal**




## Secretaría de Obras y Servicios (SOS-DGOIV)




**Asistencia a la mesa: Quincenal**

## Secretaría de Seguridad Ciudadana - Subsecretaría de Control de Tránsito

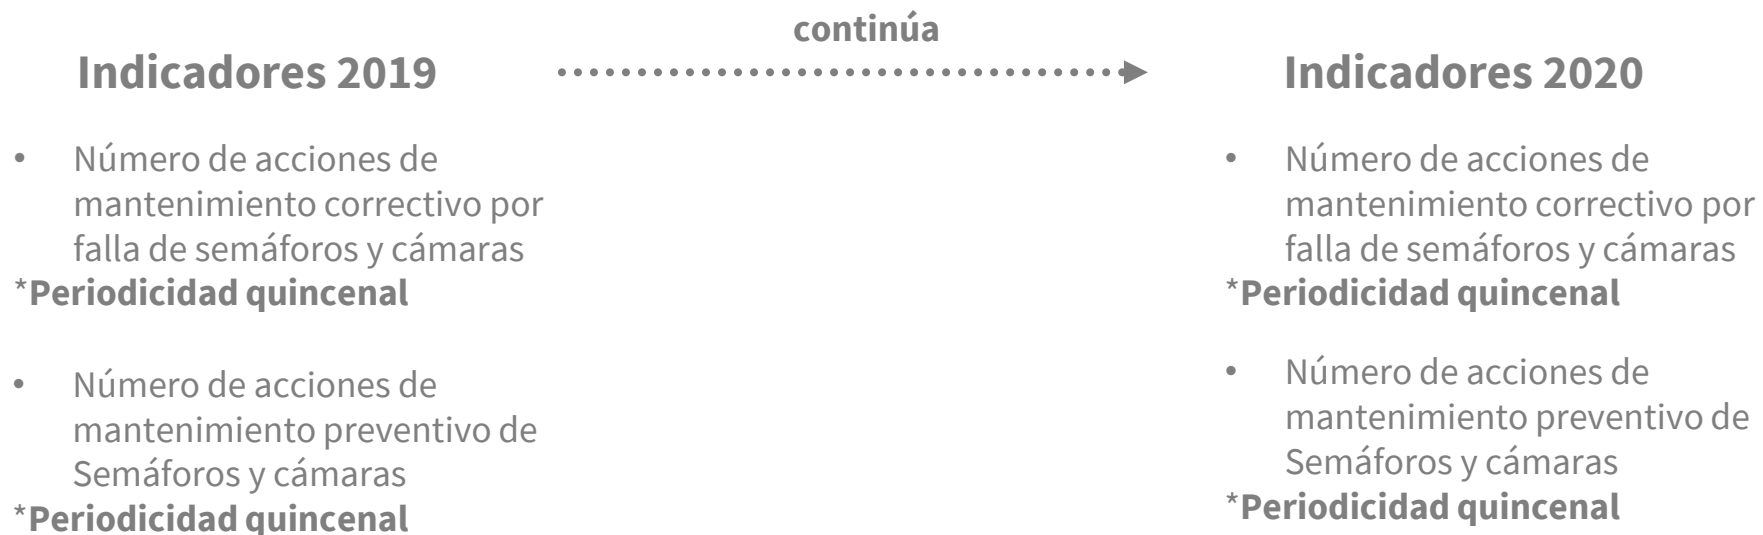


**Asistencia a la mesa: Quincenal**

## Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX)

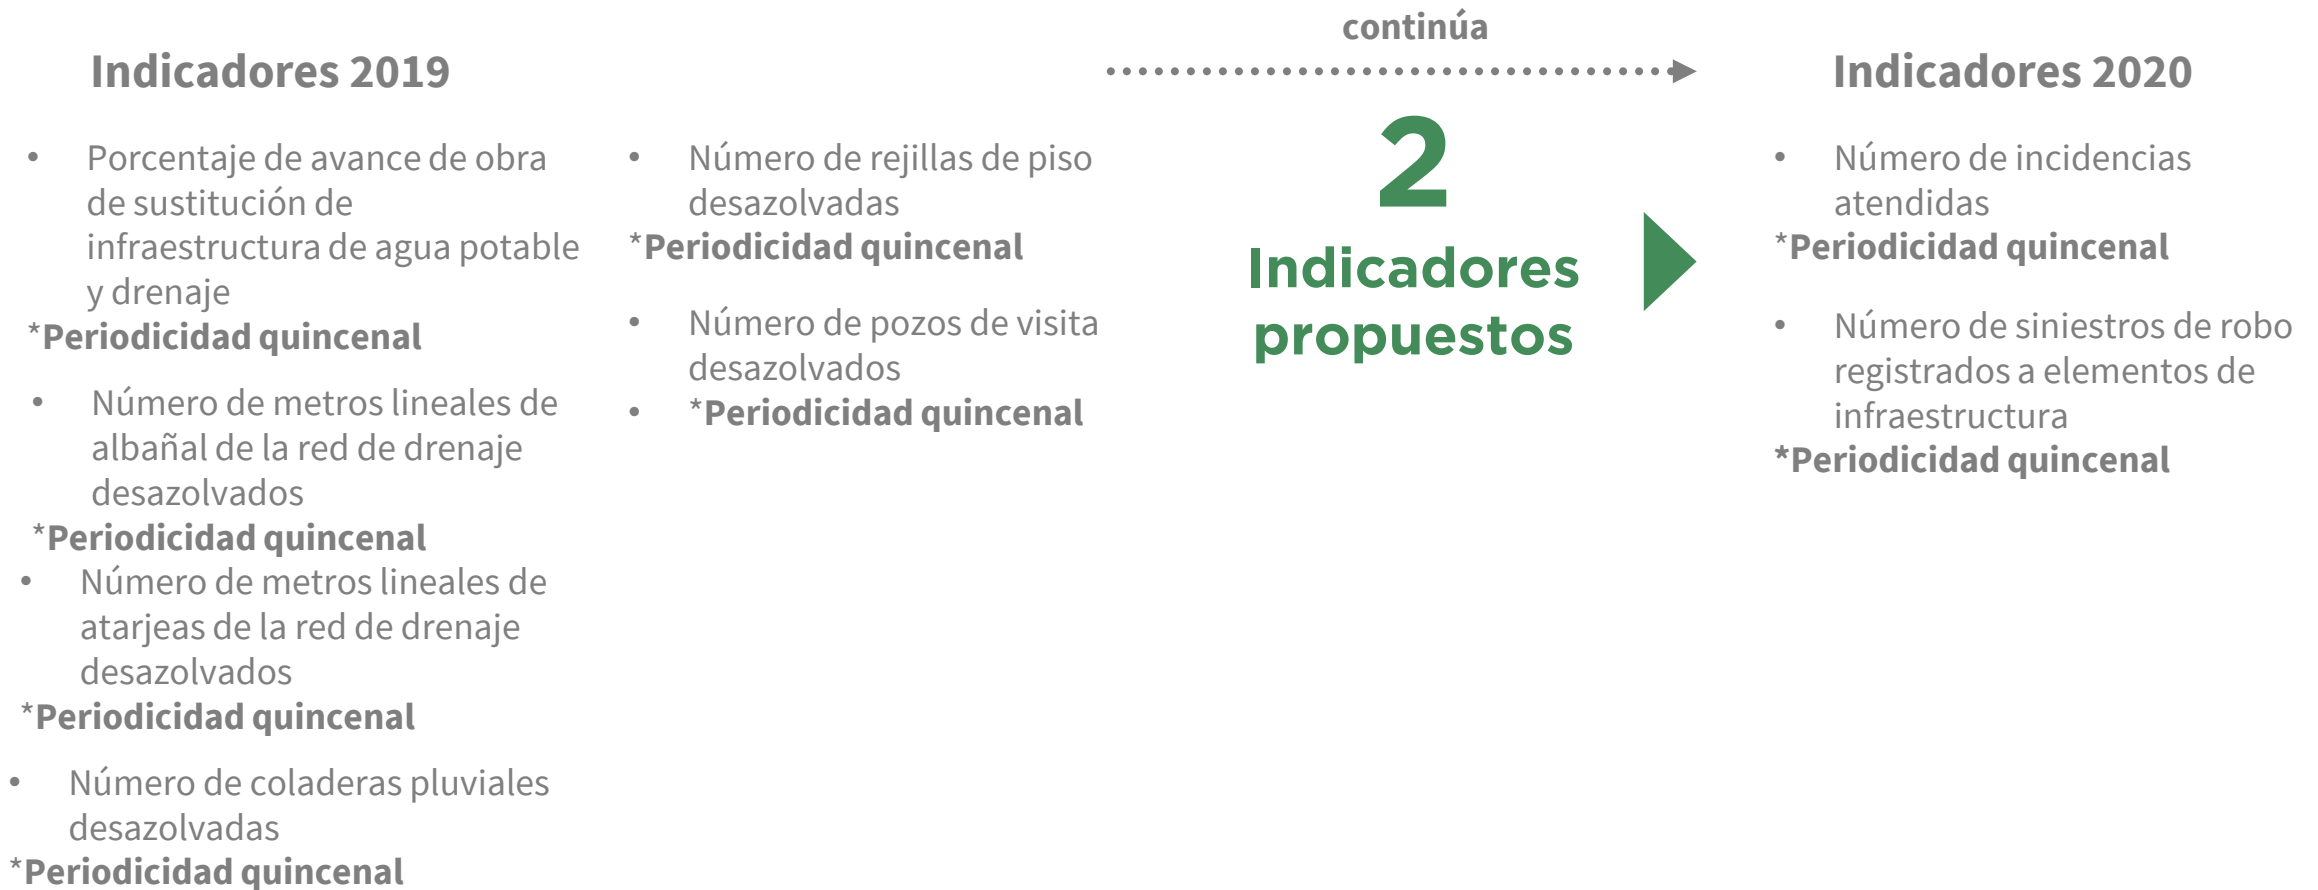

**Asistencia a la mesa: Quincenal**

## Sistema de Transporte Colectivo Metro

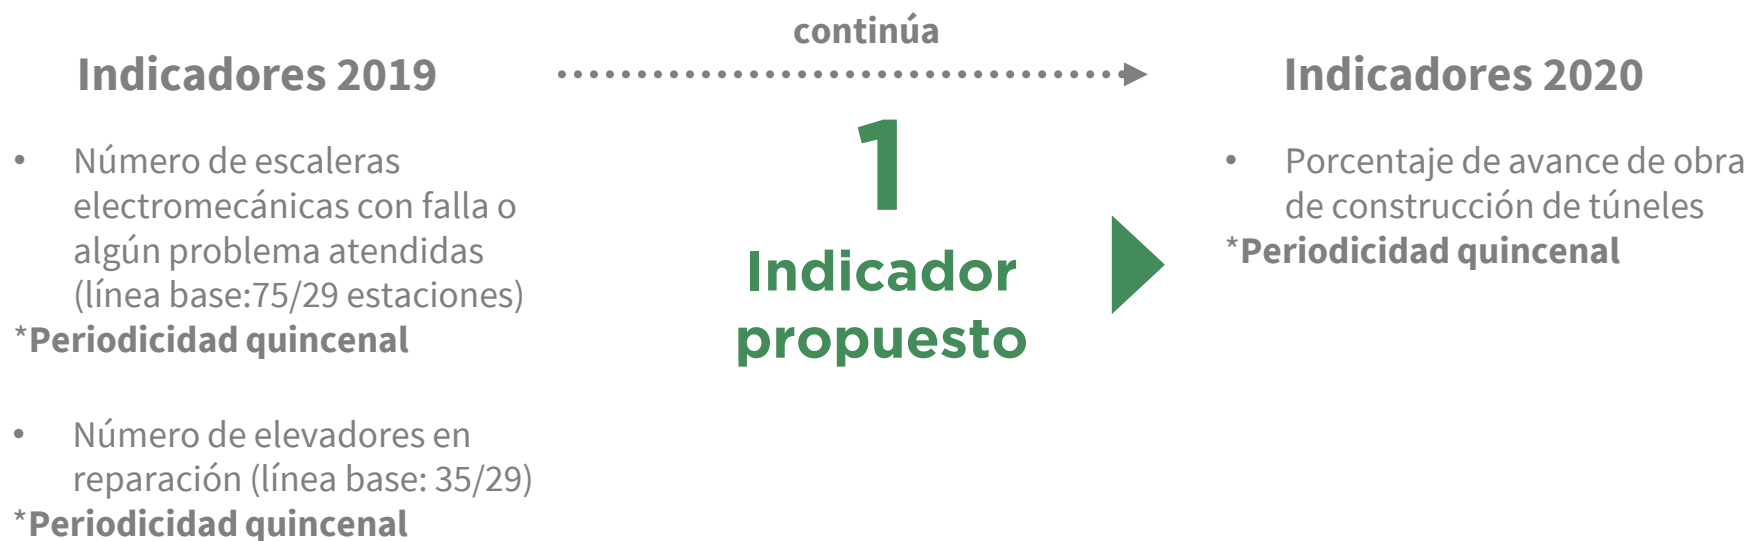

**Asistencia a la mesa: Mensual**

## Teléfonos de México (TELMEX)

Indicadores 2019



Indicadores 2020

3

Indicadores  
propuestos



- Número de siniestros de robo registrados de elementos de infraestructura  
**\*Periodicidad quincenal**
- Número de incidencias de riesgo atendidas  
**\*Periodicidad quincenal**
- Número de obras de mantenimiento que impliquen rompimiento en vía pública  
**\*Periodicidad quincenal**

Asistencia a la mesa: Quincenal

## Ciudad Solar (Estrategia de sustentabilidad energética)

Indicadores 2019



Indicadores 2020

2

Indicadores  
propuestos



- Número de viviendas nuevas con calentador solar (Línea base por definir)
- Número de edificios del gobierno de la CDMX con sistema FV (Línea base por definir)

## Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México

Indicadores 2019



Indicadores 2020

**1**  
**Indicador  
propuesto**

- Porcentaje de avance de obras de reconstrucción de inmuebles (Línea base por definir)

**Asistencia a la mesa: Mensual**



UNIVERSIDAD DE LEÓN  
CENTRO  
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

## Reportes

Turnos e incidencias urbanas

Mesas de trabajo

Asuntos generales

Acuerdos

Asistencia

**\*Transmisión en vivo\***

CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS

"2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"



# ACH

Tema	Indicador	Periodicidad	Semana al 06/01/20	Semana al 13/01/2020	Próximo reporte
Tiraderos clandestinos	Metros cúbicos de residuos sólidos levantados en tiraderos clandestinos en el perímetro de ACH	Semanal	1,234 m3	1,039 m3	20 de enero
Limpieza	Metros cúbicos de basura recolectada en el Perímetro de la ACH (Producto de Barrido)	Semanal	2,819 m3	2,576 m3	20 de enero
Mantenimiento a infraestructura	Número de Incidencias de daño en infraestructura del Perímetro de la ACH reparadas y atendidas	Semanal	4	11	20 de enero

## ACH | Eliminación de grafiti

**2,517**  
**m<sup>2</sup> totales**

\*La mayoría son  
reincidencias

calles atendidas **38**  
cortinas metálicas **96**  
fachadas **109**



# Eliminación de grafiti en cantera

De la semana del 30/12/19 al 06/01/20:

Se han limpiado  
**1,586 m<sup>2</sup>**

Se trabajo en  
inmuebles que no  
son catalogados con  
**gel desincrustante.**



## ACH | obras menores

Se realizaron trabajos del 30/12/19 al 06/01/20 en:

República de Perú  
República de Brasil  
Plaza Garibaldi  
Correo Mayor

Los trabajos realizados consistieron en **reparación de tres tapas de registros** en República de Perú, **reparación de dos tapas de registro** en Plaza Garibaldi, **reparación de una tapa de registro** en República de Bolivia esquina República de Brasil, **reparación de una tapa de registro** en Correo Mayor esquina Moneda



## ACH | obras menores

Se realizaron trabajos del 07/01/20 al 13/01/20 en:

República de Perú  
República de Brasil  
5 de Febrero  
Correo Mayor

Los trabajos realizados consistieron en **reparación de una tapa de registros** en República de Perú entre República de Chile y Altuna, **reparación de arroyo vehicular** en Isabel la Católica frente al No. 33 entre Madero y 16 de Septiembre, **reparación de arroyo vehicular** en Dr. Mora no. 13 esquina Colón, **reparación de tapa de registro** en Correo Mayor y Moneda, **reparación de 2 banquetas** en 5 de Febrero entre Venustiano Carranza y república de Uruguay **reparación de banqueta** en 5 de Febrero entre República del Salvador y Mesones, **reparación de banqueta** en 5 de Febrero entre Regina y Mesones, **reparación de brocal y retiro de esparragos** en 5 de Febrero y República del Salvador **retiro de hito** en Plaza de la Constitución



# ALC. CUAUHTÉMOC

Tema	Indicador	Periodicidad	Semana de 30/12/19 al 05/01/20	Semana de 06/01/20 al 12/01/20	Próximo reporte	Observaciones
Luminarias	Número de luminarias reparadas en vías secundarias en PB de Cuauhtémoc	Quincenal	15	22	28 de enero	Se realizó la revisión a 37 luminarias
Poda	Número de sujetos forestales podados	Quincenal	0	0	28 de enero	Se realizó la poda a 6 sujetos forestales liberando 0 cámaras
Desazolve	Red de drenaje desazolvada en PB de Cuauhtémoc (m lineales)	Quincenal	0	137	28 de enero	Se realizó el desazolve de 137 metros lineales
Limpia (Colecta de sólidos)	Escuelas limpias y toque de campana	Quincenal	130	225	28 de enero	Se recolectaron 355 m3 de residuos sólidos (15 m3, orgánicos y 340 m3, inorgánicos)

# ALC. VENUSTIANO CARRANZA

Tema	Indicador	Periodicidad	Semana al 06/01/20	Semana al 13/01/20	Próximo reporte	Observaciones
Luminarias	Número de luminarias reparadas en vías secundarias	Semanal	5	7	21 de enero	Se detalla la ubicación y causa en el anexo
Tiraderos Clandestinos	Toneladas de residuos sólidos recolectados de tiraderos clandestinos en el PB de VC (línea base de 26 tiraderos)	Semanal	569.8	508.2	21 de enero	Se recolectaron 33 toneladas diariamente de residuos sólidos



# ALC. VENUSTIANO CARRANZA

REPORTE DE LUMIARIAS REPARADAS EN EL PERÍMETRO B EN LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA					
DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		COLONIA	CANTIDAD	MOTIVO
CDA. MIGUEL NEGRETE 15	GRAL EMILIANO ZAPATA	MIGUEL NEGRETE	10 DE MAYO	1	MANTENIMIENTO
SASTRERIA 40	MIGUEL NEGRETE		10 DE MAYO	1	MANTENIMIENTO
F C DE CINTURA 39	ALARCON	GRAL EMILIANO ZAPATA	10 DE MAYO	1	RECONEXIÓN DE LINEAS
MIGUEL NEGRETE 111	CDA. DE MIGUEL NEGRETE	SASTRERIA	10 DE MAYO	1	MANTENIMIENTO
MIGUEL NEGRETE 135	GRAL EMILIANO ZAPATA	TAPICERIA	10 DE MAYO	1	RECONEXIÓN DE LINEAS
CDA. MIGUEL NEGRETE 26	MIGUEL NEGRETE		10 DE MAYO	1	MANTENIMIENTO
BRAVO	PEÑA Y PEÑA	NACIONAL	MORELOS I	1	MANTENIMIENTO
<b>TOTAL</b>				<b>7</b>	

Moneda: Tradicional

Resolución de castigo:



# ALC. VENUSTIANO CARRANZA

RELACION DE TIBADEROS CLANDESTINOS				
Nº. CONSECUTIVO	UBICACIÓN	TIPO DE RESIDUOS SOLIDOS %	CANTIDAD TONEL	SECTOR
01	MISAL DOMINGUEZ Y FORTINO GARCIA COL. AMERUCION PERITUMCASA	80% BASURA 10% CASCAJO	1.2	5-1
02	REF. NORTE Y HORTALANOS COL. MORELOS	80% BASURA 10% CASCAJO	1	5-1
03	AV. CIRCUNVALACION ENTRE HERFES DE MACOZARI Y SAN ANTONIO TOMATLAN	80% BASURA 15% CASCAJO	1.2	5-2
04	ZAPATA ESQ. AV. CIRCUNVALACION	80% BASURA 15% CASCAJO	1.3	5-2
05	NAZARVAL ESQ. VIDAL ALCOZER	80% BASURA 15% CASCAJO	1.1	5-3
06	COSTA RICA ESQ. VIDAL ALCOZER	80% BASURA 15% CASCAJO	1	5-2
07	PEÑA Y PEÑA ESQ. VIDAL ALCOZER	80% BASURA 15% CASCAJO	1.4	5-2
08	VIDAL ALCOZER Y BERRIOZABAL COL. MORELOS	80% BASURA 15% CASCAJO	1	5-3
09	AV. CIRCUNVALACION Y S. ROMANUE (MERCADO DULCES I) COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 10% CASCAJO	1.4	5-4
10	AV. CIRCUNVALACION Y CARRIZAL (MERCADO DE FLORES) COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 10% CASCAJO	1.3	5-4
11	AV. CIRCUNVALACION Y CARRETONES (METRO MERCEDES) COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 10% CASCAJO	1	5-4
12	JUAN DE LA GRANIA Y CORREGIDORA (LAS CAMONAS) COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 10% CASCAJO	1.5	5-4
13	SANTA ESCUELA Y CUADRANTE DE LA SOLEDAD COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 10% CASCAJO	1.5	5-4
14	ROGARIO ESQ. PLAZA SAN LAZARO (ATRAS DE LA IGLESIA) COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 10% CASCAJO	1.2	5-4

RELACION DE TIBADEROS CLANDESTINOS				
Nº. CONSECUTIVO	UBICACIÓN	TIPO DE RESIDUOS SOLIDOS %	CANTIDAD TONS	SECTOR
15	AV. CIRCUNVALACION Y SOLEDAD COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 10% CASCAJO	1.4	5-4
16	AV. CIRCUNVALACION Y MANZANARES COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 10% CASCAJO	1.5	5-4
17	JUAN PABLO ESQ. CORREGIDORA COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 10% CASCAJO	1.2	5-4
18	CONGRESO DE LA UNION ESQ. GENERAL ABANA COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 10% CASCAJO	1.4	5-4
19	GURINAL BAYO ESQ. JUAN DE LA GRANIA COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 10% CASCAJO	1	5-4
20	JUAN DE LA GRANIA ESQ. SAN CEBRIAN COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 10% CASCAJO	1.4	5-4
21	CORREGIDORA Y SAN SIMON COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	1.2	5-4
22	PLAZA DE LA SOLEDAD, SAN SIMON Y SANTA ESCUELA COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	1.4	5-4
23	TOLVA 3 COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 10% CASCAJO	1.5	5-4
24	TOLVA 3 COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 10% CASCAJO	1.5	5-4
25	AV. CIRCUNVALACION Y CASBETONES COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	1.4	5-4
26	JUAN DE LA GRANIA ESQ. SAN CEBRIAN COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	1	5-4



# SOS – DGOIV

## AVANCES DE OBRA (RESUMEN)

### PLAZA LORETO – JARDÍN DEL OBISPO – V. TRUJANO

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL - PLAZA LORETO-JARDIN DEL OBISPO Y CALLE VALERIO TRUJANO						
FRENTE DE TRABAJO	CONTRATO	UBICACIÓN VIALIDAD Y TRAMO	EMPRESA	CONCEPTO	AVANCE REAL	AVANCE PROGRAMADO
2	DGOIV-AD-L-1-163-19	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL EN LA PLAZA LORETO, JARDIN OBISPO, VALERIO TRUJANO	CONSORCIO DE INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES, S. A DE C. V. (CICSA )	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL	90.00 %	100.00 %

### ANTIGÜO BARRIO DE ZOQUIAPAN

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL - ANTIGÜO BARRIO SAN PABLO ZOQUIAPAN						
FRENTE DE TRABAJO	CONTRATO	UBICACIÓN VIALIDAD Y TRAMO	EMPRESA	CONCEPTO	AVANCE REAL	AVANCE PROGRAMADO
3	DGOIV-AD-L-1-165-19	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL DEL ANTIGUO BARRIO SAN PABLO ZOQUIAPAN, EN LAS CALLES DE SOLEDAD Y LEONA VICARIO	IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL, S. A. DE C. V. (IDINSA)	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL	98.00 %	100.00 %

# SOS – DGOIV

## AVANCES DE OBRA (RESUMEN)

### GALEANA – VIOLETA – RIVA PALACIO

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL - CALLES DE GALEANA, VIOLETA Y RIVA PALACIO						
FRENTE DE TRABAJO	CONTRATO	UBICACIÓN, VALIDAD Y TRAMO	EMPRESA	CONCEPTO	AVANCE REAL	AVANCE PROGRAMADO
4	DGOIV-LPN-L-1-156-19	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL DE LAS CALLES DE GALEANA, CALLE RIVA PALACIO Y VIOLETA	ARTE Y DISEÑO EN ARQUITECTURA, S. A. DE C. V.	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL	98.00 %	100.00 %

### SANTA MARÍA LA REDONDA

SANTA MARÍA LA REDONDA (REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL)						
FRENTE DE TRABAJO	CONTRATO	UBICACIÓN, VALIDAD Y TRAMO	EMPRESA	CONCEPTO	AVANCE REAL	AVANCE PROGRAMADO
5	DGOIV-LPN-L-1-203-19	"TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DEL BARRIO SANTA MARÍA LA REDONDA, CALLE MINA, PENSADOR MEXICANO, SANTA VERACRUZ, 2 DE ABRIL, LOS CALLEJONES SAN JUAN DE DIOS Y PLAZA 2 DE ABRIL"	ESCODEM, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO	60.00 %	100.00 %

### PENSADOR MEXICANO

CALLE PENSADOR MEXICANO, SANTA MARÍA LA REDONDA (REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL)						
FRENTE DE TRABAJO	CONTRATO	UBICACIÓN, VALIDAD Y TRAMO	EMPRESA	CONCEPTO	AVANCE REAL	AVANCE PROGRAMADO
6	DGOIV-LPN-L-1-203-19	"TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DEL BARRIO SANTA MARÍA LA REDONDA, CALLE PENSADOR MEXICANO"	DESARROLLADORA DE IDEAS, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO	68.00 %	100.00 %



# SOS – DGOIV

## AVANCES DE OBRA (RESUMEN)

### AV. HIDALGO (CRUCES SEGUROS)

RECONFIGURACIÓN GEOMÉTRICA DE CRUCES SEGUROS						
FRENTE DE TRABAJO	CONTRATO	UBICACIÓN VIALIDAD Y TRAMO	EMPRESA	CONCEPTO	AVANCE REAL	AVANCE PROGRAMADO
13	DGOIV-AD-L-1-246-19	"TRABAJOS DE CRUCES SEGUROS EN AV. HIDALGO – PASEO DE LA REFORMA – EJE 1 PTE GUERRERO – EJE CENTRAL LÁZARO CARDENAS, COLONIA GUERRERO"	GAMI INGENIERIA E INSTALACIONES, S.A. DE C.V.	CRUCES SEGUROS	90.00 %	100.00 %

### AV. EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS

REHABILITACIÓN DE AV. EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS						
FRENTE DE TRABAJO	CONTRATO	UBICACIÓN VIALIDAD Y TRAMO	EMPRESA	CONCEPTO	AVANCE REAL	AVANCE PROGRAMADO
14	DGOIV-AD-L-1-252-19	"TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DEL EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS EN EL TRAMO DE CALLE MADERO A PLAZA GARIBALDI, COL. CENTRO, ALCALDÍA CUAUHEMOC, EN LA CIUDAD DE MÉXICO"	CONSTRUCTORA LMI, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	85.00 %	100.00 %

# SOS – DGSUS- Alumbrado Público | Anexo 1

## Reporte de luminarias reparadas en el Centro Histórico Perímetro A

Dirección	Entre calles		Colonia	Cantidad	Motivo	Incidencia
Alameda central	Cara Av. Hidalgo	Av. Juárez	Centro Histórico	1	Se realiza reconexión en líneas de luminaria del registro	Defecto Conexión
Roldán	Manzanares	Corregidora	Centro Histórico	1	Se realiza reconexión en líneas de alimentación	Defecto Conexión
Roldán	Manzanares	Corregidora	Centro Histórico	1	Se realiza reconexión en líneas de alimentación	Defecto Conexión
Roldán	Manzanares	Corregidora	Centro Histórico	1	Se realiza reconexión en líneas de alimentación	Defecto Conexión
			<b>Total</b>	<b>4</b>		

# SOS – DGSUS- Alumbrado Público | Anexo 1

## Reporte de luminarias reparadas en el Centro Histórico Perímetro A

Dirección	Entre calles	Colonia	Cantidad	Motivo	Incidencia
Alameda Central	Cara Av. Hidalgo	Av. Juárez Centro Histórico	1	Se realiza reconexión en líneas de luminaria del registro	Defecto Conexión
José María Izazaga	Isabel la Católica	Bolívar Eje Central Lázaro	1	Se cambia lámpara E-39	Lámpara apagada
José María Izazaga	Bolivar	Cárdenas Eje Central Lázaro	1	Se cambia lámpara PGZ 140W	Lámpara apagada
José María Izazaga	Cjón Igualdad	Cárdenas 2do. Cjón	1	Se realiza el cambio de balastro para encender la luminaria	Lámpara apagada
José María Izazaga	Isabel la Católica	Nezahualcóyotl	1	Limpieza general	Lámpara apagada
José María Izazaga	5 de Febrero	Isabel la Católica	1	Se realiza el cambio de balastro para encender la luminaria	Lámpara apagada
José María Izazaga	5 de Febrero	Isabel la Católica	1	Se realiza el cambio de balastro para encender la luminaria	Lámpara apagada
José María Izazaga	20 de Noviembre	5 de Febrero	1	Se realiza el cambio de balastro para encender la luminaria	Lámpara apagada
Plaza De La Constitución	Corregidora	Moneda	1	Se revisa control y se reprograma reloj con fecha y hora correcta	Control dañado
Plaza De La Constitución	5 de Febrero	20 de Noviembre	1	Se revisa control y se reprograma reloj con fecha y hora correcta	Control dañado
Plaza De La Constitución	20 de Noviembre	José María Pino Suárez	1	Se revisa control y se reprograma reloj con fecha y hora correcta	Control dañado
Plaza De La Constitución	Francisco I. Madero	16 de Septiembre	1	Se revisa control y se reprograma reloj con fecha y hora correcta	Control dañado

# SOS – DGSUS- Alumbrado Público | Anexo 1

## Reporte de luminarias reparadas en el Centro Histórico Perímetro A

Dirección	Entre calles	Colonia	Cantidad	Motivo	Incidencia	
Francisco I. Madero	Fray Pedro de Gante	Bolívar	Centro Histórico	19	Se repara corto circuito en PDL 051600 circuito es del PDL 051600 al PDL 051619 y control se ubica en PDL 051615	Defecto Conexión
Plaza De La Constitución	José Ma. Pino Suárez	Moneda	Col. Centro	1		Falta Poste
Plaza De La Constitución	José Ma. Pino Suárez	Moneda	Col. Centro	1		Falta Poste
Plaza De La Constitución	José Ma. Pino Suárez	Moneda	Col. Centro	1		Falta Poste
Plaza De La Constitución	José Ma. Pino Suárez	Moneda	Col. Centro	1	Se realiza instalacion y nivel de poste, cableado de poste, instalacion y fijación de 2 brazos tipo rizo vial y peatonal, fijación y reconexión de luminarias bellotas vial y peatonal, reconexión de líneas en registro y retiro de tapa de registro	Falta Poste
Plaza De La Constitución	José Ma. Pino Suárez	Moneda	Col. Centro	1		Falta Poste
Plaza De La Constitución	Moneda	Monte de Piedad	Col. Centro	1		Falta Poste
			<b>Total</b>	<b>38</b>		

# STC-METRO

Tema	Indicador	Quincena al 30/12/19	Quincena al 14/01/20	Próximo reporte
Infraestructura	Número de escaleras electromecánicas con falla o algún problema (línea base: 75 escaleras en 29 estaciones)	7 escaleras detenidas	10 escaleras detenidas	28 de enero
Infraestructura	Número de elevadores en reparación (línea base: 19 elevadores en 29 estaciones)	0 elevadores detenidos	0 elevadores detenidos	28 de enero





Tema	Indicador	Periodicidad	Al mes de noviembre	Al mes de diciembre	Próximo reporte
Proyectos de Vivienda	Porcentaje de avance de proyectos de vivienda (línea base: 18 )	Mensual	53.99 %	55.08%	11 de enero

# INVI

No. PREDIO	COLONIA	ALCALDÍA	PROGRAMA COLUMNA MAESTRA	AVANCE DEL PROYECTO	AVISO DE OBRA	ESTATUS	PERÍMETRO	PORCENTAJE DE AVANCE
1 2 DE ABRIL No. 42	GUERRERO	CUAUHTÉMOC	EXPROPIADO	PROYECTO EJECUTIVO LIBERADO	A-039/DOUL/62/11	OBRA EN PROCESO	A	42.20 %
2 ACADEMIA No. 33	CENTRO	CUAUHTÉMOC	EXPROPIADO	PROYECTO EJECUTIVO LIBERADO	A-028/DOUL/62/14	OBRA EN PROCESO	A	48.46 %
3 ARCOS DE BELEN No. 49	CENTRO	CUAUHTÉMOC	EXPROPIADO	PROYECTO EJECUTIVO LIBERADO	A-038/DOUL/62/17	OBRA EN PROCESO	B	99.98 %
4 EJE 1 PONIENTE GUERRERO No. 164	GUERRERO	CUAUHTÉMOC	EXPROPIADO	PROYECTO EJECUTIVO LIBERADO	A-007/DIUL/62/10	OBRA EN PROCESO	B	86.92 %
5 EJE 1 PONIENTE GUERRERO No. 110	CENTRO	CUAUHTÉMOC	EXPROPIADO	PROYECTO EJECUTIVO LIBERADO	A-085/DOUL/62/11	OBRA EN PROCESO	B	90.81 %
6 MAGNOLIA No. 12 (ANTES No. 12 y 16)	GUERRERO	CUAUHTÉMOC	PROGRAMA NORMAL	PROYECTO EJECUTIVO LIBERADO	A-069/DOUL/62/14	OBRA EN PROCESO	B	80.19 %

# INVI

No. PREDIO	COLONIA	ALCALDÍA	PROGRAMA COLUMNA MAESTRA	AVANCE DEL PROYECTO	AVISO DE OBRA	ESTATUS	PERÍMETRO	PORCENTAJE DE AVANCE
7 REPÚBLICA DE ARGENTINA No. 58	CENTRO	CUAUHTÉMOC	EXPROPIADO	PROYECTO EJECUTIVO LIBERADO	A-012/DOUL/62/14	POR INICIAR	A	0.00 %
8 REPÚBLICA DE ARGENTINA No. 87	CENTRO	CUAUHTÉMOC	EXPROPIADO	PROYECTO EJECUTIVO LIBERADO	A-079/DOUL/62/12	OBRA EN PROCESO	A	87.21 %
9 REPÚBLICA DE PERÚ No. 40	CENTRO	CUAUHTÉMOC	PROGRAMA NACIONAL	PROYECTO EJECUTIVO LIBERADO	A-009/DOUL/62/2017	OBRA EN PROCESO	B	93.60 %
10 ALLENDE No. 46	CENTRO	CUAUHTÉMOC	EXPROPIADO	PROYECTO EJECUTIVO LIBERADO	A-073/DOUL/62/12	OBRA EN PROCESO	A	100.00 %
11 LERDO No. 12	GUERRERO	CUAUHTÉMOC	EXPROPIADO	PROYECTO EJECUTIVO LIBERADO	A-006/DOUL62/13	POR INICIAR	B	0.00 %
12 PEDRO MORENO No. 154	GUERRERO	CUAUHTÉMOC	EXPROPIADO	PROYECTO EJECUTIVO LIBERADO	A-062/DOUL/62/11	POR INICIAR	B	0.00 %

# INVI

No. PREDIO	COLONIA	ALCALDÍA	PROGRAMA COLUMNA MAESTRA	AVANCE DEL PROYECTO	AVISO DE OBRA	ESTATUS	PERÍMETRO	PORCENTAJE DE AVANCE
13 TALAVERA No. 24	CENTRO	CUAUHTÉMOC	EXPROPIADO	PROYECTO EJECUTIVO LIBERADO	A-056/DOUL/62/16	POR INICIAR	A	0.00 %
14 VIOLETA No. 15	GUERRERO	CUAUHTÉMOC	EXPROPIADO	PROYECTO EJECUTIVO LIBERADO	A-024/DOUL/62/12	POR INICIAR	B	0.00 %
15 PEDRO MORENO No. 156	GUERRERO	CUAUHTÉMOC	EXPROPIADO	PROYECTO EJECUTIVO LIBERADO	A-064/DIUL/62/10	POR INICIAR	B	0.00 %
16 LECUMBERRI No. 66	ZONA CENTRO	CUAUHTÉMOC	PROGRAMA NORMAL	PROYECTO EJECUTIVO LIBERADO	A-022/DOUL/62/17	OBRA EN PROCESO	B	100.00 %
17 BELISARIO DOMINGUEZ No. 78	CENTRO	CUAUHTÉMOC	EXPROPIADO	PROYECTO EJECUTIVO LIBERADO	A-059/DOUL/62/17	OBRA EN PROCESO	A	76.75 %
18 NACIONAL No. 57	MORELOS	VENUSTIANO CARRANZA	CDI-CONVENIO DE COORDINACIÓN 2013	PROYECTO EJECUTIVO LIBERADO	A-022/DOUL/62/15	OBRA EN PROCESO	B	85.48 %

# PROSOC

Tema	Indicador	Periodicidad	Ubicación	Al mes de noviembre	Al mes de diciembre	Próximo reporte	Observaciones
Unidades habitacionales	Porcentaje de avance de proyectos de unidades habitacionales (línea base: 62)	Mensual	Alcaldía Cuauhtémoc (57 unidades habitacionales)	56.28 %	69.83 %	11 de febrero	11 obras por iniciar 15 obras en proceso 31 obras terminadas
			Alcaldía Venustiano Carranza (5 unidades habitacionales)	48.00 %	60.00 %		1 obra por iniciar 2 obras en proceso 2 obras terminadas
			<b>Total acumulado</b>	<b>52.14 %</b>	<b>64.91 %</b>		

# PROSOC

NO.	PREDIO	COLONIA	ALCALDIA	PROYECTO	ESTATUS	PORCENTAJE DE AVANCE	PERÍMETRO	CATALOGACIÓN
1	TIZAPAN 8	CENTRO	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA SANITARIA	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADO
2	SAN CAMILITO 25	CENTRO	CUAUHTEMOC	IMPERMEABILIZACION	EN PROCESO	95%	B	NO CATALOGADO
3	ROSARIO 32	CENTRO	VENUSTIANO CARRANZA	ESCALERAS	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADO
4	REPUBLICA DEL SALVADOR 206	CENTRO	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA SANITARIA	TERMINADA	100%	A	CATALOGADO
5	REPUBLICA DE PERU 32	CENTRO	CUAUHTEMOC	IMPERMEABILIZACION	TERMINADA	100%	A	CATALOGADO
6	REPUBLICA DE PERU 28	CENTRO	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADO

# PROSOC

NO.	PREDIO	COLONIA	ALCALDIA	PROYECTO	ESTATUS	PORCENTAJE DE AVANCE	PERÍMETRO	CATALOGACIÓN
7	REPUBLICA DE COSTA RICA 129	CENTRO	CUAUHTEMOC	IMPERMEABILIZACION	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADO
8	REPUBLICA DE COSTA RICA 125	CENTRO	CUAUHTEMOC	HERRERIA	TERMINADA	100%	A	NO CATALOGADO
9	REPUBLICA DE CHILE 49	CENTRO	CUAUHTEMOC	CALLES Y ANDADORES	EN PROCESO	60%	A	NO CATALOGADO
10	REPUBLICA DE CHILE 47	CENTRO	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA A HIDRAULICA	EN PROCESO	40%	A	CATALOGADO
11	PLAZA SAN LAZAROB-16	CENTRO	VENUSTIANO CARRANZA	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	POR INICIAR	0%	B	NO CATALOGADO
12	ORGANO 17	CENTRO	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA A HIDRAULICA	POR INICIAR	0%	B	NO CATALOGADO
13	ORGANO 16-18	CENTRO	CUAUHTEMOC	ESCALERAS	POR INICIAR	0%	B	NO CATALOGADO

# PROSOC

NO.	PREDIO	COLONIA	ALCALDIA	PROYECTO	ESTATUS	PORCENTAJE DE AVANCE	PERÍMETRO	CATALOGACIÓN
14	NEZAHUALCOYOTL 136	CENTRO	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA SANITARIA	EN PROCESO	10%	B	NO CATALOGADO
15	MISIONEROS 9	CENTRO	CUAUHTEMOC	ALBAÑILERIA	TERMINADA	100%	A	CATALOGADO
16	MANUEL TOLSA 56	CENTRO	CUAUHTEMOC	ESTRUCTURA	POR INICIAR	0%	B	NO CATALOGADO
17	MANUEL DOBLADO 140	CENTRO	CUAUHTEMOC	HERRERIA	POR INICIAR	0%	B	NO CATALOGADO
18	LAZARIN DEL TORO 26	CENTRO	CUAUHTEMOC	HERRERIA	EN PROCESO	80%	A	CATALOGADO
19	JOSE JOAQUIN HERRERA 28- 32	CENTRO	CUAUHTEMOC	ESCALERAS	TERMINADO	100%	B	NO CATALOGADO
20	JOSE JOAQUIN HERRERA 2-4	CENTRO	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA SANITARIA	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADO



# PROSOC

NO.	PREDIO	COLONIA	ALCALDIA	PROYECTO	ESTATUS	PORCENTAJE DE AVANCE	PERÍMETRO	CATALOGACIÓN
21	JOSE JOAQUIN HERRERA 17	CENTRO	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADO
22	JOSE JOAQUIN HERRERA 10 Y 12	CENTRO	CUAUHTEMOC	ESCALERAS	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADO
23	ISABEL LA CATOLICA 134	CENTRO	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	EN PROCESO	75%	B	NO CATALOGADO
24	FRAY SERVANDO TERESA DE MIER 142	CENTRO	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA SANITARIA	POR INICIAR	0%	B	NO CATALOGADO
25	EJE CENTRAL LAZARO CARDENAS 17	CENTRO	CUAUHTEMOC	IMPERMEABILIZACION	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADO
26	ECUADOR 23 (ANTES ALLENDE 82 Y 86)	CENTRO	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	EN PROCESO	10%	B	NO CATALOGADO
27	CORREGIDORA 148	CENTRO	VENUSTIANO CARRANZA	ESCALERAS	EN PROCESO	40%	B	NO CATALOGADO

# PROSOC

<b>NO.</b>	<b>PREDIO</b>	<b>COLONIA</b>	<b>ALCALDIA</b>	<b>PROYECTO</b>	<b>ESTATUS</b>	<b>PORCENTAJE DE AVANCE</b>	<b>PERÍMETRO</b>	<b>CATALOGACIÓN</b>
28	CORREGIDORA 140	CENTRO	VENUSTIANO CARRANZA	ESCALERAS	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADO
29	CERRADA FRAY SERVANDO 59	CENTRO	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADO
30	CALLEJON MONTERO 7	CENTRO	CUAUHTEMOC	CALLES Y ANDADORES	EN PROCESO	95%	B	NO CATALOGADO
31	ANILLO DE CIRCUNVALACION 40	CENTRO	VENUSTIANO CARRANZA	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	EN PROCESO	60%	B	NO CATALOGADO
32	ALDACO 8	CENTRO	CUAUHTEMOC	IMPERMEABILIZACION	TERMINADA	100%	A	CATALOGADO
33	5 DE FEBRERO 93	CENTRO	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA SANITARIA	POR INICIAR	0%	B	NO CATALOGADO
34	1RA. CERRADA FRAY SERVANDO 57	CENTRO	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA SANITARIA	POR INICIAR	0%	B	NO CATALOGADO

# PROSOC

NO.	PREDIO	COLONIA	ALCALDIA	PROYECTO	ESTATUS	PORCENTAJE DE AVANCE	PERÍMETRO	CATALOGACIÓN
35	CHIMALPOPOCA 51	OBREERA	CUAUHTEMOC	PINTURA	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
36	FLORIDA 57	MORELOS	CUAUHTEMOC	CALLES Y ANDADORES	POR INICIAR	0%	B	NO CATALOGADA
37	FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS 29	MORELOS	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA SANITARIA (DRENAJE)	POR INICIAR	0%	B	NO CATALOGADA
38	JESUS CARRANZA 20	MORELOS	CUAUHTEMOC	ESCALERAS Y HERRERIA	POR INICIAR	0%	B	NO CATALOGADA
39	LIBERTAD 21 A1	MORELOS	CUAUHTEMOC	IMPERMEABILIZACION	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
40	LIBERTAD 21 B2	MORELOS	CUAUHTEMOC	HERRERIA (ESCALERAS)	EN PROCESO	40%	B	NO CATALOGADA
41	LIBERTAD 21 C3	MORELOS	CUAUHTEMOC	ESCALERAS	EN RPOCESO	50%	B	NO CATALOGADA
42	LIBERTAD 21 D4	MORELOS	CUAUHTEMOC	CALLES Y ANDADORES	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA

# PROSOC

NO.	PREDIO	COLONIA	ALCALDIA	PROYECTO	ESTATUS	PORCENTAJE DE AVANCE	PERÍMETRO	CATALOGACIÓN
43	BOLIVAR 158	OBRERA	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	EN PROCESO	10%	B	NO CATALOGADA
44	SEGUNDA CERRADA DE CHIMALPOPOCANO.16	OBRERA	CUAUHTEMOC	BASE DE TINACOS	POR INICIAR	0%	B	NO CATALOGADA
45	CERRADA FRAY SERVANDO 42	TRANSITO	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA (CABLEADO)	EN PROCESO	75%	B	NO CATALOGADA
46	CHIMALPOPOCA 294	TRANSITO	CUAUHTEMOC	IMPERMEABILIZACION	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
47	MINA 167	BUENAVISTA	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA A HIDRAULICA	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
48	MOCTEZUMA 199	BUENAVISTA	CUAUHTEMOC	HERRERIA	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
49	MOCTEZUMA 33	GUERRERO	CUAUHTEMOC	HERRERIA	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
50	VIOLETA 104	BUENAVISTA	CUAUHTEMOC	HERRERIA (ESCALERAS)	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA

# PROSOC

NO.	PREDIO	COLONIA	ALCALDIA	PROYECTO	ESTATUS	PORCENTAJE DE AVANCE	PERÍMETRO	CATALOGACIÓN
51	AVENIDA NIÑOS HEROES 51	DOCTORES	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y HERRERIA (ESCALERA MARINA)	EN PROCESO	100%	B	NO CATALOGADA
52	DR. ANDRADE 14	DOCTORES	CUAUHTEMOC	IMPERMEABILIZACION, INFRAESTRUCTURA SANITARIA, INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
53	DR. ANDRADE 15	DOCTORES	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA SANITARIA	EN PROCESO	80%	B	NO CATALOGADA
54	CALZADA DE LA VIGA 16	ESPERANZA	CUAUHTEMOC	IMPERMEABILIZACION	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
55	CALZADA DE LA VIGA 18	ESPERANZA	CUAUHTEMOC	IMPERMEABILIZACION	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
56	CALZADA DE LA VIGA 30	ESPERANZA	CUAUHTEMOC	PINTURA	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
57	PENSADOR MEXICANO 47	GUERRERO	CUAUHTEMOC	IMPERMEABILIZACION	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA

# PROSOC

NO.	PREDIO	COLONIA	ALCALDIA	PROYECTO	ESTATUS	PORCENTAJE DE AVANCE	PERÍMETRO	CATALOGACIÓN
58	SANTA VERACRUZ 47	GUERRERO	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
59	VIOLETA 58	GUERRERO	CUAUHTEMOC	HERRERIA (ESCALERAS)	EN PROCESO	60%	B	NO CATALOGADA
60	GALEANA 36	GUERRERO	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA (BOMBA)	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
61	HEROES 54	GUERRERO	CUAUHTEMOC	ESTRUCTURAS	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
62	HEROES 68	GUERRERO	CUAUHTEMOC	ESCALERAS	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA

# PROSOC

## OBRAS FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)


NO.	PREDIO	COLONIA	ALCALDIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES
1	DR. ANDRADE 15	DOCTORES	CUAUHTEMOC	<b>INFRAESTRUCTURA SANITARIA</b>	CON EL PROGRAMA RIPUH SE REALIZÓ EL DRENAJE AL INTERIOR DE LA UNIDAD HABITACIONAL QUEDANDO PENDIENTE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CONEXIÓN A LINEA DE DRENAJE EN VIALIDAD
2	PEÑON 72	MORELOS	CUAUHTEMOC		SE REALIZARÁ CAMBIO DE PROYECTO POSTERIOR A LA ASAMBLEA REALIZADA POR FAIS
3	ALVEAR NUÑEZ 16	DOCTORES	CUAUHTEMOC		SE REALIZARÁ CAMBIO DE PROYECTO POSTERIOR A LA ASAMBLEA REALIZADA POR FAIS
4	5 DE FEBRERO 93	CENTRO	CUAUHTEMOC		SE REALIZARÁ CAMBIO DE PROYECTO POSTERIOR A LA ASAMBLEA REALIZADA POR FAIS



# ADIP

Tema	Indicador	Periodicidad	Reporte al 16/12	Reporte al 13/01	Próximo reporte
Conectividad e Infraestructura Tecnológica	Número de puntos de conexión wifi habilitados en postes de C5 (Línea base: 561)	Semanal	399	485	27/01/2019

### Avance de despliegue de Postes con WiFi

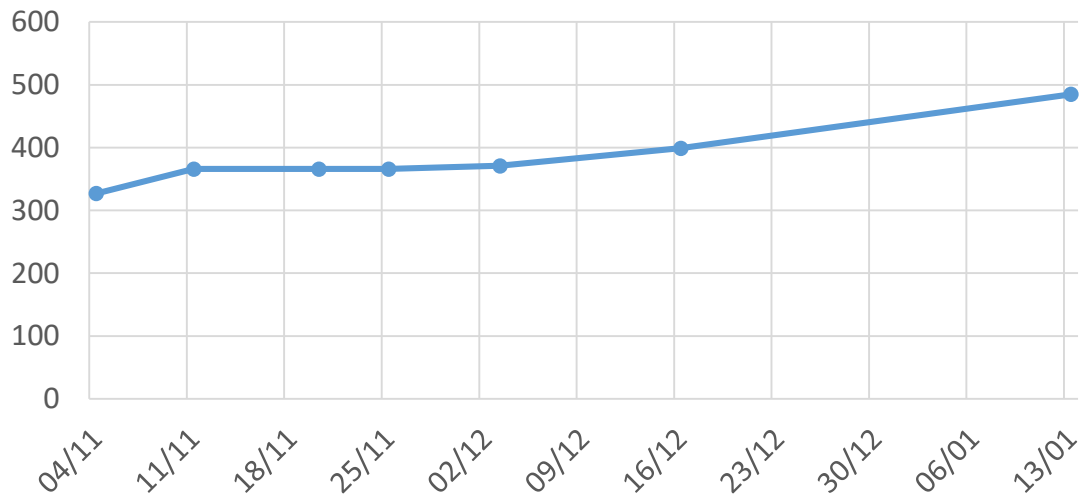

¿Cómo saber **dónde están?**

Ingresa al módulo **WiFi más cercano** en App CDMX







## ¿Cómo funcionan?

---



Funcionan con un radio de cobertura de hasta **50 metros**



Su utilización **no tiene límite de tiempo ni de contenido** y es **totalmente provisto por el Gobierno de la Ciudad**



Velocidad hasta de **20 Mbps**



Hasta **20 personas conectadas simultáneamente** por cada poste

# ILIFE

Tema	Indicador	Periodicidad	Al mes de Diciembre	Al mes de Enero	Próximo reporte
Mantenimiento de escuelas	Porcentaje de avance de mantenimiento de escuelas (línea base: 23 escuelas)	Mensual	89.9%	91.2%	28/01/2020

# ILIFE | Inmuebles escolares en proceso de atención 2018 -2020 en Centro Histórico

No.	Plantel	Porcentaje de avance	Observaciones
1	ESCUELA SECUNDARIA ADRIANA GARCIA CORRAL	44.08 %	
2	TELESECUNDARIA NO. 91	89.70 %	
3	ESCUELA PRIMARIA MARCELINO DÁVALOS	65.12 %	
4	ESCUELA PRIMARIA REPÚBLICA DE PANAMÁ	70.20 %	
5	ESCUELA SECUNDARIA ÁNGEL TRÍAS ÁLVAREZ	97.89 %	
6	ESCUELA PRIMARIA JOAQUÍN GARCÍA ICAZBALCETA	31.50 %	
<b>7</b>	<b>ESCUELA SECUNDARIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ SEC TEC No. 6</b>	<b>100.00 %</b>	<b>TERMINADA ABRIL</b>
<b>8</b>	<b>ESCUELA PRIMARIA REPÚBLICA DE BOLIVIA</b>	<b>100.00 %</b>	<b>TERMINADA ABRIL</b>
<b>9</b>	<b>ESCUELA PRIMARIA ALFREDO E. URUCHURTU</b>	<b>100.00 %</b>	<b>TERMINADA ABRIL</b>
<b>10</b>	<b>ESCUELA PRIMARIA ABRAHAM CASTELLANOS</b>	<b>100.00 %</b>	<b>TERMINADA ABRIL</b>
<b>11</b>	<b>ESCUELA PRIMARIA REPÚBLICA DE ARGENTINA</b>	<b>100.00 %</b>	<b>TERMINADA ABRIL</b>
<b>12</b>	<b>ESCUELA PRIMARIA MIGUEL SERRANO</b>	<b>100.00 %</b>	<b>TERMINADA JUNIO</b>

## ILIFE | Inmuebles escolares en proceso de atención 2018 -2020 en Centro Histórico


No.	Plantel	Porcentaje de avance	Observaciones
13	ESCUELA PRIMARIA SARA MANZANO	100.00 %	TERMINADA SEPTIEMBRE
14	ESCUELA PRIMARIA PABLO MORENO	100.00 %	TERMINADA SEPTIEMBRE
15	ESCUELA SECUNDARIA NO. 1 CÉSAR A. RUÍZ	100.00 %	SE CONCLUYERON TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE BARDA EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019 POR PARTE DE LA FUNDACIÓN ROBERT BOSCH
16	JARDÍN DE NIÑOS ENRIQUE PESTALOZZI	100.00 %	TERMINADA OCTUBRE
17	ESCUELA PRIMARIA FRAY PEDRO DE GANTE	100.00 %	TERMINADA OCTUBRE
18	JARDÍN DE NIÑOS JUAN JACOBO ROUSSEAU	100.00 %	TERMINADA OCTUBRE
19	ESCUELA PRIMARIA LIC. PONCIANO ARRIAGA	100.00 %	TERMINADA OCTUBRE
20	ESCUELA PRIMARIA REPÚBLICA DE LÍBANO	100.00 %	TERMINADA OCTUBRE
21	ESCUELA SECUNDARIA JOSÉ MANUEL RAMOS	100.00 %	TERMINADA OCTUBRE
22	JARDÍN DE NIÑOS CADETES DE LA NAVAL	100.00 %	TERMINADA OCTUBRE
23	ESCUELA NACIONAL PARA CIEGOS LIC. IGNACIO TRIGUEROS	100.00 %	TERMINADA EN OCTUBRE

**ILIFE** | ene 19 – ene 20

**91.2%**

**Avance  
porcentual  
de obra en  
proceso\***

(\*) de una meta de 23 escuelas en el Centro Histórico

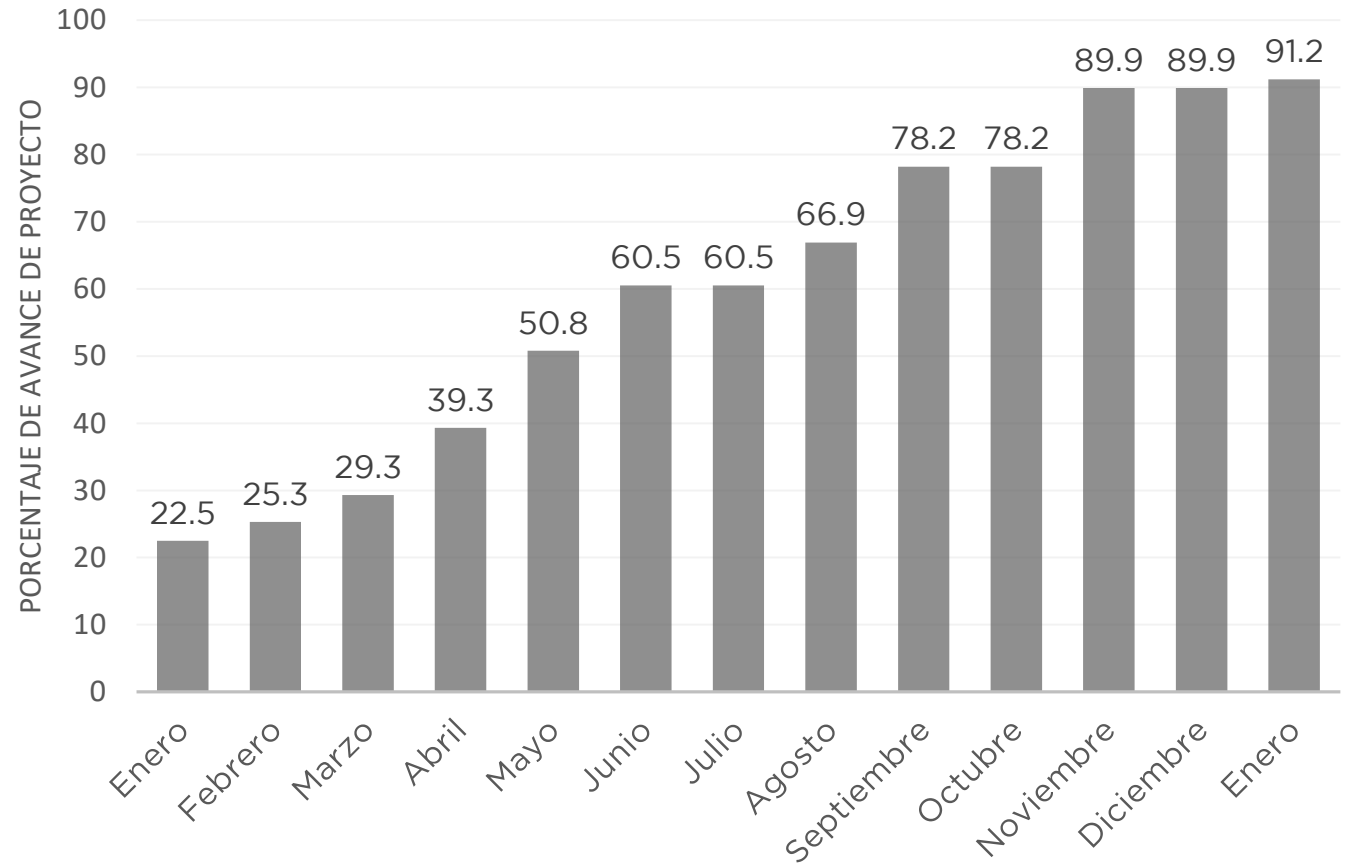



# SEDECO

## MESA DE TRABAJO DE LA AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO 2019 INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR SEDECO

Ciudad de México, a 14 de enero de 2020

**PROGRAMA DE SUPERVISIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, GAS E HIDROSANITARIAS DE LOS 329 MERCADOS PÚBLICOS ANUNCIADO POR EL SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO.**

**Primera Etapa:** Estará integrada por los 50 mercados más grandes y de mayor afluencia que tiene la Ciudad de México.

En la Alcaldía Cuauhtémoc, de 17 grandes mercados contemplados, se revisaron del Centro Histórico (10 mercados públicos): Lagunilla Ropa y telas, Tepito (Granaditas), Tepito Fierros Viejos, Martínez de la Torre, Lagunilla Zona, Tepito Varios, Tepito Zona, Juárez, Arcos de Belem y Lagunilla Varios

En la Alcaldía Venustiano Carranza, de 11 grandes mercados contemplados, se revisaron del Centro Histórico (3 mercados públicos): Merced Nave Mayor, Merced Nave Menor y Merced Banquetón.

La primera etapa dio inicio el 2 de enero involucrando la participación de la SEDECO, Comisión Federal de Electricidad, Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, SENER, Colegio de Ingenieros así como autoridades de las Alcaldía.



# SEDECO

## Programa para el Fomento y Mejoramiento de los Mercados Públicos de la Ciudad de México

Estatus al 31 de diciembre 2019

Alcaldía	Mercado	Obra y Servicio	Fecha de inicio	Fecha término	AVANCE			
					Empresa	Importe del Contrato	Avance físico	Actualización Alcaldía
Cuauhtémoc	San Camilito	REHABILITACIÓN	01/08/2019	21/12/2019	COMERCIALIZADORA Y DESARROLLO INMOBILIARIO VILALVA, S.A. DE C.V.	6,669,870.46	72%	10/12/2019
Cuauhtémoc	Lagunilla Ropa y Telas	REHABILITACIÓN	01/08/2019	21/12/2019	PROYECCIÓN Y DISEÑO EN CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	13,307,986.69	75%	10/12/2019
Cuauhtémoc	San Juan Curiosidades	REHABILITACIÓN	30/07/2019	21/12/2019	DESARROLLO E INGENIERÍA DE OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V.	32,346,718.04	40%	10/12/2019

**NOTA:** El mercado San Juan Curiosidades, fue afectado por el sismo del 19 de septiembre de 2017. Del local siniestrado en días pasado, el local fue restaurado y YA FUE ENTREGADO A LA LOCATARIA.





# SEDECO

## Mercado San Juan Curiosidades

Estatus al 31 de diciembre 2019



Local incendiado



Reparación del local incendiado



Se colocaron racks para que se respete el área de ventas de locales ubicados en la calle de Aranda de San Juan Curiosidades



# MERCADO LA MERCED

Avances por siniestro de incendio 24 de diciembre 2019  
y obra de reconstrucción




GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SEDECO

CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS

# ZONA AFECTADA POR SINIESTRO

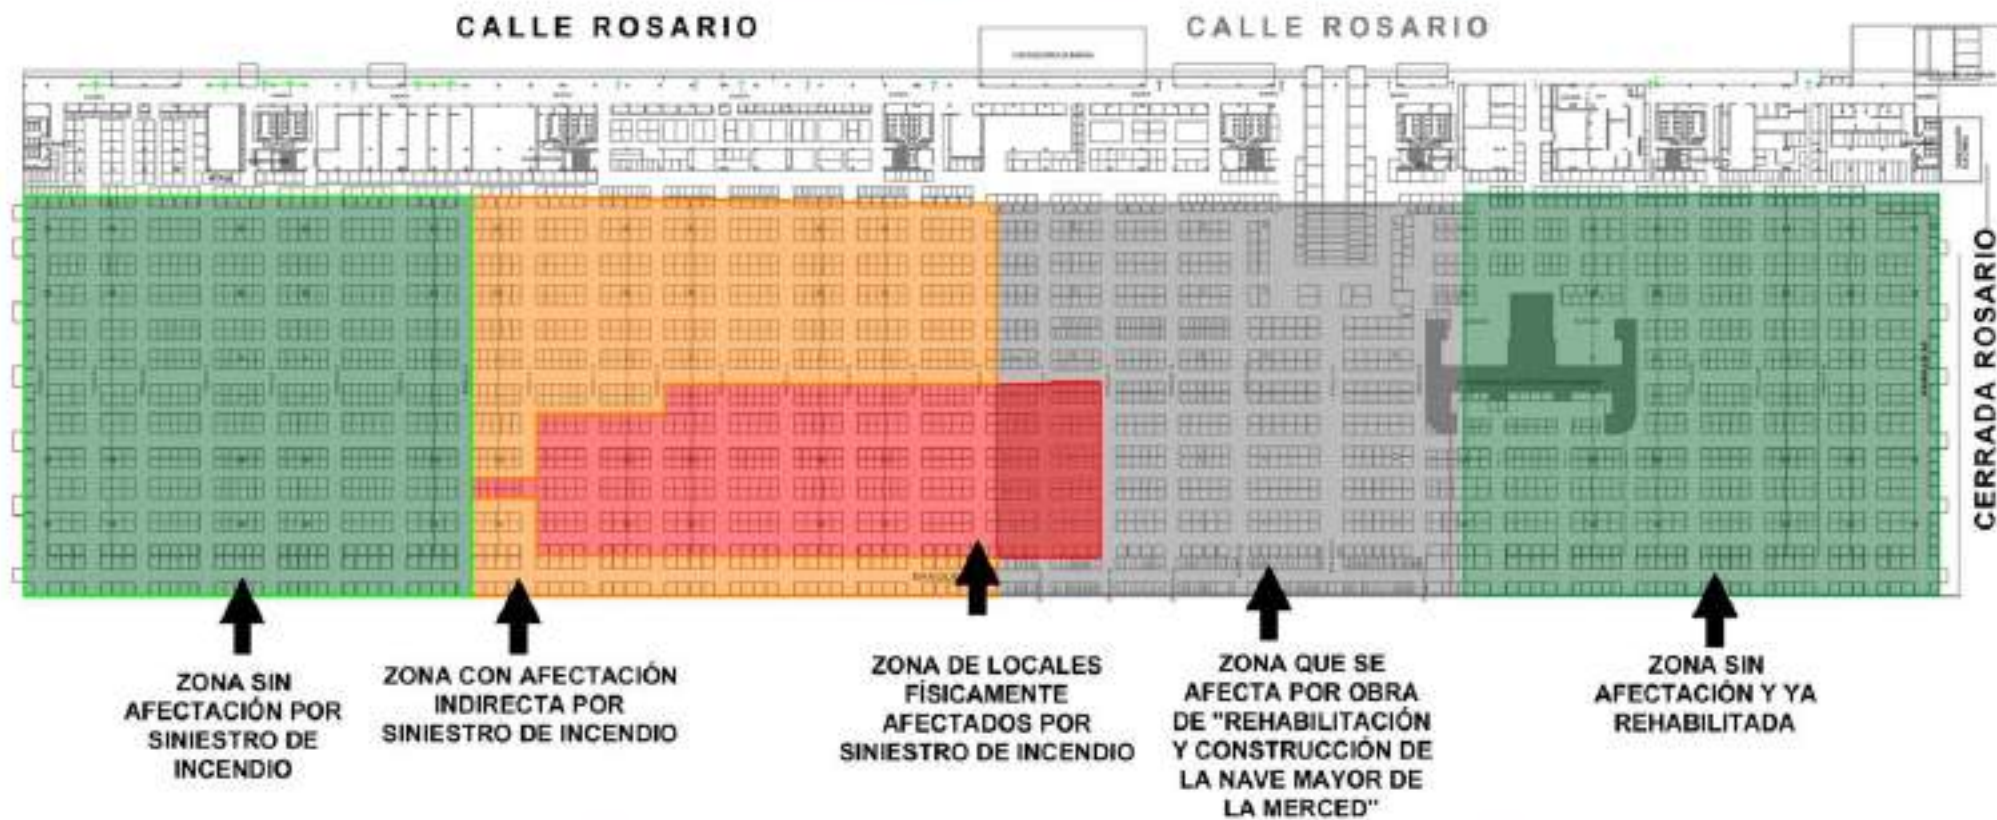

**Locales directamente  
siniestrados**  
(afectados por fuego)

**500**

**Locales indirectamente  
afectados por siniestro:**

**654**

**TOTAL**

**1154  
Locales**



## **Resultados apoyo Seguro de Desempleo y registro CENSO SEDECO.**

- 1061** locales registrados
- 2359** personas registradas (titulares y empleados).
- 150** personas atendidas, de las cuales 27 ya armaron su expediente con FONDESOS.

## **Recepción de información por la STyFE al 9 de enero de 2020.**

Mercado Nave Mayor: **1495 folios**  
Mercado Banquetón: **106 folios**

10 de enero, se atenderá por parte de STyFE con **seguimiento** de SEDECO, la entrega de folios del segundo empleado de las puertas 16 a 23 de la zona en obra.



## Primera etapa de reubicación zona en obra (SOBSE)

Avance:

- 1 Carpa de 10 x 60 metros: 120 locatarios.
- 2 Carpas de 10 x 60 metros: 124 locatarios.
- 3 Carpas de 10 x 20 metros: 28 locatarios



**Faltantes por reubicar para concluir** primera etapa: 164 locales

- Carpa 4 de 15 x 50 metros, en Calle Cerrada de Rosario, con avance de 54 espacios balizados.
  - Falta por balizar 64 espacios.
  - Capacidad Total Proyectada 118.
- Faltaría carpa de 30x 10 para reubicar 46 personas faltantes.



Zonas contempladas para la reubicación de afectados de obra y por siniestro de incendio

# FGJ

Tema	Línea base	Periodicidad	Semana del 6 AL 12/01	Próximo reporte
Infraestructura	Número de delitos en robo de medidor	Semanal	1	28 de enero

No. Carpeta de investigación	Fecha y hora	Delito	Calle	Colonia	Síntesis de los hechos
CI-FCH/CUH-6/UI-1SD/0048/01-2020 T1	08/01/2020 11:53	Robo de objetos		CENTRO DE LA CIUDAD DE MEXICO AREA 1	REFIERE QUE AL LLEGAR AL LOCAL QUE USA COMO BODEGA SE PERCATA QUE HABIAN SUSTRAYENDO EL MEDIDOR DE AGUA

# SSC – SCT – DSOT (Tránsito)

Tema	Unidad de medida	Periodicidad	Del 31/12/2019 AL 13/01	Próximo reporte
Semáforos (141)	Número de semáforos con mantenimiento preventivo	Quincenal	1	24 de enero
	Número de semáforos con mantenimiento correctivo		59	
Cámaras (16)	Número de cámaras con mantenimiento preventivo		1	
	Número de cámaras con mantenimiento correctivo		1	



UNIVERSIDAD DE LEÓN  
CENTRO  
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Reportes

## **Turnos e incidencias urbanas**

Mesas de trabajo

Asuntos generales

Acuerdos

Asistencia

**\*Corte de Transmisión\***

CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS

"2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"





## Matriz de seguimiento a turnos del 31 de Diciembre al 13 de Enero



Dependencia	Atendido	Proceso	Pendiente	Total general
ACH	33	4		37
ADIP	1			1
Al. Cuauhtémoc	17	3	2	22
Al. Venustiano Carranza	7			7
C5	7			7
CFE	7	2		9
ILIFE	1			1
INAH	3			3
INBAL		1		1
Metrobús	1			1
PGJ	3			3
SACMEX	10	1		11
SEDEMA	6	3		9
SEMOVI	1			1
SGIRPC	1			1
SOS-AP	5			5
SOS-DGOIV	9			9
SOS-DGSUS	2			2
SSC	8			8
STC-METRO	1			1
TELMEX	3		1	4
Tránsito	7			7
<b>Total general</b>	<b>133</b>	<b>14</b>	<b>3</b>	<b>150</b>





# TURNOS PENDIENTES

## Del 31 de diciembre al 13 de enero



CLAVE	FECHA DE REPORTE	SOLICITANTE	SOLICITUD	ATIENDE	ESTATUS	FECHA DE ATENCIÓN	OBSERVACIONES
TCH-164	23/12/2019	SOS-DGOIV	Reubicar acometidas de postes de alumbrado público que se van a retirar en la calle de Violeta y Riva Palacio	TELMEX	Pendiente		



# Matriz de seguimiento a Incidencias del 31 de diciembre al 13 de enero



Dependencia	Atendido	Pendiente	Proceso	Total general
ACH	1,364	19	2	1,385
Al. Cuauhtémoc	48	25		73
Al. Venustiano Carranza	4	1		5
C-5	3			3
CFE	143	64	6	213
CIS	1	3		4
IUSACELL		2		2
MCM TELECOM		1		1
SACMEX	150	22	4	176
SEDEMA		1	2	3
SGIRyPC	1			1
SOS-AP	131	11	2	144
SOS-DGOIV	13	19		32
SOS-DGSUS		7		7
STC-METRO	3			3
TELMEX	60	4	2	66
TOTAL PLAY	1			1
Tránsito	38	1	1	40
<b>Total general</b>	<b>1,960</b>	<b>180</b>	<b>19</b>	<b>2,159</b>



## VIPP 2. CALLEJÓN DEL 57 - PLAZA DE LA CONCEPCIÓN

Peticiones atendidas vía chat del 31 de diciembre al 13 de enero



TOTAL	TEMA	UBICACIÓN	CALLE	Y CALLE	ATENDIÓ
1	Reparación de tapa de registro	Plaza Garibaldi			ACH
1	Reparación de alumbrado público	Eje Central	Plaza Garibaldi	República de Ecuador	SOS-AP





## VIPP 3. SANTO DOMINGO

Peticiones atendidas vía chat del 31 de diciembre al 13 de enero



TOTAL	TEMA	UBICACIÓN	CALLE	Y CALLE	ATENDIÓ
1	Fuga de agua	Palma	República de Cuba	Donceles	SACMEX
1	Reparación de alumbrado público	Palma	República de Cuba	Donceles	SOS-AP







## VIPP 4. ALAMEDA SECTOR FINANCIERO

Peticiones atendidas vía chat del 31 de diciembre al 13 de enero



TOTAL	TEMA	UBICACIÓN	CALLE	Y CALLE	ATENDIÓ
1	Falta tapa de registro	Venustiano Carranza	Isabel la Católica	Bolívar	CFE





# Atención VIPPSC




## VIPP 5. ZÓCALO

Peticiones atendidas vía chat del 31 de diciembre al 13 de enero



TOTAL	TEMA	UBICACIÓN	CALLE	Y CALLE	ATENDIÓ
1	Tapa de registro en mal estado	Correo Mayor	Moneda		ACH
1	Falla en alumbrado público	Plaza Seminario			SOS-AP

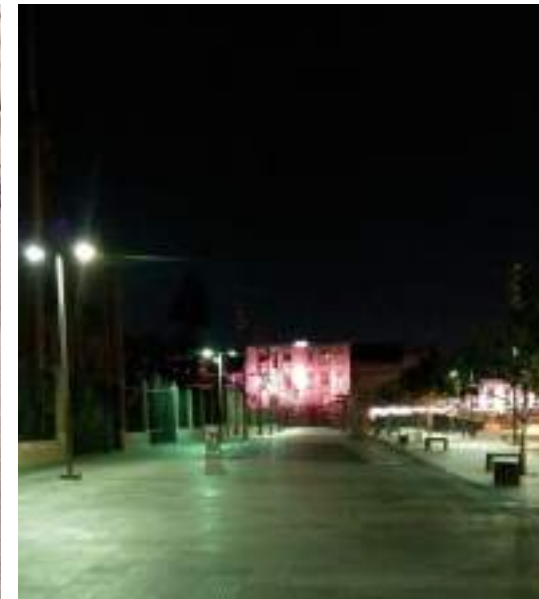



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



# Atención VIPPSC



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

## VIPP 7. VIZCAÍNAS CORREDOR CULTURAL REGINA

Peticiones atendidas vía chat del 31 de diciembre al 13 de enero



TOTAL	TEMA	UBICACIÓN	CALLE	Y CALLE	ATENDIÓ
1	Falla en semáforos	5 de febrero	San Jerónimo		Tránsito







# Atención VIPPSC



## VIPP 8. SAN PABLO



Peticiones atendidas vía chat del 31 de diciembre al 13 de enero

TOTAL	TEMA	UBICACIÓN	CALLE	Y CALLE	ATENDIÓ
1	Desazolve	Misioneros	Santo Tomás		Sacmex







# INCIDENCIAS EN PROCESO

Del 31 de diciembre al 13 de enero



CLAVE	FECHA DE REPORTE	IDENTIFICA	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS
IUCH-1202	11/01/2020	VIPP 2 Callejón del 57 Plaza de la Concepción	Fuga de agua potable	ÓRGANO		EJE CENTRAL (LÁZARO CARDENAS)				SACMEX	Proceso



# INCIDENCIAS PENDIENTES

Del 31 de diciembre al 13 de enero



CLAVE	FECHA DE REPORTE	IDENTIFICA	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS
IUCH-1176	01/01/2020	VDDP 7 Vizcainas Corredor Cultural Regina	Rejilla en mal estado	VIZCAINAS		EJE CENTRAL (LAZARO CARDENAS)	Esquina			CFE	Pendiente
IUCH-1177	02/01/2020	VIPP 3 Santo Domingo	Tapa de registro en mal estado	DEL CARMEN		REPÚBLICA DE BOLIVIA	Esquina			CFE	Pendiente
IUCH-1179	03/01/2020	VIPP 8 San Paolo	Tapa de registro en mal estado	JESÚS MARÍA		MESONES	Esquina			TELMEK	Pendiente



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO






# INCIDENCIAS PENDIENTES

Del 31 de diciembre al 13 de enero



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

CLAVE	FECHA DE REPORTE	IDENTIFICACION	SOLICITUD	UBICACION	ENTRE CALLE	Y CALLE	REFERENCIA	FOTOGRAFIA ANTES	FOTOGRAFIA DESPUES	ATIENDE	ESTATUS
IUCH-180	03/01/2020	VIPP 7 Vizcainas Corredor Cultural Regina	Rejilla en mal estado	JOSÉ MARIA IZAZAGA		CALLEJÓN DE MEZAHUALCÓYOTL	Esquina			CFE	Pendientes
IUCH-182	31/12/2019	VIPP 3 Santo Domingo	Retiro de casete telefónica	DONCELES		PALMA	Esquina			TELMEX	Pendientes
IUCH-183	31/12/2019	VIPP 3 Santo Domingo	Fuga de agua potable	SAN ILDEFONSO		REPÚBLICA DE ARGENTINA	Frente al local de Waffles			SACMEX	Pendientes



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



# INCIDENCIAS PENDIENTES

Del 31 de diciembre al 13 de enero



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

CLAVE	FECHA DE REPORTE	IDENTIFICA	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	V CALLE	REFERENCIA	FOTOGRAFIA ANTES	FOTOGRAFIA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS
IUCH-1184	01/01/2020	VIRP 5 Zocalo	Fuga de agua potable	VENUSTIANO CARRANZA	PALMA	5 DE FEBRERO	Frente al 74			SACMEX	Pendiente
IUCH-1185	02/01/2020	VIRP 3 Callejón del 57 Plaza de la Concepción	Tapa de bóveda deteriorada	REPÚBLICA DE PERÚ		INCAS	Esquina			OFE	Pendiente
IUCH-1187	04/01/2020	VIRP 1 Santa María la Redonda	Fuga de agua potable	PENSADOR MEXICANO	EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	PLAZA 2 DE ABRIL	caso eq. eje central			SACMEX	Pendiente
IUCH-1194	09/01/2020	VIRP 6 Antigua Merced Mixcalco	Desazolve de coladera	SOLEDAD		MARGIL	Frente al No. 52 A			SACMEX	Pendiente



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
CULTURA Y  
PATRIMONIO  
HISTÓRICO

# INCIDENCIAS PENDIENTES

## Del 31 de diciembre al 13 de enero



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

CLAVE	FECHA DE REPORTE	IDENTIFICA	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS
SUCH-1195	09/01/2020	VIPP 6 Antigua Merced Mixcalco	Desazolve de coladera	SOLEDAD		JESÚS MARÍA	Esquina			SACMEX	Pendientes
SUCH-1196	09/01/2020	VIPP 6 Antigua Merced Mixcalco	Desazolve de coladera	SOLEDAD		ACADEMIA	Esquina			SACMEX	Pendientes
SUCH-1197	09/01/2020	VIPP 4 Alameda Sector Financiero	Falta en alumbrado público	PLAZA DE LA SOLIDARIDAD	DR. MORA	BALDERAS				Al Cuauhtémoc	Pendientes





# INCIDENCIAS PENDIENTES

## Del 31 de diciembre al 13 de enero



CLAVE	FECHA DE REPORTE	IDENTIFICA	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUES	ATIENDE	ESTATUS
IUCH-1199	10/01/2020	VIPP 6 Antigua Merced Mixcalco	Tapa de registro rota	JUSTO SIERRA		EL CARMEN				CFE	Pendiente
IUCH-1200	11/01/2020	VIPP 3 Santo Domingo	Fuga de agua potable	PLAZA DEL ESTUDIANTE	AZTECAS	FLORIDA	Afuera del No. 21			SACMEX	Pendiente
IUCH-1201	11/01/2020	VIPP 2 Callejón del 57 Plaza de la Concepción	Cable de luz tirado	REPÚBLICA DE CHILE		REPÚBLICA DE CUBA	Esquina			CFE	Pendiente
IUCH-1204	12/01/2020	VIPP 8 San Pablo	Desazolve de coladera	ROLDÁN	MISIONEROS	SAN PABLO				SACMEX	Pendiente



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO






# INCIDENCIAS PENDIENTES

Del 31 de diciembre al 13 de enero



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

CLAVE	FECHA DE REPORTE	IDENTIFICA	SOLICITUD	UBICACION	ENTRE CALLE	Y CALLE	REFERENCIA	FOTOGRAFIA ANTES	FOTOGRAFIA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS
IUCH-1206	13/01/2020	VIPP 3 Santo Domingo	Falta en semáforos	REPÚBLICA DE COSTA RICA		MANUEL DOBLADO				Tránsito	Pendiente
IUCH-1207	13/01/2020	VIPP 2 Callejón del 57 Plaza de la Concepción	Falta en acometida	PALHA		REPÚBLICA DE CUBA	Esquina			CFE	Pendiente
IUCH-1208	13/01/2020	VIPP 6 Antigua Merced Mixcalco	Desarrolve de coladera	PLAZA LORETO	SAN ILDEFONSO	JUSTO SIERRA	Frente al No. 8			SACMEX	Pendiente
IUCH-1209	13/01/2020	VIPP 6 Antigua Merced Mixcalco	Falta tapa de registro	PLAZA LORETO	SAN ILDEFONSO	JUSTO SIERRA	Frente al No. 8			SACMEX	Pendiente



UNIVERSIDAD DE LEÓN  
CENTRO  
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Reportes

Turnos e incidencias urbanas

## Mesas de trabajo

Asuntos generales

Acuerdos

Asistencia

**\*Corte de Transmisión\***

CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS

"2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"



## Dependencias participantes

- INAH
- INBAL
- CULTURA
- AL. Cuauhtémoc
- AL. V. Carranza
- FCH
- SEDEMA
- SGIRPC
- INVEA
- PAOT
- FEDAPUR
- SSC - TRÁNSITO

## Objetivo

- Proteger el patrimonio histórico, cultural y arquitectónico del Centro Histórico.

## Metas 2020

- Identificar obras sin los permisos previos e implementar el Protocolo de Atención a Obras Irregulares.
- Realizar mesas de seguimiento a las obras irregulares identificadas.
- Actualizar información la Guía de Buenas Prácticas para Intervenciones en Edificios Históricos cuando sea necesario.
- Fortalecer la campaña permanente de denuncia de obras irregulares.

# Mesa de Gestión Integral de Grasas y Residuos Sólidos



## Dependencias participantes

- SEDEMA
- SGIRPC
- AL. Cuauhtémoc
- AL. V. Carranza
- SEDECO
- SOS
- SACMEX
- CULTURA
- FCH
- SGIRPC

## Objetivo

- Implementar acciones para prevenir el vertido de grasas y aceites al drenaje y el mal manejo de los residuos sólidos.

## Metas 2020

- Promover el buen manejo de residuos de aceites y grasas en establecimientos mercantiles para evitar afectaciones a la infraestructura hidráulica y prevenir riesgos.
- Erradicar los tiraderos clandestinos en la vía pública

# Mesa de Prevención de Riesgos

## Objetivo

- Ejecutar acciones encaminadas a prevenir y/o eliminar riesgos para las personas en el espacio público e inmuebles del Centro Histórico.

## Metas 2020

- Identificar, balizar y socializar todas las zonas de menor riesgo en el perímetro A del Centro Histórico
- Reparar el 100% de los desperfectos en el espacio público que generen riesgo para las personas
- Eliminar el 100% de los "diablitos" de robo de energía eléctrica en el espacio público del perímetro A.
- Eliminar la flora parasita y limpiar de manera correctiva cornisas en inmuebles afectados
- Gestionar la atención a los inmuebles en alto riesgo

## Dependencias participantes

- SGIRPC
- ISC
- AL. Cuauhtémoc
- AL. V. Carranza
- CFE
- SSC
- SOS-DGSUS



UNIVERSIDAD DE LEÓN  
CENTRO  
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Reportes

Turnos e incidencias urbanas

Mesas de trabajo

**Asuntos generales**

Acuerdos

Asistencia

**\*Corte de Transmisión\***

CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS

"2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"

# RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS EN EL CENTRO HISTÓRICO BARRIO ANTIGUA MERCED

Inversión: 55.92 mdp    Área total intervenida: 22,815 m<sup>2</sup>    Personas beneficiadas: 503,800



- Calle Soledad (Circunvalación-Correo Mayor)
- Calle Leona Vicario (República de Venezuela-República de Guatemala)
- Calle Emiliano Zapata (Academia-Mergil)
- Callejón de Lecheras
- Calle De la Santísima (Soledad-República Guatemala)
- Plaza Loreto





INSTITUTO DEL  
CENTRO  
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

## RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS EN EL CENTRO HISTÓRICO — BARRIO ANTIGUA MERCED —



### Acciones

- 3,469 Plantas, arbustos y cubre suelos
- 136 Árboles
- 276 Luminarios tipo LED
- 3,000 m<sup>2</sup> de área verde
- 6,000 m<sup>2</sup> de arroyo vehicular
- 13,815 m<sup>2</sup> de banquetas atendidas
- 181 Bolardos colocados
- 20 Racks para bicicleta
- Renovación y nivelación de pavimentos e infraestructura
- Retiro de mobiliario urbano obsoleto
- Implementación de cruces seguros
- Incorporación de arbolado y vegetación arbustiva
- Incorporación de señalización horizontal y vertical
- Implementación de mobiliario urbano de estancia
- Mantenimiento a fuente y bancas



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE SANTIAGO

SECRETARÍA DE  
URBANA Y RESIDENCIAL

CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS

BUENA  
CABA

CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS

“2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”



INSTITUTO DEL  
CENTRO  
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

# RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS EN EL CENTRO HISTÓRICO BARRIO ANTIGUA MERCED



Antes



Después

PLAZA LORETO



Antes



Después

CALLE SOLEDAD



Antes



Después

CALLE DE LA SANTÍSIMA



SECRETARÍA DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
OBRAS Y SERVICIOS

CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS

MAESTRA  
CASA

CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS

"2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"





INSTITUTO DEL  
CENTRO  
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

## RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS EN EL CENTRO HISTÓRICO — BARRIO ANTIGUA MERCED —



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO


SECRETARÍA DE  
URBANO Y SERVICIOS

CIUDAD INNOVADORA  
Y DE SERVICIOS

BUENA  
CASA

CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS

"2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"



# Sustitución de líneas de **Agua Potable y Drenaje** en el Centro Histórico de la Ciudad de México



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



SACMEX

CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS





**Monto total de las obras**  
 Soledad: \$ 6, 950,227.68  
 Leona Vicario: \$ 7, 801,914.58  
**\$ 14, 752, 142. 26**

**Agua Potable:**  
 Soledad: 572 m  
 Leona Vicario: 539 m  
**1, 111 m colocados**  
 15 cm de diámetro

**Drenaje:**  
 Soledad: 529 m  
 Leona Vicario: 499 m  
**1,028 m colocados**  
 38 y 45 cm de diámetro



## Instalación de tubería de PAD por el procedimiento constructivo de excavación a cielo abierto y perforación direccional.



Instalación en zanja a cielo abierto



Instalación con perforación direccional



**Instalación de tren de piezas especiales y caja de válvulas para operación y seccionamiento.**



**Piezas especiales fabricadas  
con hierro fundido.**





**Construcción de pozos de visita y colocación de brocales para inspección y mantenimiento de la línea de drenaje.**

**Pozos de visita:  
Soledad 8  
Leona vicario 11**





**Instalación de rejillas  
sobre la calle Leona  
Vicario, evita causar  
daños a la Iglesia de  
la Santísima, en  
coordinación con el  
INAH.**







## Tomadas domiciliarias agua potable y descargas de drenaje.



LEONA VICARIO: 53  
SOLEDAD: 48  
Agua Potable



LEONA VICARIO: 53  
SOLEDAD: 48  
Drenaje



UNIVERSIDAD DE LEÓN  
CENTRO  
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Reportes

Turnos e incidencias urbanas

Mesas de trabajo

Asuntos generales

**Acuerdos**

**Asistencia**

**\*Se reanuda  
transmisión en vivo\***

CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS

"2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"



UNIVERSIDAD DE LEÓN  
CENTRO  
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

# PRÓXIMA SESIÓN

28 de enero de 2020  
A las 10:30 horas

**\*Transmisión en vivo\***

CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS

"2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"
