



# MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO





# Inicio de la transmisión en vivo

14 DE MAYO 2019



# Orden del día

- Reportes
- Turnos e incidencias urbanas
- Mesas de trabajo
- Asuntos generales
- Acuerdos
- Asistencia



# ACH

Tema	Línea base	Periodicidad	Semana al 07/05	Semana al 14/05	Próximo reporte
Tiraderos clandestinos	Metros cúbicos de residuos sólidos levantados en tiraderos clandestinos en el perímetro de ACH	Quincenal	1,597	1,459	28 de mayo
Limpieza	Metros cúbicos de basura recolectada en el Perímetro de la ACH (Producto de Barrido)	Quincenal	2,333	2,336	28 de mayo



## ACCIONES POR CALLES DEL 29 DE ABRIL AL 13 DE MAYO

- 16 de Septiembre
- Palma
- 5 de Febrero
- Corredor Dr. Mora
- Plaza de la Constitución
- Av. Juárez, 5 de Mayo, Circuito  
Plaza de la Constitución
- Av. Juárez, Artículo 123, Venustiano  
Carranza y 5 de Febrero
- Venustiano Carranza
- República de Uruguay
- Tacuba
- República de Cuba
- Regina
- San Jerónimo
- Ángela Peralta
- República de Chile



## RETIRO DE GRAFITI

Total de cortinas	1,252 piezas
Área de cortinas metálicas pintadas	13,358 m <sup>2</sup>
Total de fachadas	354 fachadas
Área de fachadas pintadas	5,604 m <sup>2</sup>
Colocación de antigrafiti	112 m <sup>2</sup>
Grafiti despintado con thinner	1,875 m <sup>2</sup>
<b>Total de grafiti retirado</b>	<b>20,949 m<sup>2</sup></b>



## GALERÍA NOCTURNA DE ARTE URBANO MÁS GRANDE DE AMÉRICA

- Se demostró la inclusión que muestra el gobierno de la ciudad mediante el contacto directo establecido entre la Jefa de Gobierno y la ciudadanía por medio de las **audiencias públicas**.
- Proponiendo el **arte urbano como alternativa al grafiti ilegal** y como una expresión que convive y respeta los inmuebles sin causar daño al patrimonio.
- En un trabajo conjunto entre los empresarios de las calles de las novias, la **SSC (Unidad Grafiti)**, los **artistas urbanos** y la **Autoridad del Centro Histórico**, en una primera etapa, se pintarán **36 obras** de arte sobre cortinas metálicas

## GALERÍA NOCTURNA DE ARTE URBANO MÁS GRANDE DE AMÉRICA





## GALERÍA NOCTURNA DE ARTE URBANO MÁS GRANDE DE AMÉRICA





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL  
CENTRO  
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

## GALERÍA NOCTURNA DE ARTE URBANO MÁS GRANDE DE AMÉRICA



## Alc. Cuauhtémoc

Tema	Línea base	Periodicidad	Semana al 23/04	Semana al 30/04	Semana al 07/05	Semana al 14/05	Observaciones
Luminarias	Número de Luminarias reparadas en vías secundarias en PB de Cuauhtémoc	Semanal	39	19	--	67	
Obra	Reparación de banquetta	Quincenal	2 m <sup>2</sup>	6 m <sup>2</sup>	--	49 m <sup>2</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reparaciones en Mesones, Rep. de Brasil y Belisario Domínguez.</li> </ul>
Poda	Liberación de luminarias	Semanal	17 sujetos forestales	34	--	30	



## Alc. Cuauhtémoc

Tema	Línea base	Periodicidad	Semana al 23/04	Semana al 30/04	Semana al 07/05	Semana al 14/05	Observaciones
Desazolve	Red de drenaje desazolvada en PB de Cuauhtémoc (m lineales)	Semanal	85 m	262 m	--	215 m	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 215 ml de desazolve,</li> <li>• 9 coladeras de banquetas liberadas</li> <li>• 99 rejillas de piso</li> </ul>
Limpia (Colecta de sólidos)	Escuelas limpias y toque de campana.	Semanal	167 m <sup>3</sup>	219 m <sup>3</sup>	--	522 m <sup>3</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 38 m<sup>3</sup> orgánicos</li> <li>• 484 inorgánicos</li> </ul>

# Alc. Cuauhtémoc

## Luminarias

REPORTE DE LUMIARIAS REPARADAS EN LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC						
FECHA	DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		COLONIA	CANTIDAD	MOTIVO
30/04 al 06/05	<b>PEÑA Y PEÑA</b>	GONZALEZ ORTEGA	VIDAL ALCO CER	CENTRO ORIENTE	15	
30/04 al 06/05	<b>NACIONAL # 19</b>	MANUEL DOBLADO	VIDAL ALCO CER	CENTRO ORIENTE	8	
07/05 al 14/05	<b>PLAZA SANTA CATARINA</b>	REP. HONDURAS	REP. DE BRASIL	CENTRO NORTE		TOMA DE CORRIENTE
07/05 al 14/05	<b>5 DE FEBRERO</b>	IZAZAGA	FRAY SERVANDO	CENTRO CENTRO	26	
07/05 al 14/05	<b>CALLEJON DE LA CONDESA</b>	5 DE MAYO	TACUBA	CENTRO CENTRO	1	TIPO BELLOTA
07/05 al 14/05	<b>ART. 123</b>	BALDERAS	REVILLAGIGEDO	CENTRO ALAMEDA	9	
07/05 al 14/05	<b>JESUS MA</b>	FRAY SERVANDO	SAN PABLO	CENTRO MERCED	2	
07/05 al 14/05	<b>TALavera</b>	RAMON CORONA	REP. SALVADOR	CENTRO MERCED	5	
07/05 al 14/05	<b>JESUS MA</b>	FRAY SERVANDO	SAN PABLO	CENTRO MERCED	1	
<b>TOTAL</b>					<b>67</b>	

# Alc. Cuauhtémoc

## Desazolve

REPORTE DE DESAZOLVES REALIZADOS EN LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC						
FECHA	DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		COLONIA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
30/04 al 06/05	<b>INDEPENDENCIA</b>	BALDERAS	REVILLAGIGEDO	CENTRO ALAMEDA	22	
30/04 al 06/05	<b>LECUMBERRI</b>	MANUEL DOBLADO	CIRCUNVALACION	CENTRO MERCED	100 MTS	
30/04 al 06/05	<b>LUIS MOYA</b>	INDEPENDENCIA		CENTRO ALAMEDA		SUMINISTRO DE PINTURA
30/04 al 06/05	<b>LECUMBERRI # 35 Y 37</b>	CIRCUNVALACION	MANUEL DOBLADO	CENTRO ALAMEDA		SUMINISTRO DE IMPERMIABILIZANTE
30/04 al 06/05	<b>BUCARELI</b>	TOLSA	GRAL PRIM	CENTRO ALAMEDA	8 MTS	
30/04 al 06/05	<b>FRANCISCO DE GARAY</b>	ESQ AV. CHAPULTEPEC			3 MTS	
07/05 al 14/05	<b>INDEPENDENCIA</b>	EJE CENTRAL	REVILLAGIGEDO	CENTRO ALAMEDA	22 MTS	DESAZOLVE
07/05 al 14/05	<b>MOTOLINIA # 11</b>	5 DE MAYO	TACUBA	CENTRO CENTRO	14 MTS	DESAZOLVE
07/05 al 14/05	<b>5 DE MAYO # 39</b>	MOTOLINIA	ISABEL LA CATOLICA	CENTRO CENTRO	4 MTS	DESAZOLVE
07/05 al 14/05	<b>REP.PERU# 120</b>	ARGENTINA	BRASIL	CENTRO NORTE	18 MTS	DESAZOLVE
07/05 al 14/05	<b>MARQUEZ STERLING # 2</b>	LUIS MOYA	REVILLAGIGEDO	CENTRO ALAMEDA		RETIRO DE 10 COSTALES ESCOMBRO
07/05 al 14/05	<b>GONZALEZ ORTEGA # 24</b>	BERRIOZABAL	COSTA RICA	CENTRO NORTE	20 MTS	DESAZOLVE CANALETA DE PISO
07/05 al 14/05	<b>TRES GUERRAS</b>	EMILIO DONDE	GRAL PRIM	CENTRO ALAMEDA	4 MTS	DESAZOLVE COLADERA DE BANQUETA
07/05 al 14/05	<b>REP. BRASIL</b>	REP DE CUBA	PALMA NTE	CENTRO NORTE		REPARACION DE 1 M2 DE BANQUETA
07/05 al 14/05	<b>MESONES</b>	CORREO MAYOR	PINO SUAREZ	CENTRO MERCED		REPARACION DE 45 M2 DE BANQUETA
07/05 al 14/05	<b>BELIZARIO DOMINGUEZ # 60</b>	PALMA	ISABEL LA CATOLICA	CENTRO NORTE		REPARACION DE 3 M2 CON ACABADO EN COLOR NEGRO
				<b>TOTAL</b>	<b>215 MTS</b>	

# Alc. Cuauhtémoc

## Podas

REPORTE DE PODAS REALIZADOS EN LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC						
FECHA	DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		COLONIA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
30/04 al 06/05	<b>CJON DEL HORMIGUERO</b>	ESQ. N. OTE.	C/SAN MIGUEL	CENTRO MERCED	2	
30/04 al 06/05	<b>ROLDAN</b>	CIRCUNVALACION				ARBOL CAIDO
30/04 al 06/05	<b>FRAY SERVANDO</b>	ROLDAN		CENTRO MERCED	5	
30/04 al 06/05	<b>SAN PABLO</b>	ESQ LAS CRUCEES		CENTRO MERCED	1	
30/04 al 06/05	<b>SAN PABLO # 40</b>	TOPACIO	ROLDAN	CENTRO MERCED	8	
30/04 al 06/05	<b>CORREO MAYOR # 19</b>	REGINA	SAN PABLO	CENTRO MERCED	1	
30/04 al 06/05	<b>SAN PABLO</b>	TOPACIO	ROLDAN	CENTRO MERCED	7	
07/05 al 14/05	<b>REP. ECUADOR # 66</b>	COMONFORT	PALMA NORTE	CENTRO NORTE	2	
07/05 al 14/05	<b>PLAZA SAN JERONIMO</b>	5 DE FEBRERO	ISABEL LA CATOLICA	CENTRO CENTRO	1	RETIRO APUNTO DE CAERSE
07/05 al 14/05	<b>REGINA # 129</b>	LAS CRUCES	CORREO MAYOR	CENTRO MERCED	1	
07/05 al 14/05	<b>LAS CRUCES # 42 Y 44</b>	MESONES	REGINA	CENTRO MERCED		TRABAJO SIN REALIZAR POR FALTA DE ESPACIO
07/05 al 14/05	<b>JESUS MA</b>	MEDICO MILITAR	HOSPITAL JUAREZ	CENTRO MERCED	1	ALTURA 20 MTS
07/05 al 14/05	<b>INDEPENDENCIA #40</b>	LUIS MOYA	JOSE MA MARROQUI	CENTRO ALAMEDA		LA PODA DESTE LUGAR YA ESTABA HECHA
07/05 al 14/05	<b>5 DE MAYO # 29</b>	BOLIVAR	MOTOLINIA	CENTRO CENTRO		LIBERACION DE VENTANAS
07/05 al 14/05	<b>CJON CONDESA</b>	5 DE MAYO	TACUBA	CENTRO CENTRO	1	
<b>TOTAL</b>					<b>30</b>	



## Alc. Venustiano Carranza

Tema	Línea base	Periodicidad	Semana al 23/04	Semana al 30/04	Semana al 07/05	Semana al 14/05
Luminarias	Número de Luminarias reparadas en vías secundarias	Semanal	7	4	0	0
Tiraderos clandestinos	Toneladas de residuos sólidos recolectados de tiraderos clandestinos en el PB de VC (línea base: 26 tiraderos)	Semanal	--	<b>500.5 m<sup>3</sup></b>	--	<b>970.2 m<sup>3</sup></b> (31.5 ton diarias)
Desazolve	Red de drenaje desazolvada en PB de VC (metros lineales)	Semanal	--	--	--	--



# Alc. Venustiano Carranza

# Tiraderos Clandestinos


RELACION DE TIRADEROS CLANDESTINOS				
N°. CONSECUTIVO	UBICACIÓN	TIPO DE RESIDUOS SÓLIDOS %	CANTIDAD TONS	SECTOR
01	MIGUEL DOMINGUEZ Y PENITENCIARIA COL. AMPLIACIÓN PENITENCIARIA	90% BASURA 10% CASCAJO	1.25	S-1
02	EJE 1 NORTE Y HORTELANOS COL. MORELOS	90% BASURA 10% CASCAJO	3	S-1
03	AV. CIRCUNVALACIÓN ENTRE HÉROES DE NACÓZARI Y SAN ANTONIO TOMATLAN	85% BASURA 15% CASCAJO	1	S-2
04	ZAPATA ESQ. AV. CIRCUNVALACIÓN	85% BASURA 15% CASCAJO	1.25	S-2
05	NACIONAL ESQ. VIDAL ALCOCER	85% BASURA 15% CASCAJO	1	S-2
06	COSTA RICA ESQ. VIDAL ALCOCER	85% BASURA 15% CASCAJO	1.5	S-2
07	PEÑA Y PEÑA ESQ. VIDAL ALCOCER	85% BASURA 15% CASCAJO	0.5	S-2
08	VIDAL ALCOCER Y BERRIOZABAL COL. MORELOS	85% BASURA 15% CASCAJO	2	S-2
09	AV. CIRCUNVALACIÓN Y G. PEDRAZA (MERCADO DULCES I) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	2	S-9
10	AV. CIRCUNVALACIÓN Y CARRIZAL (MERCADO DE FLORES) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.5	S-9
11	AV. CIRCUNVALACIÓN Y CARRETONES (METRO MERCED) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	1	S-9
12	JUAN DE LA GRANJA Y CORREGIDORA (LAS CANCHAS) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.2	S-9
13	SANTA ESCUELA Y CUADRANTE DE LA SOLEDAD COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.4	S-9

RELACION DE TIRADEROS CLANDESTINOS				
N°. CONSECUTIVO	UBICACIÓN	TIPO DE RESIDUOS SÓLIDOS %	CANTIDAD TONS	SECTOR
15	AV. CIRCUNVALACIÓN Y SOLEDAD COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	2	S-9
16	AV. CIRCUNVALACIÓN Y MANZANARES COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	2.5	S-9
17	JUAN PABLO ESQ. CORREGIDORA COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.3	S-9
18	CONGRESO DE LA UNIÓN ESQ. GENERAL ANAYA COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.2	S-9
19	GENERAL ANAYA ESQ. JUAN DE LA GRANJA COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.3	S-9
20	JUAN DE LA GRANJA ESQ. SAN CIPRIAN COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	2.5	S-9
21	CORREGIDORA Y SAN SIMÓN COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	0.2	S-9
22	PLAZA DE LA SOLEDAD, SAN SIMÓN Y SANTA ESCUELA COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	0.5	S-9
23	TOLVA 2 COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	3.1	S-9
24	TOLVA 3 COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	3	S-9
25	AV. CIRCUNVALACIÓN Y CARRETONES COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	0.5	S-9
26	JUAN DE LA GRANJA ESQ. SAN CIPRIAN COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	0.4	S-9



# Alc. Venustiano Carranza

## Tiraderos Clandestino

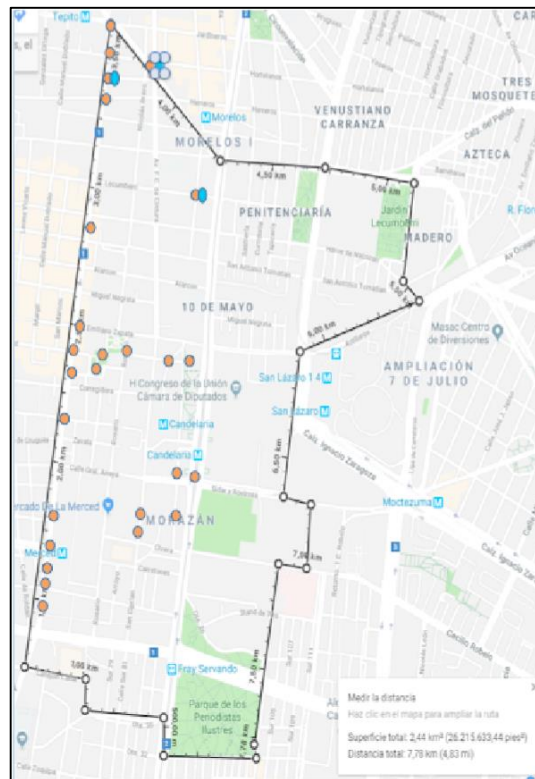

Montón Tradicional



Recolección de cascajo






# Sacmex




Tema	Línea base	Periodicidad	Semana al 14/05	Próximo reporte
Desazolve de red. Perímetro "A" y "B"	Red de drenaje desazolvada (m lineal) <b>Complemento del Perímetro "B"</b>	Quincenal	Atarjeas: 12,400 ml	28 de mayo
			Pozos de Visita: 264 pzas	
			Rejilla de Piso: 177 pzas	
			Coladeras Pluviales: 1,168 pzas	
			Albañal: 1,430 ml	



## CROQUIS AVANCE DE LIMPIEZA Y DESAZOLVE CENTRO HISTORICO

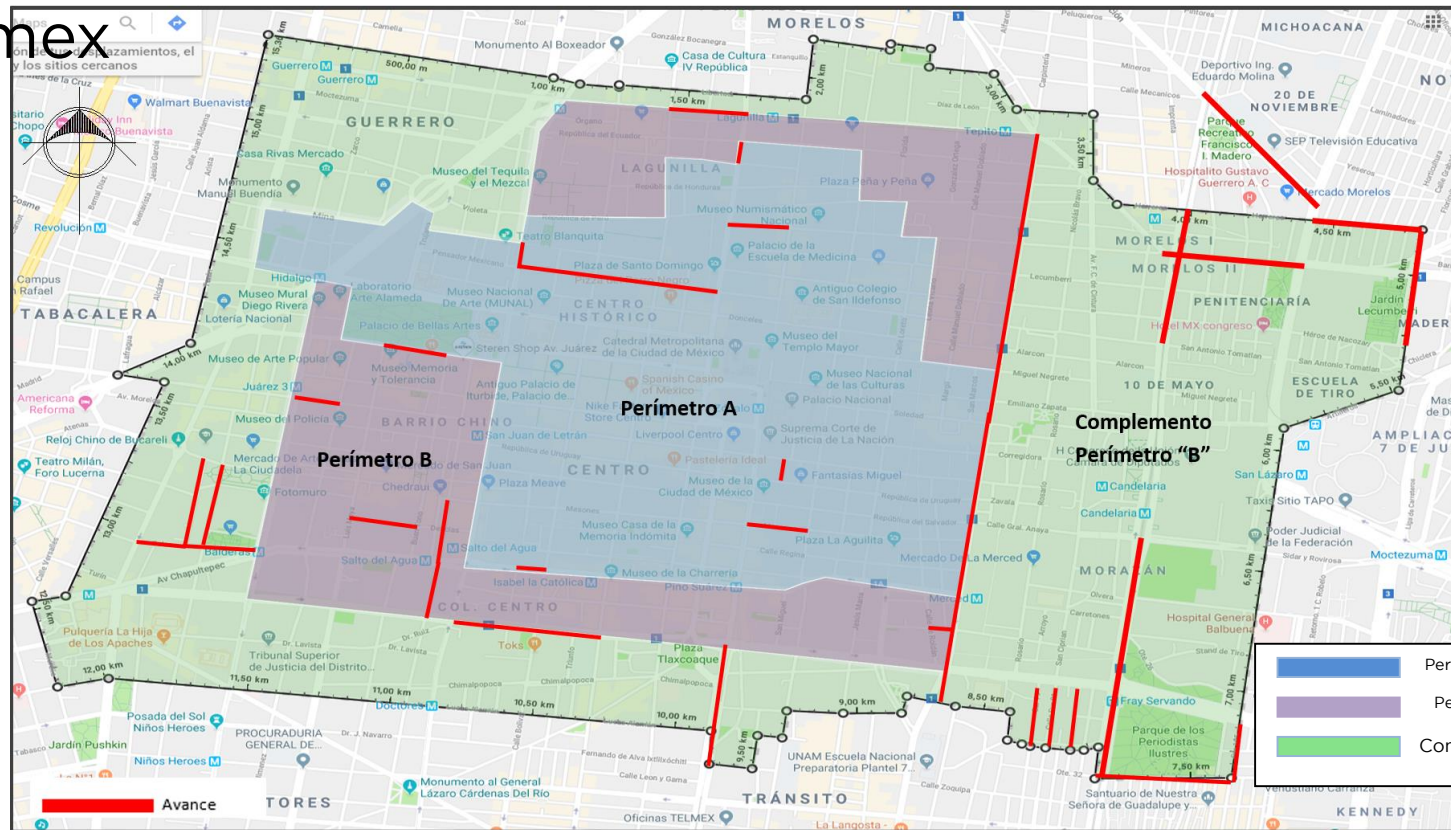Sacmex



	Perímetro "A" (Atendido)
	Perímetro "B" (Atendido)
	Complemento Perímetro "B"

# SOS-Alumbrado Público

Tema	Línea base	Periodicidad	Semana del 29/04 al 14/05	Próximo reporte
Alumbrado Público	Número de puntos de luz (PDL) atendidos y reparados en zona de contrato PPS ( Censo sin finalizar de 3, 549)	Semanal	PA - <b>140</b> PB - 0	28 de mayo



INVI

	PREDIO	COLONIA	ALCALDIA	PROGRAMA COLUMNA MAESTRA	AVANCE DEL PROYECTO	AVISO DE OBRA	STATUS DE OBRA	PERIMETRO A Y B	PORCENTAJE DE AVANCE
1	2 DE ABRIL NO 42	GUERRERO	CUAUHTEMOC	EXPROPIADO	PROYECTO EJECUTIVO LIBERADO	A-039/DOUL/62/11	OBRA EN PROCESO	A	42.20%
2	ACADEMIA NO.33	CENTRO	CUAUHTEMOC	EXPROPIADO	PROYECTO EJECUTIVO LIBERADO	A-028/DOUL/62/14	OBRA EN PROCESO	A	48.46%
3	ARCOS DE BELEN NO 49	CENTRO	CUAUHTEMOC	EXPROPIADO	PROYECTO EJECUTIVO LIBERADO	A-038/DOUL/62/17	OBRA EN PROCESO	B	43.50%
4	EJE 1 PONIENTE GUERRERO NO 164	GUERRERO	CUAUHTEMOC	EXPROPIADO	PROYECTO EJECUTIVO LIBERADO	A-007/DIUL/62/10	OBRA EN PROCESO	B	86.92%
5	EJE 1 PONIENTE GUERRERO NO. 110	BUENAVISTA	CUAUHTEMOC	EXPROPIADO	PROYECTO EJECUTIVO LIBERADO	A-085/DOUL/62/11	OBRA EN PROCESO	B	90.81%
6	MAGNOLIA NO. 12 (ANTES NO. 12 Y 16)	GUERRERO	CUAUHTEMOC	PROGRAMA NORMAL	PROYECTO EJECUTIVO LIBERADO	A-069/DOUL/62/14	OBRA EN PROCESO	B	55.20%



INVI

	PREDIO	COLONIA	ALCALDIA	PROGRAMA COLUMNA MAESTRA	AVANCE DEL PROYECTO	AVISO DE OBRA	STATUS DE OBRA	PERIMETRO A Y B	PORCENTAJE DE AVANCE
7	REPUBLICA DE ARGENTINA NO. 58	CENTRO	CUAUHTEMOC	EXPROPIADO	PROYECTO EJECUTIVO LIBERADO	A-012/DOUL/62/14	POR INICIAR	A	0.00%
8	REPUBLICA DE ARGENTINA NO. 87	CENTRO	CUAUHTEMOC	EXPROPIADO	PROYECTO EJECUTIVO LIBERADO	A-079/DOUL/62/12	OBRA EN PROCESO	A	80.30%
9	REPUBLICA DE PERU NO. 40	CENTRO	CUAUHTEMOC	PROGRAMA NORMAL	PROYECTO EJECUTIVO LIBERADO	A-009/DOUL/62/2017	OBRA EN PROCESO	B	90.80%
10	ALLENDE NO. 46	CENTRO	CUAUHTEMOC	EXPROPIADO	PROYECTO EJECUTIVO LIBERADO	A-073/DOUL/62/12	OBRA EN PROCESO	A	94.50%
11	LERDO NO. 12	GUERRERO	CUAUHTEMOC	EXPROPIADO	PROYECTO EJECUTIVO LIBERADO	A-008/DOUL/62/13	POR INICIAR	B	0.00%
12	PEDRO MORENO NO. 154	GUERRERO	CUAUHTEMOC	EXPROPIADO	PROYECTO EJECUTIVO LIBERADO	A-062/DOUL/62/11	POR INICIAR	B	0.00%



INVI

	PREDIO	COLONIA	ALCALDIA	PROGRAMA COLUMNA MAESTRA	AVANCE DEL PROYECTO	AVISO DE OBRA	STATUS DE OBRA	PERIMETRO A Y B	PORCENTAJE DE AVANCE
13	TALAVERA NO. 24	CENTRO	CUAUHTEMOC	EXPROPIADO	PROYECTO EJECUTIVO LIBERADO	A-058/DOUL/62/16	POR INICIAR	A	0.00%
14	VIOLETA NO. 15	GUERRERO	CUAUHTEMOC	EXPROPIADO	PROYECTO EJECUTIVO LIBERADO	A-024/DOUL/62/12	POR INICIAR	B	0.00%
15	PEDRO MORENO NO 156	GUERRERO	CUAUHTEMOC	EXPROPIADO	PROYECTO EJECUTIVO LIBERADO	A-064/DIUL/62/10	POR INICIAR	B	0.00%
16	LECUMBERRI No 66	ZONA CENTRO	CUAUHTEMOC	PROGRAMA NORMAL	PROYECTO EJECUTIVO LIBERADO	A-022/DOUL/62/17	OBRA EN PROCESO	B	100.00%
17	BELISARIO DOMINGUEZ NO. 78	CENTRO	CUAUHTEMOC	EXPROPIADO	PROYECTO EJECUTIVO LIBERADO	A-059/DOUL/62/17	OBRA EN PROCESO	A	46.65%
18	NACIONAL NO. 57	MORELOS	VENUSTIANO CARRANZA	CDI - CONVENIO DE COORDINACION 2013	PROYECTO EJECUTIVO LIBERADO	A-022/DOUL/62/15	OBRA EN PROCESO	B	74.99%





# STC-METRO

Tema	Línea base	Periodicidad	Semana al 14/05	Próximo reporte	Observaciones
Infraestructura	Número de escaleras electromecánicas con falla o algún problema (línea base: 75 escaleras en 29 estaciones)	Quincenal	<b>6</b> escaleras detenidas	28 de mayo	- <b>2 detenidas</b> por daño en tarjeta - <b>71 equipos</b> están funcionando
Infraestructura	Número de elevadores en reparación (línea base: 19 elevadores en 29 estaciones)	Quincenal	<b>0</b> elevadores detenidos	28 de mayo	- Se restableció el elevador de la estación Zócalo



# INAH

Tema	Línea base	Periodicidad	Mes al 14/05	Próximo reporte
Denuncias recibidas	Número de denuncias recibidas en obras y acciones fuera de norma y sin autorización	Mensual <b>(mayo)</b>	<b>6</b> Denuncias y seguimiento	28 de mayo

# INAH

## Denuncias recibidas - mayo

<b>1. Rep. de Perú 122</b>	(Demolición interior) Obra suspendida, actualmente con los datos aportados por la ACH, se está elaborando denuncia de hechos ante la Fiscalía General de la República.
<b>2. Rep. de Bolivia 83</b>	Obra nueva colindante con monumento, fue suspendida, actualmente están siendo asesorados y únicamente han sacado basura y materiales del predio.
<b>3. Motolinia 40</b>	Colindante con monumento histórico, realizaban obras de ampliación, manifestaron que a la brevedad posible presentarán proyecto de obras ante el INAH, el 13 de mayo de 2019 venció su periodo de alegatos.
<b>5. Rep. Argentina 96</b>	Cuentan con autorización para realizar demolición parcial, aún no presentan proyecto de obra mayor.
<b>6. Rep. Argentina 94</b>	Se generó requerimiento para el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, para que realicen obras de restauración en el referido inmueble.
<b>7. Calle de Tacuba 71</b>	Con los datos aportados por la ACH actualmente se elabora denuncia de hechos ante la Fiscalía General de la República



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL  
CENTRO  
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS


## SEDEMA

1. El 30 de abril se realizó recorrido en Calle República de Perú entre Calle República de Brasil y Calle República de Chile, Calle Allende entre Calle República de Perú y Av. 5 de mayo y Calle Bolivar entre Av. 5 de Mayo y Calle Mesones, **para el marcaje de 48 espacios de plantación.**
2. Los días 8 y 9 de mayo se realizó recorrido en Calle Francisco I. Madero entre Eje Central Lázaro Cárdenas y Calle 5 de Febrero y Calle Palma entre Calle Belisario Domínguez y Calle 16 de Septiembre, **para el marcaje de 55 sitios de plantación.**

# Avance al 10 de mayo



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

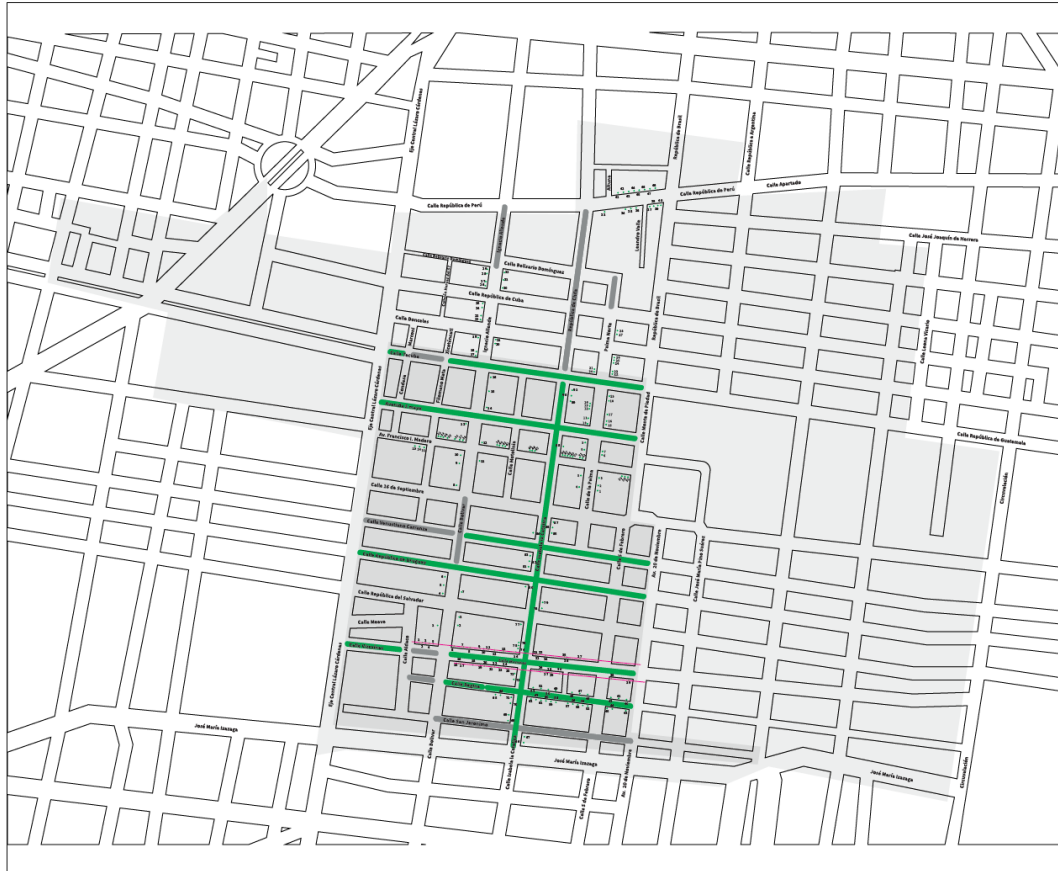


DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS Y ÁREAS DE VALOR AMBIENTAL  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VERDE

INFORME DE AVANCES DEL PROYECTO DE PLANTACIÓN DEL PERÍMETRO Y4 DEL CENTRO HISTÓRICO 6 AL 13 DE MAYO

### UBICACIÓN

PERÍMETRO Y4 CENTRO HISTÓRICO  
Área de Cuauhtémoc



# SEDECO

## Mercados Públicos dentro de los polígonos A y B del Centro Histórico de la Ciudad de México

Mercados comprendidos dentro del <b>Perímetro A</b> del Centro Histórico de la Ciudad de México				
Consecutivo	Alcaldía	Mercado	No. Oficial	Tipo de proyecto/atención
1	Cuauhtémoc	Abelardo L. Rodríguez (Coronas)	83	
2	Cuauhtémoc	Abelardo L. Rodríguez (Zona)	16	
3	Cuauhtémoc	Dos de Abril	10	Supervisión por parte de Infraestructura de la SEDECO

# SEDECO

## Mercados Públicos dentro de los polígonos A y B del Centro Histórico de la Ciudad de México

Mercados comprendidos dentro del **Perímetro B** del Centro Histórico de la Ciudad de México

Consecutivo	Alcaldía	Mercado	No. Oficial	Tipo de proyecto/atención
1	Cuauhtémoc	Lagunilla San Camilito	4	Programa para el Fomento y Mejoramiento / Supervisión por parte de Infraestructura de la SEDECO
2	Cuauhtémoc	San Juan Curiosidades	86	Programa para el Fomento y Mejoramiento
3	Cuauhtémoc	Lagunilla Ropa y Telas	1	Programa para el Fomento y Mejoramiento / Supervisión por parte de Infraestructura de la SEDECO
4	Venustiano Carranza	Merced Nave Mayor	102	Supervisión por parte de Infraestructura de la SEDECO / Especial
5	Cuauhtémoc	Martínez de la Torre (ANEXO)	5	
6	Cuauhtémoc	Martínez de la Torre (ZONA)	7	
7	Cuauhtémoc	Lagunilla varios	3	Supervisión por parte de Infraestructura de la SEDECO
8	Cuauhtémoc	Lagunilla zona	2	Supervisión por parte de Infraestructura de la SEDECO
9	Cuauhtémoc	Tepito Ropa y Telas (Granaditas)	60	Supervisión por parte de Infraestructura de la SEDECO
10	Cuauhtémoc	Merced Mixcalco	108	
11	Venustiano Carranza	Merced Ampudia	52	Supervisión por parte de Infraestructura de la SEDECO
12	Venustiano Carranza	Merced Anexo	106	Supervisión por parte de Infraestructura de la SEDECO
13	Venustiano Carranza	Merced Banquetón	109	Supervisión por parte de Infraestructura de la SEDECO
14	Venustiano Carranza	Merced Comidas	104	Supervisión por parte de Infraestructura de la SEDECO
15	Venustiano Carranza	Merced Flores	105	Supervisión por parte de Infraestructura de la SEDECO

# SEDECO

## Mercados Públicos dentro de los polígonos A y B del Centro Histórico de la Ciudad de México

Mercados comprendidos dentro del **Perímetro B** del Centro Histórico de la Ciudad de México


Consecutivo	Alcaldía	Mercado	No. Oficial	Tipo de proyecto/atención
16	Venustiano Carranza	Merced Nave Menor	101	Supervisión por parte de Infraestructura de la SEDECO
17	Venustiano Carranza	Merced Paso a Desnivel	103	Supervisión por parte de Infraestructura de la SEDECO
18	Venustiano Carranza	Merced Paso a Desnivel Gómez Pedraza	241	Supervisión por parte de Infraestructura de la SEDECO
19	Venustiano Carranza	Sonora	107	Supervisión por parte de Infraestructura de la SEDECO
20	Venustiano Carranza	Sonora Anexo	108	Supervisión por parte de Infraestructura de la SEDECO
21	Cuauhtémoc	Juárez	8	Supervisión por parte de Infraestructura de la SEDECO
22	Cuauhtémoc	San Juan Pugibet	77	
23	Cuauhtémoc	San Juan Arcos de Belem	78	
24	Cuauhtémoc	Palacio de las Flores	74	
25	Cuauhtémoc	Pequeño comercio	66	
26	Cuauhtémoc	San Lucas	9	Supervisión por parte de Infraestructura de la SEDECO
27	Cuauhtémoc	Tepito Fierros Viejos	23	Supervisión por parte de Infraestructura de la SEDECO
28	Cuauhtémoc	Tepito Varios	36	Supervisión por parte de Infraestructura de la SEDECO
29	Cuauhtémoc	Tepito Zona	14	Supervisión por parte de Infraestructura de la SEDECO





# SEDECO

## Mercados para intervenciones en el ejercicio 2019

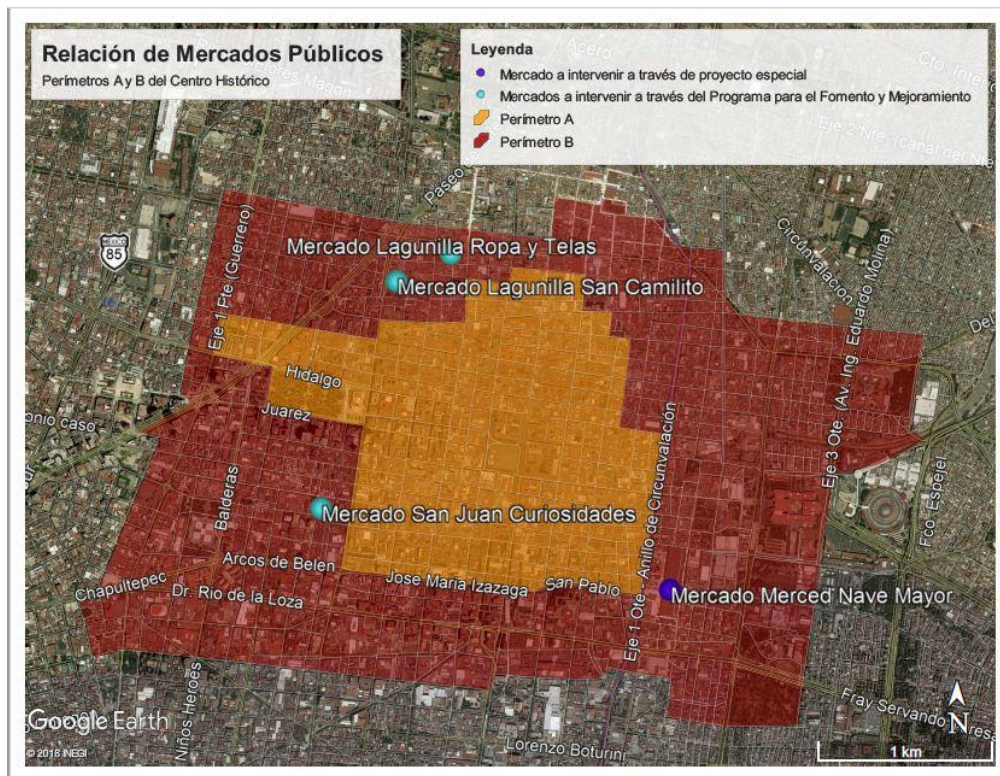


# SEDECO

## Flujograma

Proceso de aplicación del recurso y etapa en la que se encuentra la Alcaldía Cuauhtémoc.

## Programa para el Fomento y Mejoramiento de los Mercados Públicos de la CDMX

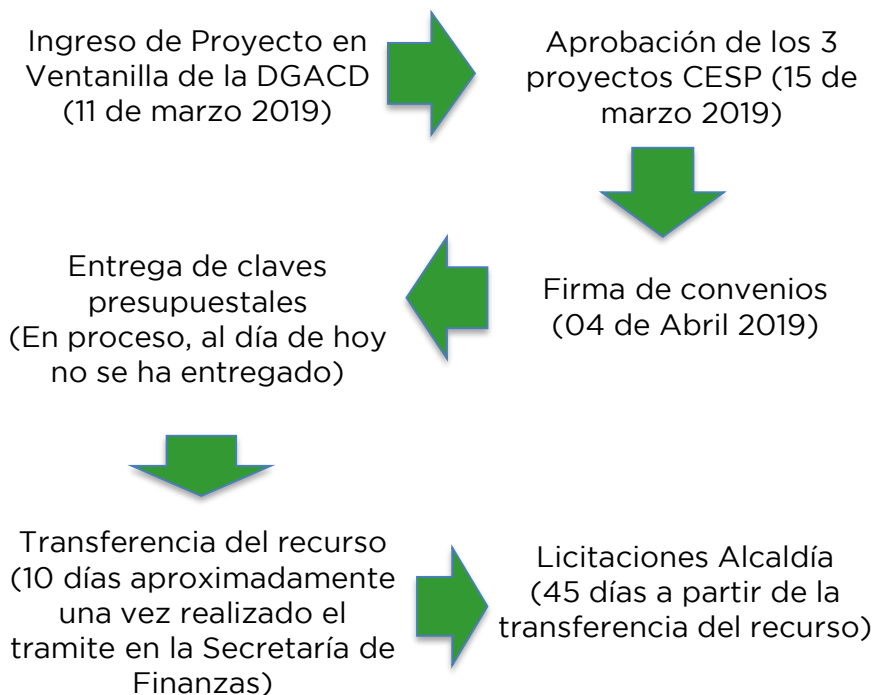

# SEDECO

## Programa para el Fomento y Mejoramiento de los Mercados Públicos de la CDMX

### Mercados Participantes

#### 1. Lagunilla Ropa y Telas

Aportación SEDECO (52%) \$7,112,937.15 y Alcaldía (48%) \$6,622,606.63 **Total: \$13,735,543.78**

#### 2. Lagunilla San Camilito

Aportación SEDECO (21%) \$1,739,691.58 y Alcaldía (79%) \$6,611,468.61 **Total: \$8,351,160.19**

#### 3. San Juan Curiosidades

Aportación SEDECO (60%) \$19,999,999.80 y Alcaldía (40%) \$13,333,333.20 **Total: \$33,333,333.00**

**Estatus en el proceso:** Los tres mercados se encuentran en entrega de claves presupuestales.  
Con reiterativos con fecha 25 de abril del año en curso.

# SEDECO

## Mercados Merced Nave Mayor y Merced

**Conclusión de la 4ta Etapa e inicio de la 5ta. etapa de reconstrucción y restitución de la zona comprendida de la 17 a la 22 afectadas por incendio del 27 de febrero de 2013.**

### Instancias participantes

- **Secretaría de Obras y Servicios** (Instancia ejecutora de obra).
- **Alcaldía Venustiano Carranza** (Instancia operativa sobre reubicación de locatarios y comercio en la vía pública. Participa en el proceso de socialización del proyecto y obra).
- **Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública** (Seguimiento en la reubicación temporal, comercio en vía pública y en el proceso de socialización del proyecto y la obra).
- **Secretaría de Desarrollo Económico** (Seguimiento y apoyo en el proceso de socialización del proyecto y la obra).
- **Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil** (Instancia que revisará temas normativos de protección civil de la obra y la reubicación temporal).



# SEDECO

## Mercados Merced Nave Mayor y Merced

### Actividades realizadas

- **Recorridos** en zonas aledañas al **Mercado Público Merced Nave Mayor** para determinar **accesos a vehículos, materiales y trabajadores de la obra.**
- **Mesas de trabajo** para **coordinar la reubicación de locatarios** pertenecientes a la zona que será restaurada y **gestionar recursos para la estructura** temporal que será utilizada para este fin.



# ILIFE

Tema	Línea base	Periodicidad	Mes de Marzo	Mes de Abril	Próximo reporte
Sismo 19S	Porcentaje de avance de escuelas con daños del Sismo 19S en 3 escuelas*	Mensual	62.49%	69.16%	11 de junio
Mantenimiento de escuelas	Porcentaje de avances de escuelas con el programa de mantenimiento normal del Instituto en 20 escuelas*	Mensual	46.19%	48.10%	11 de junio



## Inmuebles escolares en proceso de atención 2018 -2019 en Centro Histórico

No.	PLANTEL	Avance al 11 de abril	Avance al 02 de Mayo	Porcentaje de avance	Observaciones
1	<b>ESCUELA PRIMARIA MIGUEL SERRANO</b>	<b>70.48%</b>	<b>75.48%</b>	<b>▲ 5.00%</b>	
2	<b>ESCUELA SECUNDARIA ADRIANA GARCIA CORRAL</b>	<b>32.00%</b>	<b>32.00%</b>	<b>▬ 0.00%</b>	
3	ESCUELA SECUNDARIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ SEC TEC No. 6	93.00%	100.00%	▲ 7.00%	<b>ENTREGADA ABRIL</b>
4	ESCUELA PRIMARIA REPÚBLICA DE BOLIVIA	91.02%	100.00%	▲ 8.98%	<b>ENTREGADA ABRIL</b>
5	<b>ESCUELA PRIMARIA ALFREDO E. URUCHURTU</b>	<b>84.98%</b>	<b>100.00%</b>	<b>▲ 15.02%</b>	<b>ENTREGADA ABRIL</b>
6	ESCUELA PRIMARIA PABLO MORENO	40.08%	40.08%	▬ 0.00%	
7	ESCUELA PRIMARIA REPÚBLICA DE ARGENTINA	98.08%	100.00%	▲ 1.92%	<b>ENTREGADA ABRIL</b>
8	ESCUELA NACIONAL PARA CIEGOS LIC. IGNACIO TRIGUEROS	0.00%	0.00%	▬ 0.00%	<b>INICIA MAYO</b>
9	TELESECUNDARIA NO. 91	28.04%	55.01%	▲ 26.97%	
10	ESCUELA PRIMARIA SARA MANZANO	34.56%	34.56%	▬ 0.00%	
11	ESCUELA PRIMARIA MARCELINO DÁVALOS	36.54%	36.54%	▬ 0.00%	
12	ESCUELA PRIMARIA REPÚBLICA DE PANAMÁ	37.96%	37.96%	▬ 0.00%	

**Escuelas afectadas por sismo**



## Inmuebles escolares en proceso de atención 2018 -2019 en Centro Histórico

No.	PLANTEL	Avance al 11 de abril	Avance al 02 de Mayo	Porcentaje de avance	Observaciones
13	ESCUELA SECUNDARIA JOSÉ MANUEL RAMOS	36.90%	36.90%	0.00%	
14	ESCUELA PRIMARIA ABRAHAM CASTELLANOS	100.00%	100.00%	0.00%	<b>ENTREGADA ABRIL</b>
15	ESCUELA SECUNDARIA ÁNGEL TRÍAS ÁLVAREZ	63.14%	63.14%	0.00%	
16	JARDÍN DE NIÑOS CADETES DE LA NAVAL	23.82%	23.82%	0.00%	
17	ESCUELA SECUNDARIA No. 1 CÉSAR A. RUÍZ	0.00%	0.00%	0.00%	<b>INICIO DE TRABAJOS EN JUNIO, REHABILITACIÓN DE LA BARDA POR PARTE DE LA FUNDACIÓN BOSCH. SE CUENTA CON DICTAMEN DE PROTECCIÓN CIVIL</b>
18	JARDÍN DE NIÑOS ENRIQUE PESTALOZZI	34.07%	34.07%	0.00%	
19	ESCUELA PRIMARIA FRAY PEDRO DE GANTE	75.15%	75.15%	0.00%	
20	ESCUELA PRIMARIA JOAQUÍN GARCÍA ICAZBALCETA	0.94%	0.94%	0.00%	
21	JARDÍN DE NIÑOS JUAN JACOBO ROUSSEAU	39.80%	39.80%	0.00%	
22	ESCUELA PRIMARIA LIC. PONCIANO ARRIAGA	59.24%	59.24%	0.00%	
23	ESCUELA PRIMARIA REPÚBLICA DE LÍBANO	31.38%	24.82%	-6.56%	
		<b>48.31%</b>	<b>50.85%</b>	<b>2.54%</b>	





# PGJ

Tema	Línea base	Periodicidad	Semana al 14/05	Próximo reporte
Infraestructura	Robos de coladeras	Semanal	1	28 de mayo
Infraestructura	Robos de medidor	Semanal	1	28 de mayo

No.	No. CARPETA DE INVESTIGACION	FECHA Y HORA	DELITO	CALLE	COLONIA	SINTESIS DE LOS HECHOS
1	CI-FCH/CUH-2/UI-3CD/3419/05-2019	07/05/2019 04:14	ROBO DE OBJETOS		CENTRO DE LA CIUDAD DE MEXICO AREA 1	POLICIA PREVENTIVO PONEN A DISPOSICION AL HOY IMPUTADO CON EL ANTECEDENTE DE HABER QUITADO UNA COLADERA Y LLEVARLA CARGANDO
2	CI-FCH/CUH-4/UI-3SD/627/05-2019	06/05/2019 20:00	ROBO DE OBJETOS	ALLENDE	CENTRO DE LA CIUDAD DE MEXICO AREA 3	MANIFIESTA EL DENUNCIANTE QUE SUSTRAJERON SU MEDIDOR DE AGUA DE SU LOCAL

# PAOT

## Denuncias presentadas ante la PAOT en el Centro Histórico de la CDMX - Perímetro A

Periodo **01/Enero/2019** al **12/abril/2019**

Materia	Total	Estatus		Concluidas
		Investigación	Proceso de admisión	
Ruido	23	13	2	8
Construcción y/o uso de suelo	12	10	2	
Residuos	0			
Áreas Verdes	0			
Animales	3		2	1



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL  
CENTRO  
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

# Acuerdos

**\*Continuamos transmitiendo en vivo\***



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL  
CENTRO  
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

# Asistencia

**\*Continuamos transmitiendo en vivo\***



# Muchas gracias

Próxima sesión:  
**28 de mayo de 2019**, a las 10:30 horas
