



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO





Inicio de la transmisión en vivo

16 DE ABRIL 2019



Orden del día

- Reportes
- Mesas de trabajo
- Turnos e incidencias
- Asuntos generales
- Acuerdos
- Asistencia



ACH

Tema	Línea base	Periodicidad	Semana al 16/04	Próximo reporte
Tiraderos clandestinos	Metros cúbicos de residuos sólidos levantados en tiraderos clandestinos en el perímetro de ACH	Semanal	1,508	23 de abril
Limpieza	Metros cúbicos de basura recolectada en el Perímetro de la ACH (Producto de Barrido)	Semanal	2,225	23 de abril





ACCIONES POR CALLES DEL 09 AL 15 DE ABRIL

- Mesones
- Jesús María
- Belisario Domínguez
- Regina
- Tacuba
- Av. Juárez, López, Artículo 123, Venustiano Carranza y 5 de Febrero
- Plaza de las Vizcaínas
- Plaza Santa Catarina

MESONES DE ISABEL LA CATÓLICA A ALDAMO 09/04/19

- **07 elementos** de la Autoridad del Centro Histórico
- **174 m²** eliminación de grafiti en muros

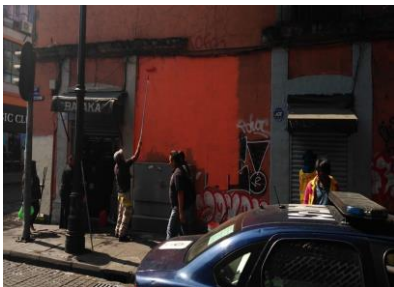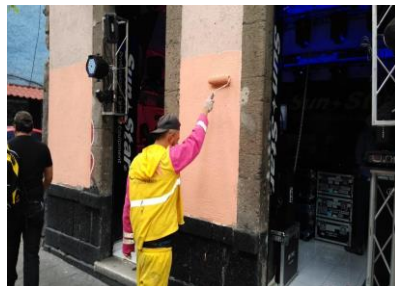


MESONES CALLEJON DE MESONES A ISABEL LA CATÓLICA 09/04/19

- **09 elementos** de la Autoridad del Centro Histórico
- **248 m²** eliminación de grafiti en 18 cortinas, 03 cajas de Telmex, 01 puesto, 06 bolardos, 1 puerta y 07 postes
- **20 m²** eliminación de grafiti con thinner





MESONES DE ALDACO A EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS 10/04/19

- **07 elementos** de la Autoridad del Centro Histórico
- **264 m2** eliminación de grafiti en muros

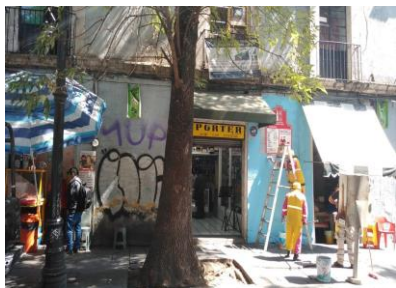


MESONES DE ISABEL LA CATÓLICA A DE BOLÍVAR

- **10 elementos** de la Autoridad del Centro Histórico
- **304 m²** eliminación de grafiti con pintura de esmalte en 24 cortinas metálicas, 01 caja de Telmex, 7 puertas y 12 postes
- **30 m²** eliminación de grafiti con thinner

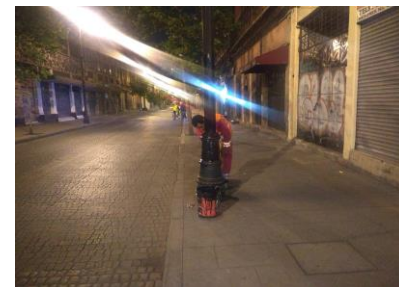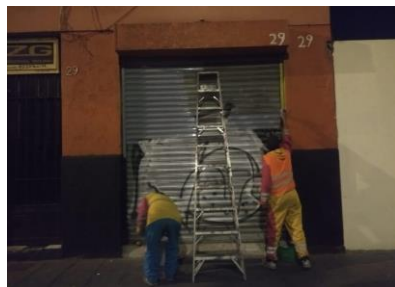


ELIMINACIÓN DE GRAFITTI EN JESUS MARIA DE MANZANARES A CORREGIDORA 12/04/19

- **05 elementos** de la Autoridad del Centro Histórico
- **70 m2** eliminación de grafitti en muros

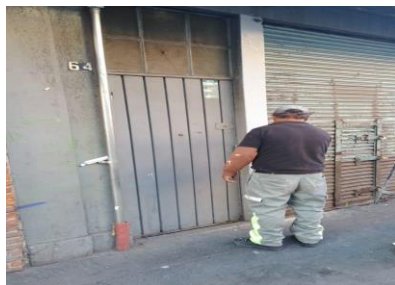

ELIMINACIÓN DE GRAFITI EN BELISARIO DOMINGUEZ DE EJE CENTRAL LAZARO CARDENAS A CALLE HEROES DEL 57 12/04/19

- **05 elementos** de la Autoridad del Centro Histórico
- **58 m2** eliminación de grafiti en muros

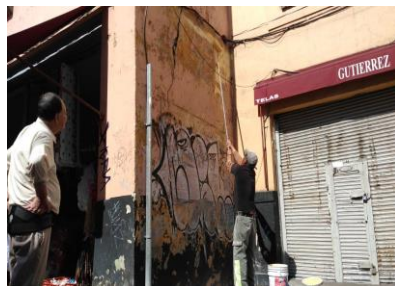

ELIMINACIÓN DE GRAFITI EN MESONES DE ALDACO A EJE CENTRAL 12/04/19

- **06 elementos** de la Autoridad del Centro Histórico
- **201 m2** eliminación de grafiti en 22 cortinas, 01 puerta y 03 cajas de semáforo
- **05 m2** eliminación de grafiti con thinner





TEATRO EN PLAZAS PÚBLICAS REGINA 13/04/19

- **05 elementos** de la Autoridad del Centro Histórico
- **470 m²** barrido manual en corredor
- **470 m²** papeleo en andadores
- **150 m²** papeleo en andadores
- **0.75 m³** recolección de residuos sólidos




ELIMINACIÓN DE GRAFITI EN TACUBA DE MONTE DE PIEDAD A REPUBLICA DE CHILE (REINCIDENCIA) 13/04/19

- **08 elementos** de la Autoridad del Centro Histórico
- **124 m²** eliminación de grafiti en 09 cortinas y 02 puestos

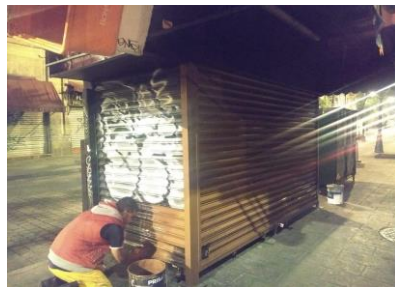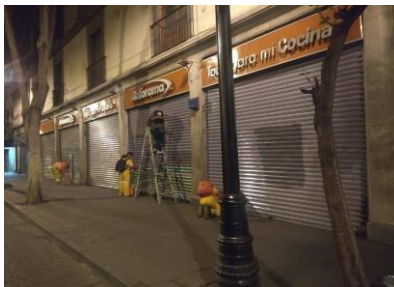



PASEO CICLISTA “MUEVETE EN BICI”, EN AV. JUÁREZ, LÓPEZ, ARTICULO 123, V. CARRANZA Y 5 DE FEBRERO 14/04/19

- **17 elementos** de la Autoridad del Centro Histórico
- **12,128 m²** barrido manual en banqueta
- **8.50 m³** recolección de residuos sólidos




TEATRO EN PLAZAS PUBLICAS PLAZA DE LAS VIZCAINAS 14/04/19

- **04 elementos** de la Autoridad del Centro Histórico
- **700 m²** barrido manual en plaza
- **700 m²** papeleo en andadores
- **350 m²** papeleo en áreas verdes
- **10 piezas** recolección de papeleras
- **3.25 m³** recolección de residuos sólidos



OBRA DE TEATRO EN PLAZA SANTA CATARINA 14/04/19

- **04 elementos** de la Autoridad del Centro Histórico
- **330 m²** barrido manual en plaza
- **330 m²** papeleo en andadores
- **50 m²** papeleo en área verde
- **1.00 m³** recolección de residuos sólidos

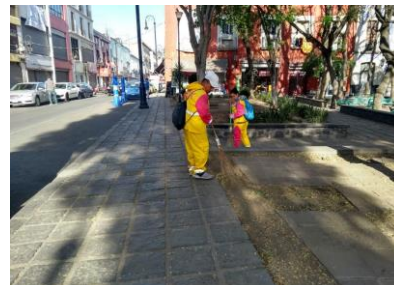



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO




MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

CALLES ATENDIDAS

1	Av. 20 de Noviembre y San Antonio Abad de Chimalpopoca a Mesones
2	Tacuba de Monte de Piedad a Filomeno Mata
3	San Jerónimo de 5 de Febrero a Isabel la Católica
4	Av. 5 de Mayo de Eje Central a Monte de Piedad
5	Isabel la Católica de Tacuba a Izazaga
6	Independencia y Av. Juárez de Dolores a Luis Moya
7	República de Chile de Tacuba a República de Paraguay
8	Donceles de Isabel la Católica a República de Brasil
9	Bolívar de Tacuba a Izazaga
10	Allende de Tacuba a República de Paraguay
11	Av. Hidalgo de 2 de Abril a Eje Central
12	Eje Central de Av. Hidalgo a Pensador Mexicano
13	Regina de 5 de Febrero a Isabel la Católica
14	Regina de 20 de Noviembre a Aldaco Católica
15	Mesones de 20 de Noviembre a Eje Central

CALLES CON MAYOR INCIDENCIA DE GRAFITI EN EL PERÍMETRO "A" DEL CENTRO HISTÓRICO

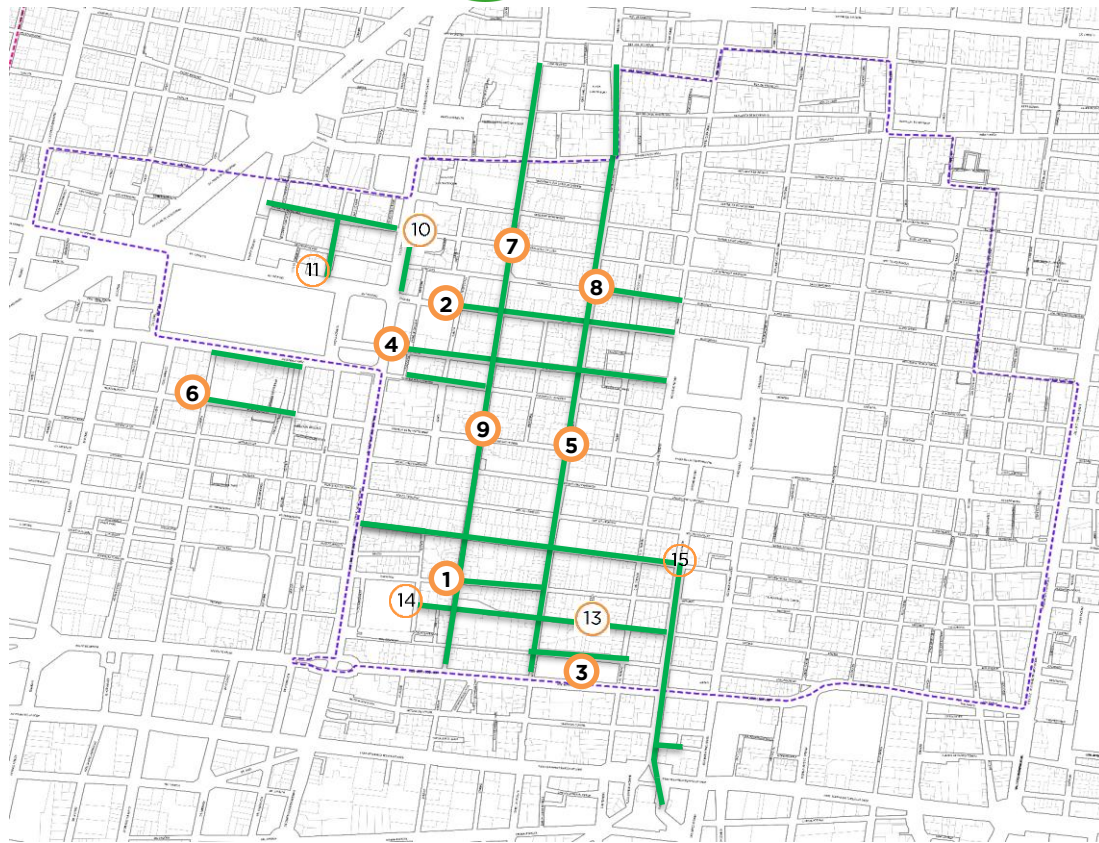




GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

No.	CALLES	FECHA
1	Mesones de Isabel la Católica a Bolívar	19- 25 abril
2	Jesús María de San Pablo a Corregidora	26-30 abril
3	Alhóndiga de Corregidora a República de Guatemala	1º-3 mayo
4	Pino Suárez de san Jerónimo a República de El Salvador	4-5 mayo
5	Izazaga de Av. 20 de Noviembre a Pino Suárez	El grafiti es sobre el Templo de San Miguel y es inmueble catalogado con toda la fachada de cantera
6	Vizcaínas, Aldaco, Callejón de San Ignacio y Callejón Esperanza	El grafiti es principalmente sobre el Colegio de las Vizcaínas y es inmueble catalogado con toda la fachada de cantera y tezontle, requiere tratamiento especial.

CALLES CON MAYOR INCIDENCIA DE GRAFITI EN EL PERÍMETRO “A” PROGRAMADAS PARA SER ATENDIDAS

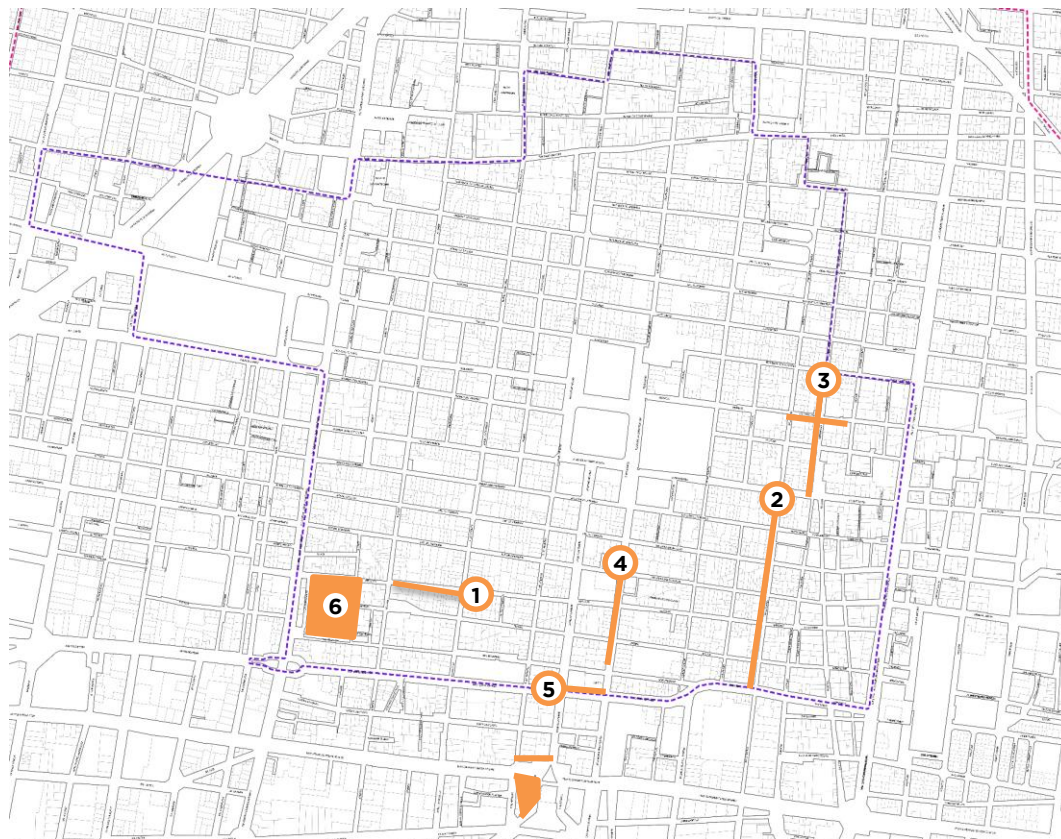



Alc. Cuauhtémoc

Tema	Línea base	Periodicidad	Semana al 26/03	Semana al 02/04	Semana al 09/04	Semana al 16/04
Luminarias	Número de Luminarias reparadas en vías secundarias en PB de Cuauhtémoc	Semanal	52	30	130	20
Desazolve	Red de drenaje desazolvada en PB de Cuauhtémoc (m lineales)	Semanal	177 m	166 m	265 m	287 m
Limpia (Colecta de solidos)	Escuelas limpias y toque de campana.	Semanal	207 m ³	227 m ³	222 m ³	221 m ³



Alc. Cuauhtémoc

Tema	Línea base	Periodicidad	Semana al 26/03	Semana al 02/04	Semana al 09/04	Semana al 16/04
Tiraderos Clandestinos	Numero de calles y/o espacios públicos recuperados de tiraderos clandestinos de desechos sólidos en el PB de Cuauhtémoc	Semanal	--	9m ³	6m ³	5 m ³
Poda	Liberación de luminarias	Semanal	--	--	--	12

Alc. Cuauhtémoc

Luminarias

REPORTE DE LUMIARIAS REPARADAS EN LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC					
DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		COLONIA	CANTIDAD	MOTIVO
LUIS MOYA	ARCOS DE BELEN	AYUNTAMIENTO	CENTRO ALAMEDA	20	
			TOTAL	20	

Alc. Cuauhtémoc

PODAS

REPORTE DE PODAS REALIZADOS EN LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC					
DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		COLONIA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
COLON 17	BALDERAS		CENTRO VIII	1	
INDEPENDENCIA 30			CENTRO VIII	3	
HEROES DE GRANADITAS 93			CENTRO II	4	
VIZCAINAS	EJE CENTRAL		CENTRO V	4	
			TOTAL	12	

Alc. Cuauhtémoc

DESAZOLVE

REPORTE DE DESAZOLVES REALIZADOS EN LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC					
DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		COLONIA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
MESONES	PINO SUAREZ	CORREO MAYOR	CENTRO MERCED	100	
MOTOLINIA	MOTOLIANIA	5 DE MAYO	CENTRO CENTRO	4	
SANTO TOMAS	MISIONEROS	RAMON CORONA	CENTRO MERCED	20	
SANTO TOMAS	SALVADOR	URUGUAY	CENTRO MERCED	5	
LAS CRUCES	SAN PABLO	MESONES	CENTRO MERCED	14	
ROLDAN	MISIONEROS	RAMON CORONA	CENTRO MERCED	8	
MISIONEROS	TOPACIO	ROLDAN	CENTRO MERCED	32	
RAMON CORONA	CIRCUNVALACION	TALAVERA	CENTRO MERCED	100	
CALLEJON DE TIZAPAN	EJE CENTRAL	IGUALDAD		4	
TOTAL				287	



Alc. Venustiano Carranza

Tema	Línea base	Periodicidad	Semana al 26/03	Semana al 02/04	Semana al 09/04	Semana al 16/04
Tiraderos clandestinos	Toneladas de residuos sólidos recolectados de tiraderos clandestinos en el PB de VC (línea base: 26 tiraderos)	Semanal	31 ton (diarias) 477.4 m ³	32.5 ton (diarias) 500.5 m ³	31 (diarias) 477.4 m ³	32.5 (diarias) 500.5 m ³
Luminarias	Número de Luminarias reparadas en vías secundarias	Semanal	24	27	11	15
Desazolve	Red de drenaje desazolvada en PB de VC (metros lineales)	Semanal	--	105 m	--	131 m

Alc. Venustiano Carranza


RELACION DE TIRADEROS CLANDESTINOS				
Nº. CONSECUTIVO	UBICACIÓN	TIPO DE RESIDUOS SÓLIDOS %	CANTIDAD TONS	SECTOR
01	MIGUEL DOMINGUEZ Y PENITENCIARIA COL. AMPLIACIÓN PENITENCIARIA	90% BASURA 10% CASCAJO	1.5	S-1
02	EJE 1 NORTE Y HORTELANOS COL. MORELOS	90% BASURA 10% CASCAJO	3	S-1
03	AV. CIRCUNVALACIÓN ENTRE HÉROES DE NACOZARI Y SAN ANTONIO TOMATLAN	85% BASURA 15% CASCAJO	1.5	S-2
04	ZAPATA ESQ. AV. CIRCUNVALACIÓN	85% BASURA 15% CASCAJO	1	S-2
05	NACIONAL ESQ. VIDAL ALCOCER	85% BASURA 15% CASCAJO	1.5	S-2
06	COSTA RICA ESQ. VIDAL ALCOCER	85% BASURA 15% CASCAJO	1	S-2
07	PEÑA Y PEÑA ESQ. VIDAL ALCOCER	85% BASURA 15% CASCAJO	0.5	S-2
08	VIDAL ALCOCER Y BERRIOZABAL COL. MORELOS	85% BASURA 15% CASCAJO	2	S-2
09	AV. CIRCUNVALACIÓN Y G. PEDRAZA (MERCADO DULCES I) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	2	S-9
10	AV. CIRCUNVALACIÓN Y CARRIZAL (MERCADO DE FLORES) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.5	S-9
11	AV. CIRCUNVALACIÓN Y CARRETONES (METRO MERCED) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	1	S-9
12	JUAN DE LA GRANJA Y CORREGIDORA (LAS CANCHAS) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.2	S-9

Tiraderos clandestinos

RELACION DE TIRADEROS CLANDESTINOS				
Nº. CONSECUTIVO	UBICACIÓN	TIPO DE RESIDUOS SÓLIDOS %	CANTIDAD TONS	SECTOR
13	SANTA ESCUELA Y CUADRANTE DE LA SOLEDAD COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.4	S-9
14	ROSARIO ESQ. PLAZA SAN LAZARO (ATRÁS DE LA IGLESIA) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.4	S-9
15	AV. CIRCUNVALACIÓN Y SOLEDAD COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	2	S-9
16	AV. CIRCUNVALACIÓN Y MANZANARES COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	2.5	S-9
17	JUAN PABLO ESQ. CORREGIDORA COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.3	S-9
18	CONGRESO DE LA UNIÓN ESQ. GENERAL ANAYA COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.2	S-9
19	GENERAL ANAYA ESQ. JUAN DE LA GRANJA COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.3	S-9
20	JUAN DE LA GRANJA ESQ. SAN CIPRIAN COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	3	S-9
21	CORREGIDORA Y SAN SIMÓN COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	0.2	S-9
22	PLAZA DE LA SOLEDAD, SAN SIMÓN Y SANTA ESCUELA COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	0.5	S-9
23	TOLVA 2 COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	3.1	S-9
24	TOLVA 3 COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	3	S-9
25	AV. CIRCUNVALACIÓN Y CARRETONES COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	0.5	S-9
26	JUAN DE LA GRANJA ESQ. SAN CIPRIAN COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	0.4	S-9

Alc. Venustiano Carranza

Tiraderos clandestinos

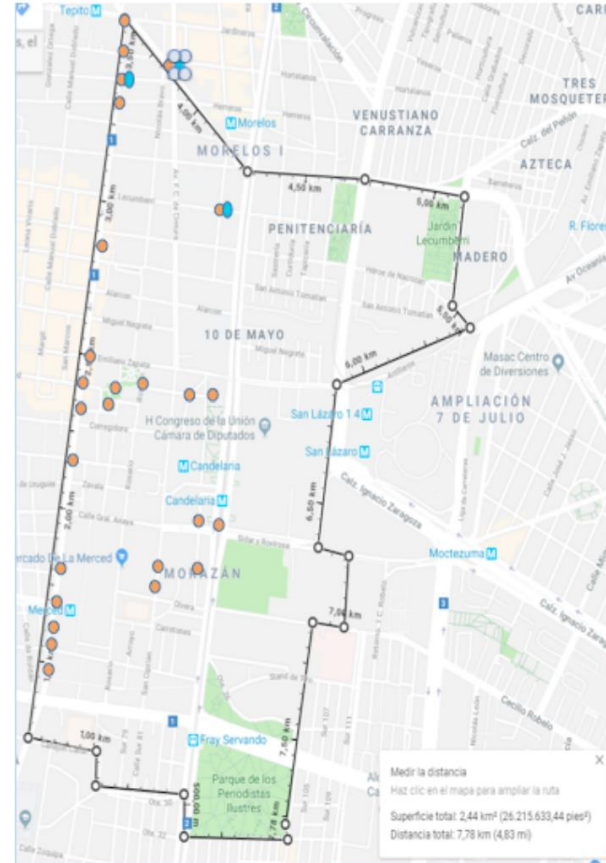

Montón Tradicional






Recolección de cascajo



Alc. Venustiano Carranza

Desazolve

Trabajo	Unidad de medida	Avance	Colonias	Calles	Fotografía
SONDEO DE DOS COLADERAS PLUVIALES	METRO LINEAL	16	LORENZO BOTURINI	SUR 77 No. 93 ENTRE GUTIERREZ NAJERA Y NIVEL	
SONDEO DE 2 TRAMOS DE ATARJEA	METRO LINEAL	100	LORENZO BOTURINI	SUR 77 No. 93 ENTRE GUTIERREZ NAJERA Y NIVEL	
SONDEO DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	METRO LINEAL	15	LORENZO BOTURINI	SUR 79 No. 356 ENTRE NIVEL Y LORENZO BOTURINI	



SOS-Alumbrado Público

Tema	Línea base	Periodicidad	Semana al 16/04	Próximo reporte
Alumbrado Público	Número de puntos de luz (PDL) atendidos y reparados en zona de contrato PPS (Censo sin finalizar de 3, 549)	Semanal	PA - 21 PB - 0	23 de abril



TELMEX

Tema	Línea base	Periodicidad	Semana al 16/04	Observaciones
Infraestructura de Comunicación Telefónica	Trabajos intensivos de limpieza, mantenimiento y rehabilitación de los Teléfonos Públicos del Centro Histórico (Línea base: 518 teléfonos)	Semanal	474 atendidos	Avance de 92 %



CFE

Tema	Línea base	Periodicidad	Semana al 16/04	Próximo reporte
Coladeras y/o registros colocados	Número de coladeras y/o registros colocados que afectan la red eléctrica	Semanal	25	23 de abril
Cortes de energía eléctrica	Número de atenciones de emergencias por falta de energía eléctrica que implique rompimiento de banquetas o de arroyo vehicular	Mensual	38	07 de mayo
Red eléctrica del Centro Histórico	Porcentaje de avance de actualización de la red eléctrica del Centro Histórico	Mensual	100%	07 de mayo
Mantenimiento a bóvedas	Desagüe de bóvedas. (Línea base: 130)	Semanal	26 Avance del 19%	23 de abril



METRO

Tema	Línea base	Periodicidad	Semana al 16/04	Próximo reporte	Observaciones
Infraestructura	Número de escaleras electromecánicas con falla o algún problema (línea base: 75 equipos /29 estaciones)	Quincenal	1	30 de abril	Guerrero de L-B desde del 09 de abril
Infraestructura	Número de elevadores en reparación (línea base: 19/29)	Quincenal	Sin fallas	30 de abril	

RECONSTRUCCIÓN DEL MERCADO PÚBLICO MERCED NAVE MAYOR Y BANQUETÓN INCENDIO 27 DE FEBRERO 2013



SEDECO



ANTECEDENTES

- Inmueble construido en 1957 catalogado como patrimonio artístico de la Ciudad de México.
- Sufre incendio en febrero de 2013, donde se daña aproximadamente una tercera parte de la nave, específicamente la sección sur y se afectan más de 1,000 comerciantes.
- La Alcaldía Venustiano Carranza, Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano en su momento, fue la encargada de la reconstrucción de la zona afectada del Mercado, proyectando la intervención en 4 etapas.
- En dichas etapas no se consideraron las losas de los pasillos 17 a la 22.
- Locatarios que laboraban en las secciones concluidas han comenzado a reingresar al inmueble a través de los mecanismos que la Alcaldía ha determinado.

Las **Puertas 17 a la 22**, comprenden la zona afectada indirectamente en el incendio de 2013 que no fue rehabilitada por la Alcaldía; los locatarios pertenecientes a la misma, después del sismo del 19S, solicitaron apoyo al Instituto para Seguridad de las Construcciones para dictaminar daños post-sísmicos, aunque éste observó (que los daños son a causa del deterioro natural y falta de mantenimiento).



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO




AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

PLANO DE ÁREA AFECTADA POR INCENDIO

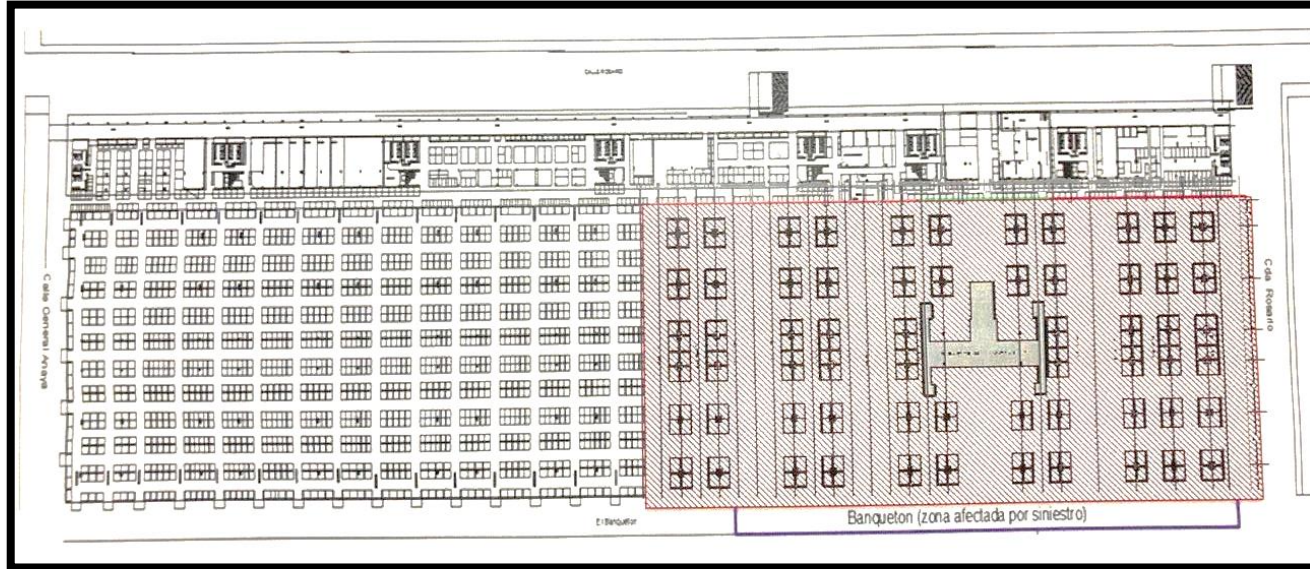

Fuente: Alcaldía Venustiano Carranza, Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano

EL 06 DE MARZO DE 2013 EL INSTITUTO DE SEGURIDAD DE CONSTRUCCIONES DEL DISTRITO FEDERAL, INDICA QUE EL ÁREA SINIISTRADA NO CUENTA CON LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y ESTABILIDAD, POR LO QUE RECOMIENDA SU DEMOLICIÓN.



SECRETARÍA
DE DESARROLLO
ECONÓMICO



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO




AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

1ª ETAPA, ENTIDAD EJECUTORA LA ALCALDÍA Venustiano Carranza, Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano (04 DE NOVIEMBRE 2013)

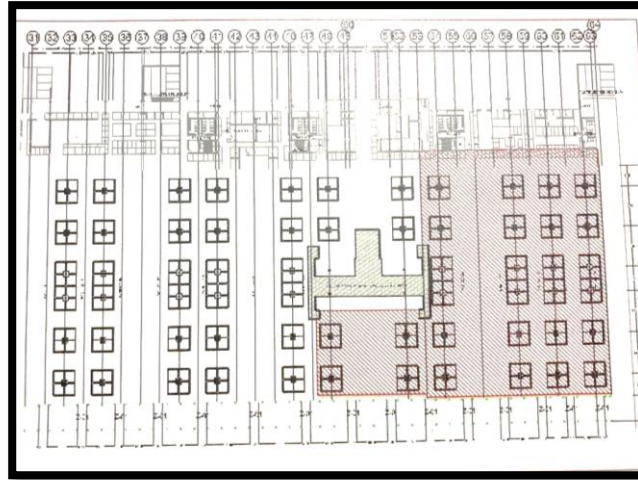

Fuente: Alcaldía Venustiano Carranza, Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano

INVERSIÓN \$20,711,732.20 CON I.V.A.

- DEMOLICIÓN DE COLUMNAS; LOSAS TAPA, DADOS Y CONTRATRABES DE CIMENTACIÓN.
- DEMOLICIÓN DE LOCALES COMERCIALES.
- ARMADO, CIMBRADO Y COLADO DE DADOS, CONTRATRABES Y LOSAS TAPA DE CIMENTACIÓN ASÍ COMO DE COLUMNAS.
- ARMADO, CIMBRADO Y COLADO DE LOSA DE PISO, COLUMNAS Y LOSA DE TECHO DE LOCALES COMERCIALES.
- CONSTRUCCIÓN DE REGISTROS Y DRENAJE SANITARIO.



SECRETARÍA
DE DESARROLLO
ECONÓMICO



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO




AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

2ª ETAPA, ENTIDAD EJECUTORA LA ALCALDÍA Venustiano Carranza, Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano (12 DE JUNIO 2014)

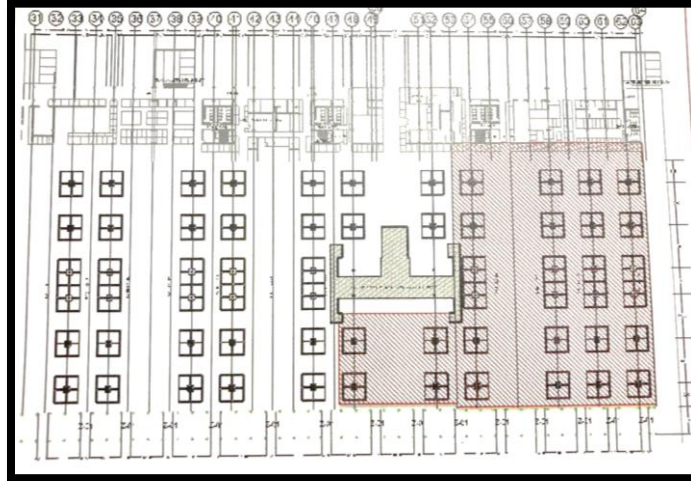

Fuente: Alcaldía Venustiano Carranza, Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano


INVERSIÓN \$58,619,378.46 CON I.V.A.

- RESTITUCIÓN DE 10 LOSAS DE CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIÓN DE LAS MISMAS.
- CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE FACHADAS PONIENTE Y SUR.
- ACABADOS EN LOCALES COMERCIALES DE FACHADAS ORIENTE, PONIENTE Y SUR.
- INSTALACIONES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y DRENAJE INTERIOR DE ESTA ZONA.
- BANQUETAS Y GUARNICIONES DEL ENTORNO.
- INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN EL INTERIOR DEL MERCADO MERCED NAVE MAYOR.



SECRETARÍA
DE DESARROLLO
ECONÓMICO

3ª ETAPA, ENTIDAD EJECUTORA ALCALDÍA Venustiano Carranza, Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano (2015)

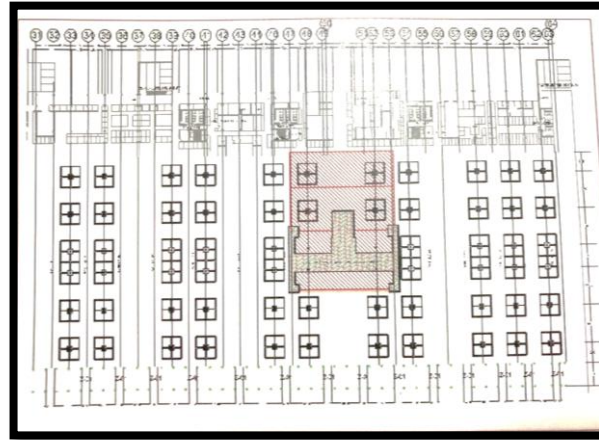

Fuente: Alcaldía Venustiano Carranza, Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano

INVERSIÓN \$20,000,000.00 CON I.V.A.

- DEMOLICIÓN DE CUBIERTAS, COLUMNAS, FIRMES Y DADOS DE CIMENTACIÓN.
- CONSTRUCCIÓN DE DRENAJES Y AGUA POTABLE, COLUMNAS LOCALES PERIMETRALES ZONA ORIENTE LOCALES, PERIMETRALES ZONA PONIENTE IMPERMEABILIZACIÓN LOCALES ORIENTE, MOVIMIENTO DE TAPIALES Y COMPLEMENTO CELOSÍA ORIENTE (DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN) CELOSÍA PONIENTE (DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN), SUPERVISIÓN DRO, RESTITUCIÓN DE FIRMES Y PISOS, CUBIERTAS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, BAJADAS PLUVIALES, HERRERÍA, INSTALACIÓN SISTEMA CONTRA INCENDIO.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO




AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

4ª ETAPA, ENTIDAD EJECUTORA ALCALDÍA Venustiano Carranza, Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano (PARCIAL)

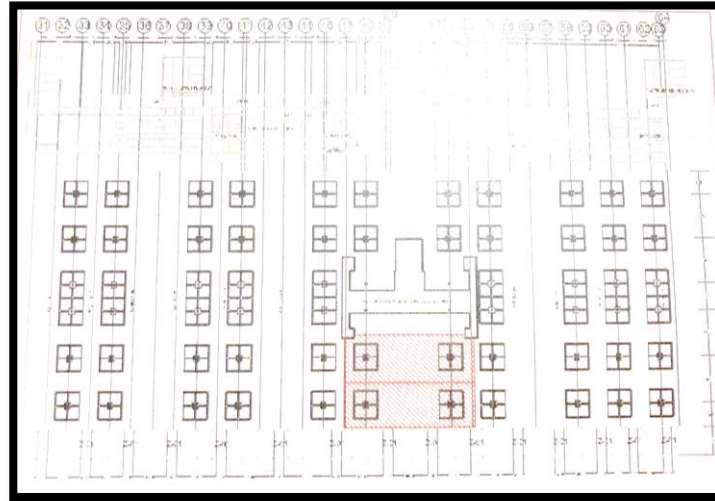

Fuente: Alcaldía Venustiano Carranza, Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano

INVERSIÓN \$20,000,000.00 CON I.V.A.

- SUPERVISIÓN DRO, RESTITUCIÓN DE FIRMES Y PISOS, CONSTRUCCIÓN DE 3 LOCALES DE CUBIERTAS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, BAJADAS PLUVIALES, HERRERÍA, INSTALACIÓN SISTEMA CONTRA INCENDIOS DE 15 LOCALES Y CONSTRUCCIÓN DE MUROS PERTENECIENTES AL METRO.



SECRETARÍA
DE DESARROLLO
ECONÓMICO



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

CONCLUSIÓN DE LA RECONSTRUCCIÓN. ETAPAS 1, 2, 3 Y 4 DE OBRAS



Fuente: Alcaldía Venustiano Carranza, Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano

FACHADA LATERAL



SECRETARÍA
DE DESARROLLO
ECONÓMICO



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

CONCLUSIÓN DE LA RECONSTRUCCIÓN. ETAPAS 1, 2, 3 Y 4 DE OBRAS



Fuente: Alcaldía Venustiano Carranza, Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano

LOCALES REHABILITADOS



SECRETARÍA
DE DESARROLLO
ECONÓMICO



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO




AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

4ª Y 5ª ETAPA, ENTIDAD EJECUTORA SOBSE (2019)

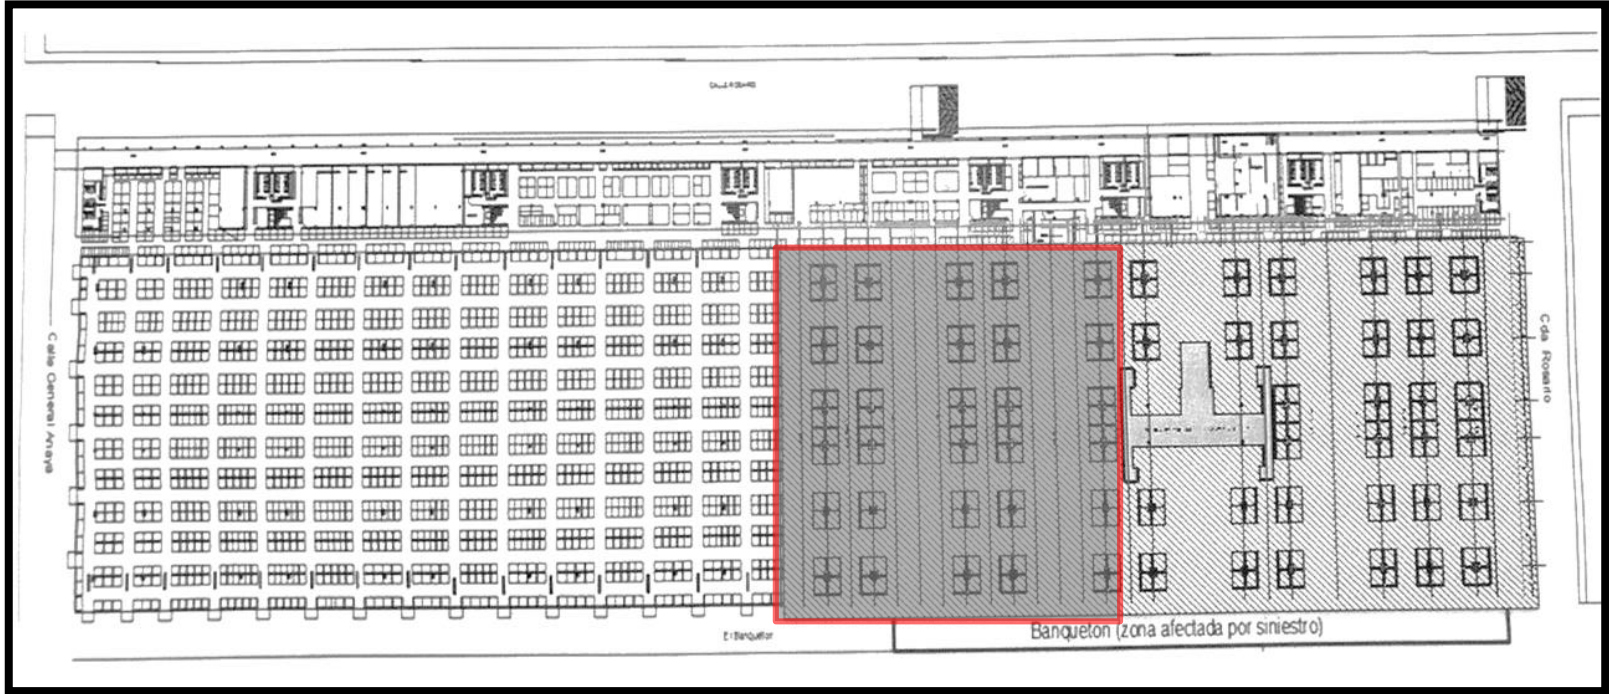

Fuente: Alcaldía Venustiano Carranza, Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano



SECRETARÍA
DE DESARROLLO
ECONÓMICO



SEDEMA

1. Los días **4, 5, 10 y 11 abril** se **realizó recorrido** en Av. 5 de Mayo entre Eje Central Lázaro Cárdenas y Calle Monte de Piedad, Calle Tacuba entre Eje Central Lázaro Cárdenas y Calle Monte de Piedad, Calle República de Uruguay entre Eje Central Lázaro Cárdenas y Av. 20 de Noviembre y Calle Venustiano Carranza entre Eje Central Lázaro Cárdenas y Av. 20 de Noviembre, para el **diagnóstico y marcaje de 123 sitios de plantación**.
2. El **5 y 10 de abril** se **realizaron calas** en Av. 5 Mayo entre Eje Central Lázaro Cárdenas y Calle Monte de Piedad y Calle Tacuba entre Eje Central Lázaro Cárdenas y Calle Monte de Piedad, **se encontró infraestructura de energía y cableado de luminarias**, por lo que **Autoridad del Centro Histórico** se **comprometió a comentar** lo anterior **con las dependencias** responsables.



PGJ

Tema	Línea base	Periodicidad	Semana al 16/04	Próximo reporte
Infraestructura	Número de delitos de medidores de agua	Semanal	2	23 de abril

No. CARPETA DE INVESTIGACION	FECHA Y HORA	DELITO	CALLE	COLONIA	SINTESIS DE LOS HECHOS
CI-FCH/CUH-4/UI-1SD/496/04-2019	10/04/2019 13:40	ROBO DE OBJETOS		CENTRO DE LA CIUDAD DE MEXICO AREA 3	SE PRESENTA ANTE ESTA REPRESENTACION SOCIAL A EFECTO DE MANIFESTAR HECHOS POSIBLEMENTE CONSTITUTIVOS DE DELITO ROBO MEDIDOR DE AGUA
CI-FCH/CUH-4/UI-2SD/503/04-2019	11/04/2019 15:05	ROBO DE OBJETOS	REPUBLICA DE PERU	CENTRO DE LA CIUDAD DE MEXICO AREA 2	EL QUERELLANTE MANIFIESTA FUE ROBADO UN MEDIDOR DE AGUA



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Mesas de trabajo

Continuamos transmitiendo en vivo



Proyectos de Intervención Urbana

- Se convoca a **reunión el miércoles 17 de abril** a las **12:00 horas** en la Autoridad del Centro Histórico
- **Acuerdos** de la reunión sobre el **Ducto Máster**



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO







AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO

Obras Irregulares



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

No.	Ubicación	Asunto	Fecha de atención	Dependencia	Acción	Estatus	Predio
1	Republica de Perú 122-124	Demolición parcial	11 de marzo	P. Civil	Suspensión de Actividades	INAH inició procedimiento Administrativo en rebeldía, está en periodo de pruebas.	
			13 y 14 de marzo	SEDEMA	Se realizó diligencia		
			15 de marzo	INAH	Suspensión de Obra		
2	República de Bolivia 83	Demolición parcial	14 de marzo	P. Civil	Suspensión de Actividades	INAH inició el procedimiento administrativo, está en periodo de pruebas. Acudieron al INAH por asesoría técnica para presentar un proyecto de obras para autorización.	
			14 de marzo	SEDEMA	Clausura		
			15 de marzo	INAH	Suspensión de Obra		
3	Motolinia 40	2 niveles adicionales no permitidos y demolición parcial	4 de abril	PAOT	Clausura (medida precautoria)	INAH citó a una Audiencia Administrativa el 10 de abril. Inició de periodo de pruebas.	
			5 de abril	INAH	Suspensión de Obra		
4	Argentina 94 - 96	Demolición Parcial	5 de abril	INVI	Revisión administrativa	Solo el No. 94 es del INVI. Serán verificados por P. Civil y SEDEMA para posible suspensión de actividades y clausura.	
			9 de abril	P. Civil	Se inicia diligencia		
			9 de abril	SEDEMA	Se inicia diligencia		



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

La Directora General de Evaluación de Impacto y Regulación Ambiental se presentó y solicitó el apoyo de la SSC por presentarse trabajos de demolición y retiro de cascajo SIN AUTORIZACIÓN



Inmueble ubicado en Av. 20 de Noviembre
No.195 entre Plaza Tlaxcoaque y Nezahualcóyotl



Acudió al lugar el Director General Jefe Cuauhtémoc con su personal logrando llevarse 6 personas y 3 vehículos, para conducirlos a la FEDAPUR.

Inmueble ubicado en Av. 20 de Noviembre No.195 entre Plaza Tlaxcoaque y Nezahualcóyotl



Obras Irregulares

- Se convoca próxima reunión lunes 22 de abril a las 12:00 hrs



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Acuerdos

Continuamos transmitiendo en vivo



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Asistencia

Continuamos transmitiendo en vivo



Muchas gracias

Próxima sesión:
23 de abril de 2019, a las 10:30 horas
