



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
CULTURA
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

**Inicio de la transmisión en vivo
17 de diciembre de 2019**



Orden del día

Reportes

Turnos e incidencias urbanas

Mesas de trabajo

Asuntos generales

Acuerdos

Asistencia

Transmisión en vivo



ACH

Tema	Indicador	Periodicidad	Semana al 02/12	Semana al 16/12	Próximo reporte
Tiraderos clandestinos	Metros cúbicos de residuos sólidos levantados en tiraderos clandestinos en el perímetro de ACH	Semanal	1,083 m3	1,205 m3	24 de diciembre
Limpieza	Metros cúbicos de basura recolectada en el Perímetro de la ACH (Producto de Barrido)	Semanal	2,403 m3	2,670 m3	24 de diciembre
Mantenimiento a infraestructura	Número de Incidencias de daño en infraestructura del Perímetro de la ACH reparadas y atendidas	Semanal	20	30	24 de diciembre



ACH | Eliminación de grafiti

156

m² totales

*La mayoría son reincidencias

calles atendidas **37**
cortinas metálicas **11**
fachadas **15**





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

CENTRO
HISTÓRICO

Eliminación de grafiti en cantera

**Se retiraron 21 m2 de grafiti sobre cantera esta semana
En Tacuba**

Se han limpiado
1,543 m²

Se trabajo en
inmuebles con
licencia del INAH
utilizando **gel
desincrustante.**



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



CENTRO
HISTÓRICO

ACH | obras menores

Se realizaron trabajos en:

Moneda
Primo de Verdad
República de Brasil
San Jerónimo
Plaza de la Fundación
Monte de Piedad
Bolívar
Donceles

Los trabajos realizados consistieron en **reposición de dos piezas de dren** en Moneda, **una pieza de dren** en Primo de Verdad y Ramos, **colocación de 3 bolardos** en Belisario Domínguez y República de Brasil, **reparación de 13 puntos diferentes de piso, banqueta y fuentes** en Plaza de la Fundación, **reparación de piso y guarnición** en **guarnición** en Monte de Piedad entre Madero y 5 de Mayo, **reparación de guarnición** en Bolívar y **reparación de piso estampado en arroyo vehicular** en Donceles entre República de Brasil y República de Argentina .



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS





Alc. Cuauhtémoc

Tema	Indicador	Periodicidad	Semana al 09/12	Semana al 16/12	Próximo reporte	Observaciones
Luminarias	Número de Luminarias reparadas en vías secundarias en PB de Cuauhtémoc	Quincenal	32	30	31 de diciembre	Se realizó la revisión a 62 luminarias
Poda	Número de sujetos forestales podados	Quincenal	25	10	31 de diciembre	Se realizó la poda a 35 sujetos forestales



Alc. Cuauhtémoc

Tema	Indicador	Periodicidad	Semana al 09/12	Semana al 16/12	Próximo reporte	Observaciones
Desazolve	Red de drenaje desazolvada en PB de Cuauhtémoc (m lineales)	Quincenal	76	70	31 de diciembre	Se realizó el desazolve de 146 metros lineales
Limpia (Colecta de solidos)	Escuelas limpias y toque de campana	Quincenal	245	260	31 de diciembre	Se recolectaron 505 m3 de residuos sólidos (40 m3 de residuos orgánicos y 465 m3 de inorgánicos)
Bacheo	Programa de bacheo en el CH	Anual	105	80		Se realizaron 185 baches en todo el polígono del C.H.



Alc. Venustiano Carranza

Tema	Indicador	Periodicidad	Semana al 09/12	Semana al 16/12	Próximo reporte	Observaciones
Luminarias	Número de Luminarias reparadas en vías secundarias	Semanal	6	0	31 de diciembre	La Coordinación territorial no realizó trabajos de alumbrado público en el Perímetro B del Centro Histórico
Tiraderos clandestinos	Toneladas de residuos solidos recolectados de tiraderos clandestinos en el PB de VC (línea base: 26 tiraderos) m3	Semanal	554.4 m3	585.2 m3	31 de diciembre	Se recolectaron 38 toneladas diariamente de Residuos Sólidos



Alc. Venustiano Carranza

RELACION DE TIRADEROS CLANDESTINOS				
Nº. CONSECUTIVO	UBICACIÓN	TIPO DE RESIDUOS SÓLIDOS %	CANTIDAD TONS	SECTOR
01	MIGUEL DOMINGUEZ Y PENITENCIARIA COL. AMPLIACIÓN PENITENCIARIA	90% BASURA 10% CASCAJO	1.6	S-1
02	EJE 1 NORTE Y HORTELANOS COL. MORELOS	90% BASURA 10% CASCAJO	1.8	S-1
03	AV. CIRCUNVALACIÓN ENTRE HÉROES DE NACOZARI Y SAN ANTONIO TOMATLAN	85% BASURA 15% CASCAJO	0.9	S-2
04	ZAPATA ESQ. AV. CIRCUNVALACIÓN	85% BASURA 15% CASCAJO	1.8	S-2
05	NACIONAL ESQ. VIDAL ALCOCER	85% BASURA 15% CASCAJO	1.6	S-2
06	COSTA RICA ESQ. VIDAL ALCOCER	85% BASURA 15% CASCAJO	1.6	S-2
07	PEÑA Y PEÑA ESQ. VIDAL ALCOCER	85% BASURA 15% CASCAJO	2	S-2
08	VIDAL ALCOCER Y BERRIOZABAL COL. MORELOS	85% BASURA 15% CASCAJO	1.6	S-2
09	AV. CIRCUNVALACIÓN Y G. PEDRAZA (MERCADO DULCES I) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	1.6	S-9
10	AV. CIRCUNVALACIÓN Y CARRIZAL (MERCADO DE FLORES) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	1.5	S-9
11	AV. CIRCUNVALACIÓN Y CARRETONES (METRO MERCED) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	1.4	S-9
12	JUAN DE LA GRANJA Y CORREGIDORA (LAS CANCHAS) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	1.2	S-9
13	SANTA ESCUELA Y CUADRANTE DE LA SOLEDAD COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	1.4	S-9

RELACION DE TIRADEROS CLANDESTINOS				
Nº. CONSECUTIVO	UBICACIÓN	TIPO DE RESIDUOS SÓLIDOS %	CANTIDAD TONS	SECTOR
14	ROSARIO ESQ. PLAZA SAN LAZARO (ATRÁS DE LA IGLESIA) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	1.4	S-9
15	AV. CIRCUNVALACIÓN Y SOLEDAD COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	1.4	S-9
16	AV. CIRCUNVALACIÓN Y MANZANARES COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	1.6	S-9
17	JUAN PABLO ESQ. CORREGIDORA COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	1.2	S-9
18	CONGRESO DE LA UNIÓN ESQ. GENERAL ANAYA COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	1	S-9
19	GENERAL ANAYA ESQ. JUAN DE LA GRANJA COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.5	S-9
20	JUAN DE LA GRANJA ESQ. SAN CIPRIAN COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	1.4	S-9
21	CORREGIDORA Y SAN SIMÓN COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	1	S-9
22	PLAZA DE LA SOLEDAD, SAN SIMÓN Y SANTA ESCUELA COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	1.5	S-9
23	TOLVA 2 COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	1.7	S-9
24	TOLVA 3 COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	2	S-9
25	AV. CIRCUNVALACIÓN Y CARRETONES COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	1.5	S-9
26	JUAN DE LA GRANJA ESQ. SAN CIPRIAN COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	1.8	S-9



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Alc. Venustiano Carranza



Montón Tradicional



Recolección de cascajo



Trabajos de Intervención en Av. Hidalgo y Eje Central Lázaro Cárdenas



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



SACMEX

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



SACMEX

Tema	Indicador	Periodicidad	Semana al 02/12	Semana al 16/12	Próximo reporte
Proyectos de Intervención Urbana	Porcentaje de avance de proyectos de intervención urbana	Semanal	88.63 %	97.00 %	31 de diciembre

Sustitución de la Red de Agua Potable

Av. Hidalgo.



Avance físico programado global: 97.12%
 Avance físico real global: 97.00%

Fecha de inicio
24 Octubre 2019
Fecha de termino:
 De Eje Central a 2 de Abril: 20 de Nov 2019
 De Valerio Trujano a Reforma: 18 de Dic 2019

- Tubería Existente — — 370.00 m.
- Tubería Instalada —— 353.00 m.
- Cajas y conexiones pendientes
- conexiones realizadas


Sustitución de la Red de Drenaje

Av. Hidalgo y Eje Central



Avance físico programado global: 97.12%
 Avance físico real global: 97.00%

Fecha de inicio
24 Octubre 2019
Fecha de termino
 De Eje Central a 2 de Abril: **20 de Nov 2019**
 De Valerio Trujano a Reforma: **7 de Dic 2019**
 De Valerio Trujano a 2 de abril: **7 de Dic 2019**

Tubería Existente		526.00 m.
Tubería Instalada		526.00 m.
Eje Central Ø 30 = 156.00		
Av. Hidalgo Ø 30 = 170.00		
Av. Hidalgo Ø 38 = 200.00		



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL

2019




GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS



VIOLETA, GALEANA Y RIVA PALACIO

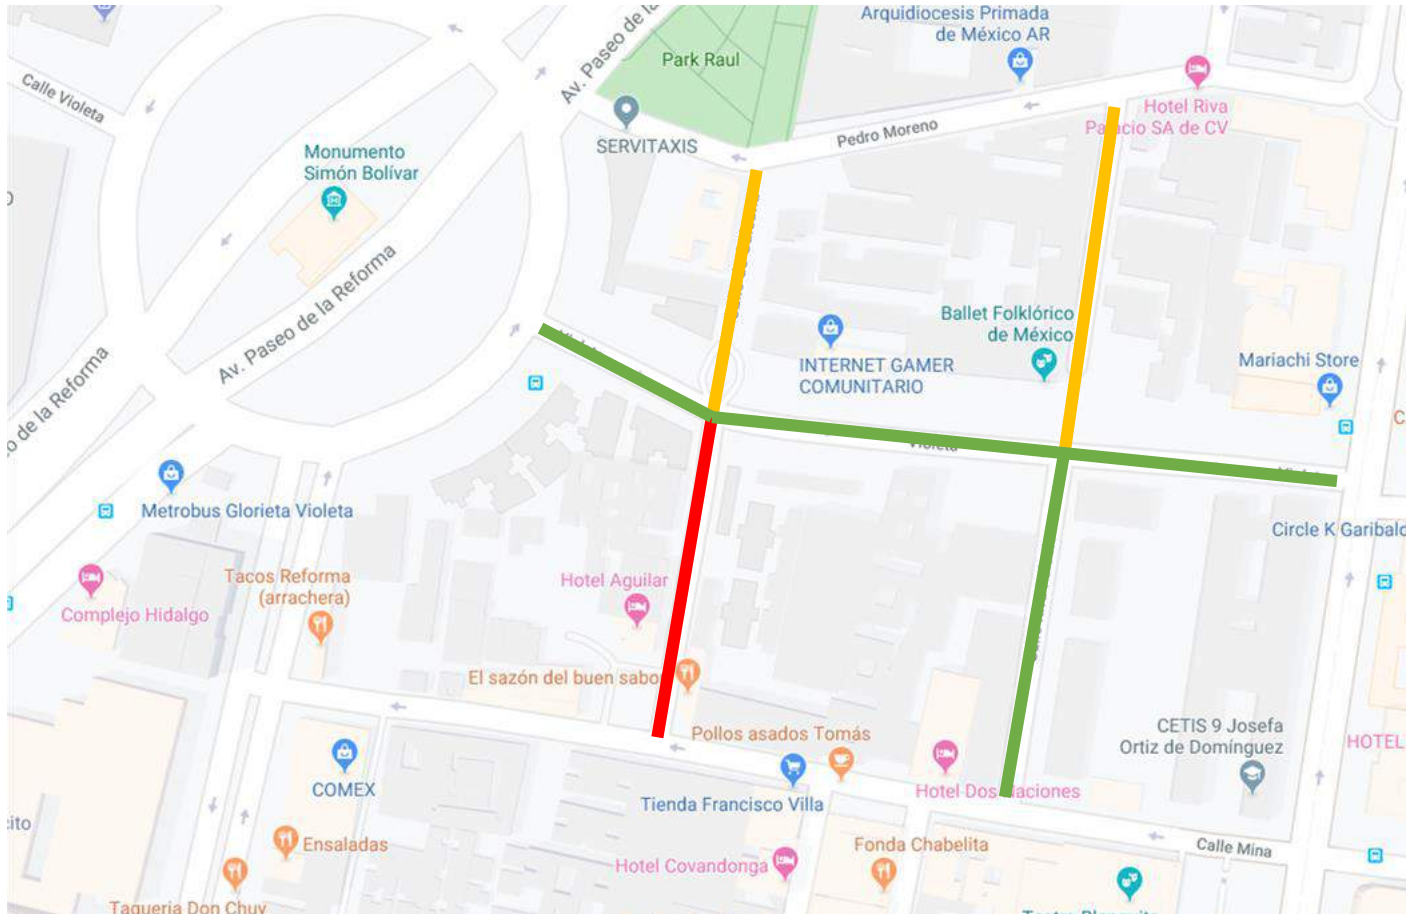

• **Calle Violeta avance de obra 85%**
Colado guarnición en la esquina reforma,
Colocación de precolado y recinto,
Colocación de lámparas y conductores eléctricos
Colocación de Tierra

• **Calle Riva Palacio Sur avance de obra 94%**
Colocación de recinto en esquinas

• **Calle Riva Palacio Norte avance de obra 50%**
colocación de recinto y precolados,
colocación de drenes

• **Calle Galeana Norte avance del 50%**
Colocación de recinto y precolado, placas jardineras y lamparas.
Colocación de recinto en esquinas

• **Calle Galeana Sur avance del 40%**
Colocación de recinto, demolición de banquetas, colocación tubo pad alumbrado público, colocación de posteria alumbrado



VIOLETA, GALEANA Y RIVA PALACIO



Colocación de precalado terracota



Colocación de lámparas y conductores eléctricos



Colado de guarnición



Armado para guarnición



Colocación de bolardos



VIOLETA, GALEANA Y RIVA PALACIO



Colocación de posteria alumbrado



Demolición de banqueta




Colocación de jardineras



Colocación de guarnición



ANTIGUO BARRIO SAN PABLO DE ZOQUIAPAN

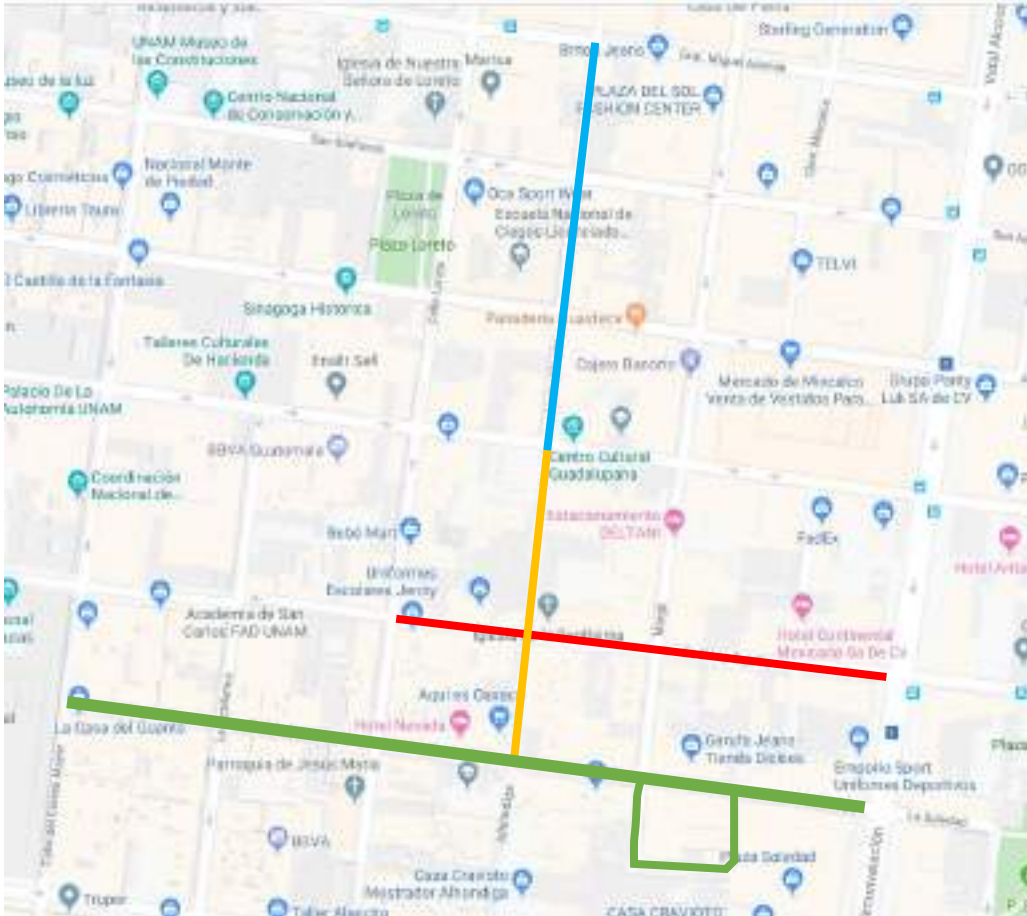

- **Calle Soledad avance de obra 88%**
Colocacion de recinto en banquetas.

Colocacion de luminarias/Detalles.

- **Callejón de Lecheras avance de obra 99.5%**
Detalles



- **Calle de la Santísima avance de obra 40%**

Colocacion de marmol



- **Leona Vicario avance de obra 50%**
Colado de MR-45
Colado de guarnición
Colado de fluido en arroyo vehicular y banquetas



- **Emiliano Zapata avance de obra 0%**
Sin Intervención



ANTIGUO BARRIO SAN PABLO DE ZOQUIAPAN



Colado de guarnición



Colado de banquetas



Colado en arroyo vehicular



Colocación de Iluminación



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

ANTIGUO BARRIO SAN PABLO DE ZOQUIAPAN



Colocación de recinto en banquetas



Colado de MR-45 Leona Vicario






PLAZA LORETO, JARDIN DEL OBISPO Y VALERIO TRUJANO



Plaza Loreto



Jardín del Obispo

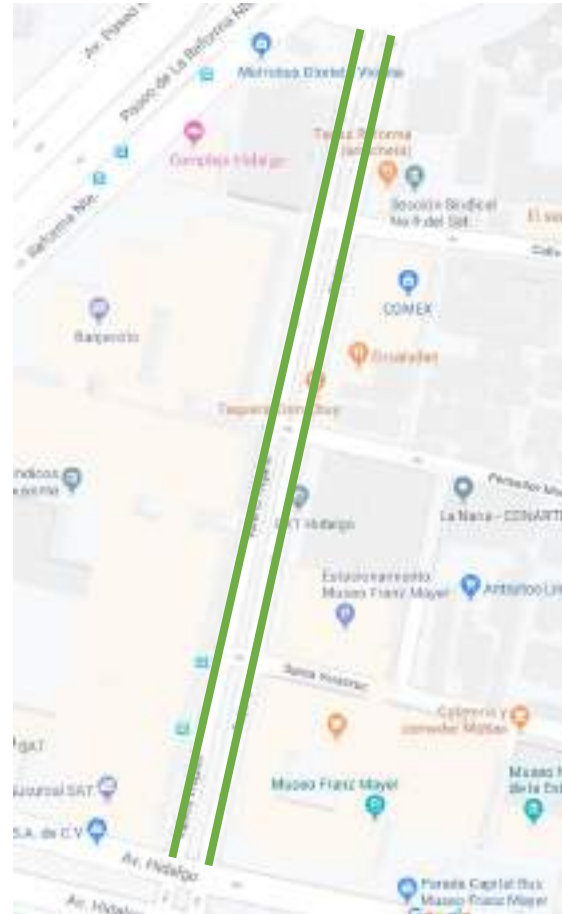

Calle Valerio Trujano



- **Calle Valerio Trujano Oriente avance de obra 92%**

Colocación de recinto en tramo de calle Javier Mina- Paseo de la Reforma y detalles

- **Calle Valerio Trujano acera Poniente avance de obra 70%**

Demolición de banquetas, colado de relleno fluido en banqueta, armado, cimbrado y colado de guarniciones, retiro de vegetación de ornato y retiro de vías de tranvía



- **Plaza Loreto avance de obra 21.43%**

Colocación de recinto y colocación de placas para jardineras



- **Jardín del Obispo avance de obra 52%**

Colocación de recinto y trabajos de obra de CFE.



PLAZA LORETO, JARDIN DEL OBISPO Y VALERIO TRUJANO



Habilitación de acero para postes en C.Valeriano Trujano



Renivelacion de registros eléctricos Plaza Loreto




Colocacion de marmol sto. Tomas





BARRIO DE SANTA MARÍA LA REDONDA

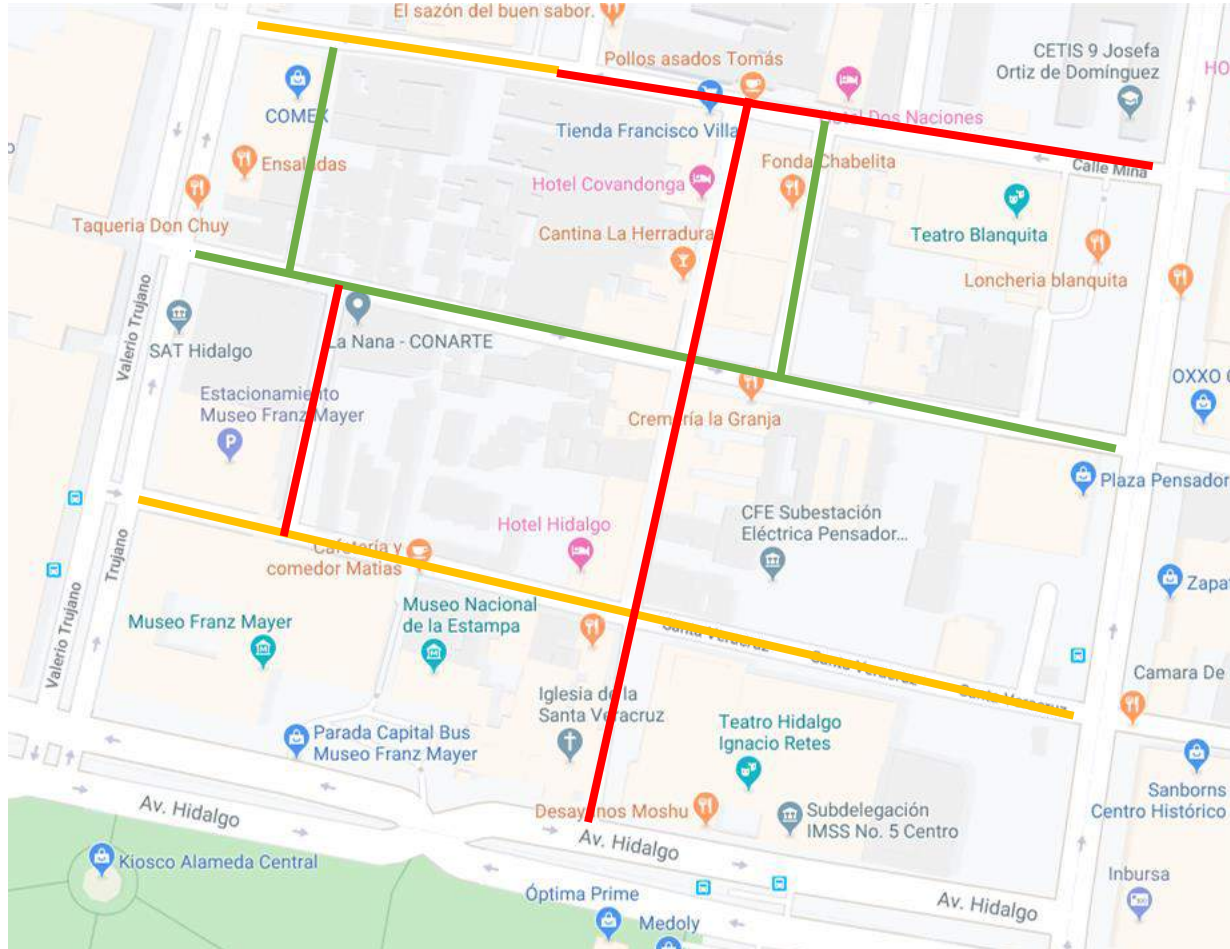

- **3er Callejón de San Juan de Dios avance de obra 50%**

Colocación de recinto en áreas peatonales

- **Plaza 2 de Abril avance de obra 65%**

Colocación dd recinto

- **Calle Pensador Mexicano avance de obra 40%**

Colocacion de Recinto

Colado de relleno fluido en banquetas

Colado de MR45 en vialidad



- **Calle Mina avance de obra 17%**

Colado de relleno fluido en banquetas, trabajos demolición

- **Calle Santa Veracruz avance de obra 40%**

Colocación de recinto

Retiro de vegetación de ornato

Canalización de luminarias.



- **Calle Mina**

Sin intervención del tramo de la calle Galeana a Eje Central

- **2do Callejón de San Juan de Dios 0%**

Sin intervención

- **Calle 2 de Abril**

Intervención de SACMEX



BARRIO DE SANTA MARÍA LA REDONDA



Avance plaza 2 de abril



Santa Veracruz cimbrado de guarnición




Avance de obra 3er Callejón de San Juan de Dios



Avance de obra Pensador Mexicano



EJE CENTRAL

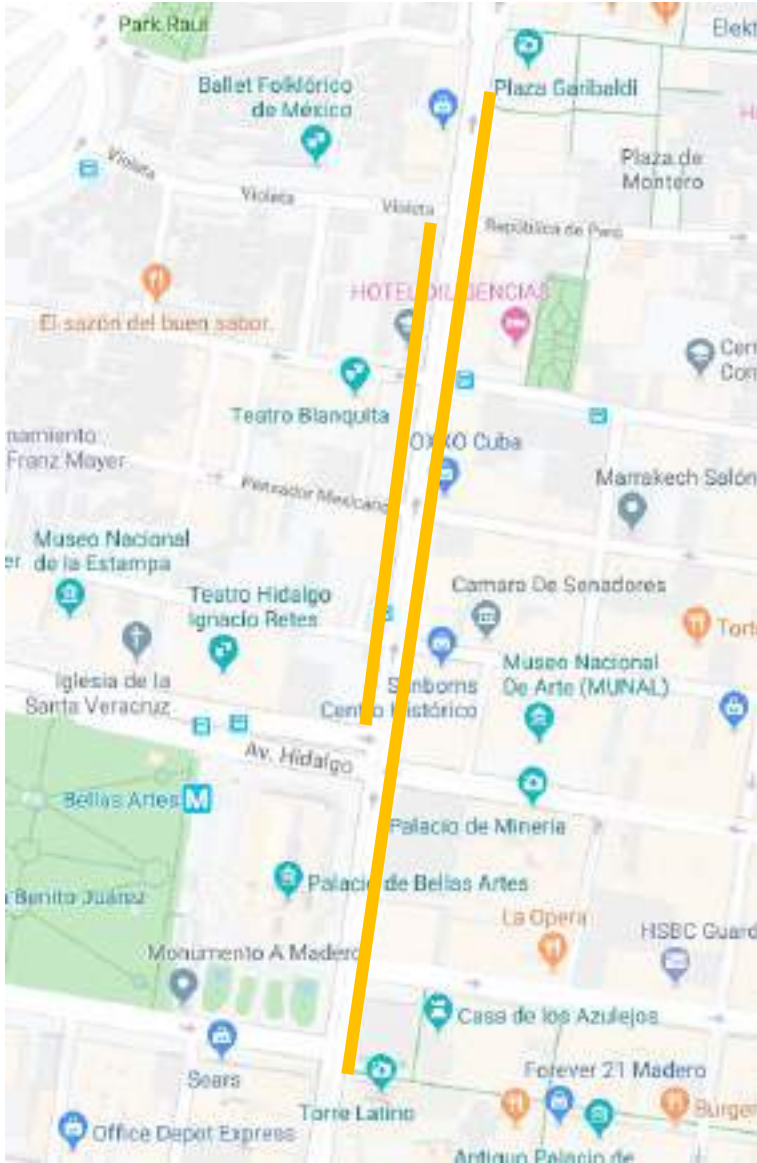

- **Eje Central acera Oriente avance de obra 11%**

Retiro de material producto de demolición, armado de cadena para desplante de muro de contención de concreto armado. 5 de mayo a Tacuba.

Colocación de recinto frente a acceso palacio postal (abanico), Descimbrado de guarnición, preparación para colado de bases para bolardos. Tacuba a Donceles

Preparación del terreno para guarnición. Donceles Rep. De cuba colado de fluido. Cuba a Belisario. Armado de murete, colocación de dren.

Renivelación y tapas para registros.

Detalles de recinto. Belisario Domínguez a Perú.

Colocación de recinto, trazo para desplante de bases del tapial a base de estructura.

- **Eje Central acera Poniente avance de obra 10%**

Acera pte.

Hidalgo a santa Veracruz.

Colocación de recinto. Santa Veracruz pensador mexicano colado de fluido para nivelación de banqueta.

Pensador mexicano a mina colocación de recinto y mármol.

Mina a violeta

Excavación para niveles de proyecto y renivelación con fluido



EJE CENTRAL



Demolición de banqueta y
guarnición



colocación de bases y registros para luminarias



colocación de guarniciones



colocación de recinto





AV. HIDALGO



- **Av. Hidalgo avance de obra 50%**

- En el tramo de Calle Héroes- Paseo de la Reforma colado de relleno fluido
- En tramo Paseo de la Reforma- Valerio Trujano colado de relleno fluido y colocación de recinto.
- En el tramo Valerio Trujano a 2 de Abril colado de relleno fluido y colocación de recinto
- En el tramo 2 de Abril a Eje Central colado de relleno fluido, colocación de recinto, colado de MR45 en arroyo vehicular, renivelación de registros pluviales.



AV. HIDALGO



Colado de relleno fluido Valerio Trujano



Colocado de relleno fluido en banquetas



colocacion de recinto negro y amarillo Oaxaca



Ajustes para registros



Colocación de recinto en Av Hidalgo



SOS – Alumbrado Público

Tema	Indicador	Periodicidad	Semana al 09/12	Semana al 16/12	Próximo reporte
Alumbrado Público	Número de luminarias reparadas en vías del PA del CH	Semanal	49	17	24 de diciembre
Alumbrado Público	Mantenimiento de iluminaciones artísticas	Semanal	00	00	24 de diciembre



SOS – Alumbrado Público | Anexo 1

Reporte de luminarias reparadas en el Centro Histórico Perímetro A

Dirección	Entre calles	Colonia	Cantidad	Motivo	Incidencia
Alhóndiga	Manzanares Corregidora	Centro	5	Se realiza reconexión de líneas de alimentación	Luminarios apagados
Plaza de la constitución	Perimetral	Centro	4	Se realiza reconexión de líneas de alimentación	Luminarios apagados
Avenida Juárez	Luis moya Balderas	Centro	5	Se realiza reconexion de lineas	Luminarios apagados
José maría izazaga	Simon bolivar Callejon igualdad	Centro	1	Se realiza reconexión de líneas de alimentación	Luminario apagado
Francisco I. Madero	Motolinia Simon bolivar	Centro	2	Se realiza cambio de lampara	Luminarios apagados



STC-METRO

Tema	Indicador	Periodicidad	Quincena al 16/12	Próximo reporte
Infraestructura	Número de escaleras electromecánicas con falla o algún problema (línea base: 75 escaleras en 29 estaciones)	Quincenal	10 escaleras detenidas	31 de diciembre
Infraestructura	Número de elevadores en reparación (línea base: 19 elevadores en 29 estaciones)	Quincenal	0 elevadores detenidos	31 de diciembre



CFE


Actividad	Unidad	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Próximo reporte
Limpieza de registros y/o desagües	Piezas	355	825	
Registros de robos		0	7	31 de diciembre
Atención a las fallas	Eventos	84	204	



ADIP

Tema	Indicador	Periodicidad	Reporte al 02/12	Reporte al 16/12	Próximo reporte
Conectividad e Infraestructura Tecnológica	Número de puntos de conexión wifi habilitados en postes de C5 (Línea base: 561)	Semanal	371	399	30/12/2019

Avance de despliegue de Postes con WiFi

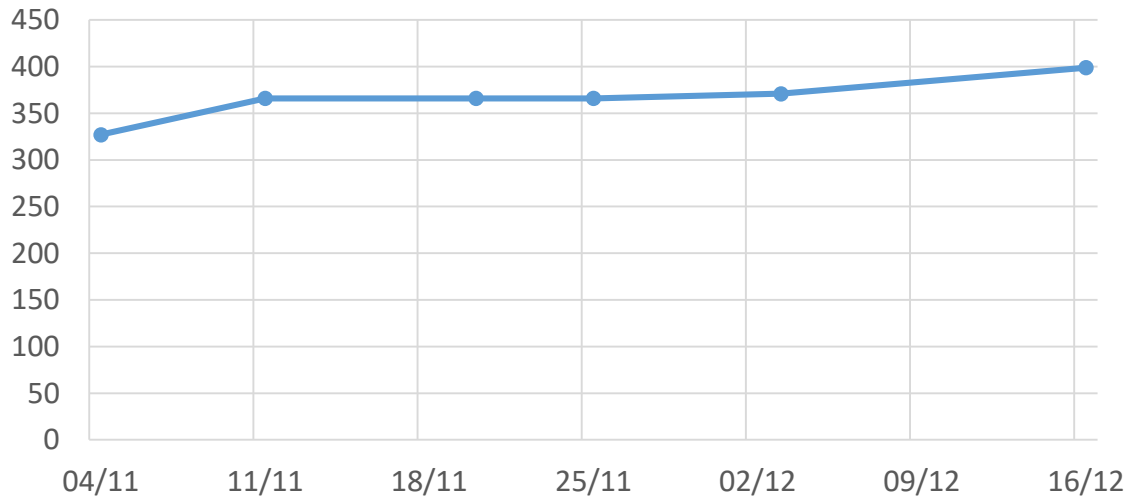

¿Cómo saber **dónde están?**

Ingresa al módulo **WiFi más cercano** en **App CDMX**





¿Cómo funcionan?



Funcionan con un radio de cobertura de hasta **50 metros**



Su utilización **no tiene límite de tiempo ni de contenido** y es **totalmente provisto por el Gobierno de la Ciudad**



Velocidad hasta de **20 Mbps**



Hasta **20 personas conectadas simultáneamente** por cada poste



INAH

Tema	Indicador	Periodicidad	Reporte al 02/12	Reporte al 16/12	Próximo reporte	Observaciones
Obras en el Centro Histórico	Número de trámites de solicitud de autorización de obra en inmuebles ubicados en el Centro Histórico	Semanal	13	14	31 de diciembre	Anexo 1
	Número de autorizaciones de obra en inmuebles ubicados en el Centro Histórico	Semanal	5	13	31 de diciembre	Anexo 2



INAH

Anexo 1. Tramites de solicitudes de autorización de obra en inmuebles ubicados en el "Centro Histórico de la Ciudad de México" ingresados en la Ventanilla Única del 3 al 16 de diciembre de 2019

Fecha de ingreso	Ubicación	Nº	Tipo de Obras
3-dic.-19	BUCARELI	8	PINTURA MURAL
3-dic.-19	DONCELES	26	TERMINACION DE OBRA
3-dic.-19	VIZCAINAS PONIENTE	10	MANTENIMIENTO
3-dic.-19	JOSE MA IZAZAGA	34	MANTENIMIENTO FACHADA
5-dic.-19	MOTOLINIA	6	PINTURA EN FACHADA
6-dic.-19	JOSE MARIA PINO SUAREZ	25	MANTENIMIENTO
9-dic.-19	PALMA NORTE	308-507	MANTTO MARQUESINA
9-dic.-19	REP ARGENTINA	94	DEMOLICION
10-dic.-19	AYUNTAMIENTO	29	APUNTALAMIENTO
10-dic.-19	EJE CENTRAL LAZARO CARDENAS	123	DEMOLICION
13-dic.-19	REPP BRASIL	33	PRORROGA LICENCIA
13-dic.-19	DONCELES	106	PRORROGA LICENCIA
16-dic.-19	REP SALVADOR	70	ADECUACION
16-dic.-19	REP CUBA	74	MANTENIMIENTO



INAH

Anexo 2. Autorizaciones de obra en inmuebles ubicados en el Centro Histórico del 3 al 16 de diciembre de 2019

Ubicación	Nº	Tipo de obra	Autorización
DR. JOSÉ MARÍA VERTIZ	96	PRÓRROGA	558/19
NEZAHUALCOYOTL	7	SUSTITUCIÓN DE CORTINA METÁLICA	559/19
JOSÉ MARÍA IZAZAGA	19	PRÓRROGA	560/19
JOSÉ MARÍA IZAZAGA	23	PRÓRROGA	561/19
NEZAHUALCOYOTL	10	PRÓRROGA	562/19
FRANCISCO I. MADERO	53	LIBERACIÓN DE AGREGADOS	565/19
REPÚBLICA DE BRASIL	53	MANTENIMIENTO	566/19
CRISTÓBAL COLÓN	1	MANTENIMIENTO	567/19
AVENIDA CHAPULTEPEC	67-ANTES 63	PRÓRROGA	568/19
LONDRES	8	MANTENIMIENTO DE FACHADA	569/19
JOSÉ MARÍA IZAZAGA	34	MANTENIMIENTO DE FACHADA	571/19
SAN ILDEFONSO	33	REHABILITACIÓN	573/19
VIZCAÍNAS PONIENTE	10	MANTENIMIENTO	574/19



SSC – SCT – DSOT (Tránsito)


Tema	Unidad de medida	Periodicidad	Del 2 al 15/12	Próximo reporte
Semáforos (141)	Número de semáforos con mantenimiento preventivo	Quincenal	47	24 de diciembre
	Número de semáforos con mantenimiento correctivo		90	
Cámaras (16)	Número de cámaras con mantenimiento preventivo		8	
	Número de cámaras con mantenimiento correctivo		6	



SSC-SCT-DSOT

CORRECTIVO	
ACOMETIDA	1
APAGADO	2
CAMBIA	1
CANALIZACION	3
CINTILANTE	22
CLOSTER DAÑADO	2
CONEXION	2
CORTO	9
DESCONECTADO	31
DESCOORDINADO	1
FALSO CONTACTO	1
FOCO FUNDIDO	3
TARJETA DAÑADA	4
VISERA ROTA	1
PREVENTIVO	
	47
TOTAL GENERAL	137

MANTENIMIENTO SEMAFORICO

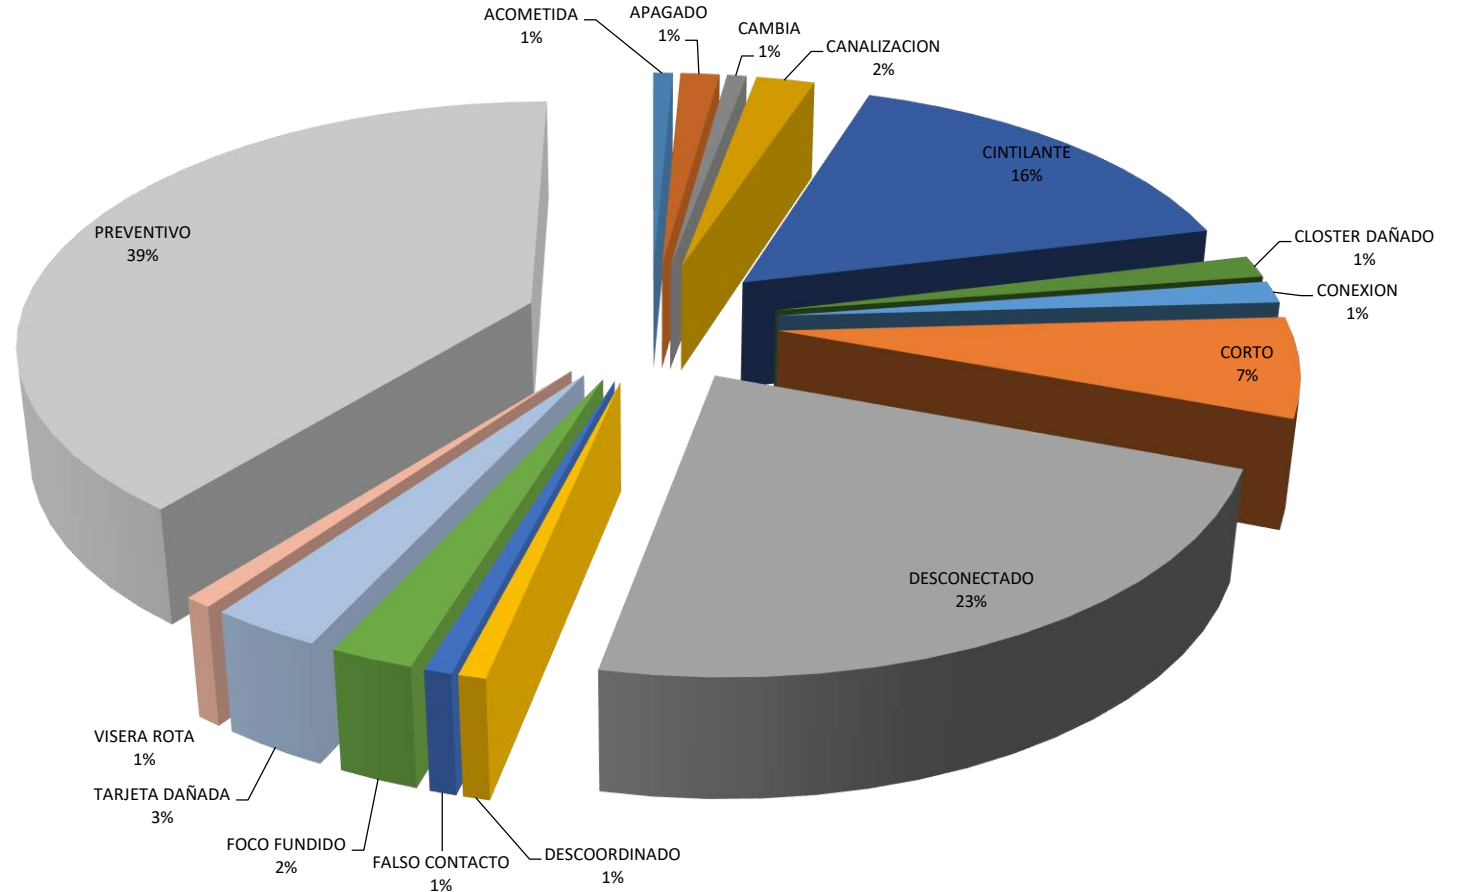




SSC-SCT-DSOT

CORRECTIVOS	
CORTO	5
SISTEMA SPRIT	1
PREVENTIVOS	
	8
TOTAL	14

Título del gráfico

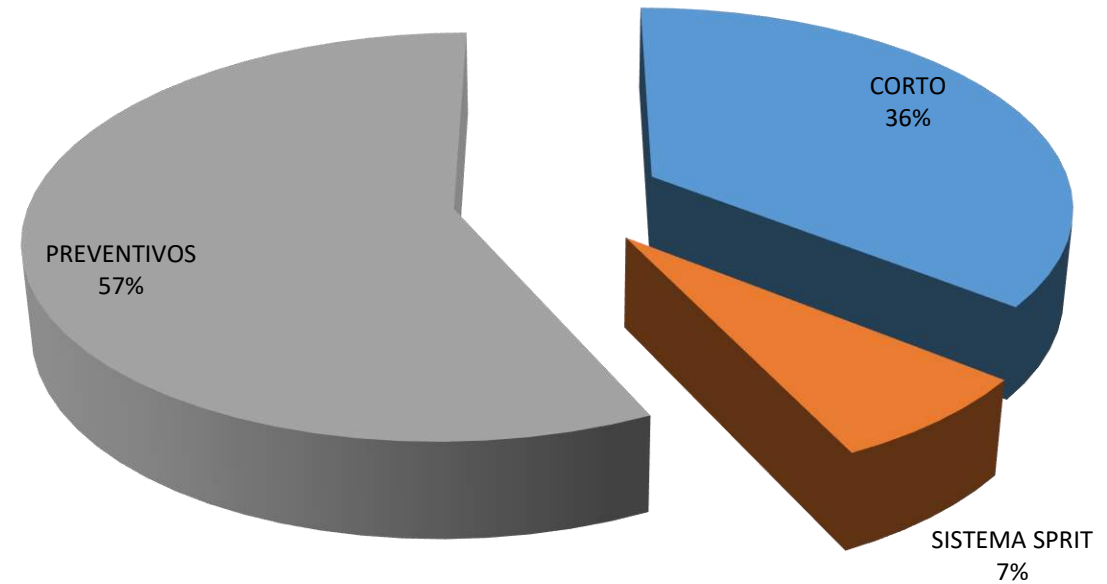



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



SECRETARÍA DE
CULTURA
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Orden del día

Reportes

Turnos e incidencias urbanas

Mesas de trabajo

Asuntos generales

Acuerdos

Asistencia

Corte de transmisión



Matriz de seguimiento a turnos Enero a Diciembre



Dependencia	Atendido	Proceso	Pendiente	Total general
ACH	33	3	1	37
ADIP	1			1
Al. Cuauhtémoc	16	1	4	21
Al. Venustiano Carranza	7			7
C5	7			7
CFE	7	2		9
ILIFE	1			1
INAH	3			3
INBAL			1	1
Metrobús	1			1
PGJ	3			3
SACMEX	9	1		10
SEDEMA	6	3		9
SEMOVI	1			1
SGIRPC	1			1
SOS-AP	5			5
SOS-DGOIV	7	1		8
SOS-DGSUS	2			2
SSC	8			8
STC-METRO	1			1
TELMEX	3			3
Tránsito	7			7
Total general	129	11	6	146



TURNOS NUEVOS

Del 03 al 16 de diciembre



FECHA DE REPORTE	SOLICITANTE	SOLICITUD	ATIENDE
16/12/2019	ACH	Verificar permisos de comercio establecido en el pasillo de la entrada central del Mercado Abelardo L. Rodríguez sobre República de Venezuela (donde se encuentra obra mural de Pedro Rendón Escenas Populares), obstruido actualmente y dañado por los diablitos de los comerciantes	Al. Cuauhtémoc
16/12/2019	ACH	Realizar diagnóstico del estado de conservación de la obra mural de Pedro Rendón Escenas Populares ubicada en el pasillo de la entrada del Mercado Abelardo L. Rodríguez, para establecer las recomendaciones correspondientes para la adecuada conservación de la obra mural.	INBAL
16/12/2019	UNAM	Poda en la Jardinería de José Vasconcelos, ubicada en San Ildefonso casi esquina Del Carmen	Al. Cuauhtémoc
16/12/2019	UNAM	Comparta el horario y rutas del servicio de recolección de basura para estar en condiciones de sacar la basura de sus recintos en tiempo y forma	Al. Cuauhtémoc
16/12/2019	UNAM	Movimiento de bolardos para evitar reiteradas colisiones, en el Palacio de Medicina, en la calle de República de Venezuela y República de Brasil	ACH
17/12/2019	ACH	Solicitud de verificación en materia de trampas de grasas a los 19 establecimientos de Motolinía por motivo de la rehabilitación de jardinerías	SACMEX



TURNOS ATENDIDOS

Del 03 al 16 de diciembre

CLAVE	FECHA DE REPORTE	SOLICITANTE	SOLICITUD	ATIENDE	ESTATUS	FECHA DE ATENCIÓN	OBSERVACIONES
TCH-154	03/12/2019	SEDECO	Gestionar recorrido con CFE y Telmex a mercados para realizar diagnóstico del estado de las instalaciones eléctricas y de telefonía	ACH	Atendido	05/12/2019	Se realizaron recorridos a 2 mercados (Abelardo Rodríguez, Lagunilla ropa y telas)
TCH-155	03/12/2019	PROSOC	Se gestione reunión con Sacmex, Alc. Cuauhtémoc y PROSOC para revisar la conectividad de drenaje para cuatro unidades habitacionales.	ACH	Atendido	05/12/2019	



Matriz de seguimiento a Incidencias del 01 de enero al 16 de diciembre



Dependencia	Atendido	Pendiente	Proceso	Total general
ACH	1,317	22	2	1,341
Al. Cuauhtémoc	27	39	2	68
Al. Venustiano Carranza	4			4
C-5	2	1		3
CFE	99	91	8	198
CIS		3		3
IUSACELL		2		2
MCM TELECOM		1		1
SACMEX	119	33	3	155
SEDEMA		1	2	3
SGIRyPC	1			1
SOS-AP	121	16	1	138
SOS-DGOIV	11	22		33
SOS-DGOP		1		1
SOS-DGSUS		7		7
STC-METRO	3			3
TELMEX	49	7	7	63
TOTAL PLAY			1	1
Tránsito	36	2		38
Total general	1,789	248	26	2,063



Atención VIPPSC



VIPP 2. CALLEJÓN DEL 57 - PLAZA DE LA CONCEPCIÓN



Peticiones atendidas vía chat del 03 al 16 de diciembre

TOTAL	TEMA	UBICACIÓN	CALLE	Y CALLE	ATENDIÓ
1	Falla en alumbrado público	República de Cuba	Eje Central	Allende	SOS-AP



VIPP 4. ALAMEDA SECTOR FINANCIERO

Peticiones atendidas vía chat del 03 al 16 de diciembre



TOTAL	TEMA	UBICACIÓN	CALLE	Y CALLE	ATENDIÓ
1	Reposición de tapa de coladera	Donceles	Allende	Callejón Xicotencatl	SACMEX
1	Falla en alumbrado público	Isabel la Católica	República del Salvador	Francisco I. Madero	SOS-AP





VIPP 5. ZÓCALO



Peticiones atendidas vía chat del 03 al 16 de diciembre

TOTAL	TEMA	UBICACIÓN	CALLE	Y CALLE	ATENDIÓ
3	Falla en alumbrado público	Moneda	Primo de Verdad		SOS-AP
		Monte de Piedad	Tacuba	5 de mayo	
		Acera de Catedral	Plaza de la Constitución		





VIPP 6. ANTIGUA MERCED - MIXCALCO



Peticiones atendidas vía chat del 03 al 16 de diciembre

TOTAL	TEMA	UBICACIÓN	CALLE	Y CALLE	ATENDIÓ
1	Fuga de agua potable	Leona Vicario	República de Venezuela	San Antonio Tomatlán	SACMEX





Atención VIPPSC



VIPP 7. VIZCAINAS - CORREDOR CULTURAL REGINA

Peticiones atendidas vía chat del 03 al 16 de diciembre



TOTAL	TEMA	UBICACIÓN	CALLE	Y CALLE	ATENDIÓ
1	Falla en alumbrado público	Vizcaínas	Callejón de San Ignacio	Aldaco	SOS-AP



VIPP 8. SAN PABLO



Peticiones atendidas vía chat del 03 al 16 de diciembre

TOTAL	TEMA	UBICACIÓN	CALLE	Y CALLE	ATENDIÓ
2	Falla en suministro de energía eléctrica	Misioneros	Roldán	Eje 1 Oriente	CFE
		San Pablo	Correo Mayor		
2	Falla en semáforos	San Pablo	Correo Mayor		Tránsito
		Correo Mayor	Regina		
1	Falta tapa de registro	Roldán	San Pablo		SACMEX





INCIDENCIAS ATENDIDAS

Del 03 al 16 de diciembre



FECHA DE REPORTE	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS	OBSERVACIONES
05/12/2019	Falta en suministro de energía eléctrica	AV. MORELOS	ENRICO MARTÍNEZ	ITURBIDE	En el No. 30			CFE	Atendido	SE REEMPLAZARON FUSIBLES
09/12/2019	Falta en alumbrado público	JUÁREZ	LUIS MOYA	BALDERAS				SOS-AP	Atendido	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
CULTURA
CENTRO
HISTÓRICO

INCIDENCIAS EN PROCESO

Del 03 al 16 de diciembre



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

FECHA DE REPORTE	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS	OBSERVACIONES
10/12/2019	Retiro de caseta telefónica	TACUBA		MONTE DE PIEDAD				TELMEX	Proceso	



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



INCIDENCIAS PENDIENTES

Del 03 al 16 de diciembre



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

FECHA DE REPORTE	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS
03/12/2019	Falla en alumbrado público	REPÚBLICA DE CHILE	DONCELES	BELISARIO DOMINGUEZ				Al. Cusuhtémoc	Pendiente
04/12/2019	Falla en suministro de energía eléctrica	INDEPENDENCIA	LUIS MOYA	REVILLAGIGEDO				CFE	Pendiente
04/12/2019	Tapa de registro dañada	ARTÍCULO 123		ITURBIDE	Esquina			CFE	Pendiente
04/12/2019	Falla en alumbrado público	ALTUNA						Al. Cusuhtémoc	Pendiente
04/12/2019	Falla en suministro de energía eléctrica	JESÚS MARÍA	EMILIANO ZAPATA	SOLEDAD				CFE	Pendiente
04/12/2019	Falla en alumbrado público	REPÚBLICA DE CHILE	BELISARIO DOMINGUEZ	REPÚBLICA DE PERÚ				Al. Cusuhtémoc	Pendiente
04/12/2019	Falla en alumbrado público	MARIANA DEL TORO DE LAZARIN	ALLENDE	REPUBLICA DE CHILE				Al. Cusuhtémoc	Pendiente



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



INCIDENCIAS PENDIENTES

Del 03 al 16 de diciembre



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS



FECHA DE REPORTE	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS
04/12/2019	Falla en alumbrado público	REPÚBLICA DE ECUADOR	SAN CAMILITO	EJE CENTRAL (LÁZARO CARDENAS)				Al Cuauhtémoc	Pendiente
05/12/2019	Fuga de agua	AV. HIDALGO	DR. HORA	VALERIO TRUJANO	FRENTE AL NO. 79			SACMEX	Pendiente
05/12/2019	Falla en suministro de energía eléctrica	JESÚS MARÍA	MESONES	REPÚBLICA DEL SALVADOR				CFE	Pendiente
05/12/2019	Falla en suministro de energía eléctrica	REPÚBLICA DE COSTA RICA	REPÚBLICA DE ARGENTINA	AZTECAS				CFE	Pendiente



INCIDENCIAS PENDIENTES

Del 03 al 16 de diciembre



FECHA DE REPORTE	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS
06/12/2019	Falta tapa de caja de válvulas de agua potable	REPÚBLICA DE ECUADOR		SAN CAMILITO				SACMEX	Pendiente
06/12/2019	Bacheo	EJE 1 ORIENTE (ANILLO DE CIRCUNVALACION)		SAN PABLO				SOS-DGOIV	Pendiente



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
CULTURA Y
PATRIMONIO
HISTÓRICO

INCIDENCIAS PENDIENTES

Del 03 al 16 de diciembre



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS



FECHA DE REPORTE	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS
07/12/2019	Daño en registro	REPÚBLICA DE COLOMBIA		REPÚBLICA DE ARGENTINA				CFE	Pendiente
06/12/2019	Bache en pavimento	REPÚBLICA DE BRASIL		REPÚBLICA DE PERÚ				SOS-DGOIV	Pendiente
09/12/2019	Falla en alumbrado público	VIOLETA		EJE CENTRAL (LÁZARO CARDENAS)				Al Cuauhtémoc	Pendiente
09/12/2019	Falla en alumbrado público	VALERIO TRUJANO						Al Cuauhtémoc	Pendiente
10/12/2019	Retiro de cableado	SOLEDAD	ACADEMIA	SANTISIMA				TELMEX	Pendiente



INCIDENCIAS PENDIENTES

Del 03 al 16 de diciembre



FECHA DE REPORTE	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS
11/12/2019	Fuga de agua potable	ARANDA		ARCOS DE BELÉN	Esquina			SACMEX	Pendiente
12/12/2019	Registro de tapa rota	REPÚBLICA DE PERÚ	ALLENDE	EJE CENTRAL (LAZARO CARDENAS)	Frente al Callejón de Montero			TELMEX	Pendiente



INCIDENCIAS PENDIENTES

Del 03 al 16 de diciembre



FECHA DE REPORTE	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS
13/12/2019	Renovación de registro	ALLENDE	BE LISARIO DOMÍNGUEZ	REPÚBLICA DE CUBA				TELMEX	Pendiente
15/12/2019	Falta tapa de registro	SAN PABLO	TOPACIO		Lado surponiente			CIS	Pendiente



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



INCIDENCIAS PENDIENTES

Del 03 al 16 de diciembre



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

FECHA DE REPORTE	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS
15/12/2019	Falta tapa de registro	REPÚBLICA DEL SALVADOR	ROLDÁN	TALAVERA				TELMEX	Pendiente



Orden del día

Reportes

Turnos e incidencias urbanas

Mesas de trabajo

Asuntos generales

Acuerdos

Asistencia

Transmisión en vivo



Orden del día

Reportes

Turnos e incidencias urbanas

Mesas de trabajo

Asuntos generales

Acuerdos

Asistencia

Transmisión en vivo



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
CULTURA
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

PRÓXIMA SESIÓN

31 de diciembre de 2019

A las 10:30 horas

Transmisión en vivo
