



# MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL  
CENTRO  
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

# Inicio de la transmisión en vivo

**25 DE JUNIO 2019**



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL  
CENTRO  
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

# Orden del día

- Reportes
- Turnos e incidencias urbanas
- Mesas de trabajo
- Asuntos generales
- Acuerdos
- Asistencia



# ACH

Tema	Línea base	Periodicidad	Semana al 18/06	Semana al 25/06	Próximo reporte
Tiraderos clandestinos	Metros cúbicos de residuos sólidos levantados en tiraderos clandestinos en el perímetro de ACH	Quincenal	1,303	1,305	09 de julio
Limpieza	Metros cúbicos de basura recolectada en el Perímetro de la ACH (Producto de Barrido)	Quincenal	2,251	2,350	09 de julio
Mantenimiento a infraestructura	Número de Incidencias de daño en infraestructura del Perímetro de la ACH reparadas y atendidas	Quincenal	52		09 de julio



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL  
CENTRO  
HISTÓRICO

## ACH | Obras menores


Se realizaron trabajos en **Plaza de la Concepción**, y las calles de Regina, **Pino Suárez**, **Av. Hidalgo**, **Belisario Domínguez**, **Allende** y **Tacuba**.

Los trabajos realizados consistieron en:

- **Reforzar piezas de rejilla Irving** en Plaza de la Concepción;
- **Colocación de 2 bolardos** en la esquina de Regina y Bolívar,
- **Demolición y colocación de 9.92 m<sup>2</sup> de recinto en banqueta** de Pino Suárez casi esquina con Regina,
- **Retiro de 3 bolardos en mal estado** en Belisario Domínguez y Allende,
- **Reparación de registro** en Belisario Domínguez,
- **Retiro de 30 arriates metálicos** en mal estado en Tacuba, **colocación de chaflán y cinta peligro** en la salida del Metro Bellas Artes que da a la calle 2 de Abril



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

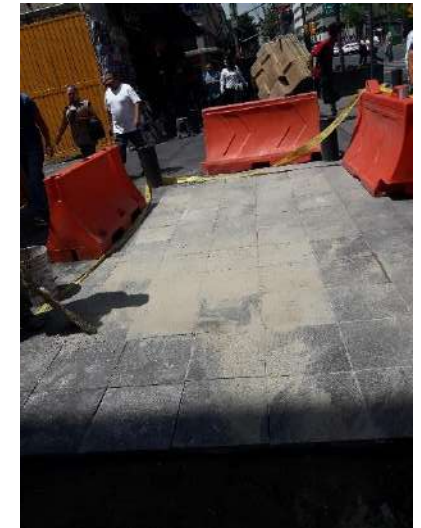



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL  
CENTRO  
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

## Eliminación de grafiti

**Calles atendidas: 33**

**Cortinas metálicas: 27**

**Fachadas: 35**

**M<sup>2</sup> totales: 701**

**\*La mayoría son reincidencias**

**247**

**M<sup>2</sup>**

**de cortinas**



**414**

**M<sup>2</sup>**


**de fachadas**



**40**

**M<sup>2</sup>**

**retirados con  
thiner**

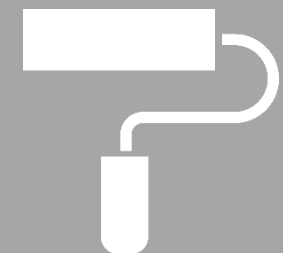



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL  
CENTRO  
HISTÓRICO

## Eliminación de grafiti en inmuebles catalogados

### Templo de San Miguel Arcángel

(Av. 20 de Noviembre esquina José María Izazaga)

- El primer procedimiento que se está utilizando es a base de un gel desincrustante, se deja actuar 30 minutos, se talla con cepillo de Ixtle y por último se enjuaga con agua a baja presión
- Lo estamos utilizando en la fachada poniente del Templo de San Miguel Arcángel que es principalmente de **tezontle y cantera**
- Por la porosidad de la piedra la **efectividad del retiro está en un 85%**, quedando una sombra o “fantasma” del grafiti
- Conforme avancemos iremos probando otros procedimientos
- El Templo de San Miguel se terminará el próximo 28 de junio



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS



Antes



Después



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

# Alc. Cuauhtémoc

Tema	Línea base	Periodicidad	Semana al 11/06	Semana al 18/06	Semana al 25/06	Observaciones
Luminarias	Número de Luminarias reparadas en vías secundarias en PB de Cuauhtémoc	Quincenal	70	135	161	Se realizó la revisión a 296 luminarias
Poda	Número de sujetos forestales podados	Quincenal	54	56	10	Se realizó la poda a 66 sujetos forestales





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL  
CENTRO  
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

# Alc. Cuauhtémoc

Tema	Línea base	Periodicidad	Semana al 11/06	Semana al 18/06	Semana al 25/06	Observaciones
Desazolve	Red de drenaje desazolvada en PB de Cuauhtémoc (m lineales)	Semanal	165	299	223	Se realizó el desazolve de <b>522</b> metros lineales <b>de desazolve, 131 rejillas de piso</b> y <b>161 coladeras</b> de banqueta
Limpia (Colecta de solidos)	Escuelas limpias y toque de campana	Semanal	260 m <sup>3</sup>	260 m <sup>3</sup>	276 m <sup>3</sup>	<b>Se recolectaron 536 m<sup>3</sup> de residuos sólidos</b> (44 m <sup>3</sup> de residuos orgánicos y 492 m <sup>3</sup> de inorgánicos)



# Alc. Cuauhtémoc

## Reporte de luminarias reparadas

REPORTE DE LUMIARIAS REPARADAS EN LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC					
DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		COLONIA	CANTIDAD	MOTIVO
NICARAGUA	BRASIL	ARGENTINA	CENTRO II	9	
PLAZA SAN JUAN	AYUNTAMIENTO	ERNESTO PUGIBET	CENTRO VIII	89	
PLAZA SANTO DOMINGO	BRASIL	BELISARIO DOMINGUEZ	CENTRO IV	21	
ORGANO # 17	EJE CENTRAL	ALLENDE	CENTRO I	9	
MARQUES STERLING	BALDERAS	REVILLAGIGEDO	CENTRO VIII	7	
PLAZA SAN JUAN	AYUNTAMIENTO	ERNESTO PUGIBET	CENTRO VIII	89	
REP. NICARAGUA	BRASIL	ARGENTINA	CENTRO I	9	
PARAGUAY	EJE I NORTE	BRASIL	CENTRO I	3	
PARAGUAY	ARGENTINA	BRASIL	CENTRO I	12	
PLAZA TOLSA	BALDERAS	ENRICO MARTINEZ	CENTRO VIII	48	
TOTAL				296	



# Alc. Cuauhtémoc

## Reporte de desazolve

REPORTE DE DESAZOLVES REALIZADOS EN LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC					
DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		COLONIA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
RODRIGUEZ PUEBLA #25	VENEZUELA	LECUMBERRI	CENTRO III	10 MTS	
LECUMBERRI # 16	MANUEL DOBLADO	LEONA VICARIO	CENTRO III	50 MTS	
ISABEL LA CATOLICA	5 DE MAYO	TACUBA	CENTRO IV	24 MTS	
REP E COSTA RICA # 108	GONZALES ORTEGA	MANUEL DOBLADO	CENTRO I	10 MTS	
GONZALES ORTEGA # 30	PEÑA Y PEÑA	COSTA RICA	CENTRO I	6 MTS	
BOLIVAR	FRANCISCO Y MADERO	CHIMALPOPOCA	CENTRO VI	15 MTS	
VIZCAINAS # 24	ALDACO	EJE CENTRAL	CENTRO V	8MTS	
LUIS MOYA	ESQ ERNESTO PUGIBET		CENTRO VIII	80 MTS	
ECUADOR # 72	ALLENDE	COMONFORT	CENTRO I	1 MTS	
SAN JERONIMO # 112	PINO SUAREZ	CORREO MAYOR	CENTRO V	45 MTS	
REP. DE HONDURAS	INCAS	CHILE	CENTRO I	50 MTS	299MTS SEMANA DEL 10 AL 16 DE JUNIO
5 DE FEBRERO	VENUSTIANO CARRANZA	FRAY SERVANDO	CENTRO IV	120 MTS	
CHIMALPOPOCA	EJE CENTRAL		CENTRO VI	6 MTS	
EL CARMEN # 39	VENEZUELA	COLOMBIA	CENTRO II	25 MTS	
REP. BRASIL	TACUBA	EJE 1 NORTE	CENTRO IV	30 MTS	
ARCOS DE BELEN # 55	LUIS MOYA	RREVILLAGIGEDO	CENTRO VIII	2 MTS	
ISABEL LA CATOLICA #125	NEZAHUALCOYOTL	FRAY SERVANDO	CENTRO VI	40 MTS	
			TOTAL	522	



# Alc. Cuauhtémoc

## Reporte de podas

REPORTE DE PODAS REALIZADOS EN LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC					
DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		COLONIA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
ALLENDE	JUAN ALVARES	CJON VAQUITA	CENTRO I	10	
PARAGUAY # 2 6 Y 25	BRASIL	COMONFORT	CENTRO I	8	
JUAN ALVARES	CJON DE LA VAQUITA		CENTRO I	2	
COMONFORT	ECUADOR		CENTRO I	1	
ECUADOR # 45	ALLENDE	COMONFORT	CENTRO I	1	
COMONFORT	OTE	ECUADOR	CENTRO I	3	
COMONFORT	ESQ	PARAGUAY	CENTRO I	1	
PARAGUAY # 74	REP BRASIL	ARGENTINA	CENTRO I	1	
ALLENDE # 72,74, 77	HONDURAS	ECUADOR	CENTRO I	7	
ALLENDE	ECUADOR		CENTRO I	1	
ALLENDE	ECUADOR		CENTRO I	6	
ALLENDE	IGNACIO RAYON	EJE I NORTE	CENTRO I	7	
PARAGUAY # 26 Y 25	BRASIL	COMONFORT	CENTRO I	8	
C JUAN ALVARES	CJON DE LA VAQUITA		CENTRO I	2	60 ARBOLES HASTA SEMANA DEL 10 AL 16 JUNIO
VENUSTIANO CARRANZA # 144 -150			CENTRO IV	3	
URUGUAY # 149 -151	LAS CRUCES	CORREO MAYOR	CENTRO VII	2	
EHEVESTE # 05	BOLIVAR	ALDACO	CENTRO V	2	
FRAY SERVANDO # 344	ROLDAN	TOPACIO	CENTRO VII	1	
			TOTAL	66	



## Alc. Venustiano Carranza

Tema	Línea base	Periodicidad	Semana al 11/06	Semana al 25/06	Observaciones
Luminarias	Número de Luminarias reparadas en vías secundarias	Quincenal	<b>61</b>	<b>28</b>	
Tiraderos clandestinos	Toneladas de residuos sólidos recolectados de tiraderos clandestinos en el PB de VC (línea base: 26 tiraderos)	Quincenal	<b>1,047.2 m<sup>3</sup></b> (34 ton diarias)	<b>985.6 m<sup>3</sup></b> (32 ton diarias)	
Desazolve	Red de drenaje desazolvada en PB de Al. Venustiano Carranza (m lineales)	Semanal		<b>8,550 ml</b>	Col. Centro I, Centro II y Unidad hab. Candelaria de los Patos  Rejillas de piso, Coladeras pluviales, pozos de visita y albañal domiciliario



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL  
CENTRO  
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

# Alc. Venustiano Carranza

## Reporte de luminarias reparadas

REPORTE DE LUMIARIAS REPARADAS EN EL PERÍMETRO B EN LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA					
DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		COLONIA	CANTIDAD	MOTIVO
MIGUEL DOMINGUEZ 12	HEROE DE NACAZARI	SN ANTONIO TOMATLAN	10 DE MAYO	1	MANTENIMIENTO
SN ANTONIO TOMATLAN 66	NICOLAS BRAVO		CENTRO I	2	MANTENIMIENTO
NICOLAS BRAVO 23	SN ANTONIO TOMATLAN		CENTRO I	1	MANTENIMIENTO
NICOLAS BRAVO 11	ALARCON		CENTRO I	1	MANTENIMIENTO
SN ANTONIO TOMATLAN 23	NICOLAS BRAVO	ALARCON	CENTRO I	1	MANTENIMIENTO
ALARCON 29	BRAVO	F C DE CINTURA	CENTRO I	1	MANTENIMIENTO
F C DE CINTURA 6	EMILIANO ZAPATA	MIGUEL NEGRETE	CENTRO I	4	MANTENIMIENTO
EMILIANO ZAPATA 105	BRAVO	CIRCUNVALACION	CENTRO I	3	MANTENIMIENTO
MIGUEL NEGRETE 42	BRAVO	F C DE CINTURA	CENTRO I	1	MANTENIMIENTO
ALARCON 37	NICOLAS BRAVO	F C DE CINTURA	CENTRO I	1	MANTENIMIENTO
SN ANTONIO TOMATLAN 66	NICOLAS BRAVO	CIRCUNVALACION	CENTRO I	1	MANTENIMIENTO

REPORTE DE LUMIARIAS REPARADAS EN EL PERÍMETRO B EN LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA					
DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		COLONIA	CANTIDAD	MOTIVO
PENITENCIARIA 33	CONGRESO DE LA UNION	SASTRERIA	PENITENCIARIA	1	MANTENIMIENTO
JARCERIA 157	PANADEROS	PELUQUEROS	MORELOS I	1	MANTENIMIENTO
JARCERIA 251	TALABARTEROS	PLOMEROS	MORELOS I	1	MANTENIMIENTO
CARPINTERIA 2	MECANICOS	CARPINTERIA	MORELOS I	2	MANTENIMIENTO
MECANICOS 46	F C DE CINTURA	CARPINTERIA	MORELOS I	1	MANTENIMIENTO
NACIONAL 44	CIRCUNVALACION		MORELOS I	1	MANTENIMIENTO
JOAQUIN HERRERA 55	BRAVO	VIDAL ALCOCER	MORELOS I	1	MANTENIMIENTO
NICOLAS BRAVO 66	LECUMBERRI	JOAQUIN HERRERA	MORELOS I	1	MANTENIMIENTO
IMPRESA 240	LABRADORES	MECANICOS	MORELOS I	1	MANTENIMIENTO
HOJALATERIA 63	LABRADORES	JARDINEROS	MORELOS I	1	MANTENIMIENTO
			TOTAL	61	



# Alc. Venustiano Carranza

## Reporte de tiraderos clandestinos

RELACION DE TIRADEROS CLANDESTINOS				
Nº. CONSECUTIVO	UBICACIÓN	TIPO DE RESIDUOS SÓLIDOS %	CANTIDAD TONS	SECTOR
01	MIGUEL DOMINGUEZ Y PENITENCIARIA COL. AMPLIACIÓN PENITENCIARIA	90% BASURA 10% CASCAJO	1	S-1
02	EJE 1 NORTE Y HORTELANOS COL. MORELOS	90% BASURA 10% CASCAJO	3	S-1
03	AV. CIRCUNVALACIÓN ENTRE HÉROES DE NACAZARI Y SAN ANTONIO TOMATLAN	85% BASURA 15% CASCAJO	1	S-2
04	ZAPATA ESQ. AV. CIRCUNVALACIÓN	85% BASURA 15% CASCAJO	1	S-2
05	NACIONAL ESQ. VIDAL ALCO CER	85% BASURA 15% CASCAJO	1	S-2
06	COSTA RICA ESQ. VIDAL ALCO CER	85% BASURA 15% CASCAJO	1.5	S-2
07	PEÑA Y PEÑA ESQ. VIDAL ALCO CER	85% BASURA 15% CASCAJO	0.5	S-2
08	VIDAL ALCO CER Y BERRIOZABAL COL. MORELOS	85% BASURA 15% CASCAJO	2	S-2
09	AV. CIRCUNVALACIÓN Y G. PEDRAZA (MERCADO DULCES I) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	2	S-9
10	AV. CIRCUNVALACIÓN Y CARRIZAL (MERCADO DE FLORES) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	1	S-9
11	AV. CIRCUNVALACIÓN Y CARRETONES (METRO MERCED) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	1.5	S-9
12	JUAN DE LA GRANJA Y CORREGIDORA (LAS CANCHAS) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.2	S-9
13	SANTA ESCUELA Y CUADRANTE DE LA SOLEDAD COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.5	S-9

RELACION DE TIRADEROS CLANDESTINOS				
Nº. CONSECUTIVO	UBICACIÓN	TIPO DE RESIDUOS SÓLIDOS %	CANTIDAD TONS	SECTOR
14	ROSARIO ESQ. PLAZA SAN LAZARO (ATRÁS DE LA IGLESIA) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.5	S-9
15	AV. CIRCUNVALACIÓN Y SOLEDAD COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	2	S-9
16	AV. CIRCUNVALACIÓN Y MANZANARES COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	2	S-9
17	JUAN PABLO ESQ. CORREGIDORA COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.5	S-9
18	CONGRESO DE LA UNIÓN ESQ. GENERAL ANAYA COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.2	S-9
19	GENERAL ANAYA ESQ. JUAN DE LA GRANJA COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.3	S-9
20	JUAN DE LA GRANJA ESQ. SAN CIPRIAN COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	2.5	S-9
21	CORREGIDORA Y SAN SIMÓN COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	0.2	S-9
22	PLAZA DE LA SOLEDAD, SAN SIMÓN Y SANTA ESCUELA COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	0.5	S-9
23	TOLVA 2 COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	3.1	S-9
24	TOLVA 3 COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	3	S-9
25	AV. CIRCUNVALACIÓN Y CARRETONES COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	0.5	S-9
26	JUAN DE LA GRANJA ESQ. SAN CIPRIAN COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	0.5	S-9



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO




AUTORIDAD DEL  
CENTRO  
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

# Alc. Venustiano Carranza

Evidencia de desazolve

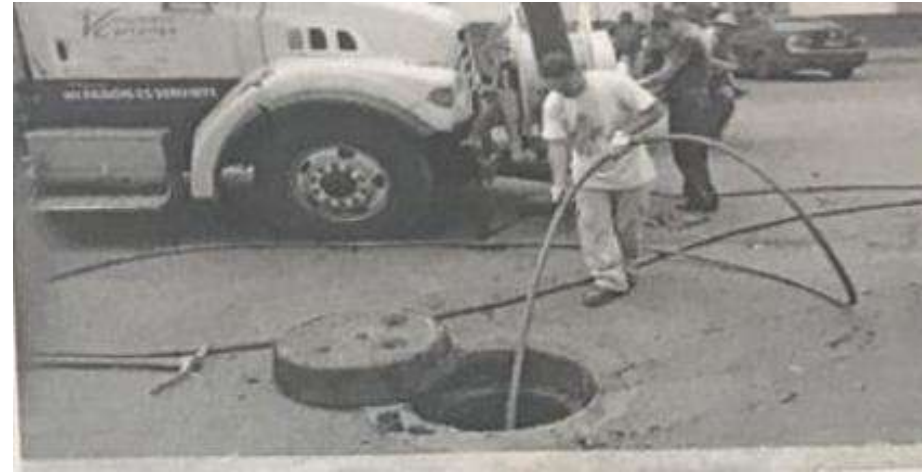





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL  
CENTRO  
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

# Sacmex

Tema	Línea base	Periodicidad	Semana al 25/06	Próximo reporte
Desazolve de red. Perímetro "A" y "B"	Red de drenaje desazolvada (m lineal) <b>Complemento del Perímetro "B"</b>	Quincenal	Atarjeas: <b>18,565 ml</b>	09 de julio
			Pozos de Visita: <b>399 pzas</b>	
			Rejilla de Piso: <b>268 pzas</b>	
			Coladeras Pluviales: <b>1,193 pzas</b>	
			Albañal: <b>2,143 ml</b>	



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO




AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

## CROQUIS AVANCE DE LIMPIEZA Y DESAZOLVE CENTRO HISTORICO

Sacmex

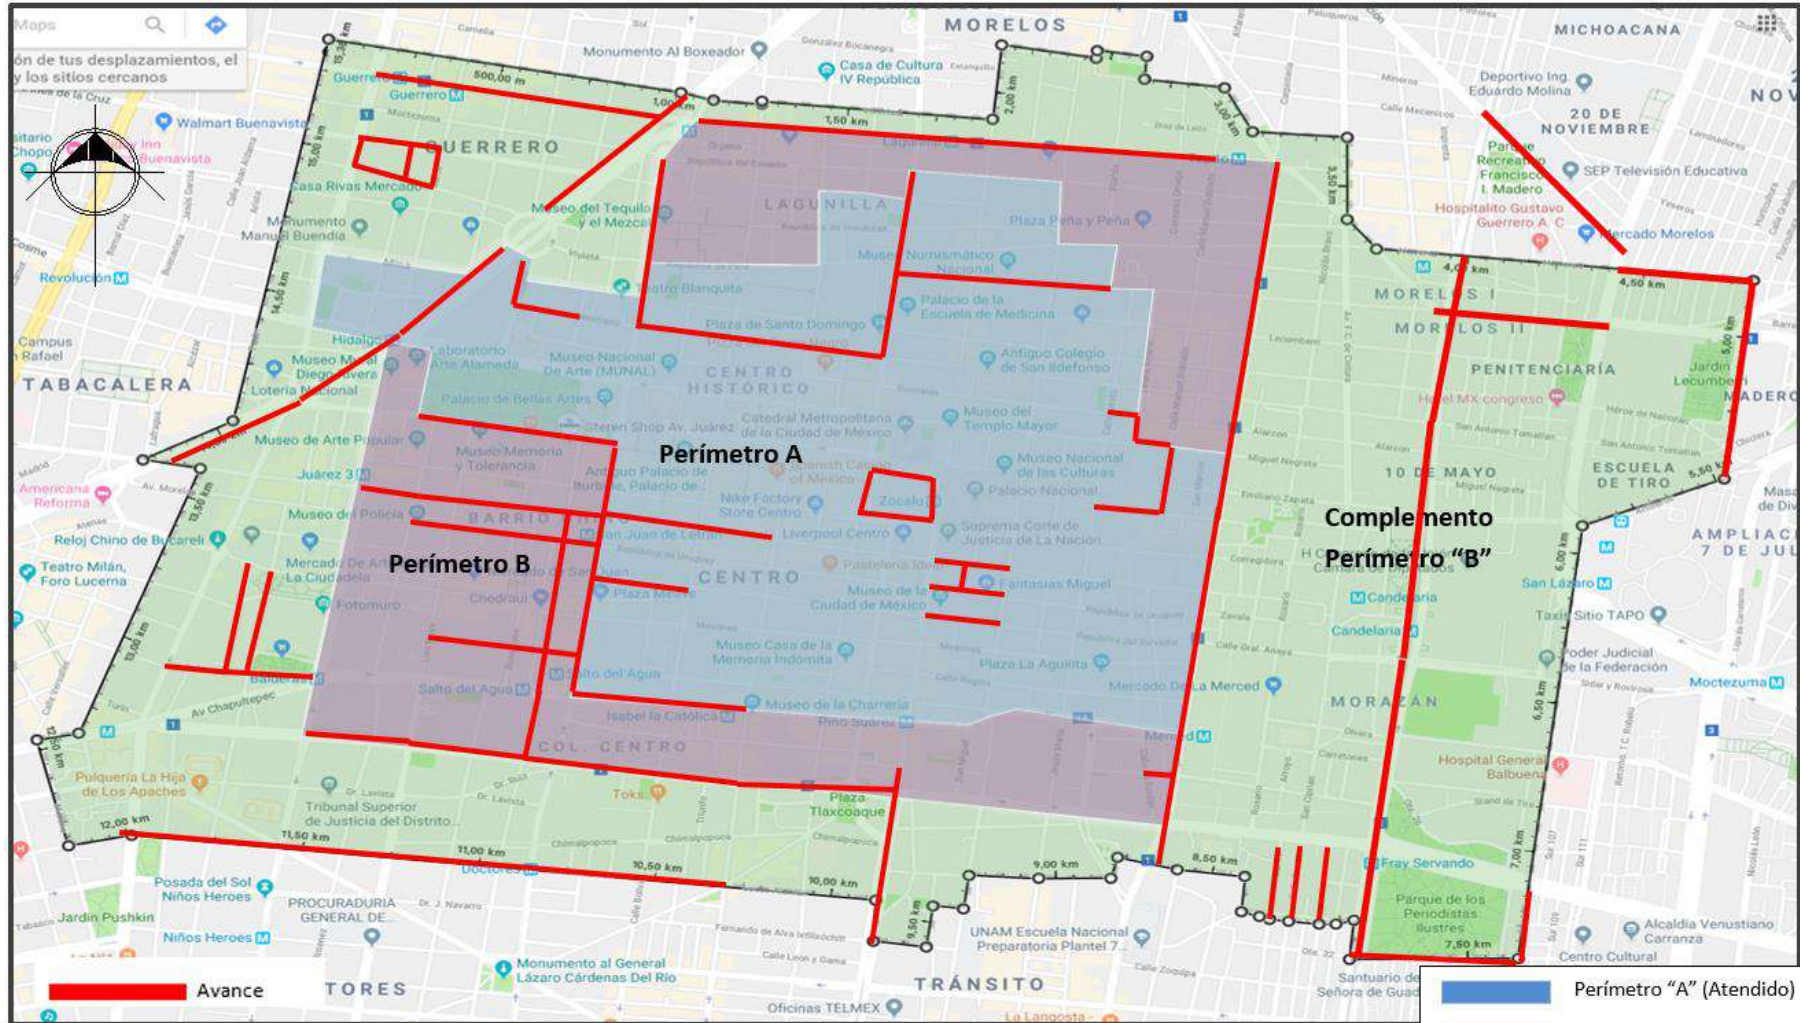

- Perímetro "A" (Atendido)
- Perímetro "B" (Atendido)
- Complemento Perímetro "B"

# Sustitución de líneas y redes de Agua Potable y Drenaje Santa María la Redonda



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

## Sacmex

AGUA POTABLE

LONGITUD TOTAL= 1217 m

Sustitución de tubería de 152 mm. (6") de diámetro de agua potable y Sustitución de tuberías de 0.38, 0.45 y 0.61 m. de diámetro de drenaje de polietileno de alta densidad, sobre las calles Santa Veracruz, 2º y 3er. Callejón San Juan de Dios, Valerio trujano, plaza 2 de abril, Andador teatro blanquita y Pensador mexicano, Colonia Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc.



TUBERÍA EXISTENTE

TUBERÍA INSTALADA

L= 80m

# Sustitución de líneas y redes de Agua Potable y Drenaje Santa María la Redonda



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

## Sacmex

DRENAJE

LONGITUD TOTAL= 1265 m

Sustitución de tubería de 152 mm. (6") de diámetro de agua potable y Sustitución de tuberías de 0.38, 0.45 y 0.61 m. de diámetro de drenaje de polietileno de alta densidad, sobre las calles Santa Veracruz, 2º y 3er. Callejón San Juan de Dios, Valerio trujano, plaza 2 de abril, Andador teatro blanquita y Pensador mexicano, Colonia Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc.



TUBERÍA EXISTENTE



TUBERÍA INSTALADA



L= 162 m

# Sustitución de líneas y redes de Agua Potable y Drenaje Santa María la Redonda




MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

## Sacmex

AGUA POTABLE

LONGITUD TOTAL= 1266 m

Sustitución de tubería de 305 mm. (12"), 152 mm. (6") y 101 mm. (4") de diámetro de agua potable y Sustitución de tuberías de 0.38, 0.45 y 0.61 m. de diámetro de drenaje de polietileno de alta densidad, sobre las calles Mina, Galeana, Riva Palacio y Violeta, Colonia Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc.

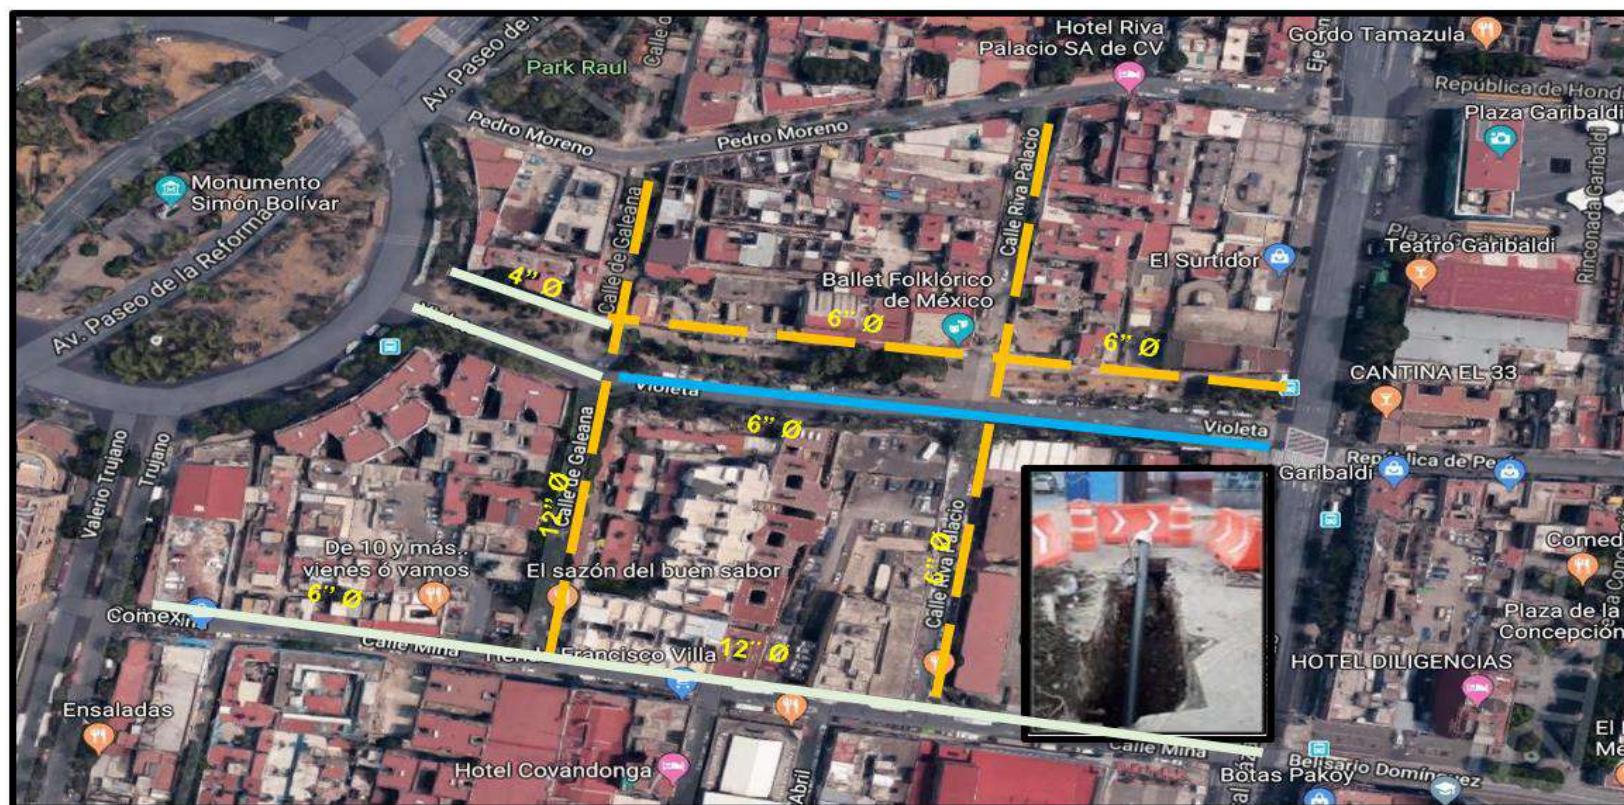

TUBERÍA EXISTENTE

TUBERÍA INSTALADA

L= 190.00 m

# Sustitución de líneas y redes de Agua Potable y Drenaje Santa María la Redonda



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

## Sacmex

**DRENAJE**

**LONGITUD TOTAL= 1102 m**

Sustitución de tubería de 305 mm. (12”), 152 mm. (6”) y 101 mm. (4”) de diámetro de agua potable y Sustitución de tuberías de 0.38, 0.45 y 0.61 m. de diámetro de drenaje de polietileno de alta densidad, sobre las calles Mina, Galeana, Riva Palacio y Violeta, Colonia Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc.



TUBERÍA EXISTENTE



TUBERÍA INSTALADA



**L= 6.10 m**





GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO

# Sustitución de líneas y redes de Agua Potable y Drenaje Antigua Merced



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS


## Sacmex

AGUA POTABLE

LONGITUD TOTAL 492 M

Tubería existente

Tubería instalada 400 m

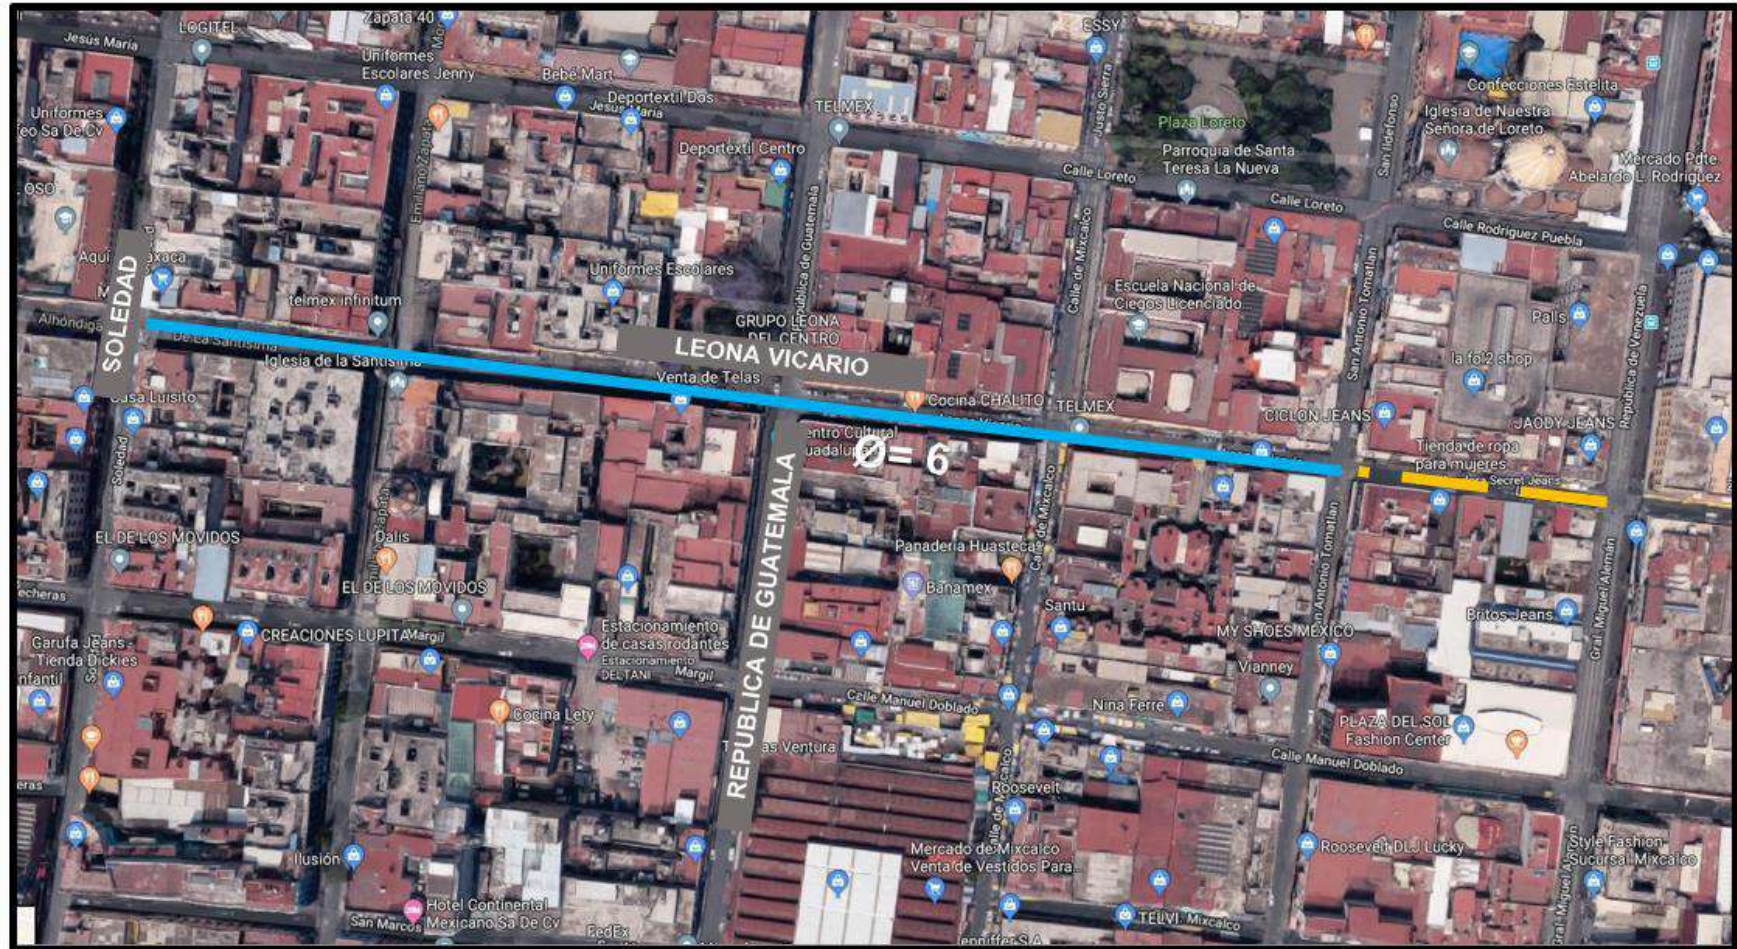

# Sustitución de líneas y redes de Agua Potable y Drenaje

## Antigua Merced



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

# Sacmex

**DRENAJE**

Tubería existente

Tubería instalada 310 m



**TOTAL 499 M**





# Sustitución de líneas y redes de Agua Potable y Drenaje Antigua Merced



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

## Sacmex

AGUA POTABLE

LONGITUD TOTAL= 572 M

Tubería existente

Tubería instalada 160 m



# Sustitución de líneas y redes de Agua Potable y Drenaje

## Antigua Merced



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

# Sacmex

**DRENAJE**

**LONGITUD TOTAL= 529 M**

Tubería existente

Tubería instalada 300 m





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

# SOS-Alumbrado Público

Tema	Línea base	Periodicidad	Semana del 18/06	Semana al 25/06	Próximo reporte
Alumbrado Público	Número de luminarias reparadas en vías del Perímetro del CH PDLs	Quincenal	<b>PA - 128</b>	<b>PA - 220</b>	09 de julio
			<b>PB - 90</b>	<b>PB - 90</b>	



# SOS-DGSUS

## TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL ESPACIO PÚBLICO, EN PLAZAS, CALLES, CORREDORES PEATONALES Y SEMIPEATONALES

CALLE	TRAMO	ACCIONES	UNIDAD	CANTIDADES			% EJECTADO
				TOTAL	EJECTADA	FALTANTE	
REPUBLICA DEL SALVADOR	CALLE ALDACO A EJE CENTRAL	ARROYO (COLOCACIÓN DE MR)	M3	52.40	52.40	0.00	100.00%
		ARROYO (DEMOLICION DE MR)	M3	52.40	52.40	0.00	100.00%
TACUBA	REP DE BRASIL A EJE CENTRAL	BANQUETAS	M2	595.00	95.00	500.00	15.97%
		ARRIATES	PZA	43.00	43.00	0.00	100.00%
		TOCONES	PZA	7.00	7.00	0.00	100.00%
MARCONI	CALLE TACUBA A DONCELES	REPOSICION DE PISO DAÑADO	M2	383.13	0.00	383.13	0.00%
5 DE MAYO	MONTE DE PIEDAD A EJE CENTRAL	RETIRO DE ARRIATES	PZA	21.00	21.00	0.00	0.00%
		RETIRO DE TOCONES	PZA	4.00	1.00	3.00	0.00%
AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO ESQ. EJE CENTRAL	DEMOLICION DE CONCRETO EN ARROYO VEHICULAR	M3	0.45	0.45	0.00	0.00%



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL  
CENTRO  
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

# SOS-DGSUS

## REPORTE DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO EN EL CENTRO HISTÓRICO

REPORTE SEMANAL DEL 17 AL 21 DE JUNIO 2019

### ACUMULADO TRABAJOS REALIZADOS

RETIRO DE ARRIATES		
• CALLE TACUBA	43.00	Pzas
• CALLE 5 DE MAYO	2.00	Pzas

RETIRO DE TOCONES		
• CALLE TACUBA	7.00	Pzas
• CALLE 5 DE MAYO	1.00	Pzas
• CALLE MOTOLINIA	3.00	Pzas
• DONCELES	1.00	Pzas

DEMOLICIÓN DE PISO DE CANTERA		
• CALLE MARCONI	252.32	m <sup>2</sup>

SUMINISTRO Y COLADO DE PISO DE CONCRETO		
• REPÚBLICA DEL SALVADOR	52.4	m <sup>3</sup>
	296.0	m <sup>2</sup>

CONSTRUCCION DE ARRIATES		
• CALLE TACUBA	4	Pzas

COLADO EN BANQUETA DAÑADA		
• PALMA Y BRASIL	12	m <sup>2</sup>

#### NOTA IMPORTANTE

- Corte con sierra en banquetta en áreas dañadas en la calle de Tacuba entre Palma y Bolívar lado derecho de la circulación.
- Colado de banquetta dañada entre Brasil y Palma lado derecho de la circulación. Demolición de firme en calle de Marconi.
- Volumen=2.00m2. Fza de trabajo 28 gentes



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL  
CENTRO  
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

# SOS-DGSUS

REPORTE DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO  
REPORTE SEMANAL DEL 17 AL 21 DE JUNIO 2019

## REPORTE FOTOGRAFICO

CALLE REPÚBLICA DEL SALVADOR



DEMOLICIÓN





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL  
CENTRO  
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

# SOS-DGSUS

## REPORTE DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO REPORTE SEMANAL DEL 17 AL 21 DE JUNIO 2019

### REPORTE FOTOGRAFICO

CALLE REPÚBLICA DEL SALVADOR



CARGA Y ACARREO DE MATERIAL





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL  
CENTRO  
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

# SOS-DGSUS

## REPORTE DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO REPORTE SEMANAL DEL 17 AL 21 DE JUNIO 2019

### REPORTE FOTOGRAFICO

CALLE REPÚBLICA DEL SALVADOR



CONFINAMIENTO Y SEÑALAMIENTO







GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL  
CENTRO  
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

# SOS-DGSUS

## REPORTE DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO REPORTE SEMANAL DEL 17 AL 21 DE JUNIO 2019

### REPORTE FOTOGRAFICO

CALLE REPÚBLICA DEL SALVADOR



REPARACIONES DE SACMEX





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL  
CENTRO  
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

# SOS-DGSUS

## REPORTE DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO REPORTE SEMANAL DEL 17 AL 21 DE JUNIO 2019

### REPORTE FOTOGRAFICO

CALLE REPÚBLICA DEL SALVADOR



COLADO Y ESTAMPADO DE CONCRETO



# SOS-DGSUS

## REPORTE DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO REPORTE SEMANAL DEL 17 AL 21 DE JUNIO 2019

### REPORTE FOTOGRAFICO

CALLE REPÚBLICA DEL SALVADOR



COLADO Y ESTAMPADO DE CONCRETO



# SOS-DGSUS

## DESVIACIÓN DE LA RUTA DEL METROBUS SOBRE REPÚBLICA DEL SALVADOR Y EJE CENTRAL LÁZARO CARDENAS CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

UBICACION	FECHA DE ATENCION	AREA TOTAL EN M2	SE ATENDERÁ CON:	HORARIO DE TRABAJO
Eje Central Lázaro Cárdenas y República del Salvador	16 junio al 1° de julio 2019	296.00 m2	Empresa contratista	24hrs. durante el periodo indicado



Atención de superficie de rodamiento dañada sobre República del Salvador en el tramo entre Eje Central Lázaro Cárdenas y Aldaco.



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL  
CENTRO  
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

# SOS-DGSUS

## DESVIACIÓN DE LA RUTA DEL METROBUS SOBRE REPÚBLICA DEL SALVADOR Y EJE CENTRAL LÁZARO CARDENAS CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



**Atención de superficie de rodamiento dañada sobre:**

República del Salvador en el tramo de Eje Central Lázaro Cárdenas y Aldaco.

# SOS-DGSUS

## DESVIACIÓN DE LA RUTA DEL METROBUS SOBRE REPÚBLICA DEL SALVADOR Y EJE CENTRAL LÁZARO CARDENAS CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



### DESVIO DE LA RUTA DE ORIENTE A PONIENTE:

- 1) ISABEL LA CATOLICA;
- 2) REPÚBLICA DE URUGUAY;
- 3) EJE CENTRAL LÁZARO CARDENAS;
- 4) AYUNTAMIENTO (REGRESO A LA RUTA).

# SOS-DGSUS

## DESVIACIÓN DE LA RUTA DEL METROBUS SOBRE REPÚBLICA DEL SALVADOR Y EJE CENTRAL LÁZARO CARDENAS CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



### DESVIO DE LA RUTA DE PONIENTE A ORIENTE:

- 1) AYUNTAMIENTO;
- 2) EJE CENTRAL LÁZARO CARDENAS;
- 3) V. CARRANZA;
- 4) BOLIVAR;
- 5) R. SALVADOR (REGRESO A LA RUTA).



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL  
CENTRO  
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

# SOS-DGSUS

## REPORTE DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO REPORTE SEMANAL DEL 17 AL 21 DE JUNIO 2019

### REPORTE FOTOGRAFICO

CALLE MARCONI ENTRE TACUBA Y DONCELES



DEMOLICION DE PISO DE CANTERA







GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL  
CENTRO  
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

# SOS-DGSUS

## REPORTE DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO REPORTE SEMANAL DEL 17 AL 21 DE JUNIO 2019

### REPORTE FOTOGRAFICO

REHABILITACION DE ARRIATES EN LA CALLE DE TACUBA





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL  
CENTRO  
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

# STC-METRO

Tema	Línea base	Periodicidad	Semana al 25/06	Próximo reporte	Observaciones
Infraestructura	Número de escaleras electromecánicas con falla o algún problema (línea base: 75 escaleras en 29 estaciones)	Quincenal	<b>11</b> escaleras detenidas	09 de julio	- <b>67 equipos</b> están funcionando
Infraestructura	Número de elevadores en reparación (línea base: 19 elevadores en 29 estaciones)	Quincenal	<b>06</b> elevadores detenidos	09 de julio	- 13 funcionando



# INVI

Tema	Línea base	Periodicidad	Mes JUNIO (25/06)	Próximo reporte
Proyectos de obra de vivienda	Porcentaje de avance por proyecto (de los 18 reportados en el CH)	Mensual	<i>Por iniciar - 06</i> <i>En proceso - 12</i> 66.88%	30 de julio



INVI

## RELACIÓN PREDIOS EN PERIMETRO A Y B DEL CENTRO HISTORICO OBRAS EN PROCESO Y POR INICIAR

No.	PREDIO	COLONIA	ALCALDIA	AVISO DE OBRA	STATUS DE OBRA	PERIMETRO A Y B	PORCENTAJE DE AVANCE
1	2 DE ABRIL NO 42	GUERRERO	CUAUHTEMOC	A-039/DOUL/62/11	OBRA EN PROCESO	A	<b>42.20%</b>
2	ACADEMIA NO.33	CENTRO	CUAUHTEMOC	A-028/DOUL/62/14	OBRA EN PROCESO	A	<b>48.46%</b>
3	ARCOS DE BELEN NO 49	CENTRO	CUAUHTEMOC	A-038/DOUL/62/17	OBRA EN PROCESO	B	<b>44.00%</b>
4	EJE 1 PONIENTE GUERRERO NO 164	GUERRERO	CUAUHTEMOC	A-007/DIUL/62/10	OBRA EN PROCESO	B	<b>86.92%</b>
5	EJE 1 PONIENTE GUERRERO NO. 110	BUENAVISTA	CUAUHTEMOC	A-085/DOUL/62/11	OBRA EN PROCESO	B	<b>90.81%</b>
6	MAGNOLIA NO. 12 (ANTES NO. 12 Y 16)	GUERRERO	CUAUHTEMOC	A-069/DOUL/62/14	OBRA EN PROCESO	B	<b>62.70%</b>
7	REPUBLICA DE ARGENTINA NO. 58	CENTRO	CUAUHTEMOC	A-012/DOUL/62/14	POR INICIAR	A	<b>0.00%</b>
8	REPUBLICA DE ARGENTINA NO. 87	CENTRO	CUAUHTEMOC	A-079/DOUL/62/12	OBRA EN PROCESO	A	<b>83.10%</b>
9	REPUBLICA DE PERU NO. 40	CENTRO	CUAUHTEMOC	A-009/DOUL/62/2017	OBRA EN PROCESO	B	<b>90.99%</b>
10	ALLENDE NO. 46	CENTRO	CUAUHTEMOC	A-073/DOUL/62/12	OBRA EN PROCESO	A	<b>95.40%</b>

INVI

## RELACIÓN PREDIOS EN PERIMETRO A Y B DEL CENTRO HISTORICO OBRAS EN PROCESO Y POR INICIAR

No.	PREDIO	COLONIA	ALCALDIA	AVISO DE OBRA	STATUS DE OBRA	PERIMETRO A Y B	PORCENTAJE DE AVANCE
11	LERDO NO. 12	GUERRERO	CUAUHTEMOC	A-006/DOUL/62/13	POR INICIAR	B	0.00%
12	PEDRO MORENO NO. 154	GUERRERO	CUAUHTEMOC	A-062/DOUL/62/11	POR INICIAR	B	0.00%
13	TALAVERA NO. 24	CENTRO	CUAUHTEMOC	A-056/DOUL/62/16	POR INICIAR	A	0.00%
14	VIOLETA NO. 15	GUERRERO	CUAUHTEMOC	A-024/DOUL/62/12	POR INICIAR	B	0.00%
15	PEDRO MORENO NO 156	GUERRERO	CUAUHTEMOC	A-064/DIUL/62/10	POR INICIAR	B	0.00%
16	LECUMBERRI No 66	ZONA CENTRO	CUAUHTEMOC	A-022/DOUL/62/17	OBRA EN PROCESO	B	<b>100.00%</b>
17	BELISARIO DOMINGUEZ NO. 78	CENTRO	CUAUHTEMOC	A-059/DOUL/62/17	OBRA EN PROCESO	A	<b>49.55%</b>
18	NACIONAL NO. 57	MORELOS	VENUSTIANO CARRANZA	A-022/DOUL/62/15	OBRA EN PROCESO	B	<b>75.35%</b>



# INAH

Tema	Línea base	Periodicidad	Semana al 25/06	Próximo reporte	Observaciones
Denuncias recibidas	Número de denuncias recibidas en obras y acciones fuera de norma y sin autorización	Quincenal	<b>02</b> denuncias y seguimiento	09 de julio	



# INAH

Ubicación	Descripción
<b>Jesús María 8</b>	No es monumento histórico, se están realizando obras interiores de remodelación. Fueron requeridos para regularizar las obras, venció requerimiento el 11 de junio de 2019. <b>En proceso de SUSPENSIÓN</b>
<b>San Ildefonso 75</b>	Es monumento histórico, se está realizando obras de remodelación de local comercial, fueron requeridos para regularizar la obra, venció 12 de junio de 2019. <b>En proceso de SUSPENSIÓN</b>



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL  
CENTRO  
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

# INBAL

Tema	Línea base	Periodicidad	Mes al 30/04	Próximo reporte
Obras y proyectos de intervención urbana	Número de solicitudes de para obras menores	Mensual <b>(27 de mayo al 24 de junio)</b>	<b>30</b>	30 de julio
	Número de solicitudes de para obras mayores		<b>0</b>	30 de julio





# ILIFE

Tema	Línea base	Periodicidad	Mes de Mayo	Mes de Junio	Próximo reporte
Sismo 19S	Porcentaje de avance de escuelas con daños del Sismo 19S en 3 escuelas*	Mensual	69.16%	77.33%	30 de julio
Mantenimiento de escuelas	Porcentaje de avances de escuelas con el programa de mantenimiento normal del Instituto en 20 escuelas*	Mensual	48.10%	58.00%	30 de julio



# ILIFE

## Inmuebles escolares en proceso de atención 2018 -2019 en Centro Histórico

No.	PLANTEL	AVANCE FÍSICO (AL 02 DE MAYO)	AVANCE FÍSICO (AL 20 DE JUNIO)	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES
1	ESCUELA PRIMARIA MIGUEL SERRANO	75.48%	<b>100.00%</b>	▲ 24.52%	
2	ESCUELA SECUNDARIA ADRIANA GARCIA CORRAL	32.00%	32.00%	0.00%	
3	ESCUELA SECUNDARIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ SEC TEC No. 6	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	0.00%	<b>ENTREGADA ABRIL</b>
4	ESCUELA PRIMARIA REPÚBLICA DE BOLIVIA	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	0.00%	<b>ENTREGADA ABRIL</b>
5	ESCUELA PRIMARIA ALFREDO E. URUCHURTU	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	0.00%	<b>ENTREGADA ABRIL</b>
6	ESCUELA PRIMARIA PABLO MORENO	40.08%	54.02%	▲ 13.94%	
7	ESCUELA PRIMARIA REPÚBLICA DE ARGENTINA	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	0.00%	<b>ENTREGADA ABRIL</b>
8	ESCUELA NACIONAL PARA CIEGOS LIC. IGNACIO TRIGUEROS	0.00%	0.00%	0.00%	
9	TELESECUNDARIA NO. 91	55.01%	59.89%	▲ 4.88%	
10	ESCUELA PRIMARIA SARA MANZANO	34.56%	60.07%	▲ 25.51%	
11	ESCUELA PRIMARIA MARCELINO DÁVALOS	36.54%	58.47%	▲ 21.93%	
12	ESCUELA PRIMARIA REPÚBLICA DE PANAMÁ	37.96%	66.74%	▲ 28.78%	



# ILIFE

## Inmuebles escolares en proceso de atención 2018 -2019 en Centro Histórico

No.	PLANTEL	AVANCE FÍSICO (AL 02 DE MAYO)	AVANCE FÍSICO (AL 20 DE JUNIO)	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES
13	ESCUELA SECUNDARIA JOSÉ MANUEL RAMOS	36.90%	36.90%	0.00%	
14	ESCUELA PRIMARIA ABRAHAM CASTELLANOS	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	0.00%	<b>ENTREGADA ABRIL</b>
15	ESCUELA SECUNDARIA ÁNGEL TRÍAS ÁLVAREZ	63.14%	65.47%	2.33%	
16	JARDÍN DE NIÑOS CADETES DE LA NAVAL	23.82%	30.44%	▲ 6.62%	
17	ESCUELA SECUNDARIA No. 1 CÉSAR A. RUÍZ	0.00%	0.00%	0.00%	<b>INICIO DE TRABAJOS, REHABILITACIÓN DE LA BARDA POR PARTE DE LA FUNDACIÓN BOSCH.</b>
18	JARDÍN DE NIÑOS ENRIQUE PESTALOZZI	34.07%	49.35%	▲ 15.28%	
19	ESCUELA PRIMARIA FRAY PEDRO DE GANTE	75.15%	75.15%	0.00%	
20	ESCUELA PRIMARIA JOAQUÍN GARCÍA ICAZBALCETA	0.94%	8.62%	▲ 7.68%	
21	JARDÍN DE NIÑOS JUAN JACOBO ROUSSEAU	39.80%	69.32%	▲ 29.52%	
22	ESCUELA PRIMARIA LIC. PONCIANO ARRIAGA	59.24%	74.86%	▲ 15.62%	
23	ESCUELA PRIMARIA REPÚBLICA DE LÍBANO	24.82%	50.70%	▲ 25.88%	



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL  
CENTRO  
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

# SEDEMA

Tema	Unidad de medida	Periodicidad	Semana al 11/06	Próximo reporte	Observaciones
Reforestación	Número de sujetos forestales plantados (línea base: 162)	Quincenal	51 árboles	09 de Julio	Se tiene un avance del 31.48%



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL  
CENTRO  
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

# SEDEMA

1. Del **10 al 14 de junio**, se plantaron **28 individuos** dentro de los cuales se encuentran las especies: *Lagerstromia indica*, Astronómica; y *Ligustrum lucidum*, Trueno; en las calles **Venustiano Carranza y República de Uruguay**; y

2. Del **17 al 21 de junio** se plantaron **23 individuos** dentro los cuales se encuentran las especies: *Lagerstroemia indica*, Astronómica; y *Ligustrum lucidum*, Trueno en las calles **Mesones, Palma, República de Uruguay y Venustiano Carranza**.





AUTORIDAD DEL  
CENTRO  
HISTÓRICO

GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

# SEDEMA

Avance al 25 de junio





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL  
CENTRO  
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

## PGJ

Tema	Línea base	Periodicidad	Semana al 25/06	Próximo reporte
Infraestructura	Número de delitos de medidores de agua	Quincenal	1	09 de julio

No. CARPETA DE INVESTIGACION	FECHA Y HORA	DELITO	CALLE	COLONIA	SINTESIS DE LOS HECHOS
CI-FCH/CUH-6/UI-2SD/1182/06-2019	22/06/2019 13:12	ROBO DE OBJETOS		CENTRO DE LA CIUDAD DE MEXICO AREA 7	SE ROBARON EL MEDIDOR DE AGUA, TUBERIA Y SWCK DE LA LUZ



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL  
CENTRO  
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

## SSC-SCT-DSOT (Tránsito)

Tema	Unidad de medida	Periodicidad	Semana al 25/06	Próximo reporte
Semáforos	Número de semáforos con mantenimiento preventivo	Quincenal	41	09 de Julio
Semáforos	Número de semáforos con mantenimiento correctivo por falla	Quincenal	87	09 de Julio
Cámaras de tránsito	Número de cámaras de tránsito con mantenimiento preventivo	Quincenal	9	09 de Julio
Cámaras de tránsito	Número de cámaras de tránsito con mantenimiento correctivo por falla	Quincenal	4	09 de Julio





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL  
CENTRO  
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

## SSC-SCT-DSOT (Tránsito)

### Mantenimiento de la Red Semafórica y Cámaras de Tránsito del Centro Histórico

#### INFRAESTRUCTURA SEMAFÓRICA

*Intersecciones*

SISTEMA CENTRALIZADO	<b>149</b>
SISTEMA AISLADO	<b>13</b>

#### INFRAESTRUCTURA DE RED DE CÁMARAS DE TRÁNSITO

**10**

**Descripción:** son todas las acciones que tienen como objetivo preservar la infraestructura con la se cuenta o restaurarla a un estado en el cual pueda llevar a cabo alguna función designado, requiriendo la necesidad de rehabilitar o sustituir el equipo para poder continuar haciendo uso de él, evitando demoras en tiempo de recorrido así como daños materiales y humanos.



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

# SSC-SCT-DSOT (Tránsito)

## MANTENIMIENTO SEMAFÓRICO

### CORRECTIVO


APAGADO	9
CABLE DE COMUNICACIÓN	3
CINTILANTE	24
CLOSTER DAÑADO	1
CONEXION	4
CORTO	6
DESCONECTADO	14
SEMÁFORO DAÑADO	2
FOCO FUNDIDO	7
INSTALACIÓN	5
OBRA CIVIL	1
PEATON APAGADO	2
PEGADO	1
PUERTA ABIERTA	2
TARJETA DAÑADA	5
SEMÁFORO A PUNTO DE CAER	1

### PREVENTIVO

41

**TOTAL**

**128**

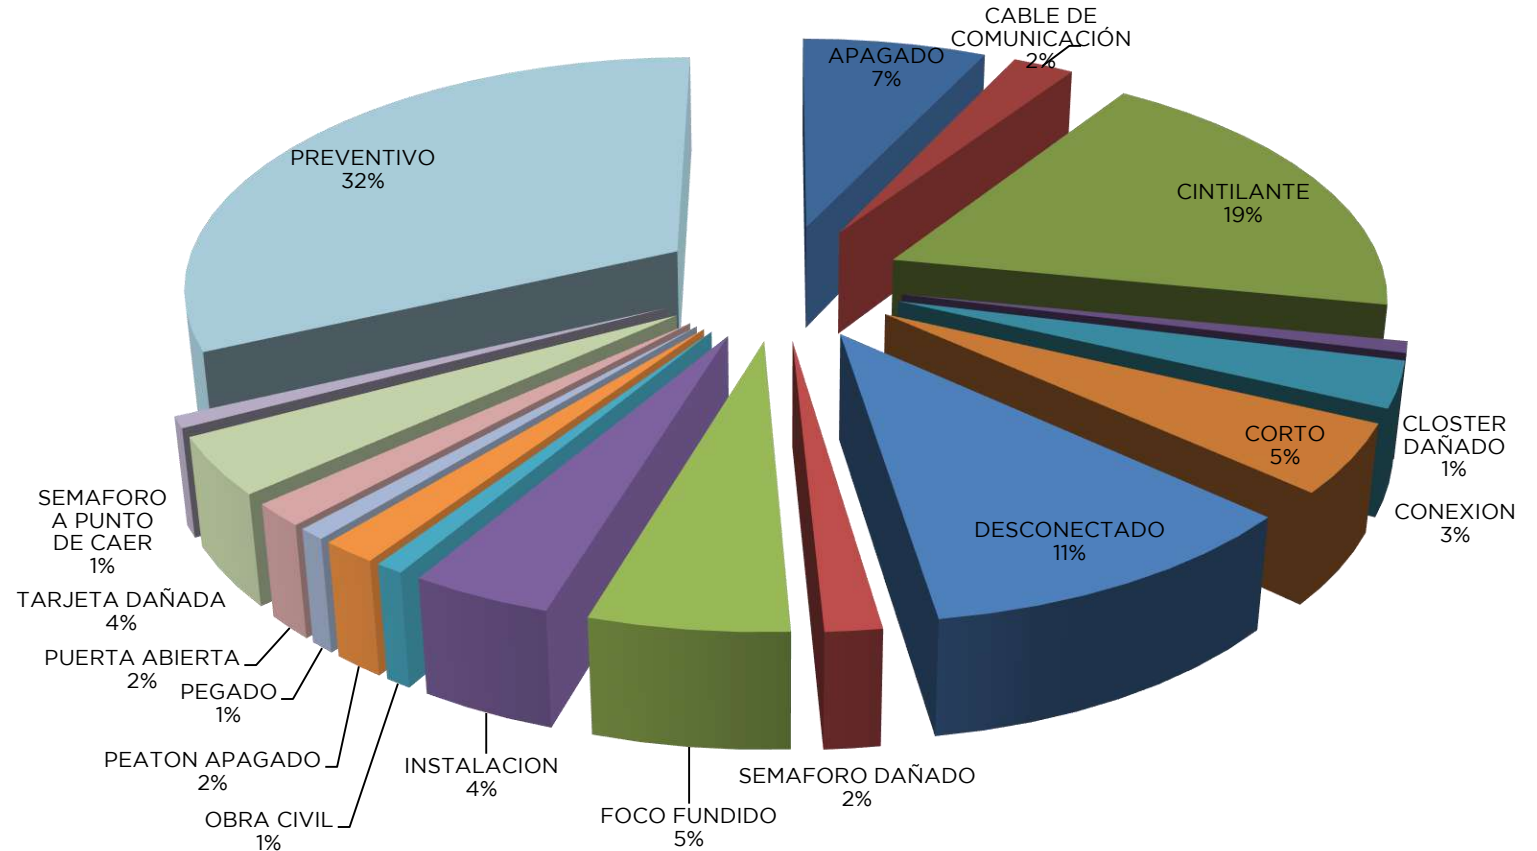



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL  
CENTRO  
HISTÓRICO




MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

## SSC-SCT-DSOT (Tránsito)

### MANTENIMIENTO DE CÁMARAS DE TRÁNSITO

CORRECTIVOS	
CORTO	1
SISTEMA SPRIT	1
ACOMETIDA	2
PREVENTIVOS	
	9
<b>TOTAL</b>	<b>13</b>

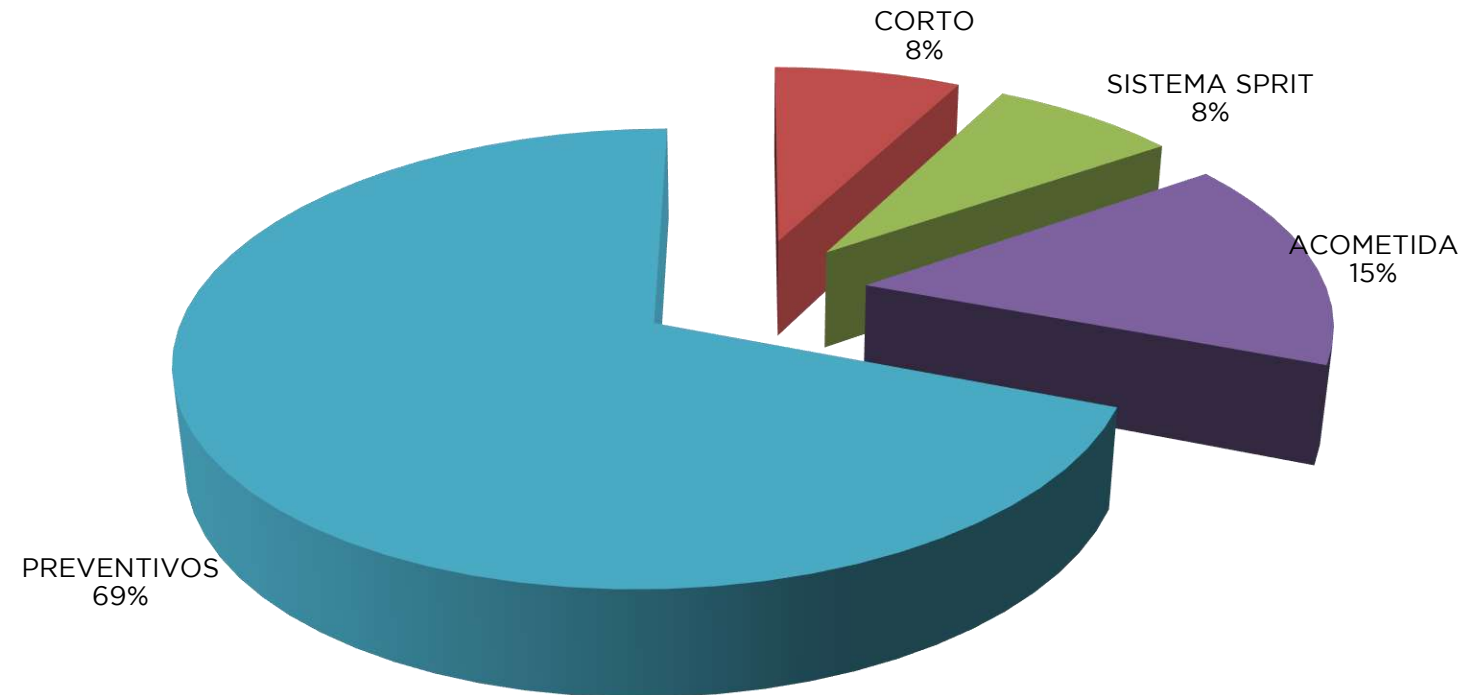



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL  
CENTRO  
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

# Turnos e incidencias urbanas

**\*Corte de transmisión\***  
**PRIVADO**



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO




MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

# TURNOS


Del 11 al 24 de junio

**8**  
turnos  
atendidos




ACH: 3  
Al. Cuauhtémoc: 1  
Al. Vc: 1  
CFE: 1  
SOS-AP: 1  
SOS-DGOIV: 1

**5**  
turnos en  
proceso



ACH: 2  
Al. Cuauhtémoc: 1  
PGJ: 1  
Tránsito: 1

**1**  
turnos  
pendiente



SGIRyPC: 1



# TURNOS ATENDIDOS

## Del 11 al 24 de junio



FECHA DE REPORTE	SOLICITANTE	SOLICITUD	ATIENDE	ESTATUS	FECHA DE ATENCIÓN	OBSERVACIONES
11/06/2019	TELMEX	Apoyar en las obras que se están haciendo en Eje Central y Fray Servando, que ojalá se puedan hacer en las noches para no afectar la vialidad y la operación del Trolebús.	ACH	<b>Atendido</b>	11/06/2019	
11/06/2019	ACH	Proporcionar mapas de grafiti para Seguridad Ciudadana	ACH	<b>Atendido</b>	12/06/2019	
11/06/2019		Solicitud de listado de obras que afecten el tránsito vehicular para compartir con Tránsito	ACH	<b>Atendido</b>	23/06/2019	Se entrega a Tránsito para que elabore programa de desvíos
11/06/2019	ACH	Solicitar de manera oficial que den máxima publicidad en sus medios electrónicos y que, además, impriman los materiales para la difusión de la campaña de manejo de grasas.	Al. Cuauhtémoc	<b>Atendido</b>	13/06/2019	Se solicitó vía oficio ACH/DEPCPCC/134/2019
11/06/2019	ACH	Solicitar de manera oficial que den máxima publicidad en sus medios electrónicos y que, además, impriman los materiales para la difusión de la campaña de manejo de grasas.	Al. Venustiano Carranza	<b>Atendido</b>	13/06/2019	Se solicitó vía oficio ACH/DEPCPCC/134/2019
11/06/2019	ACH	Ver la posibilidad de hacer la contratación del servicio provisional con CFE para el alumbrado de la Plaza San Lucas	CFE	<b>Atendido</b>	18/06/2019	
11/06/2019	PGJ	Apoyo para una luminaria que no funciona enfrente del Juzgado Cívico	SOS-AP	<b>Atendido</b>	11/06/2019	
11/06/2019	ACH	Iniciar el trámite para que les den el resguardo de la plaza San Lucas.	SOS-DGOIV	<b>Atendido</b>	18/06/2019	El Director está en disposición de entrega



## TURNOS EN PROCESO

### Del 11 al 24 de junio



FECHA DE REPORTE	SOLICITANTE	SOLICITUD	ATIENDE	ESTATUS	FECHA DE ATENCIÓN	OBSERVACIONES
11/06/2019	ACH	Iniciar el trámite para que les den el resguardo de la plaza San Lucas.	Al. Cuauhtémoc	<b>Proceso</b>		
11/06/2019	ACH	En virtud de que no se cuenta con cámara del C5 en el punto de Paraguay y Brasil donde se encuentra el Juzgado Cívico, ver la factibilidad de poner una cámara o conectar a una privada dentro del programa Mi Calle	PGJ	<b>Proceso</b>		
11/06/2019	ACH	Solicitud de semáforo para los vecinos de la calle de Regina, en la esquina de Bolívar con Regina	Tránsito	<b>Proceso</b>		Vecinos presentarán solicitud por escrito
11/06/2019	VIPP.3	Solicitan apoyo para la Escuela Miguel Serrano ubicada en la calle de República de Cuba ya que no han podido entregarla por falta de presupuesto, tenemos 2 ciclos escolares en la escuela Gabino Barreda	ACH	<b>Proceso</b>		Avance Físico 100% (al 20 de junio)
14/06/2019	VIPP.6	Verificar en la calle de Jesús María #61 se construyó una rampa de concreto en vía pública para subir	ACH	<b>Proceso</b>		Verificar en sitio



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL  
CENTRO  
HISTÓRICO

## TURNOS PENDIENTES

Del 11 al 24 de junio



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

FECHA DE REPORTE	SOLICITANTE	SOLICITUD	ATIENDE	ESTATUS	FECHA DE ATENCIÓN	OBSERVACIONES
14/06/2019	VIPP.6	Solicitar una visita de verificación mediante oficio a la SGIRyPC sobre el predio de academia No.9	SGIRyPC	Pendiente		






GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

# INCIDENCIAS URBANAS

## Del 11 al 24 de junio





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO









AUTORIDAD DEL  
CENTRO  
HISTÓRICO

# INCIDENCIAS ATENDIDAS

## Del 11 al 24 de junio



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

FECHA DE REPORTE	SOLICITUD	UBICACIÓN	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS	OBSERVACIONES
21/06/2019	Árbol caído	Plaza la Aguilita			ACH	Atendido	
12/06/2019	Falla en alumbrado público	Motolinia			CFE	Atendido	Atendido en conjunto con SOS-AP
20/06/2019	Falla en suministro de energía eléctrica	Isabel la Católica			CFE	Atendido	



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



# INCIDENCIAS ATENDIDAS

## Del 11 al 24 de junio



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

FECHA DE REPORTE	SOLICITUD	UBICACIÓN	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS	OBSERVACIONES
20/06/2019	Falla en suministro de energía eléctrica	San Jerónimo			CFE	Atendido	
11/06/2019	Drenaje saturado	Callejón de dolores			SACMEX	Atendido	Personal técnico y equipo hidroneumático de alta presión adscrito al SACMEX, realizó limpieza y desazolve de 220 m de atarjea de 0.30 m de diámetro, 5 pozos de visita y 1 m3 de azolve extraído, quedado la red libre de drenaje libre de azolve y en funcionamiento
13/06/2019	Falla de dos farolas	Rodríguez Puebla			SOS-AP	Atendido	



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL  
CENTRO  
HISTÓRICO

# INCIDENCIAS ATENDIDAS

## Del 11 al 24 de junio



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

FECHA DE REPORTE	SOLICITUD	UBICACIÓN	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS	OBSERVACIONES
21/06/2019	Falla en alumbrado público	Motolinia			SOS-AP	Atendido	
21/06/2019	Falla en alumbrado público	5 de Mayo			SOS-AP	Atendido	
22/06/2019	Falla en alumbrado público	Palma			SOS-AP	Atendido	



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO








AUTORIDAD DEL  
CENTRO  
HISTÓRICO

# INCIDENCIAS ATENDIDAS

## Del 11 al 24 de junio



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

FECHA DE REPORTE	SOLICITUD	UBICACIÓN	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS	OBSERVACIONES
22/06/2019	Falla en alumbrado público	Tacuba			SOS-AP	Atendido	
22/06/2019	Falla en alumbrado público	5 de Mayo			SOS-AP	Atendido	
13/06/2019	Falla en semáforo	Correo Mayor			Tránsito	Atendido	Estaba apagado desde interruptor de control se restablece control queda funcionando Técnico Agustín Ornelas



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO







AUTORIDAD DEL  
CENTRO  
HISTÓRICO

# INCIDENCIAS ATENDIDAS

## Del 11 al 24 de junio



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

FECHA DE REPORTE	SOLICITUD	UBICACIÓN	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS	OBSERVACIONES
20/06/2019	Desprendimiento de semáforo	Correo Mayor			Tránsito	Atendido	Se revisa intersección y se coloca un codo para semáforo peatonal y se ajusta reloj de las 18:10 a 18:35 unidad 19 Técnico: Uriel García
22/06/2019	Revisión de señalamiento vertical	Donceles			Tránsito	Atendido	



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO






AUTORIDAD DEL  
CENTRO  
HISTÓRICO

# INCIDENCIAS EN PROCESO

## Del 11 al 24 de junio



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

FECHA DE REPORTE	SOLICITUD	UBICACIÓN	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS	OBSERVACIONES
20/06/2019	Falta tapa de registro	Isabel la Católica			ACH	Proceso	Se colocó tapa provisional de triplay
23/06/2019	Falla en suministro de energía eléctrica	Callejón del 57			CFE	Proceso	
20/06/2019	Colector saturado; apoyo con vector	Arcos de Belen			SACMEX	Proceso	
21/06/2019	Revisión de árbol	República de Colombia			SGIRyPC	Proceso	
21/06/2019	Revisión de semáforo	Ayuntamiento			Tránsito	Proceso	



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO






# INCIDENCIAS PENDIENTES

Del 11 al 24 de junio



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS




FECHA DE REPORTE	SOLICITUD	UBICACIÓN	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS	OBSERVACIONES
12/06/2019	Renivelación en piso	2 de Abril			ACH	Pendiente	
14/06/2019	Falta tapa de registro	República de Guatemala			ACH	Pendiente	
17/06/2019	Falta tapa de registro	República de Uruguay			ACH	Pendiente	
11/06/2019	Falla en alumbrado público	Pensador Mexicano			CFE	Pendiente	Se repara, dura unos días y vuelve a estar sin luz
16/06/2019	Verificar tapa de registro	Plaza Garibaldi			CFE	Pendiente	



# INCIDENCIAS PENDIENTES

## Del 11 al 24 de junio



FECHA DE REPORTE	SOLICITUD	UBICACIÓN	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS	OBSERVACIONES
18/06/2019	Falla en suministro de energía eléctrica	Berriozabal			CFE	Pendiente	Reporte 629454 por vía internet
19/06/2019	Falta tapa de registro	Balderas			CFE	Pendiente	
21/06/2019	Falta tapa de registro	Eje Central			CFE	Pendiente	
19/06/2019	Falta tapa de registro de agua potable	Isabel la Católica			SACMEX	Pendiente	



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO





AUTORIDAD DEL  
CENTRO  
HISTÓRICO

# INCIDENCIAS PENDIENTES

## Del 11 al 24 de junio



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

FECHA DE REPORTE	SOLICITUD	UBICACIÓN	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS	OBSERVACIONES
24/06/2019	Drenaje saturado	Corregidora			SACMEX	Pendiente	
15/06/2019	Reforestación de árboles	Plaza de San Juan			SEDEMA	Pendiente	El proyecto que dejó la AEP en la plaza San Juan
17/06/2019	Falla en alumbrado público	Carmen a Mixcalco			SOS-AP	Pendiente	No hay luz de la será de lado derecho se ve muy oscuro



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO





AUTORIDAD DEL  
CENTRO  
HISTÓRICO

# INCIDENCIAS PENDIENTES

## Del 11 al 24 de junio



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

FECHA DE REPORTE	SOLICITUD	UBICACIÓN	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS	OBSERVACIONES
19/06/2019	Poste de luz en mal estado	Arcos de Belen			SOS-AP	Pendiente	Poste de alumbrado publico,de metal fracturado de la parte inferior muy fracturado con una altura de aproximadamente 10mt de largo,con un diametro de 80cm.
11/06/2019	Reposición de bolardos	Bolívar			SOS-DGSUS	Pendiente	



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO





AUTORIDAD DEL  
CENTRO  
HISTÓRICO

# INCIDENCIAS PENDIENTES

## Del 11 al 24 de junio



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

FECHA DE REPORTE	SOLICITUD	UBICACIÓN	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS	OBSERVACIONES
13/06/2019	Reposición de tapas de dren	Plaza Tlaxcoaque			SOS-DGSUS	Pendiente	
18/06/2019	Boveda colapsando	Santo Tomás y Misioneros			TELMEX	Pendiente	para poder hacer esta reparación necesita Telmex primero atender su bóveda.  (ACH) - No se intervino por no dañar instalaciones de la empresa.



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO

# INCIDENCIAS DE ATENCIÓN URGENTE CFE



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS



Eje Central esq. Ayuntamiento



Misioneros esq. Circunvalación



Jesús María esq. Regina




Allende esq. Donceles




GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO



# INCIDENCIAS DE ATENCIÓN URGENTE TELMEX



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS



Santo Tomás esq. Misioneros



Misioneros entre Roldán y Santo Tomás



Misioneros esq. Roldán



## Matriz de seguimiento a incidencias urbanas compilado



Dependencia	Total de incidencias	Pendientes	En proceso	Atendidas
<b>ACH</b>	<b>79</b>	66	3	10
<b>ALC. CUAUHTÉMOC</b>	<b>18</b>	8	2	8
<b>ALC. V. CARRANZA</b>	<b>4</b>	--	--	4
<b>SACMEX</b>	<b>41</b>	9	1	31
<b>SOS-AP</b>	<b>37</b>	9	--	28
<b>SOS-DGOIV</b>	<b>15</b>	15	--	--
<b>SOS-DGSUS</b>	<b>13</b>	13	--	--
<b>CFE</b>	<b>68</b>	52	4	12
<b>TELMEX</b>	<b>19</b>	13	--	6
<b>C-5</b>	<b>2</b>	--	--	2
<b>STC-METRO</b>	<b>2</b>	--	--	2
<b>TRÁNSITO</b>	<b>13</b>	1	2	10
<b>IUSACELL</b>	<b>2</b>	2	--	--
<b>SOS-DGOP</b>	<b>1</b>	1	--	--
<b>SEDEMA</b>	<b>1</b>	1	--	--
<b>SGIRPC</b>	<b>2</b>	1	1	--
<b>POR DEFINIR</b>	<b>4</b>	4	--	--
	<b>321</b>	<b>195</b>	<b>13</b>	<b>113</b>



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL  
CENTRO  
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

# Mesas de trabajo

**\*Corte de transmisión\***  
**PRIVADO**





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO




AUTORIDAD DEL  
CENTRO  
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
OBRAS IRREGULARES

## Propuesta de Protocolo de Obras Irregulares 12 pasos para Detener y Regularizar las Obras

### IMPLEMENTACIÓN ACH



### IDENTIFICACIÓN

- Cualquier dependencia local o federal.
- Denuncia ciudadana

### DETENCIÓN

- INAH
- ALCALDÍAS
- SGIRyPC
- SEDEMA
- INVEA
- PAOT
- FEDAPUR
- SSC

### SEGUIMIENTO PARA SANCIÓN Y REGULARIZACIÓN

- INAH
- INBAL
- SEDUVI
- ALCALDIAS
- FEDAPUR
- PAOT
- INVEA
- SEDEMA

**Seguimiento .** ACH – FCH – Sec. de Cultura – Tránsito - SSC – C5



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL  
CENTRO  
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
OBRAS IRREGULARES

## Propuesta de Protocolo de Obras Irregulares

### 12 pasos para Detener y Regularizar las Obras

#### IDENTIFICACIÓN



1. Denuncia por parte de servidor público o ciudadano al correo electrónico:  
ach.obrasirregulares@gmail.com  
o al grupo de *WhatsApp* de Obras Irregulares

2. Revisar listado de permisos de obra proporcionado por el **INAH**.

**2.1** Revisión de documentación de los entes responsables al momento que se realiza la denuncia.

3. Se transmite la información al grupo de **WhatsApp** de obras irregulares para que se continúen las acciones correspondientes.



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO










AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL OBRAS IRREGULARES

## Propuesta de Protocolo de Obras Irregulares

### 12 pasos para Detener y Regularizar las Obras

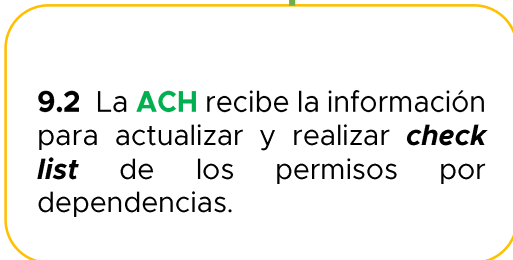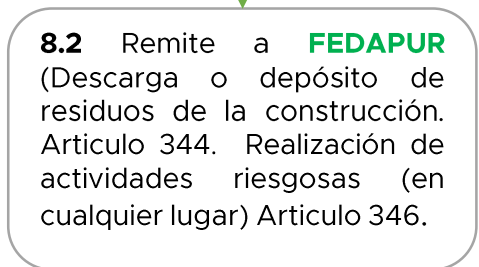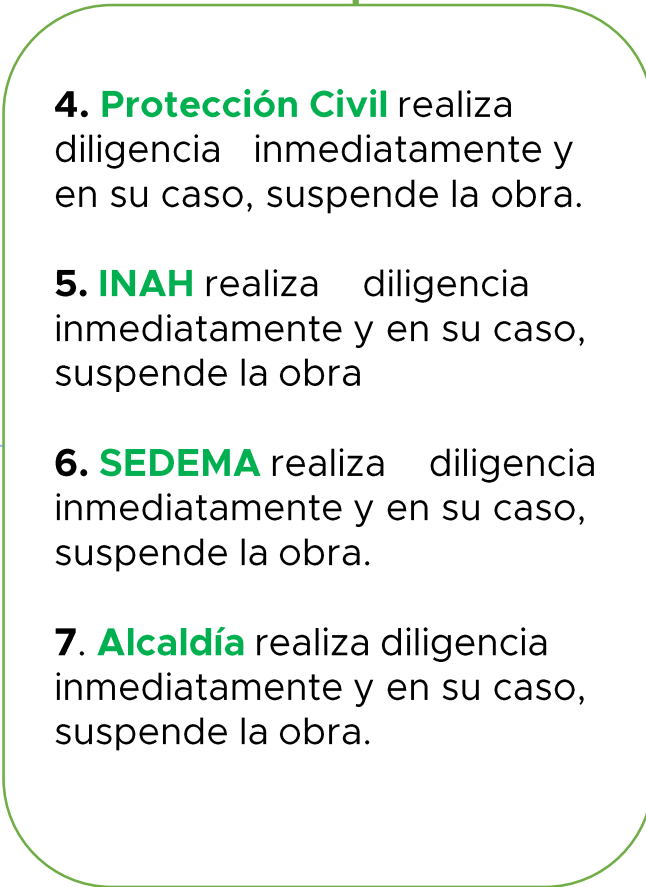



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO




MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL OBRAS IRREGULARES

## Propuesta de Protocolo de Obras Irregulares


### 12 pasos para Detener y Regularizar las Obras

**SEGUIMIENTO PARA SANCIÓN Y REGULARIZACIÓN**

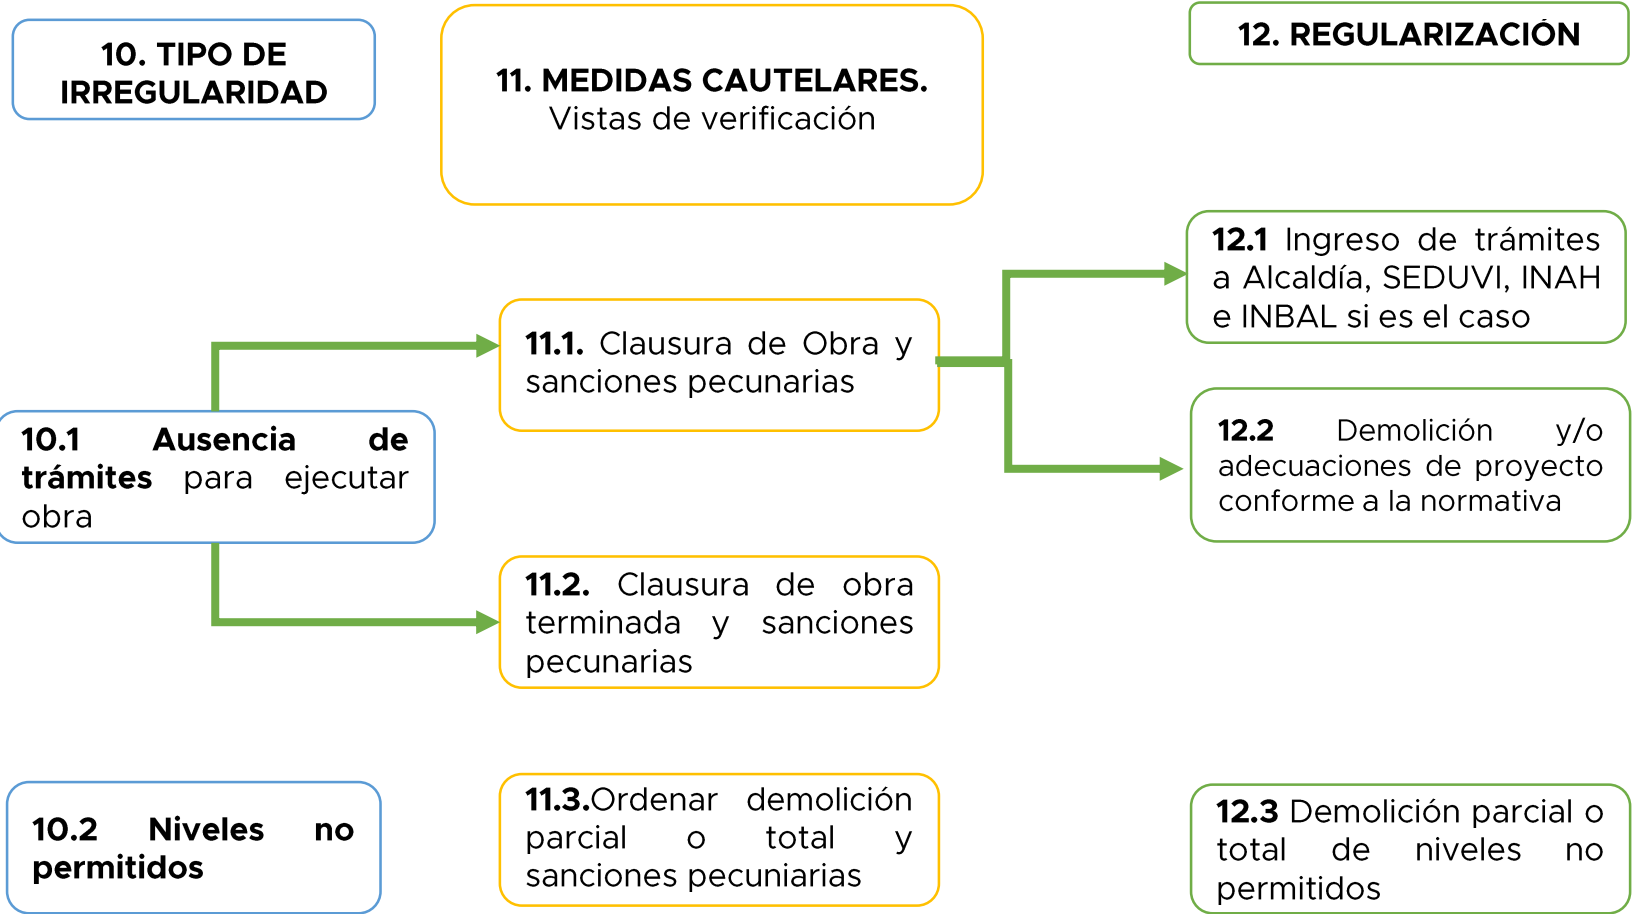

# Propuesta de Protocolo de Obras Irregulares

## 12 pasos para Detener y Regularizar las Obras

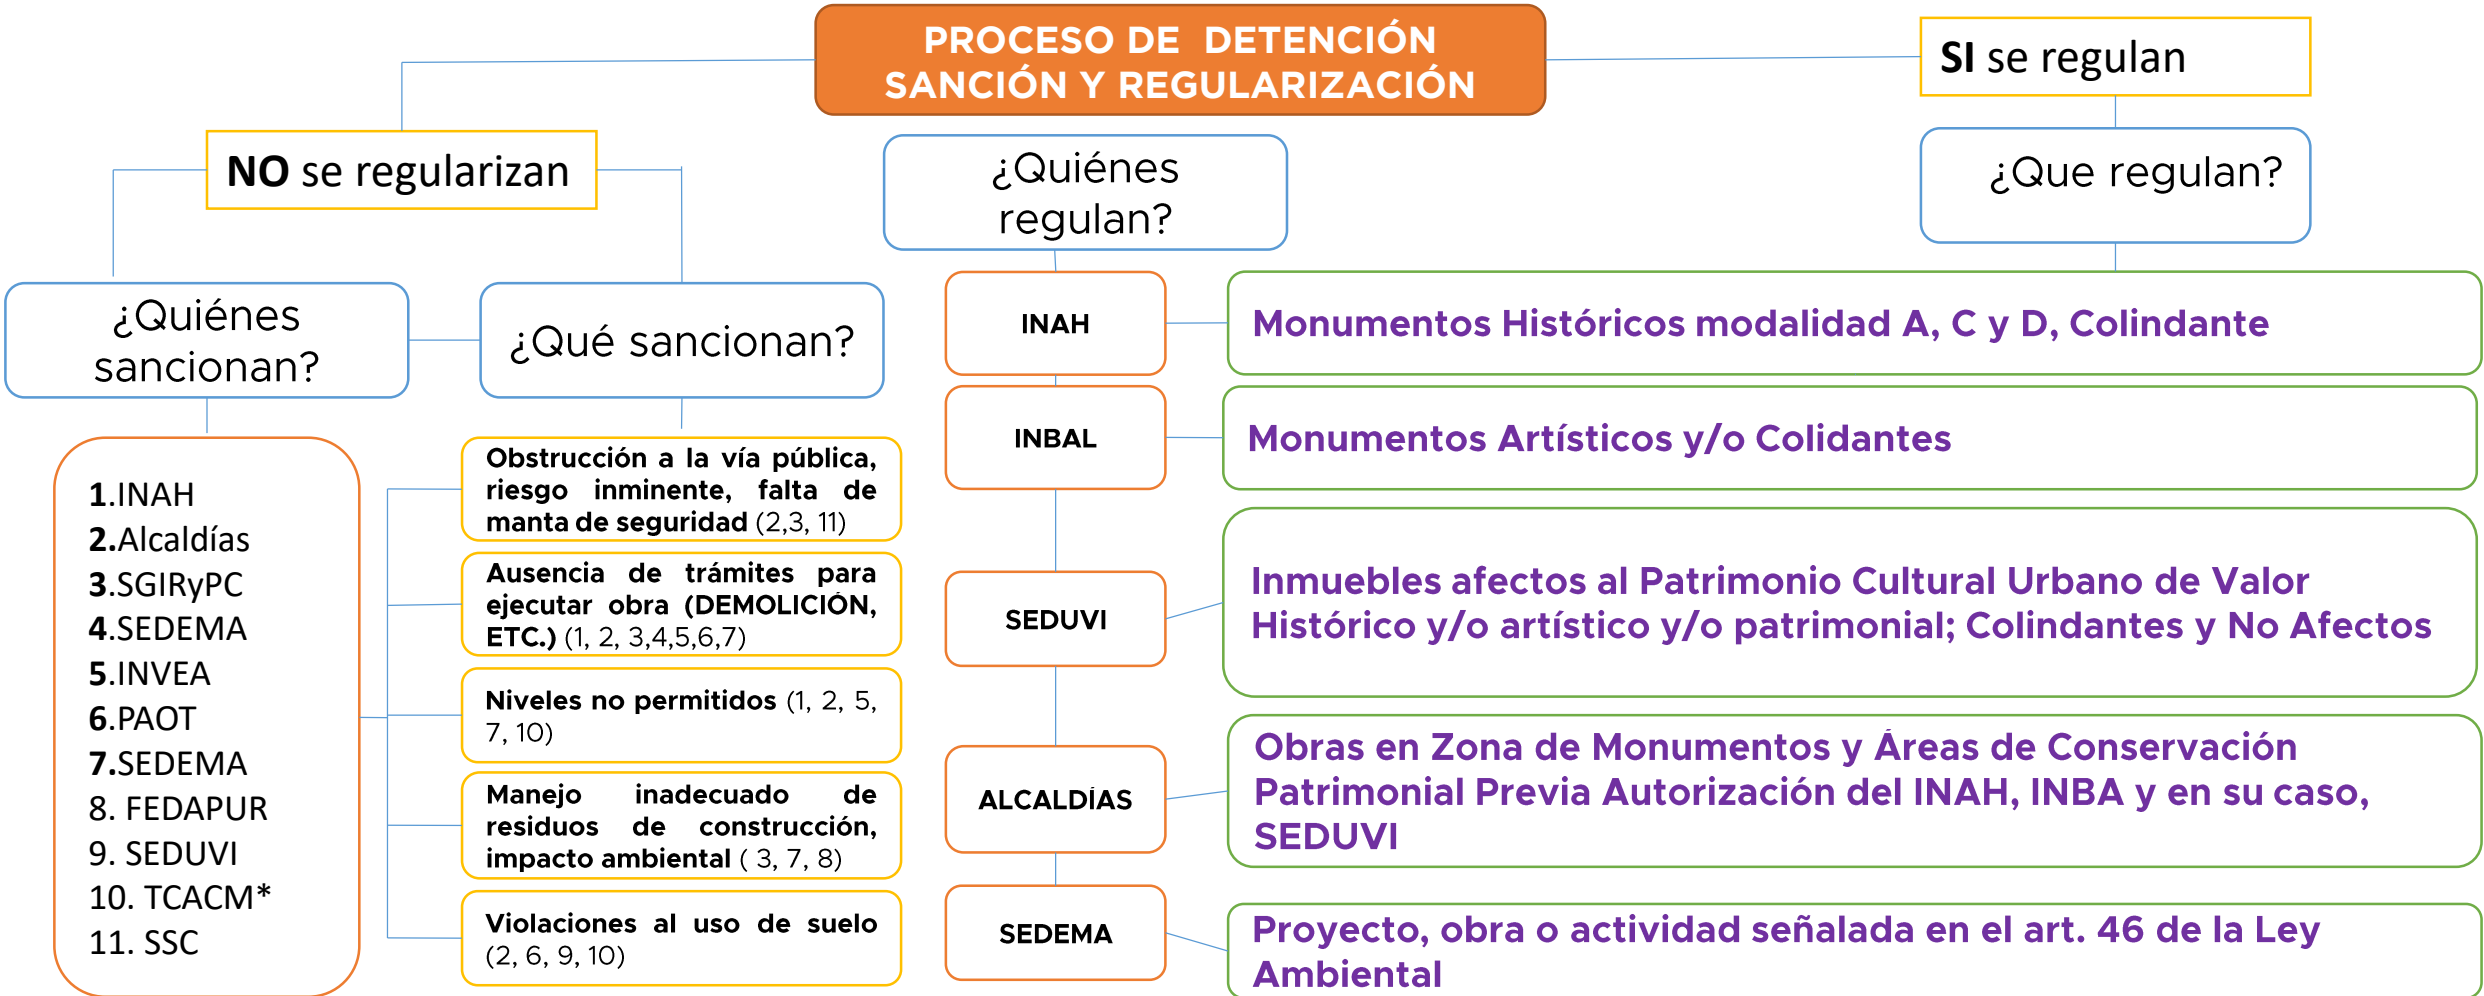

\*Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de México (GOFDF 10/01/14)

# Mercados Centro Histórico



## Mercado Abelardo L. Rodríguez



**X** Murales afectados por  
humedad

**X** Herrería deteriorada

**X** Cantera en mal estado

Recorrido de visita

**Próximo Martes 2 de julio a las 11 am**

**ACH - INAH - INBAL - FCH - CULTURA - SEDECO - AL. CUAUHTÉMOC**



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL  
CENTRO  
HISTÓRICO

# Gestión integral de grasas, aceites y residuos sólidos

## Informe

Se programaron tres recorridos para informar a los negocios de venta de comida y usuarios sobre el tratamiento que deben tener las grasas, aceites y residuos sólidos que generen.

También se invitó a consultar la lista de empresas certificadas para su recolección.

### Áreas de recorrido

- **Regina - San Jerónimo**
- **Plaza Santo Domingo** (Rep. De Cuba y Rep. De Brasil)
- **Plaza San Juan** (Ernesto Pugibet y Buen Tono)

Participaron

**SGIRPC - SACMEX - SEDEMA - SSC - ACH**



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS



# Gestión integral de grasas, aceites y residuos sólidos



## Impacto en Redes Sociales de la ACH - Campaña de manejo integral de grasas

### FACEBOOK

7 Publicaciones

15 mil 226 impactos orgánicos

### TWITTER

10 Publicaciones

55 mil 609 impactos orgánicos

Rt Gobierno de la Ciudad de México  
Cuauhtémoc, Sacmex,  
Venustiano Carranza, Sedema





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL  
CENTRO  
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

# Asuntos generales

**\*Corte de transmisión\***  
**PRIVADO**

## Notificación de obras públicas de emergencia en el Centro Histórico

La **ACH** concentrará **información** referente a **obras públicas** de emergencia, a fin de mejorar la seguridad y protección de los peatones.



SACMEX



CFE





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO




AUTORIDAD DEL  
CENTRO  
HISTÓRICO

## Obras en vía pública que afectan el tránsito peatonal y vehicular



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

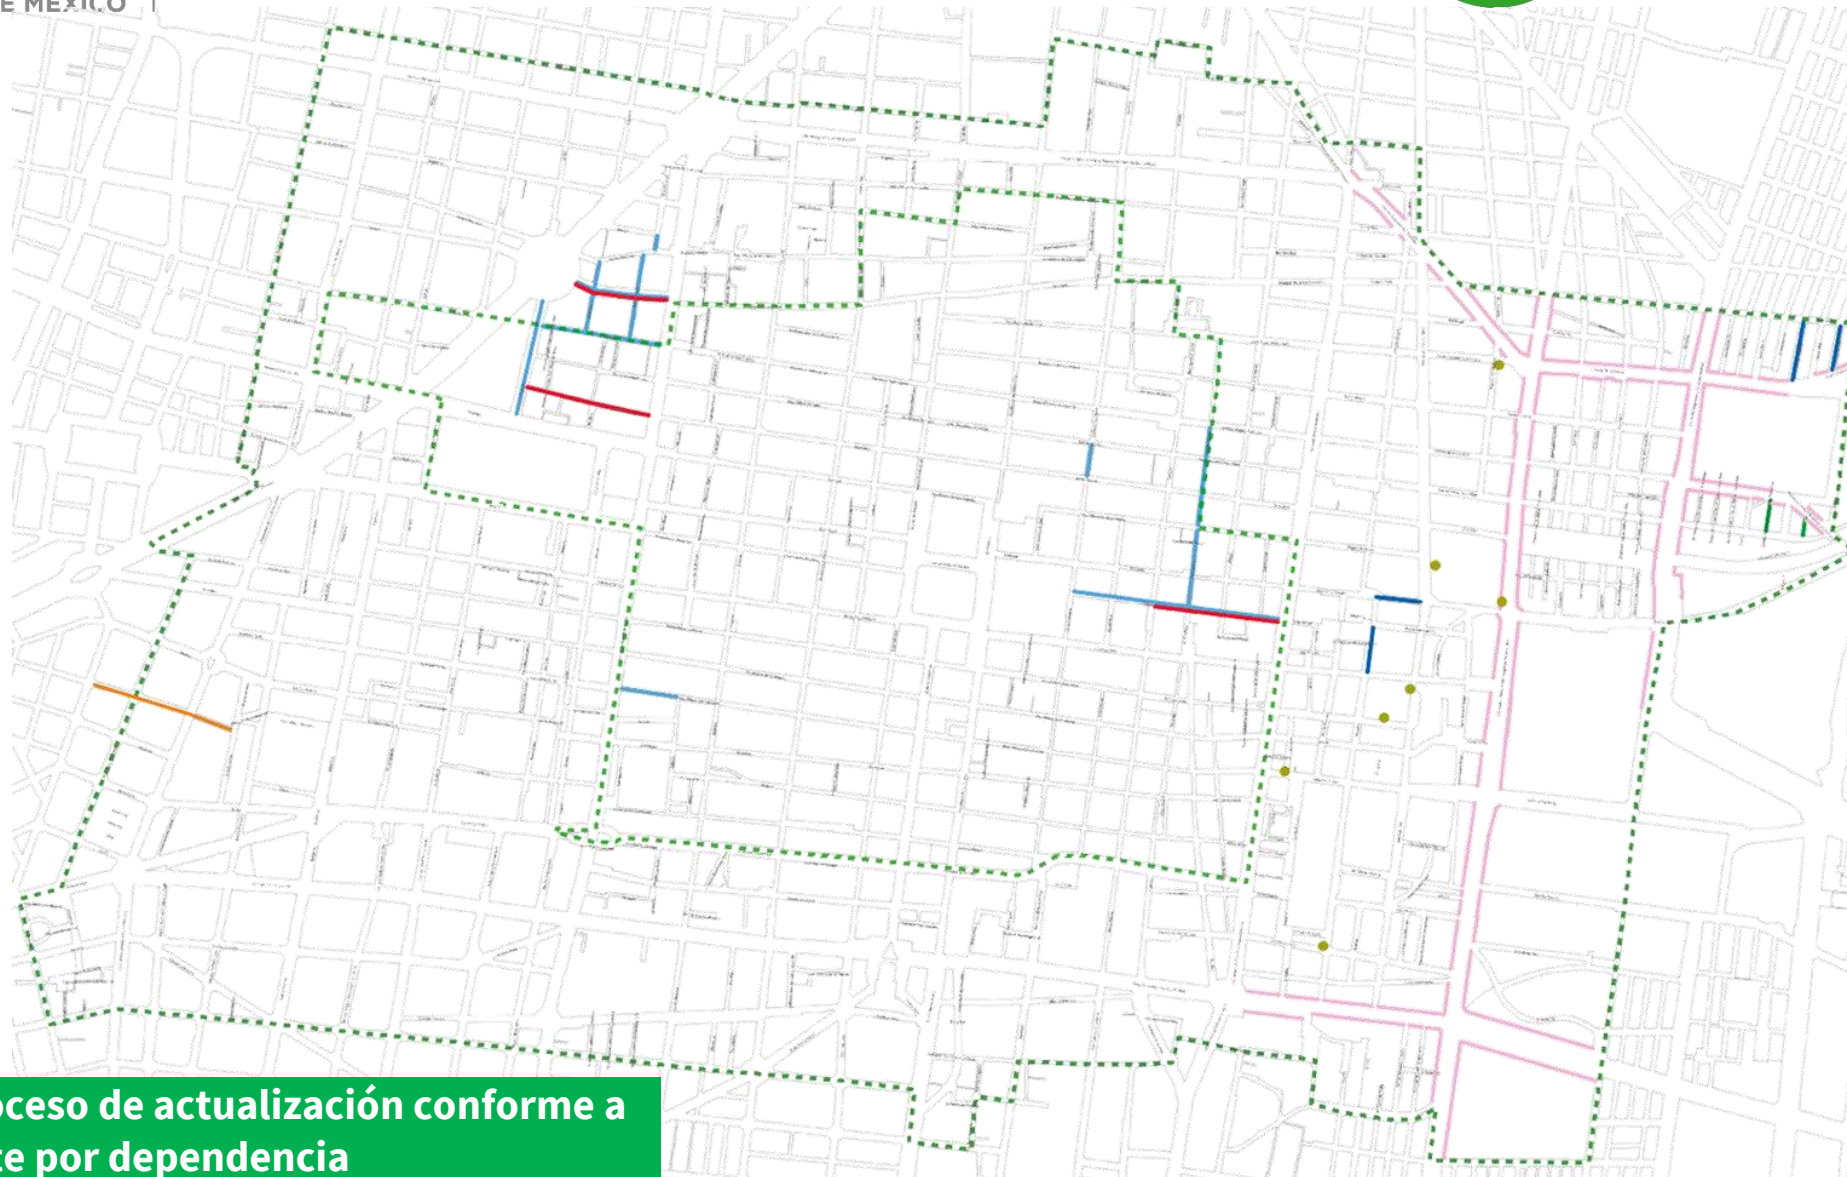

### Simbología

- Perímetro A
- Perímetro B

### Obras en Vía Pública que Afectan el Tránsito Peatonal y Vehicular

- SACMEX
- SOS-DGSUS

### Obras que realiza la alcaldía Venustiano Carranza

- Asfalto
- Banquetas y Guarniciones
- Drenaje Participativo
- Camaras de Vigilancia

### Obras que realiza la alcaldía Cuauhtémoc

- Rehabilitación carpeta asfáltica, banquetas, guarniciones y sistema de drenaje

En proceso de actualización conforme a  
reporte por dependencia



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL  
CENTRO  
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

# Acuerdos

**\*Continuamos transmitiendo en vivo\***



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL  
CENTRO  
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

# Asistencia

**\*Continuamos transmitiendo en vivo\***



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL  
CENTRO  
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

# Próxima sesión

**09 de julio de 2019**, a las 10:30 horas
