



## MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL  
CENTRO  
HISTÓRICO



# INICIO DE LA TRANSMISIÓN EN VIVO



# Orden del día


- 1. Reportes por dependencia**
- 2. Temas problema / Avances en mesas de trabajo**
- 3. Turnos**
- 4. Asuntos generales**
- 5. Acuerdos**
- 6. Asistencia**



# Reportes

**\*Continuamos transmitiendo en vivo\***

## Estatus por dependencia según consenso alcanzado sobre su integración

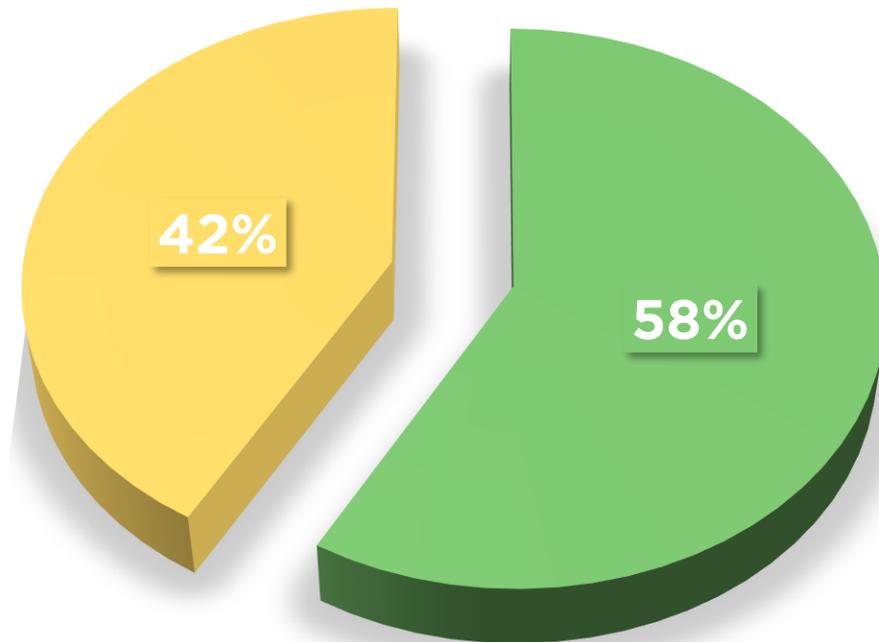

■ Validados con datos (14 dependencias)

■ En proceso (10 dependencias)

**Total: 24 dependencias**



## Estatus por dependencia

| Validado con datos           | En proceso de validación |
|------------------------------|--------------------------|
| ACH                          | Secretaría de Cultura    |
| SACMEX                       | Alcaldía Cuauhtémoc      |
| Alcaldía Venustiano Carranza | FCH                      |
| INAH                         | SEDEMA                   |
| INBA                         | INVEA                    |
| INVI                         | SEMOVI                   |
| C5                           | SEDUVI                   |
| PGJ                          | PCGIR                    |
| ILIFE                        | Metrobus                 |
| CFE                          | ADIP                     |
| SOS                          |                          |
| TELMEX                       |                          |
| SSC-Policía Auxiliar         |                          |
| SSC-Zona Centro              |                          |



# Reportes validados

**\*Continuamos transmitiendo en vivo\***

## ► Autoridad del Centro Histórico

| Tema   | Unidad de medida   | Periodicidad | Fecha de corte |             |                 |
|--|--|--------------|----------------|-------------|-----------------|
|  |  |              | 17 de enero    | 24 de enero | próximo reporte |
| Tiraderos clandestinos   | Metros cúbicos de residuos sólidos levantados en tiraderos clandestinos en el perímetro de ACH   | Semanal      | 1,560          | 1,583       | 31 de enero     |
| Tiraderos clandestinos   | Número de calles y/o espacios públicos recuperados de tiraderos clandestinos de cascajo en el Perímetro de la ACH (SE REPORTAN SITIOS ATENDIDOS) | Semanal      | 40             | 46          | 31 de enero     |
| Limpieza   | Metros lineales barridos en el Perímetro de la ACH   | Semanal      | 5,072,886      | 5,072,886   | 31 de enero     |
| Limpieza   | Metros cúbicos de basura recolectada en el Perímetro de la ACH (Producto de Barrido)   | Semanal      | 2,179          | 2,085       | 31 de enero     |
| Limpieza   | Número de papeleras repuestas en el Centro Histórico (meta 160)  | Semanal      | 0              | 134         | 31 de enero     |
| Mantenimiento a infraestructura  | Número de Incidencias de daño en infraestructura del Perímetro de la ACH reparadas y atendidas   | Semanal      | 0              | 0           | 31 de enero     |
| Supervisión de Proyectos de intervención urbana en el Centro Histórico | Porcentaje de avance de proyectos de intervención urbana en el Centro Histórico  | Mensual      | --             | --          | 05 de febrero   |
| Señalética   | Número de señalizaciones de obras públicas colocadas por la ACH en el PA   | Semanal      | 0              | 0           | 31 de enero     |

## ► SACMEX


| Tema                                  | Unidad de medida   | Periodicidad | Fecha de corte  |                               |                 |
|---------------------------------------|--|--------------|---|-------------------------------|-----------------|
|                                       |  |              | 21 de enero   | 28 de enero                   | Próximo reporte |
| Coladeras / Registros                 | Número de coladeras y/o registros colocados (Línea base: 66)   | Semanal      | 24  | 36                            | 04 de febrero   |
| Red hidráulica del CH                 | Porcentaje de avance de la red hidráulica del Centro Histórico   | Mensual      | Se comunica por oficio falta de autorización presupuestal para los trabajos |                               |                 |
| Desazolve de red. Perímetro "A" y "B" | Metraje de red secundaria de drenaje desazolvada del Perímetro "A" y "B".<br>Línea base<br>Atarjeas: 38,455 ml<br>Pozo de visita: 55 pzas<br>Rejilla de piso: 47 pzas<br>Coladera pluvial: 53 pzas<br>Albañal: 80 ml | Semanal      | Atarjeas: 11,105 ml   | Atarjeas: 17,335 ml           | 04 de febrero   |
|                                       |  |              | Pozos de Visita: 193 pzas   | Pozos de Visita: 312 pzas     | 04 de febrero   |
|                                       |  |              | Rejilla de Piso: 146 pzas   | Rejilla de Piso: 260 pzas     | 04 de febrero   |
|                                       |  |              | Coladeras Pluviales: 141 pzas   | Coladeras Pluviales: 250 pzas | 04 de febrero   |
|                                       |  |              | Albañal: 300 ml   | Albañal: 500 ml               | 04 de febrero   |

► **SACMEX**

**TRABAJOS EN ATENCIÓN A INCIDENCIAS REPORTADAS AL SACMEX**

**RED DE DRENAJE**

28 de enero
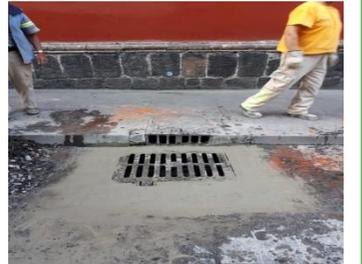
| NO. | OFICINA                  | FECHA ATENCIÓN | INCIDENCIA                            | UBICACIÓN   | TRABAJOS REALIZADOS  | IMAGEN ANTES   | IMAGEN DESPUÉS   |
|-----|--------------------------|----------------|---------------------------------------|---|--|--|--|
| 1   | DESAZOLVE<br>ZONA CENTRO | 20/01/2019     | RENIVELACION<br>DE REJILLA DE<br>PISO | CALLE VENUSTIANO<br>CARRANZA ESQ. PALMA,<br>COL. CENTRO, ALCALDÍA<br>CUAUHTEMOC               | SE REALIZO<br>EMBOQUILLADO DE<br>BATERIA DE REJILLA<br>DE PISO |   |   |
| 2   | DESAZOLVE<br>ZONA CENTRO | 21/01/2019     | RENIVELACION<br>DE REJILLA DE<br>PISO | CALLE VENUSTIANO<br>CARRANZA ENTRE<br>BOLÍVAR Y GANTE, COL.<br>CENTRO, ALCALDÍA<br>CUAUHTEMOC | SE REALIZO CAMBIO<br>DE REJILLA DE PISO                        |  |  |

► **SACMEX**

**TRABAJOS EN ATENCIÓN A INCIDENCIAS REPORTADAS AL SACMEX**

| RED DE DRENAJE |                       |                |  |   |                            |   | 28 de enero   |  |
|----------------|-----------------------|----------------|--|---|----------------------------|---|---|--|
| NO.            | OFICINA               | FECHA ATENCIÓN | INCIDENCIA                                 | UBICACIÓN   | TRABAJOS REALIZADOS        | IMAGEN ANTES  | IMAGEN DESPUÉS  |  |
| 3              | DESAZOLVE ZONA CENTRO | 21/01/2019     | RENIVELACION DE COLADERA PLUVIAL           | CALLE URUGUAY ENTRE BOLÍVAR E ISABEL LA CATÓLICA, COL. CENTRO, ALCALDÍA CUAUHTEMOC          | SE CAMBIO COLADERA PLUVIAL |    |    |  |
| 4              | DESAZOLVE ZONA CENTRO | 21/01/2019     | EMBOQUILLADO DE POZO DE VISITA (PRECOLADO) | CALLE SALVADOR ENTRE 5 DE FEBRERO E ISABEL LA CATÓLICA, COL. CENTRO, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC    | SE RENIVELO POZO DE VISITA |   |   |  |
| 5              | DESAZOLVE ZONA CENTRO | 22/01/2019     | EMBOQUILLADO DE COLADERA PLUVIAL           | CALLE BRASIL ENTRE GONZÁLEZ OBREGÓN Y BELISARIO DOMÍNGUEZ, COL. CENTRO, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC | SE CAMBIO COLADERA PLUVIAL |  |  |  |

► **SACMEX**

**TRABAJOS EN ATENCIÓN A INCIDENCIAS REPORTADAS AL SACMEX**

| RED DE DRENAJE |                       |                |  |   |  |   | 28 de enero   |  |
|----------------|-----------------------|----------------|--|---|--|---|---|--|
| NO.            | OFICINA               | FECHA ATENCIÓN | INCIDENCIA                                       | UBICACIÓN   | TRABAJOS REALIZADOS                          | IMAGEN ANTES  | IMAGEN DESPUÉS  |  |
| 6              | DESAZOLVE ZONA CENTRO | 22/01/2019     | MEJORAR LA CAPTACIÓN PLUVIAL DE COLADERA PLUVIAL | CALLE BRASIL ENTRE BELISARIO DOMÍNGUEZ Y COLOMBIA, COL. CENTRO, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC | SE EMBOQUILLO Y LIMPIEZA DE COLADERA PLUVIAL |    |    |  |
| 7              | DESAZOLVE ZONA CENTRO | 22/01/2019     | RENIVELACIÓN DE COLADERA PLUVIAL                 | CALLE CHILE ENTRE HONDURAS Y PERÚ, COL. CENTRO, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC                 | SE RENIVELO BROCAL DE COLADERA PLUVIAL       |   |   |  |
| 8              | DESAZOLVE ZONA CENTRO | 22/01/2019     | RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA                   | CALLE CHILE ENTRE HONDURAS Y PERÚ, COL. CENTRO, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC                 | SE CAMBIO BROCAL DE POZO DE VISITA           |  |  |  |


► **SACMEX**

**TRABAJOS EN ATENCIÓN A INCIDENCIAS REPORTADAS AL SACMEX**

| RED DE DRENAJE |                       |                |   |  |                                      |   | 28 de enero   |  |
|----------------|-----------------------|----------------|---|--|--------------------------------------|---|---|--|
| NO.            | OFICINA               | FECHA ATENCIÓN | INCIDENCIA  | UBICACIÓN  | TRABAJOS REALIZADOS                  | IMAGEN ANTES  | IMAGEN DESPUÉS  |  |
| 9              | DESAZOLVE ZONA CENTRO | 22/01/2019     | CAMBIO DE COLADERA PLUVIAL  | CALLE DONCELES ENTRE PALMA Y BRASIL, COL. CENTRO, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC                    | SE CAMBIO BROCAL DE COLADERA PLUVIAL |    |    |  |
| 10             | DESAZOLVE ZONA CENTRO | 22/01/2019     | COLADERA PLUVIAL ROTA DEL PEINE   | CALLE CHILE ENTRE PARAGUAY Y HONDURAS, COL. CENTRO, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC                  | SE CAMBIO BROCAL DE COLADERA PLUVIAL |   |   |  |
| 11             | DESAZOLVE ZONA CENTRO | 23/01/2019     | SE REQUIERE LEVANTAR PLACA PARA SER ATENDIDO POR EL ÁREA QUE LE CORRESPONDE | CALLE SALVADOR ENTRE 5 DE FEBRERO E ISABEL LA CATÓLICA, COL. CENTRO, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC | SE COLOCO UNA REJILLA DE PISO        |  |  |  |



## Avance de limpieza y desazolve del centro histórico

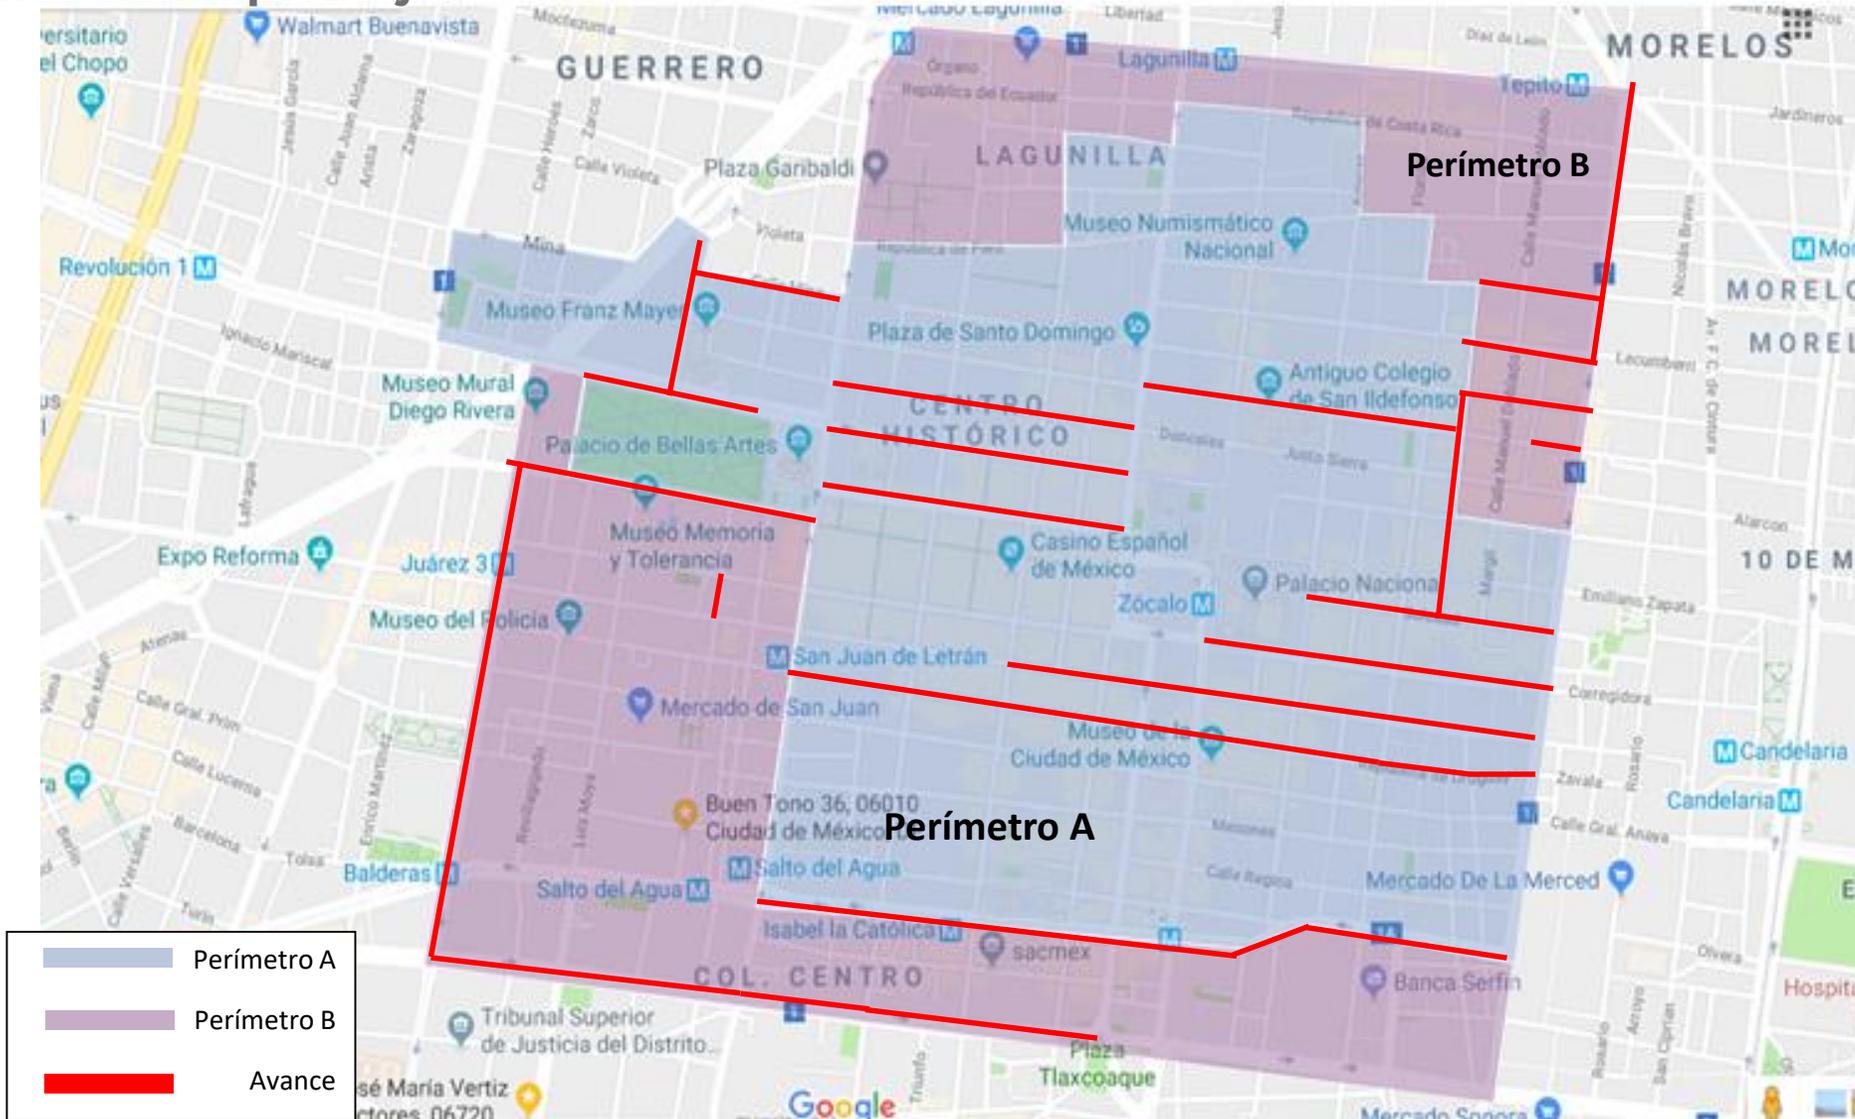

## ► Alcaldía Venustiano Carranza

| Tema                   | Unidad de medida  | Periodicidad | Fecha de corte  |   |                 |
|------------------------|---|--------------|---|---|-----------------|
|                        |   |              | 21 de enero   | 28 de enero   | Próximo reporte |
| Tiraderos clandestinos | Número de calles y/o espacios públicos recuperados de tiraderos clandestinos de desechos sólidos en el PB de VC | Mensual      | --  | --  | 19 de febrero   |
| Barrido                | Metros lineales barridos en el PB de VC   | Semanal      | 119,000   | 119,000   | 04 de febrero   |
| Basura                 | Metros cúbicos de residuos sólidos recolectados en el PB de VC  | Semanal      | 2,607.68 (176.48 Mercado Sonora, 1,694 Mercado Merced, 231 Recolección domiciliaria y 506.49 en tiraderos y barrido manual) | 2,647.26 (154 Mercado Sonora, 1,709.4 Mercado Merced, Rec. domiciliaria. 308, Tiraderos 475.86) | 04 de febrero   |
| Luminarias             | Número de Luminarias reparadas en vías secundarias en PB de la VC   | Semanal      | 14  | 5   | 04 de febrero   |
| Manifestación de obra  | Número de registros de manifestación de construcción  | Mensual      | --  | --  | 04 de febrero   |
| Manifestación de obra  | Número de registros de manifestación Tipo A   | Mensual      | --  | --  | 04 de febrero   |

## ► Alcaldía Venustiano Carranza

| Tema                              | Unidad de medida  | Periodicidad | Fecha de corte |                 |
|-----------------------------------|---|--------------|----------------|-----------------|
|                                   |   |              | 28 de enero    | Próximo reporte |
| Manifestación de obra             | Número de registros de manifestación Tipo B                     | Mensual      | --             | 12 de febrero   |
| Manifestación de obra             | Número de registros de manifestación Tipo C                     | Mensual      | --             | 12 de febrero   |
| Manifestación de obra             | Número de registros de manifestación Obra Nueva                 | Mensual      | --             | 12 de febrero   |
| Licencia de construcción especial | Número de solicitudes de licencia de construcción especial      | Mensual      | --             | 12 de febrero   |
| Licencia de construcción especial | Número licencias autorizadas                                    | Mensual      | --             | 12 de febrero   |
| Licencia de construcción especial | Número de licencias no presentadas (pendientes de autorización) | Mensual      | --             | 12 de febrero   |



## ► INAH

| Tema  | Unidad de medida  | Periodicidad | Fecha de corte |                 |
|---|---|--------------|----------------|-----------------|
|   |   |              | 28 de enero    | próximo reporte |
| Denuncias recibidas en el INAH                              | Número de denuncias recibidas en obras y acciones fuera de norma y sin autorización   | Bimestral    | 1 (*)          | 05 de marzo     |
| Restauración y recuperación de patrimonio por sismo del 19s | Número de inmuebles de propiedad federal en restauración y recuperación atendidos (Línea base: 56 [ 50 en Al. Cuauhtémoc - 6 en Al. Venustiano Carranza]) | Bimestral    | - -            | 05 de marzo     |
| Obras y proyectos de intervención urbana                    | Número de autorizaciones para la realización de proyectos y obras de intervención urbana  | Mensual      | - -            | 05 de febrero   |

(\*) Esquina de Calle Delicias y Eje Central Lázaro Cárdenas, no es Monumento pero están haciendo obras. Esta semana se va a verificar.



## ► INBA

| Tema                                     | Unidad de medida  | Periodicidad | Fecha de corte |                 |
|--|---|--------------|----------------|-----------------|
|  |   |              | 07 de enero    | próximo reporte |
| Obras y proyectos de intervención urbana | Número de solicitudes atendidas o ingresadas para diversas intervenciones en Centro Histórico | Mensual      | 7              | 05 de febrero   |
|  | Número de recomendaciones técnicas  | Mensual      | 2              | 05 de febrero   |
|  | Número con visto bueno  | Mensual      | 2              | 05 de febrero   |
|  | Número con respuesta NO viable  | Mensual      | 3              | 05 de febrero   |



## ► INVI

| Tema                          | Unidad de medida  | Periodicidad | Fecha de corte |                 |
|-------------------------------|---|--------------|----------------|-----------------|
|                               |   |              | 22 de enero    | próximo reporte |
| Proyectos de obra de vivienda | Porcentaje de avance por proyecto (de los 18 reportados en el CH)   | Mensual      |                | 22 de febrero   |
|                               | <b>Obras por iniciar (6 total)</b>                                  |              | <b>0,00%</b>   |                 |
|                               | 1. Republica de Argentina no. 58, al. Cuauhtémoc (a-012/doul/62/14) |              |                |                 |
|                               | 2. Lerdo no. 12, al. Cuauhtémoc (a-006/doul/62/13)                  |              |                |                 |
|                               | 3. Pedro Moreno no. 154, al. Cuauhtémoc (a-062/doul/62/11)          |              |                |                 |
|                               | 4. Talavera no. 24, al. Cuauhtémoc (a-056/doul/62/16)               |              |                |                 |
|                               | 5. Violeta no. 15, al. Cuauhtémoc (a-024/doul/62/12)                |              |                |                 |
|                               | 6. Pedro Moreno no 156, al. Cuauhtémoc (a-064/diul/62/10)           |              |                |                 |
|                               | <b>Porcentaje de avance de obras en proceso (12 total)</b>          |              | <b>64,50%</b>  |                 |
|                               | 1. 2 de Abril no 42, al. Cuauhtémoc (a-039/doul/62/11)              |              | 42,00%         |                 |
|                               | 2. Academia no.33, al. Cuauhtémoc (a-028/doul/62/14)                |              | 48,00%         |                 |
|                               | 3. Arcos de Belén no 49, al. Cuauhtémoc (a-038/doul/62/17)          |              | 43,00%         |                 |



► INVI

| Tema                          | Unidad de medida  | Periodicidad | Fecha de corte |                 |
|-------------------------------|---|--------------|----------------|-----------------|
|                               |   |              | 22 de enero    | próximo reporte |
| Proyectos de obra de vivienda | Porcentaje de avance por proyecto (de los 18 reportados en el CH)         | Mensual      |                | 22 de febrero   |
|                               | <b>Porcentaje de avance de obras en proceso (12 total)</b>                |              |                |                 |
|                               | 4. Eje 1 Poniente Guerrero no 164, al. Cuauhtémoc (a-007/diul/62/10)      |              | 85,00%         |                 |
|                               | 5. Eje 1 Poniente Guerrero no. 110, al. Cuauhtémoc (a-085/doul/62/11)     |              | 56,00%         |                 |
|                               | 6. Magnolia no. 12 (antes no. 12 Y 16), al. Cuauhtémoc (a-069/doul/62/14) |              | 41,00%         |                 |
|                               | 7. República de Argentina no. 87, al. Cuauhtémoc (a-079/doul/62/12)       |              | 73,00%         |                 |
|                               | 8. República de Perú no. 40, al. Cuauhtémoc (a-009/doul/62/2017)          |              | 90,00%         |                 |
|                               | 9. Allende no. 46, al. Cuauhtémoc (a-073/doul/62/12)                      |              | 93,00%         |                 |
|                               | 10. Lecumberri no 66, al. Cuauhtémoc (a-022/doul/62/17)                   |              | 99,00%         |                 |
|                               | 11. Belisario Domínguez no. 78, al. Cuauhtémoc (a-059/doul/62/17)         |              | 30,00%         |                 |
|                               | 12. Nacional no. 57, Al. Venustiano Carranza (a-022/doul/62/15)           |              | 74,00%         |                 |



► C5

| Tema                        | Unidad de medida  | Periodicidad | Fecha de corte |             |                 |
|-----------------------------|---|--------------|----------------|-------------|-----------------|
|                             |   |              | 22 de enero    | 29 de enero | Próximo reporte |
| Cámaras de video-vigilancia | Número de cámaras vandalizadas  | Semanal      | 0              | 0           | 05 de febrero   |
| Cámaras de video-vigilancia | Número de cámaras obstruidas por comercio en vía pública recuperadas                          | Semanal      | 0              | 0           | 05 de febrero   |
| Cámaras de video-vigilancia | Número de cámaras, botones y altavoces con falla intermitente en CH                           | Semanal      | 41             | 27          | 05 de febrero   |
| Cámaras de video-vigilancia | Número de asistencias a C2-Centro para mejora en visibilidad de cámaras en CH (L. Base - 102) | Mensual      | --             | --          | 05 de febrero   |
| Cámaras de video-vigilancia | Número de asistencias C2-Norte para mejora en visibilidad de cámaras en CH (L. Base - 100)    | Mensual      | --             | --          | 05 de febrero   |



► PGJ

| Tema            | Unidad de medida   | Periodicidad | Fecha de corte |             |                 |
|-----------------|--|--------------|----------------|-------------|-----------------|
|                 |  |              | 22 de enero    | 29 de enero | Próximo reporte |
| Infraestructura | Número de averiguaciones previas por robo de elementos de fierro de la infraestructura (tapas de registro, rejillas pluviales) | Semanal      | --             | 0           | 05 de febrero   |
| Infraestructura | Número de denuncias por robo de herrería (molduras de puertas de edificios antiguos, letras de bronce, etc.)                   | Semanal      | --             | 0           | 05 de febrero   |
| Infraestructura | Número de averiguaciones previas por robo de estatuas y esculturas   | Semanal      | --             | 0           | 05 de febrero   |
| Infraestructura | Número de denuncias de medidores de agua   | Semanal      | --             | 2           | 05 de febrero   |



## ► ILIFE

| Tema                      | Unidad de medida   | Periodicidad | Fecha de corte |                 |
|---------------------------|--|--------------|----------------|-----------------|
|                           |  |              | 08 de enero    | Próximo reporte |
| Sismo 19S                 | Porcentaje de avance de escuelas con daños del Sismo 19S en 3 escuelas*                                | Mensual      | 24%            | 05 de febrero   |
| Mantenimiento de escuelas | Porcentaje de avance de escuelas con el programa de mantenimiento normal del Instituto en 20 escuelas* | Mensual      | 21%            | 05 de febrero   |

► **ILIFE**

**PLANTELES EDUCATIVOS EN PROCESO DE MANTENIMIENTO**

| No. | Nivel              | Nombre del Plantel                               | Dirección   | Daños o riesgos mayores en el inmueble, o en sus colindantes | Catalogado  | CON PERMISO INAH | STATUS               |
|-----|--------------------|--|---|--|-------------|------------------|----------------------|
| 1   | Preescolar         | Juan Jacobo Rousseau                             | Callejón del Hormiguero No. 5 Col. Centro, C.P. 0609  | No   | INAH        | SI               | EN PROCESO           |
| 2   | Secundaria         | Cesar A. RUIZ Y JUAN ESCUTIA                     | Regina No. 111 Col. Centro Tel.: 5522 7148            | No   | INAH        | SI               | EN PROCESO           |
| 3   | Primaria           | Joaquin García Icazbalceta                       | Segundo callejón de Mesones No. 1 Col. Centro         | Sí   | INAH        | SI               | EN PROCESO           |
| 4   | Primaria           | República De Libano                              | Las Cruces No. 45 Col. Centro                         | Sí   | INAH        | SI               | EN PROCESO           |
| 5   | Primaria           | Marcelino Davalos                                | Academia No. 12 Col. Centro                           | No   | INAH        | SI               | EN PROCESO           |
| 6   | Primaria           | Lic. Ponciano Arriaga                            | Jesús María No. 5 Col. Centro                         | No   | INAH        | SI               | EN PROCESO           |
| 7   | Primaria           | Republica De Panama                              | Del Carmen No. 39 Col. Centro                         | No   | INAH        | SI               | EN PROCESO           |
| 8   | Primaria           | Alfredo E. Uruchurtu                             | Manuel Doblado No. 75 Col. Centro                     | No   | INAH        | NO               | EN PROCESO           |
| 9   | Primaria           | Sara Manzano                                     | Del Carmen No. 63 Col. Centro                         | No   | INAH        | SI               | EN PROCESO           |
| 10  | Preescolar         | Enrique Pestalozzi                               | Peña y Peña No. 38 Col. Centro, C.P. 06020            | Sí   | INAH        | SI               | EN PROCESO           |
| 11  | Primaria           | Lic. Miguel Serrano                              | Cuba No. 95 Col. Centro                               | Sí   | INAH        | SI               | EN PROCESO           |
| 12  | Secundaria         | Adriana García Coral                             | Belisario Domínguez No. 5 Col. Centro Tel.: 5512 9191 | No se permitió el acceso                                     | INAH        | SI               | EN PROCESO           |
| 13  | Primaria           | Pablo Moreno                                     | Bolivia No. 12 Col. Centro                            | No   | INAH        | SI               | EN PROCESO           |
| 14  | Primaria           | República De Argentina                           | Argentina No. 68 y 70 Col. Centro                     | No   | INAH        | SI               | EN PROCESO           |
| 15  | Secundaria         | ANGEL TRIAS ALVAREZ Y JULIO JIMENEZ RUEDA        | Ecuador No. 106 Col. Centro Tel.: 5529 8493           | No   | INAH        | SI               | EN PROCESO           |
| 16  | Primaria           | República De Bolivia                             | Tres Guerras No. 17 Col. Centro                       | Sí   | INAH / INBA | SI               | EN PROCESO           |
| 17  | Preescolar         | Cadetes De La Naval                              | Arcos de Belén No. 47 Col. Centro, C.P. 06070         | No   | INAH        | SI               | EN PROCESO           |
| 18  | Primaria           | Fray Pedro De Gante                              | Regina No. 86 Col. Centro                             | No   | INAH        | NO               | EN PROCESO           |
| 19  | Secundaria         | José Manuel Ramos                                | 5 de Febrero No. 90 Col. Centro Tel.: 5709 2045       | No   | INAH        | SI               | EN PROCESO           |
| 20  | Primaria           | Abraham Castellanos                              | Plaza del Estudiante No. 14 Col. Centro               | No   | INAH        | SI               | EN PROCESO           |
| 21  | Secundaria         | ESCUELA TELESECUNDARIA FEDERAL No. 91            | Vidal Alcocer No. 112.                                | No   | INAH        | SI               | EN PROCESO           |
| 22  | Especial y Técnica | Escuela Nacional Para Ciegos "Ignacio Trigueros" | Mixcalco #6   | No   | INAH        | SI               | EN ESPERA DE PERMISO |
| 23  | Secundaria         | Escuela Sec. Técnica Sor Juana Inés De La Cruz   | Enrico Martinez # 25 Co. Centro.                      | No   | INAH / INBA | SI               | EN PROCESO           |



► **ILIFE**

**PLANTELES EDUCATIVOS EN PROCESO DE REPARACIÓN DE DAÑOS OCASIONADOS POR EL SISMO 19S**

| No. | Nivel      | Nombre del Plantel   | Dirección   | Daños o riesgos mayores en el inmueble, o en sus colindantes | Catalogado | CON PERMISO INAH | STATUS     |
|-----|------------|----------------------|---|--|------------|------------------|------------|
| 8   | Primaria   | ALFREDO E. URUCHURTU | Manuel Doblado No. 75 Col. Centro                     | No   | INAH       | NO               | EN PROCESO |
| 11  | Primaria   | LIC. MIGUEL SERRANO  | Cuba No. 95 Col. Centro                               | Sí   | INAH       | SI               | EN PROCESO |
| 12  | Secundaria | ADRIANA GARCÍA CORAL | Belisario Domínguez No. 5 Col. Centro Tel.: 5512 9191 | No se permitió el acceso                                     | INAH       | SI               | EN PROCESO |

**ESTADO DE LOS TRABAJOS DE REPARACIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA ADRIANA GARCÍA CORRAL, UBICADA EN BELISARIO DOMÍNGUEZ NO. 5, COL. CENTRO**

| Edificio | Nivel                 | Trabajos   | Observaciones   | STATUS              |
|----------|-----------------------|--|---|---------------------|
| 1        | Todos (pb + 1er piso) | No se realizan trabajos en este edificio. Protegido por el INAH  |   |                     |
| 2        | 1er y 2do nivel       | No se realizan trabajos en este edificio. Protegido por el INAH  |   |                     |
| 3        | PB y 1er              | Se realizan trabajos de mantenimiento en planta baja (auditorio) y primer nivel (aulas). Se realizó la impermeabilización de azotea. | Se tiene programado concluir los trabajos en el presente ciclo escolar. | Trabajos en proceso |
| 4        | PB y 1er              | Se realizan trabajos de mantenimiento y rehabilitación de espacios educativos.   | Se tiene programado concluir los trabajos en el presente ciclo escolar. | Trabajos en proceso |

## ► Comisión Federal de Electricidad -CFE

| Tema                               | Unidad de medida   | Periodicidad | Fecha de corte |                 |
|------------------------------------|--|--------------|----------------|-----------------|
|                                    |  |              | 28 de enero    | Próximo reporte |
| Coladeras y/o registros colocados  | Número de coladeras y/o registros colocados que afecte la red eléctrica  | Semanal      | 4              | 05 de febrero   |
| Red eléctrica del Centro Histórico | Porcentaje de avance de actualización de la red eléctrica del Centro Histórico   | Mensual      | --             | 05 de febrero   |
| Falta de energía eléctrica         | Número de atenciones de emergencias por falta de energía eléctrica que implique rompimiento de banquetas o de arroyo vehicular | Mensual      | 27             | 05 de febrero   |

## ► Secretaría de Obras y Servicios (SOS)

| Tema   | Unidad de medida   | Periodicidad | Fecha de corte |             |                 |
|--|--|--------------|----------------|-------------|-----------------|
|  |  |              | 21 de enero    | 28 de enero | Próximo reporte |
| Proyecto de intervención urbana en el Centro Histórico | Porcentaje de avance de intervención urbana  | Mensual      | --             | --          | 05 de febrero   |
| Alumbrado Público                                      | Número de puntos de luz (PDL) atendidos y reparados en zona de contrato PPS ( Censo sin finalizar de 3, 549) | Semanal      | 491            | 468         | 05 de febrero   |
| Alumbrado Público                                      | "Puntos de luz (PDL) en iluminación artística atendidos (Censo de 3, 500)"                                   | Mensual      | --             | --          | 05 de febrero   |

## ► Teléfonos de México (TELMEX)

| Tema                                       | Unidad de medida  | Periodicidad | Fecha de corte |             |                 |
|--|---|--------------|----------------|-------------|-----------------|
|  |   |              | 21 de enero    | 28 de enero | Próximo reporte |
| Infraestructura de Comunicación Telefónica | Número de reposiciones de tapas de registro y marcos que implican un riesgo | Mensual      | --             | 3           | 05 de marzo     |
| Infraestructura de Comunicación Telefónica | Número de cabinas retiradas por desuso                                      | Mensual      | --             | --          | 05 de marzo     |
| Infraestructura de Comunicación Telefónica | Número de reparaciones que realizan dentro del CH                           | Mensual      | --             | --          | 05 de marzo     |

## ► Teléfonos de México (TELMEX)

| TRABAJOS EN ATENCIÓN A INCIDENCIAS REPORTADAS POR TELMEX |         |                |  |  |                     |   |   |
|--|---------|----------------|--|--|---------------------|---|---|
| REPOSICIÓN DE TAPAS, REGISTROS Y MARCOS TELMEX           |         |                |  |  |                     |   | 28 de enero   |
| NO.  | OFICINA | FECHA ATENCIÓN | INCIDENCIA                                 | UBICACIÓN  | TRABAJOS REALIZADOS | IMAGEN ANTES  | IMAGEN DESPUÉS  |
| 1  | TELMEX  | 28/01/2019     | REPOSICIONES DE TAPAS DE REGISTRO Y MARCOS | CALLE URUGUAY ENTRE EJE CENTRAL Y BOLIVAR              | MANTENIMIENTO       |    |    |
| 2  | TELMEX  | 28/01/2019     | REPOSICIONES DE TAPAS DE REGISTRO Y MARCOS | TACUBA ENTRE BOLÍVAR E ISABEL LA CATÓLICA              | MANTENIMIENTO       |   |   |
| 3  | TELMEX  | 28/01/2019     | REPOSICIONES DE TAPAS DE REGISTRO Y MARCOS | VENUSTIANO CARRANZA ENTRE ISABEL LA CATÓLICA Y BOLIVAR | MANTENIMIENTO       |  |  |



## ► SSC- Policía Auxiliar Sector 52 PUMA

| Tema                  | Unidad de medida   | Periodicidad | Fecha de corte                                 |                 |
|-----------------------|--|--------------|--|-----------------|
|                       |  |              | (del 1 de enero de 2018 a 14 de enero de 2019) | Próximo reporte |
| Prevención del delito | Número de personas remitidas al Ministerio Público por robo de objetos de infraestructura urbana | Mensual      | 11   | 05 de febrero   |
| Prevención del delito | Número de personas aseguradas por robo de objetos de infraestructura urbana                      | Mensual      | 15   | 05 de febrero   |



► Mapeo

| CALLE PRINCIPAL                     | COLONIA             | DELEGACION | REMISIONES | N° DETENIDOS | DELITO TIFICADO POR MP   |
|-------------------------------------|---------------------|------------|------------|--------------|--|
| ZARAGOZA                            | GUERRERO            | CUAUHTÉMOC | 1          | 1            | ROBO (MAS 750 SALARIOS MÍNIMO) – OBJETOS.                          |
| LUNA                                | BUENAVISTA          | CUAUHTÉMOC | 1          | 1            | ROBO (NO EXCEDA DE 300 SALARIOS MÍNIMOS O INDETERMINADO) - OBJETOS |
| DOCTOR MORA                         | CENTRO              | CUAUHTÉMOC | 1          | 1            | ROBO (MÁS 750 SALARIOS MÍNIMOS) - OBJETOS                          |
| AVENIDA HIDALGO                     | CENTRO              | CUAUHTÉMOC | 1          | 1            | ROBO (NO EXCEDA DE 300 SALARIO MÍNIMOS O INDETERMINADO) –OBJETOS   |
| AVENIDA HIDALGO                     | CENTRO              | CUAUHTÉMOC | 1          | 1            | ROBO (NO EXCEDA DE 300 SALARIOS MÍNIMOS O INDETERMINADO) – OBJETOS |
| AVENIDA RICARDO FLORES FLORES MAGON | GUERRERO            | CUAUHTÉMOC | 1          | 1            | ROBO (MÁS DE 300 Y MENOS DE 750 SALARIOS MÍNIMOS) – OBJETOS        |
| JUAN ALDAMA                         | BUENAVISTA          | CUAUHTÉMOC | 1          | 3            | ROBO (NO EXCEDA DE 300 SALARIOS MÍNIMOS O INDETERMINADO) – OBJETOS |
| AVENIDA JUAREZ                      | CENTRO              | CUAUHTÉMOC | 1          | 2            | ROBO (NO EXCEDA DE 300 SALARIOS MÍNIMOS O INDETERMINADO) – OBJETOS |
| JOSE MARIA IZAZAGA                  | CENTRO              | CUAUHTÉMOC | 1          | 2            | ROBO (MÁS 750 SALARIOS MÍNIMOS) OBJETOS                            |
| AVENIDA INSURGENTES NORTE           | BUENAVISTA          | CUAUHTÉMOC | 1          | 2            | ROBO (MÁS 750 SALARIOS MÍNIMOS) – OBJETOS                          |
| PASEO DE LA REFORMA NORTE           | NONOALCO TLATELOLCO | CUAUHTÉMOC | 1          | 1            | ROBO (NO EXCEDA DE 300 SALARIOS MÍNIMOS O INDETERMINADO) – OBJETOS |
| RICARDO CASTRO                      | PERALVILLO          | CUAUHTÉMOC | 1          | 1            | ROBO (MAS 750 SALARIOS MÍNIMOS) – OBJETOS.                         |



## INCIDENCIAS URBANAS 2019



- Policías de esta Complementaria, al realizar su recorrido de seguridad y vigilancia en las calles **de Avenida Juárez, Explanada de Bellas Artes, Colonia Centro**, se percatan que uno de los monumentos ubicados en el lugar fue dañado con pintas callejeras




- Policías de esta Complementaria, al realizar su recorrido de seguridad y vigilancia en las calles **Avenida Reforma y La Avenida Manuel Gonzalez, Colonia Nonoalco Tlatelolco**, atienden una queja ciudadana ya que vecinos del lugar manifiestan la presencia de vehículos abandonados y la falta de alumbrado público



## INCIDENCIAS URBANAS 2019

- Policías de esta Complementaria, al realizar su recorrido de seguridad y vigilancia en las calles de **Plaza de la Constitución, Colonia Centro**, se percatan de 2 registros de cableado descubiertos, los cuales pertenecen a las luminarias de las calles.

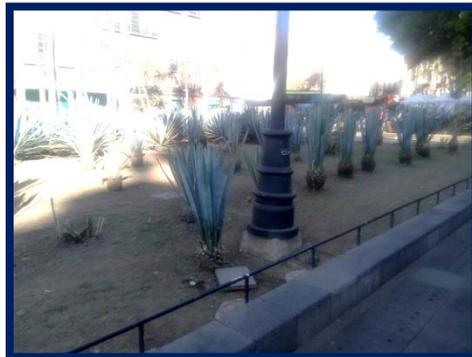

- Policías de esta Complementaria, al realizar su recorrido de seguridad y vigilancia en las calles **de Avenida Juárez, Explanada de Bellas Artes, Colonia Centro**, se percatan que uno de los monumentos ubicados en el lugar fue dañado con pintas callejeras





## ► SSC- Unidad de Protección Ciudadana “Centro”

| Tema                  | Unidad de medida   | Periodicidad | Fecha de corte |                 |
|-----------------------|--|--------------|----------------|-----------------|
|                       |  |              | 28 de enero    | Próximo reporte |
| Prevención del delito | Número de remisiones al MP por robo de infraestructura y/o mobiliario urbano | Mensual      | 0              | 05 de marzo     |
| Prevención del delito | Número de personas remitidas por robo de objetos                             | Mensual      | 1              | 05 de marzo     |
| Prevención del delito | Número de personas remitidas por daño a la propiedad dolosos                 | Mensual      | 1              | 05 de marzo     |



# Eficiencia de Robo de Objetos Ecuador y lateral de Eje Central Lázaro Cárdenas

| Etiquetas de fila | Cuenta de MODALIDAD |
|-------------------|---------------------|
|-------------------|---------------------|

Eficiencia 01





22/01/19 Siendo las 08:45 horas, se realiza el aseguramiento de quien dijo llamarse Alberto Moreno López de 41 años de edad, quien es presentado por el delito de Robo de Objetos, en la calle de Ecuador y lateral de Eje Central Lázaro Cárdenas de la Colonia Centro alcaldía Cuauhtémoc, Se inicia la carpeta de Investigación CI-FCH/CUH-2/UI-1 C/D/00554/01-2019. ya que desprendía de sus base un señalamiento de transito de metal con la leyenda “GUERRERO POR PEDRO MORENO”



| Etiquetas de fila | Cuenta de MODALIDAD  |
|-------------------|--|
| eficiencia        | 01  |

## Remisión al juzgado cívico por Tirar basura Juan Alvares y Allende de la colonia Centro.

Siendo aproximadamente las 10:30 horas, del día 27 de enero de 2019, el policía 2° 848251 Ávila Vázquez Edgar y policía 2° 1034374 Rosales Quezada Jesús, informan que al realizar sus funciones de seguridad y vigilancia a bordo de la unidad MX-434-C1 en las calles Juan Álvarez y Allende de la colonia Centro, realizan el aseguramiento de quien dijo llamarse Hugo García Guzmán de 38 años de edad, por tirar basura en vía pública, por lo que fue trasladado al juzgado cívico de Cuh-4, ubicado en Paraguay no. 37 de la colonia Centro, donde queda a disposición a las 11:00 horas con la boleta de remisión A1601439





# Reportes validados sin datos

**\*Continuamos transmitiendo en vivo\***



| Dependencia           | Reporte  |
|-----------------------|--|
| Secretaría de Cultura | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Número de actividades que coadyuven a la preservación del patrimonio cultural e histórico</li> <li>• Porcentaje de inmuebles recuperados (que serán atendidos con recursos del Fondo de Reconstrucción de la Ciudad, con recursos del FONDEN y con recursos de los seguros que están en el Centro Histórico).</li> <li>• Porcentaje de inmuebles intervenidos recuperados y restaurados propiedad de la Secretaría de Cultura (aún sin definir el universo de inmuebles a intervenir )</li> </ul>   |
| Alcaldía Cuauhtémoc   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Número de calles y/o espacios públicos recuperados de tiraderos clandestinos de desechos sólidos en el PB de Cuauhtémoc</li> <li>• Metros lineales barridos en vías secundarias del PB de Cuauhtémoc</li> <li>• Metros cúbicos de residuos sólidos recolectados en el PB de Cuauhtémoc</li> <li>• Número de Luminarias reparadas en vías secundarias del PB de Cuauhtémoc</li> <li>• Número de registros de manifestación de construcción en el Centro Histórico - Alcaldía Cuauhtémoc</li> <li>• Número de registros de manifestación Tipo A</li> <li>• Número de registros de manifestación Tipo B</li> <li>• Número de registros de manifestación Tipo C</li> <li>• Número de registros de manifestación Obra Nueva</li> <li>• Número de solicitudes de licencia de construcción especial en el Centro Histórico - Alcaldía de Cuauhtémoc</li> <li>• Número de licencias autorizadas</li> <li>• Número de licencias no presentadas (pendientes de autorización)</li> </ul> |



| Dependencia | Reporte   |
|-------------|---|
| FCH         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Porcentaje de avance físico y financiero de los proyectos de intervención urbana por proyecto</li> <li>• Número de fachadas intervenidas</li> </ul>  |
| SEDEMA      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Número de árboles en riesgo por plaga, enfermedad, ramas peligrosas o daño corregidos</li> <li>• *Número de solicitudes de impacto ambiental</li> <li>• *Número de recomendaciones técnicas</li> <li>• *Número con visto bueno</li> <li>• *Número con respuesta NO viable</li> </ul> |
| INVEA       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Número de visitas de verificación en materia de mobiliario urbano</li> <li>• Número de visitas en materia de desarrollo urbano</li> </ul>  |
| SEMOVI      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Porcentaje de avance de proyectos ejecutivos en cruces conflictivos del Centro Histórico</li> </ul>  |



| Dependencia                         | Reporte  |
|-------------------------------------|--|
| SEDUVI                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Número de solicitudes de certificados de uso de suelo en el Centro Histórico</li> <li>• *Número de solicitudes de Dictamen Técnico emitidas por la Dirección de Patrimonio Cultural Urbano (señaladas para obras de construcción, modificaciones, instalaciones, reparaciones, registro de obra ejecutada y/o demolición o su revalidación)</li> <li>• *Número de recomendaciones técnicas</li> <li>• *Número con visto bueno</li> <li>• *Número con respuesta NO viable</li> <li>• Número de inmuebles afectados por el sismo del 19s en el Centro Histórico</li> <li>• Número de obras con irregularidades en la normativa urbana en el Centro Histórico</li> </ul> |
| PCGIR                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Número de dictámenes emitidos por el ISC de inmuebles de alto riesgo</li> <li>• Porcentaje de avance de protocolo de protección civil participativo para el Centro Histórico</li> </ul>   |
| METROBUS                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Porcentaje de avance de reparación de daños en la infraestructura del Sistema de Transporte Metrobus</li> </ul>   |
| ADIP<br>(Enlace presenta indicador) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Porcentaje de avance de sistema de usuarios del subsuelo</li> </ul>   |




GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

**ADIP**

# Plataforma Usuarios del Subsuelo

# ¿Qué es la plataforma de usuarios del subsuelo?

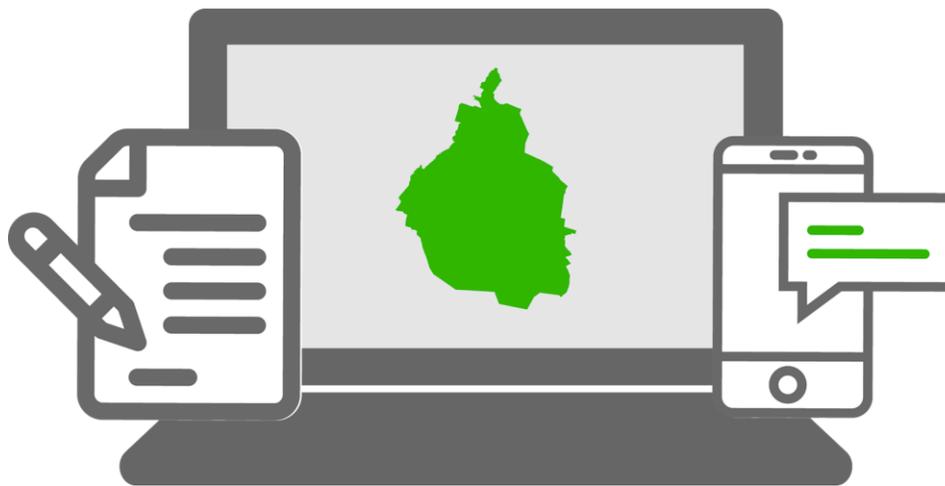

Es una plataforma para gestionar las intervenciones y proyectos de infraestructura localizada en el subsuelo del Centro Histórico. Tiene la finalidad de agilizar la aprobación de permisos, calendarizar, optimizar y notificar a los involucrados para efficientar y minimizar el número de intervenciones realizadas

# Que problemas puede resolver:



Reducir el gasto y número de intervenciones en el subsuelo



Trabajo coordinado entre dependencias




Digitalizar y optimizar la gestión de permisos.



Portal de seguimiento y control




Mantener y cuidar el Centro Histórico



Sistema unificado donde existe un registro histórico

# Quienes están involucrados:

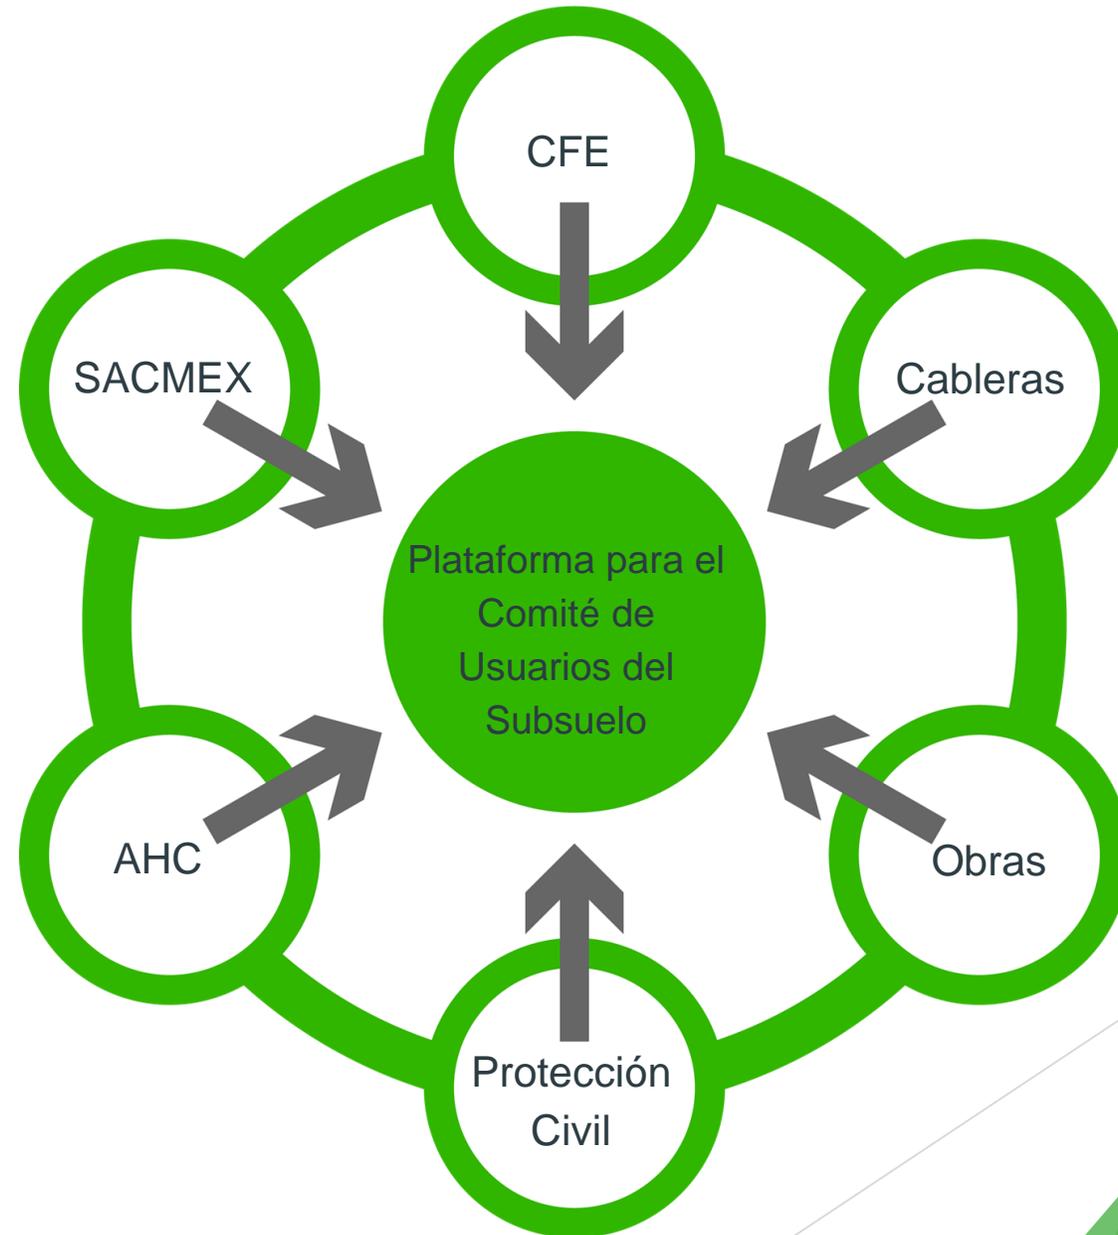

# Desarrollo de la Plataforma

4 meses prototipo

## Linea del Tiempo





# Temas problema

**\*Continuamos transmitiendo en vivo\***

## Reporte de avances en reuniones de trabajo

| Tema   | Dependencias  | Avance   | Próxima reunión                      |
|--|---|--|--------------------------------------|
| Mercado de Artesanías y Curiosidades Mexicanas de San Juan | SOS, SEDECO, FCH, ACH y Secretaría de Cultura                                 | Se plantearon tres estrategias: 1) COMPEMSA paga 2 años de pago de renta adelantado en acuerdo con SERVIMET; 2) Subcomité de Mercados de la Comisión de Reconstrucción y; 3) Ruta directa de SOS con SEDECO para Jefa de Gobierno. | Seguimiento por correo 01 de febrero |
| Robo de tapas y coladeras                                  | SACMEX, CFE, Alumbrado Público, SOS, PGJ-CUH, C5, Policía Auxiliar, FCH y ACH | Se van a preparar listas de casos denunciados ante la PGJ y ante la PGR para poder solicitar a la Procuradora General el inicio de labores de investigación  | Miércoles 30 de enero                |

## Mesas pendientes

| Tema  | Coordina  |
|---|---|
| Robo de esculturas  | Secretaría de Cultura   |
| <b>Edificios en alto riesgo de colapso y afectados por el sismo del 19S</b> | <b>Secretaría de Protección Civil y de la Gestión Integral de Riesgos</b> |
| Perforaciones en pavimento por particulares                                 | Fideicomiso del Centro Histórico  |
| Obras concluidas pendientes de entrega                                      | Fideicomiso del Centro Histórico  |
| <b>Obras irregulares</b>  | <b>SEDUVI</b>   |
| Mobiliario en vía pública colocado por instancias privadas                  | FCH-ACH   |
| <b>Mejoramiento integral de la Plaza Tolsá</b>                              | <b>FCH-ACH</b>  |



# Turnos

**\*Corte de transmisión en vivo\***  
**PRIVADO**



## Turnos Desahogados

| Dependencia  | Asunto   |
|--|--|
| <b>ILIFE</b><br><b>(Presenta resultados del cotejo de información)</b> | Cotejar listado de escuelas afectadas por el sismo del diecinueve de septiembre con el INAH, INBA y FCH para validar la información y agilizar los trámites y autorizaciones correspondientes para restaurar, rehabilitar o arreglar la infraestructura educativa en el Centro Histórico |
| <b>C-5</b><br><b>(Alcaldías presentan avances de poda)</b>             | Enviar información de las cámaras que están obstruidas por follaje para que sean atendidas por las alcaldías.  |



## Turnos Nuevos

| Dependencia   | Asunto   |
|---|--|
| <b>Dirección General de Patrimonio Inmobiliario</b> | ACH solicita mediante oficio No. ACH/DEPPMCEP/018/2019 a la DGPCI información sobre el resguardo de la Plaza Santa Veracruz y sus fuentes. |



# Asuntos generales

**\*Corte de transmisión en vivo\***  
**PRIVADO**



GOBIERNO DE LA  
**CIUDAD DE MÉXICO**  
CIUDAD INNOVADORA Y DE DERECHOS

**AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO**

# ASISTENCIA

**\*Transmisión en vivo\***



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO  
CIUDAD INNOVADORA Y DE DERECHOS

AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO

**Próxima sesión:  
05 de febrero de 2019  
a las 10:00 horas**



GOBIERNO DE LA  
**CIUDAD DE MÉXICO**  
CIUDAD INNOVADORA Y DE DERECHOS

**AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO**

# **FIN DE LA TRANSMISIÓN EN VIVO**
