



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
CULTURA  
CENTRO  
HISTÓRICO



## MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

**Reporte 29 de octubre- 04 de noviembre**

**05 de noviembre de 2019**



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
CULTURA  
CENTRO  
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

## Orden del día

### Reportes

Turnos e incidencias urbanas



# ACH

Tema	Línea base	Periodicidad	Semana al 28/10	Semana al 04/11	Próximo reporte
Tiraderos clandestinos	Metros cúbicos de residuos sólidos levantados en tiraderos clandestinos en el perímetro de ACH	Semanal	1,036 m3	951 m3	12 de noviembre
Limpieza	Metros cúbicos de basura recolectada en el Perímetro de la ACH (Producto de Barrido)	Semanal	2,123 m3	2,327 m3	12 de noviembre
Mantenimiento a infraestructura	Número de Incidencias de daño en infraestructura del Perímetro de la ACH reparadas y atendidas	Semanal	47	42	12 de noviembre



# ACH | Eliminación de grafiti

**422**

**m<sup>2</sup> totales**

\*La mayoría son reincidencias

calles atendidas	<b>35</b>
cortinas metálicas	<b>08</b>
Fachadas	<b>25</b>





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
CULTURA Y PATRIMONIO  
CENTRO  
HISTÓRICO

# Eliminación de grafiti en cantera

## BALDERAS Y REPÚBLICA DE CHILE

Se han limpiado  
**1,296 m<sup>2</sup>**

Se trabajó con **gel  
desincrustante**



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
CULTURA  
CENTRO  
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

## ACH | Obras menores

Se realizaron trabajos en:

**Isabel la Católica**

**Donceles**


**Plaza Santo Domingo**

**Bolívar**

**Manzanares**

**Margil**

Los trabajos realizados consistieron en, **colocación de 03 bolardos** en Isabel la Católica y 16 de Septiembre, **reparación de banqueta** en Donceles entre República de Chile y Allende, **punteado de tapas de registros eléctricos** en Plaza Santo Domingo, **reparación de banqueta y colocación de 03 piezas de piso de recinto** en Venustiano Carranza esquina Bolívar, **retiro de 03 papeleras** en Manzanares casi esquina Circunvalación, **colocación de 04 bolardos** en Margil esquina Zapata.

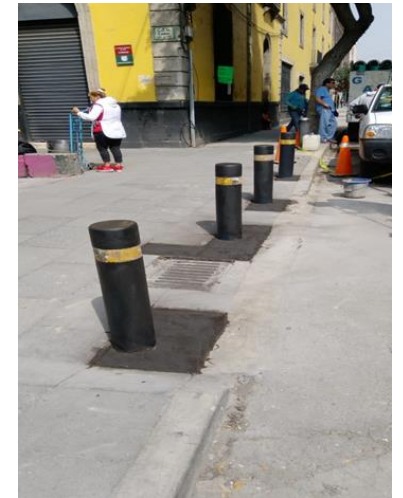



# Alc. Venustiano Carranza

Tema	Indicador	Periodicidad	Semana al 28/10	Semana al 04/11	Próximo reporte	Observaciones
Luminarias	Número de Luminarias reparadas en vías secundarias	Semanal	3	10	12 de noviembre	Se detalla la ubicación y la causa en el Anexo
Tiraderos clandestinos	Toneladas de residuos solidos recolectados de tiraderos clandestinos en el PB de VC (línea base: 26 tiraderos) m3	Semanal	477.4 m3	492.8 m3	12 de noviembre	Se recolectaron <b>32</b> toneladas diariamente de Residuos Sólidos



# Alc. Venustiano Carranza | Anexo 1

## Reporte de luminarias reparadas en el perímetro B en la Alcaldía Venustiano Carranza

Dirección	Entre calles	Colonia	Cantidad	Motivo
F C Interoceánico	Albañiles	Penitenciaría	10	Mantenimiento
		<b>TOTAL</b>	<b>10</b>	

NOTA: El día 29 de octubre, en el Parque Francisco I. Madero, ubicado en la Colonia Morelos, al realizar el recorrido, nos percatamos que 20 luminarias tipo LED de 100 watts no se encontraban en el interior.






# Alc. Venustiano Carranza | Anexo 1

RELACION DE TIRADEROS CLANDESTINOS				
Nº. CONSECUTIVO	UBICACIÓN	TIPO DE RESIDUOS SÓLIDOS %	CANTIDAD TONS	SECTOR
01	MIGUEL DOMINGUEZ Y PENITENCIARIA COL. AMPLIACIÓN PENITENCIARIA	90% BASURA 10% CASCAJO	1.5	S-1
02	EJE 1 NORTE Y HORTELANOS COL. MORELOS	90% BASURA 10% CASCAJO	1.5	S-1
03	AV. CIRCUNVALACIÓN ENTRE HÉROES DE NACOZARI Y SAN ANTONIO TOMATLAN	85% BASURA 15% CASCAJO	1	S-2
04	ZAPATA ESQ. AV. CIRCUNVALACIÓN	85% BASURA 15% CASCAJO	1.5	S-2
05	NACIONAL ESQ. VIDAL ALCOCER	85% BASURA 15% CASCAJO	1	S-2
06	COSTA RICA ESQ. VIDAL ALCOCER	85% BASURA 15% CASCAJO	1.5	S-2
07	PEÑA Y PEÑA ESQ. VIDAL ALCOCER	85% BASURA 15% CASCAJO	1	S-2
08	VIDAL ALCOCER Y BERRIOZABAL COL. MORELOS	85% BASURA 15% CASCAJO	1.5	S-2
09	AV. CIRCUNVALACIÓN Y G. PEDRAZA (MERCADO DULCES I) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	2	S-9
10	AV. CIRCUNVALACIÓN Y CARRIZAL (MERCADO DE FLORES) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	1.5	S-9
11	AV. CIRCUNVALACIÓN Y CARRETONES (METRO MERCED) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	1.5	S-9
12	JUAN DE LA GRANJA Y CORREGIDORA (LAS CANCHAS) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.2	S-9
13	SANTA ESCUELA Y CUADRANTE DE LA SOLEDAD COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.5	S-9
14	ROSARIO ESQ. PLAZA SAN LAZARO (ATRÁS DE LA IGLESIA) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	1	S-9

RELACION DE TIRADEROS CLANDESTINOS				
Nº. CONSECUTIVO	UBICACIÓN	TIPO DE RESIDUOS SÓLIDOS %	CANTIDAD TONS	SECTOR
15	AV. CIRCUNVALACIÓN Y SOLEDAD COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	1.5	S-9
16	AV. CIRCUNVALACIÓN Y MANZANARES COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	2	S-9
17	JUAN PABLO ESQ. CORREGIDORA COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.5	S-9
18	CONGRESO DE LA UNIÓN ESQ. GENERAL ANAYA COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.2	S-9
19	GENERAL ANAYA ESQ. JUAN DE LA GRANJA COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.3	S-9
20	JUAN DE LA GRANJA ESQ. SAN CIPRIAN COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	2	S-9
21	CORREGIDORA Y SAN SIMÓN COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	0.2	S-9
22	PLAZA DE LA SOLEDAD, SAN SIMÓN Y SANTA ESCUELA COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	0.5	S-9
23	TOLVA 2 COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	2.1	S-9
24	TOLVA 3 COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	3	S-9
25	AV. CIRCUNVALACIÓN Y CARRETONES COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	1	S-9
26	JUAN DE LA GRANJA ESQ. SAN CIPRIAN COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	1.5	S-9



# Alc. Venustiano Carranza | Anexo 1

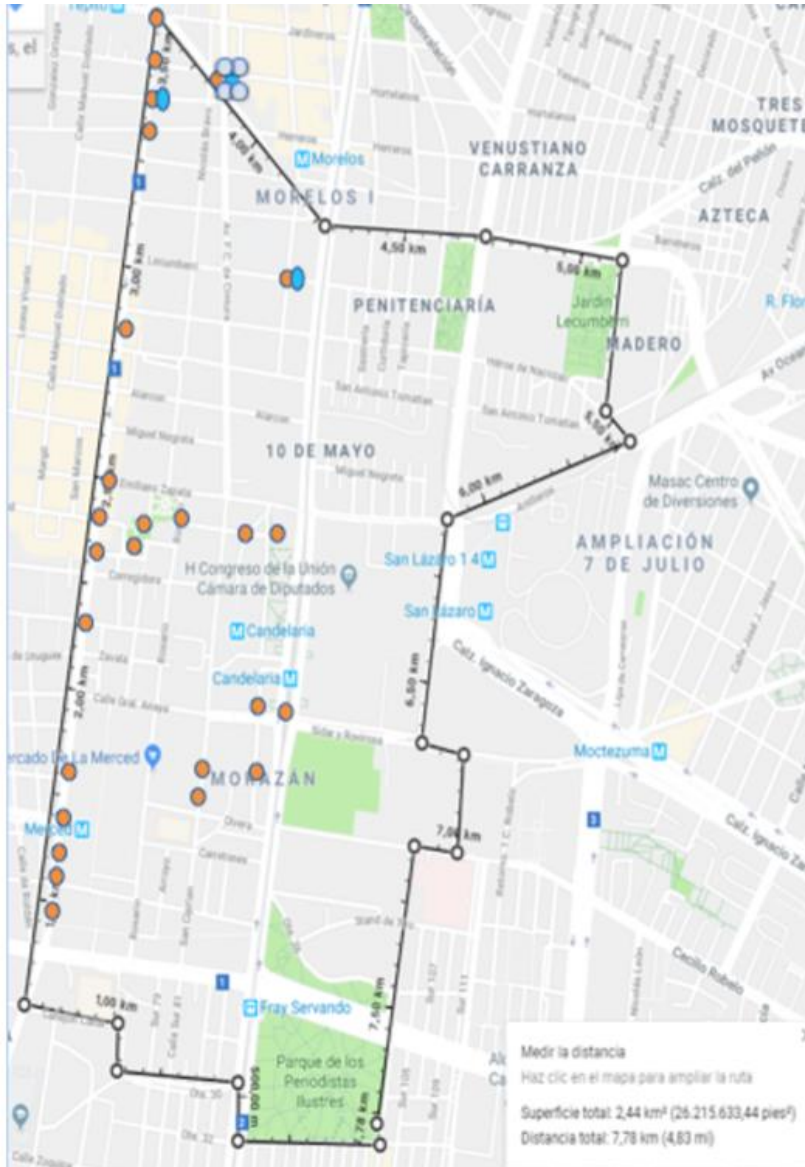

Montón Tradicional




Recolección de cascajo



## SOS - DGOIV

### VIOLETA, GALEANA Y RIVA PALACIO

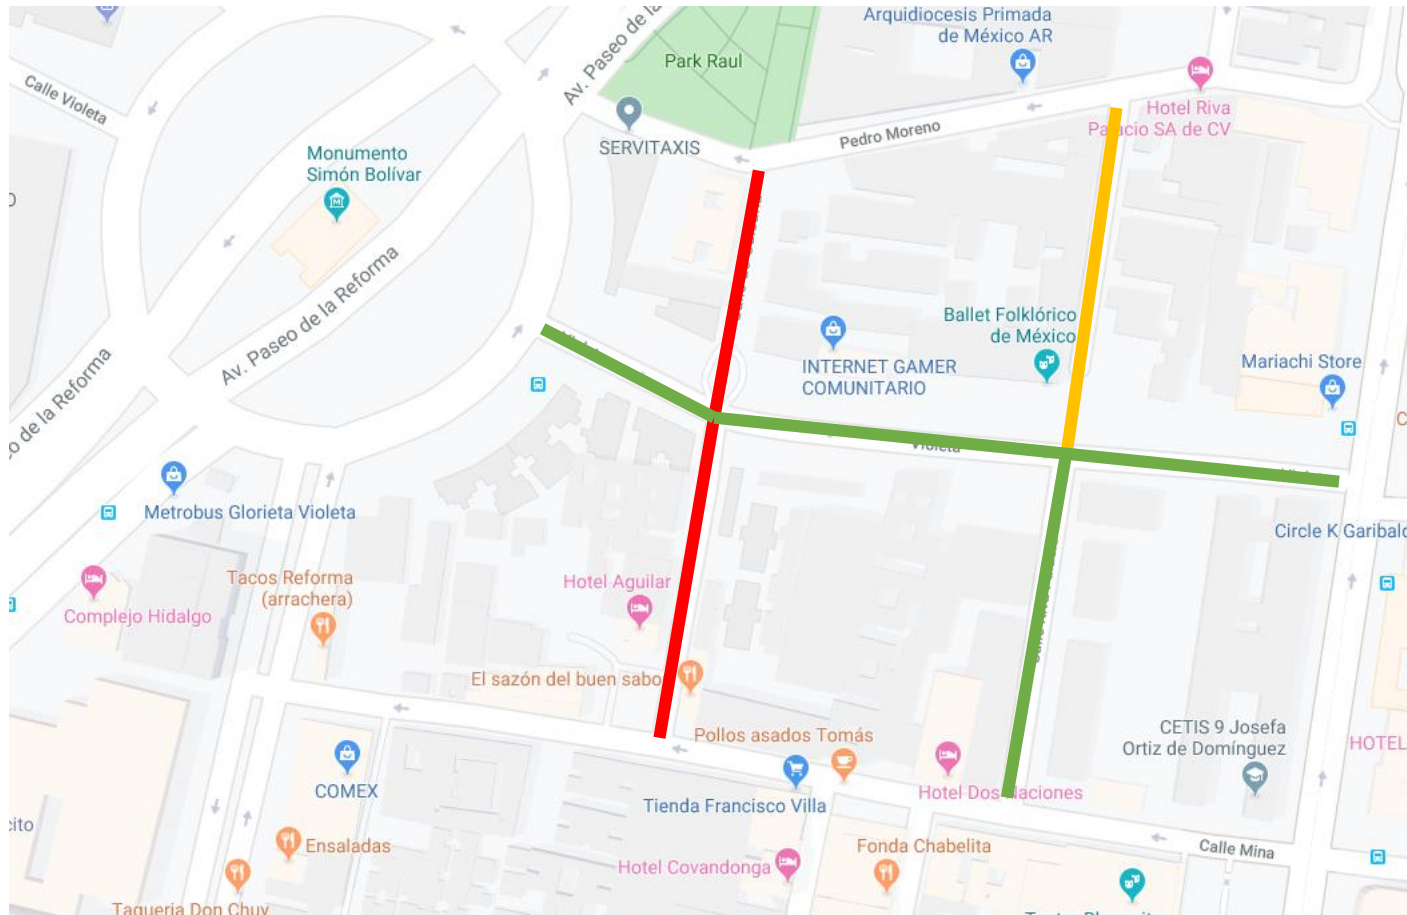

• **Calle Violeta avance de obra 76%**  
Colocación de recinto en áreas peatonales, colado de guarniciones, colocación de bolardos y colocación de luminarias.

• **Calle Riva Palacio Sur avance de obra 90%**  
Colado de MR45 en vialidad y colocación de bolardos

• **Calle Riva Palacio Norte avance de obra 20%**  
Colocación de base de concreto de relleno fluido y colocación de acabados.

• **Calle Galeana Sur avance del 5%**  
Trabajos de demolición

• **Calle Galeana Norte avance del 10%**  
Colado de Relleno fluido



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
CULTURA Y PATRIMONIO  
CENTRO  
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

## SOS - DGOIV



**Paso peatonal en Galeana Sur**




**Colado de MR-45 en Riva Palacio Sur**




**Avance Calle Violeta**



**Colado de Relleno Fluido en Galeana Sur**

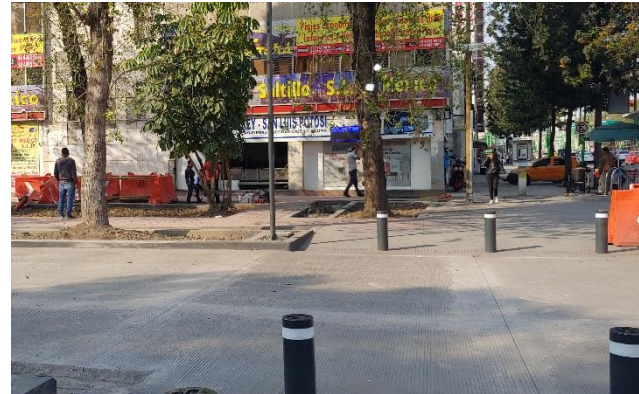

**Colocación de Bolardos Calle Violeta y Eje Central**

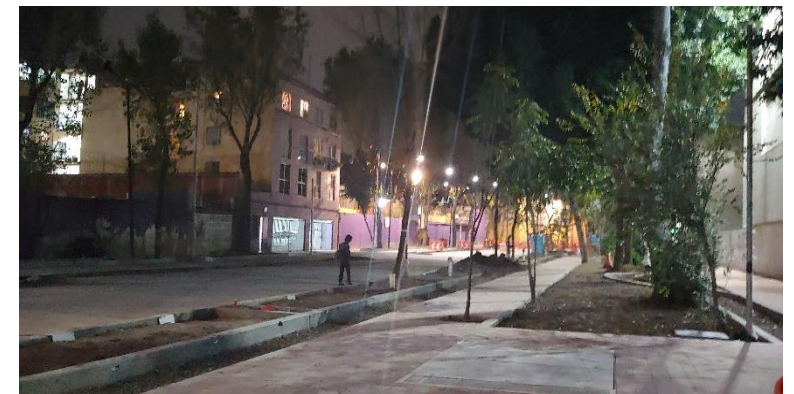


**Alumbrado en Calle Violeta**



# SOS - DGOIV

## ANTIGUO BARRIO SAN PABLO DE ZOQUIAPAN

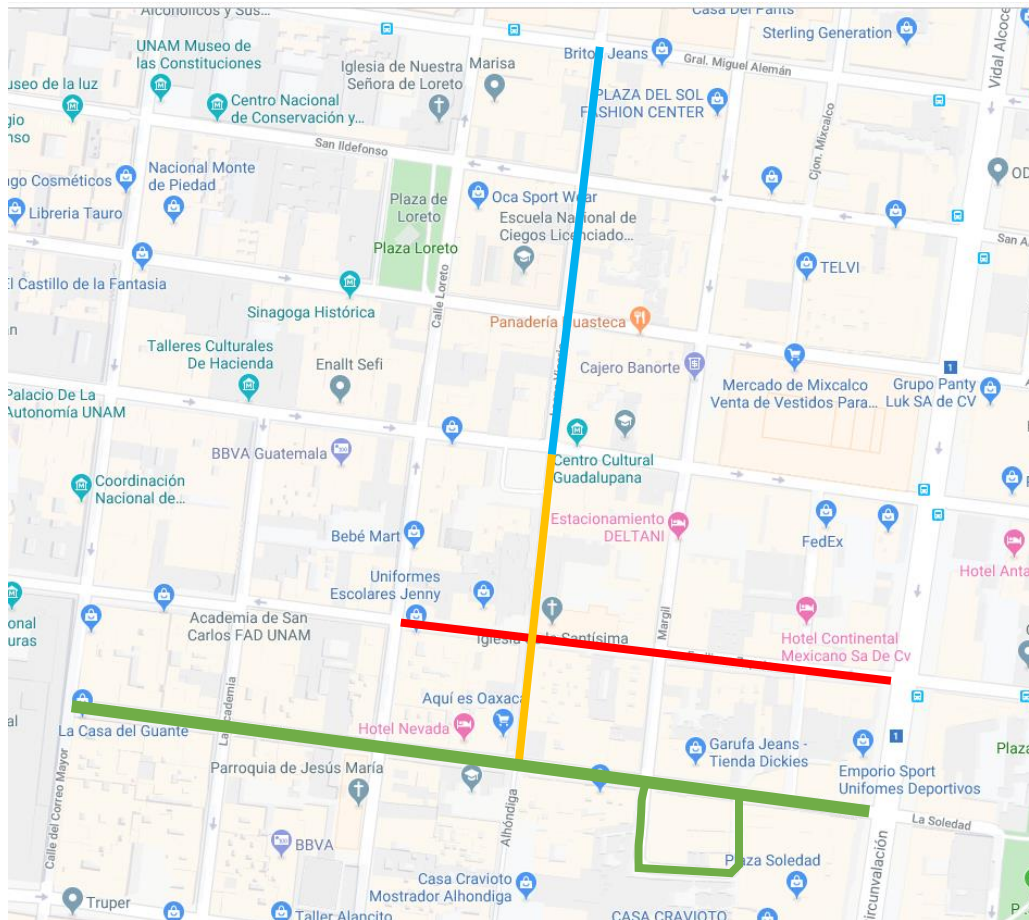

• **Calle Soledad avance de obra 70%**  
Se realizan trabajos de demolición, colado de vialidad, colocación de recinto en áreas peatonales y colado de guarniciones.



• **Callejón de Lecheras avance de obra 98%**  
Colocación de luminarias



• **Calle de la Santísima avance de obra 5%**  
Trabajos de Demolición y canalización de instalaciones



• **Leona Vicario avance de obra 1%**  
Trabajos de demolición



• **Emiliano Zapata avance de obra 0%**  
Sin Intervención



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
CULTURA Y PATRIMONIO  
CENTRO  
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

## SOS - DGOIV



**Avance de obra en Calle Soledad**



**Demolición de banqueta en Calle Soledad**



**Avance de obra en Callejón de Lecheras**



**Paso peatonal en Calle Soledad**



**Colado de MR-45 en vialidad en Calle Soledad**




**Colocación de bolardos en Calle Soledad**




# SOS - DGOIV


## PLAZA LORETO, JARDIN DEL OBISPO Y VALERIO TRUJANO

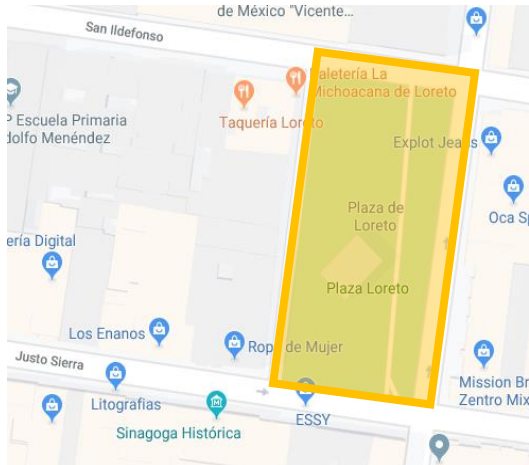

Plaza Loreto

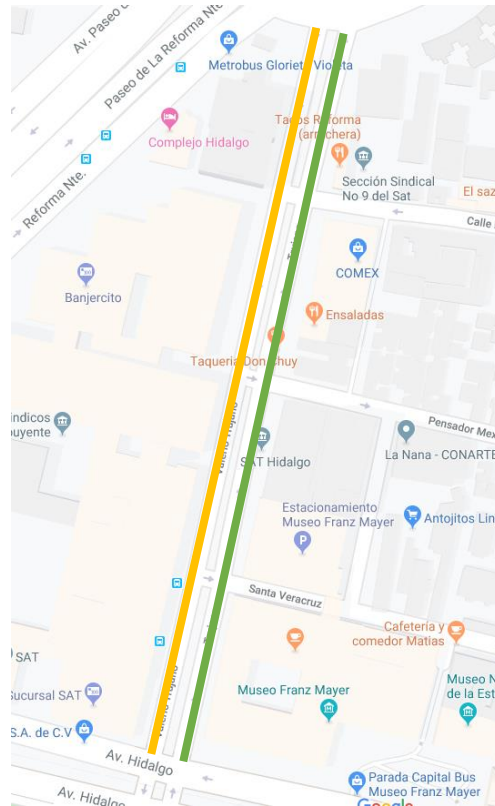

Calle Valerio Trujano

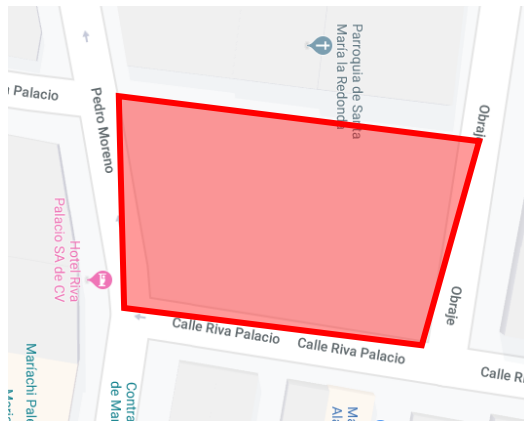

Jardín del Obispo



- **Calle Valerio Trujano Oriente avance de obra 91%**

Colocación de placas para jardineras y colocación de recinto en tramo de calle Javier Mina- Paseo de la Reforma



- **Calle Valerio Trujano acera Poniente avance de obra 30%**

Colado de relleno fluido y colado de MR45 en vialidad



- **Plaza Loreto avance de obra 12%**

Colado de relleno fluido y de guarniciones, demolición de banquetas .

- **Jardín del Obispo avance de obra 50%**

Suministro y colocación de acabados.



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

CENTRO HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

# SOS - DGOIV




Colado de Relleno Fluido y MR-45 en lado Oriente de Valerio Trujano



Plaza Loreto  
Colado de relleno fluido



Jardín del Obispo avance de obra

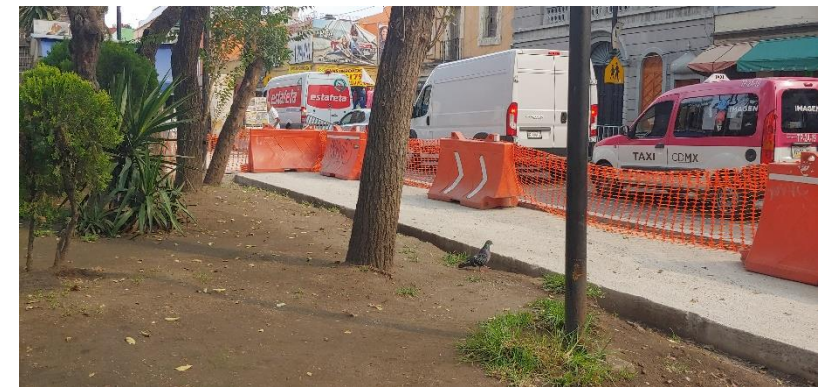


Plaza Loreto  
Confinamiento Paso Peatonal





# SOS - DGOIV

## BARRIO DE SANTA MARÍA LA REDONDA

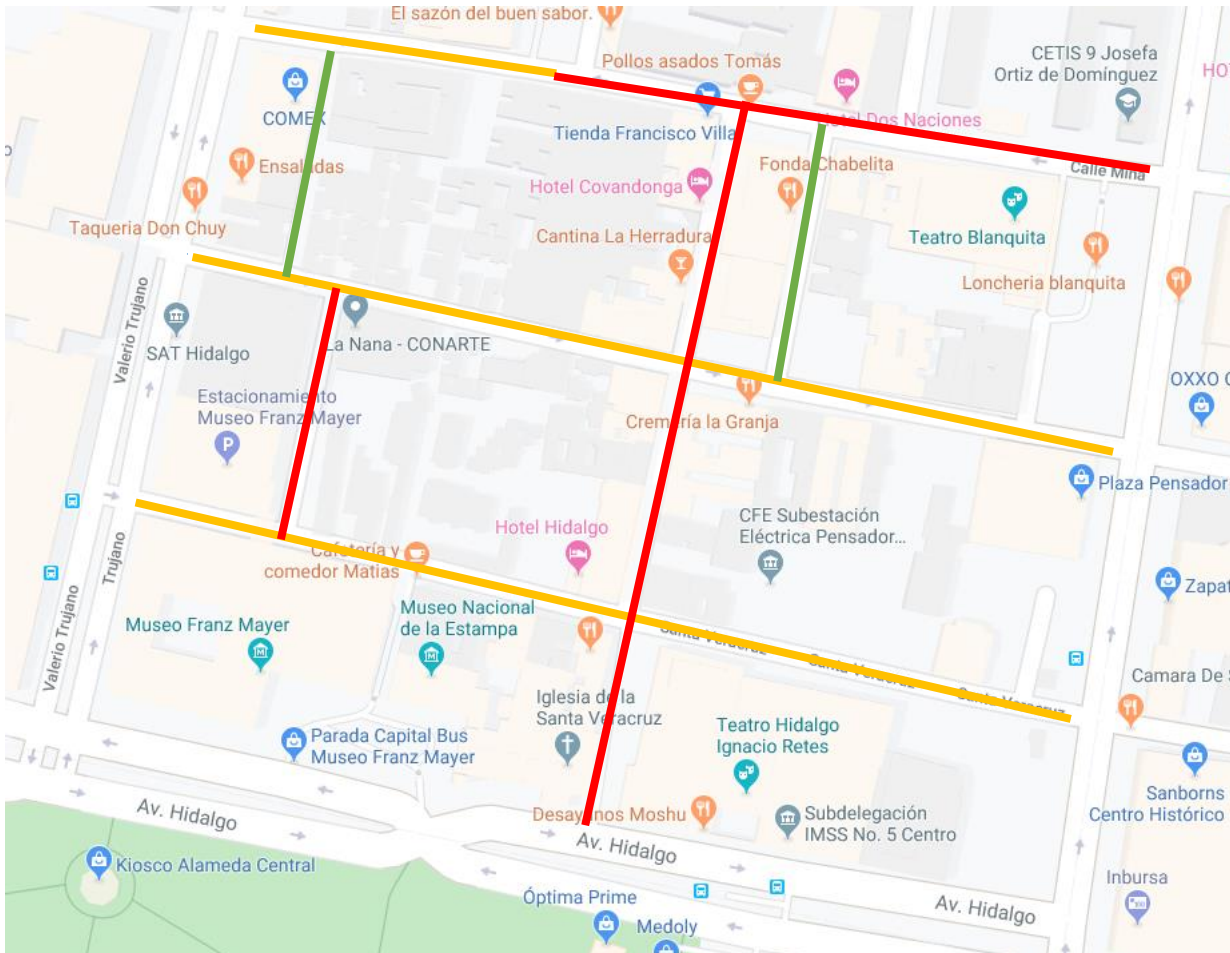

- **3er Callejón de San Juan de Dios avance de obra 50%**

Colocación de recinto en áreas peatonales

- **Plaza 2 de Abril avance de obra 65%**

Colado de relleno fluido, colocación de bases para postes

- **Calle Mina avance de obra 13%**

Trabajos de demolición y cimbrado de guarniciones

- **Calle Santa Veracruz avance de obra 20%**

Trabajos de demolición y colado de vialidad

- **Calle Pensador Mexicano avance de obra 20%**

Trabajos de demolición y colado de guarniciones

- **Calle Mina**

Sin intervención del tramo de la calle Galeana a Eje Central

- **2do Callejón de San Juan de Dios**

Sin Intervención

- **Calle 2 de Abril**

Sin intervención



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

# SOS - DGOIV



Paso Peatonal Calle Pensador Mexicano



Confinamiento en Calle Javier Mina




Avance 3er Callejón de San Juan de Dios




Confinamiento Calle Pensador Mexicano



Avance en Calle Javier Mina

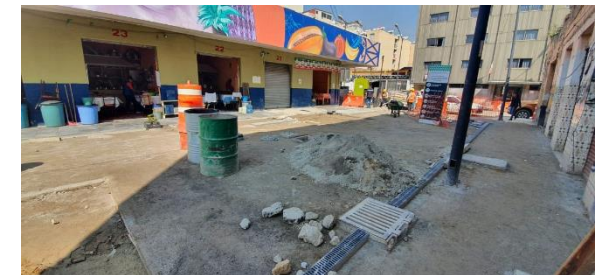

Avance en Plaza 2 de Abril

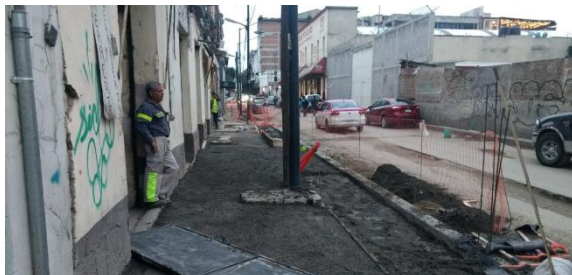

Avance en Calle Pensador Mexicano



Paso Peatonal Calle Javier Mina



Avance en Plaza 2 de Abril




GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



CENTRO  
HISTÓRICO

# SOS - DGOIV

## EJE CENTRAL

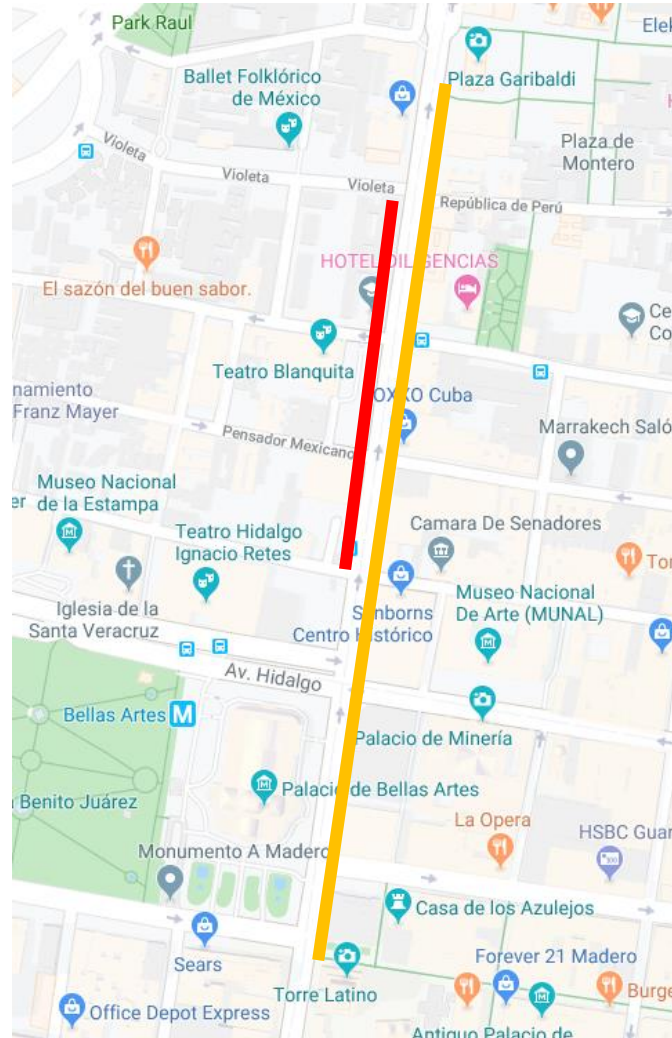

MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

- **Eje Central acera Oriente avance de obra 6%**

-En el tramo de Calle 5 de mayo – Tacuba Demolición de banquetas y colado de relleno fluido y colocación de recinto

-En el Tramo Tacuba- Donceles demolición de banquetas y guarnición y colado de relleno fluido

-En el tramo de República de Cuba- Belisario Domínguez demolición de banquetas y guarnición

- **Eje Central acera Poniente**

Sin intervención del tramo de Santa Veracruz a Calle Violeta



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
CULTURA Y  
PATRIMONIO  
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS


# SOS - DGOIV



Demolición de banquetas y guarniciones



Demolición de Banquetas

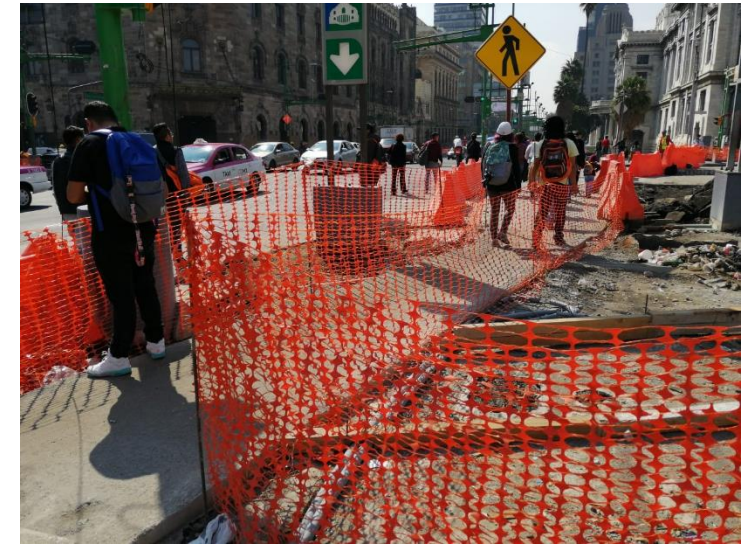

Paso Peatonal sobre Eje central acera Poniente



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO


SECRETARÍA DE  
CULTURA  
CENTRO  
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

# SOS - DGOIV

## AV. HIDALGO

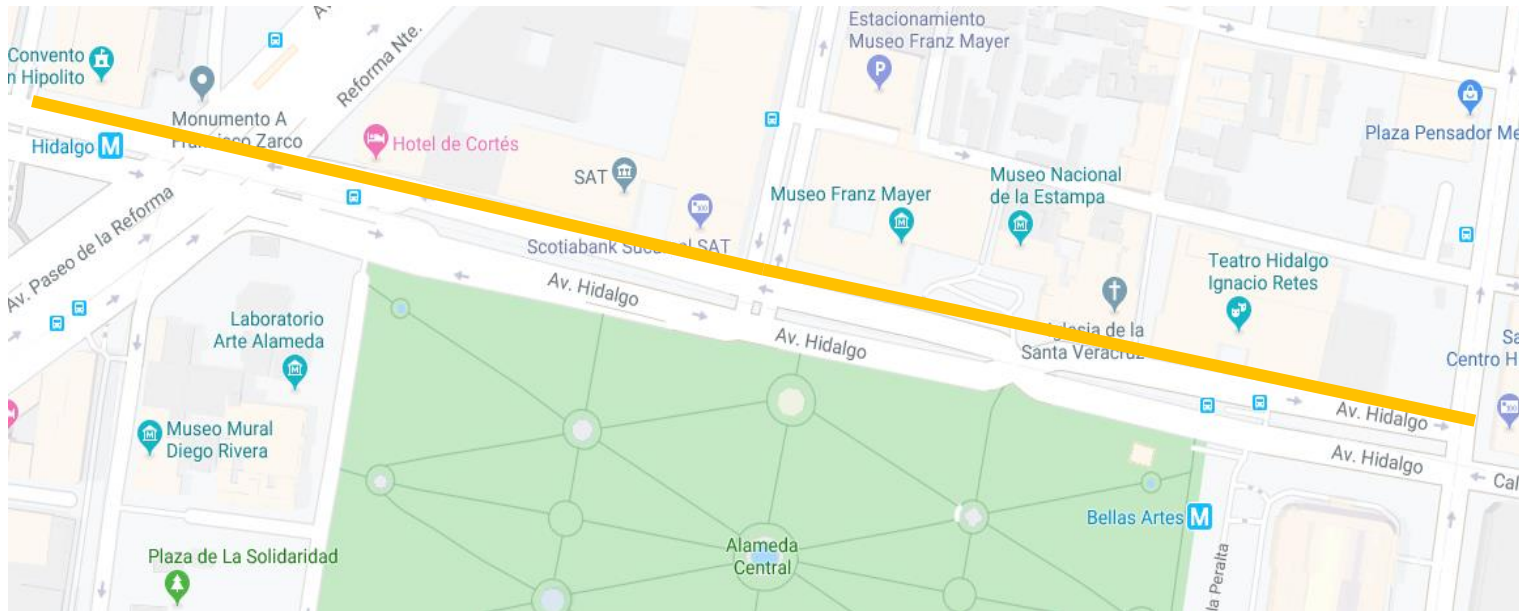

- **Av. Hidalgo avance de obra 18%**
  - Colado de relleno fluido en el tramo de Calle 2 de Abril a Eje Central
  - Demolición de carpeta asfáltica en el tramo de Calle 2 de abril a Eje Central
  - En el tramo de Calle 2 de abril a Valerio Trujano retiro de recinto de manera manual frente a plaza Santa Veracruz
  - En Tramo de Calle Valerio Trujano a Paseo de la Reforma demolición de banqueta y guarnición, colado de relleno fluido y retiro de vegetación de ornato



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
CULTURA  
CENTRO  
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS


## SOS - DGOIV



Demolición de carpeta Asfáltica del tramo  
de calle 2 de Abril a Eje Central




Confinamiento de pasos peatonales

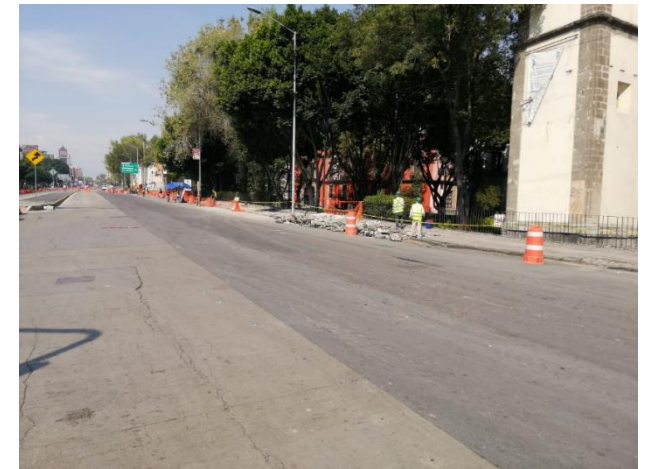

Trabajos de demolición por medios  
manuales de banqueta frente a Plaza Santa  
Veracruz



Demolición de banquetas y guarnición  
en Av. Hidalgo y Paseo de la Reforma

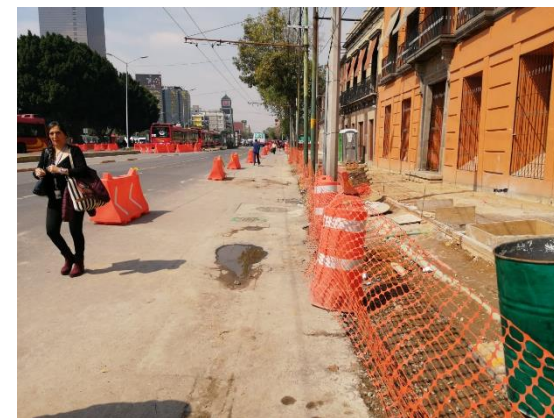

Demolición de banquetas y guarnición



# INVI

No. PREDIO	COLONIA	ALCALDÍA	PROGRAMA COLUMNA MAESTRA	AVANCE DEL PROYECTO	AVISO DE OBRA	ESTATUS	PERÍMETRO	PORCENTAJE DE AVANCE
1 2 DE ABRIL No. 42	GUERRERO	CUAUHTÉMOC	EXPROPIADO	PROYECTO EJECUTIVO LIBERADO	A-039/DOUL/62/11	OBRA EN PROCESO	A	42.20 %
2 ACADEMIA No. 33	CENTRO	CUAUHTÉMOC	EXPROPIADO	PROYECTO EJECUTIVO LIBERADO	A-028/DOUL/62/14	OBRA EN PROCESO	A	48.46 %
3 ARCOS DE BELEN No. 49	CENTRO	CUAUHTÉMOC	EXPROPIADO	PROYECTO EJECUTIVO LIBERADO	A-038/DOUL/62/17	OBRA EN PROCESO	B	90.00 %
4 EJE 1 PONIENTE GUERRERO No. 164	GUERRERO	CUAUHTÉMOC	EXPROPIADO	PROYECTO EJECUTIVO LIBERADO	A-007/DIUL/62/10	OBRA EN PROCESO	B	86.92 %
5 EJE 1 PONIENTE GUERRERO No. 110	CENTRO	CUAUHTÉMOC	EXPROPIADO	PROYECTO EJECUTIVO LIBERADO	A-085/DOUL/62/11	OBRA EN PROCESO	B	90.81 %
6 MAGNOLIA No. 12 (ANTES No. 12 y 16)	GUERRERO	CUAUHTÉMOC	PROGRAMA NORMAL	PROYECTO EJECUTIVO LIBERADO	A-069/DOUL/62/14	OBRA EN PROCESO	B	76.80 %
7 REPÚBLICA DE ARGENTINA No. 58	CENTRO	CUAUHTÉMOC	EXPROPIADO	PROYECTO EJECUTIVO LIBERADO	A-012/DOUL/62/14	POR INICIAR	A	0.00 %



# INVI

No. PREDIO	COLONIA	ALCALDÍA	PROGRAMA COLUMNA MAESTRA	AVANCE DEL PROYECTO	AVISO DE OBRA	ESTATUS	PERÍMETRO	PORCENTAJE DE AVANCE
8 REPÚBLICA DE ARGENTINA No. 87	CENTRO	CUAUHTÉMOC	EXPROPIADO	PROYECTO EJECUTIVO LIBERADO	A-079/DOUL/62/12	OBRA EN PROCESO	A	86.81 %
9 REPÚBLICA DE PERÚ No. 40	CENTRO	CUAUHTÉMOC	PROGRAMA NACIONAL	PROYECTO EJECUTIVO LIBERADO	A-009/DOUL/62/2017	OBRA EN PROCESO	B	93.20 %
10 ALLENDE No. 46	CENTRO	CUAUHTÉMOC	EXPROPIADO	PROYECTO EJECUTIVO LIBERADO	A-073/DOUL/62/12	OBRA EN PROCESO	A	100.00 %
11 LERDO No. 12	GUERRERO	CUAUHTÉMOC	EXPROPIADO	PROYECTO EJECUTIVO LIBERADO	A-006/DOUL62/13	POR INICIAR	B	0.00 %
12 PEDRO MORENO No. 154	GUERRERO	CUAUHTÉMOC	EXPROPIADO	PROYECTO EJECUTIVO LIBERADO	A-062/DOUL/62/11	POR INICIAR	B	0.00 %
13 TALAVERA No. 24	CENTRO	CUAUHTÉMOC	EXPROPIADO	PROYECTO EJECUTIVO LIBERADO	A-056/DOUL/62/16	POR INICIAR	A	0.00 %





# INVI

No. PREDIO	COLONIA	ALCALDÍA	PROGRAMA COLUMNA MAESTRA	AVANCE DEL PROYECTO	AVISO DE OBRA	ESTATUS	PERÍMETRO	PORCENTAJE DE AVANCE
14 VIOLETA No. 15	GUERRERO	CUAUHTÉMOC	EXPROPIADO	PROYECTO EJECUTIVO LIBERADO	A-024/DOUL/62/12	POR INICIAR	B	0.00 %
15 PEDRO MORENO No. 156	GUERRERO	CUAUHTÉMOC	EXPROPIADO	PROYECTO EJECUTIVO LIBERADO	A-064/DIUL/62/10	POR INICIAR	B	0.00 %
16 LECUMBERRI No. 66	ZONA CENTRO	CUAUHTÉMOC	PROGRAMA NORMAL	PROYECTO EJECUTIVO LIBERADO	A-022/DOUL/62/17	OBRA EN PROCESO	B	100.00 %
17 BELISARIO DOMINGUEZ No. 78	CENTRO	CUAUHTÉMOC	EXPROPIADO	PROYECTO EJECUTIVO LIBERADO	A-059/DOUL/62/17	OBRA EN PROCESO	A	71.45 %
18 NACIONAL No. 57	MORELOS	VENUSTIANO CARRANZA	CDI-CONVENIO DE COORDINACIÓN N 2013	PROYECTO EJECUTIVO LIBERADO	A-022/DOUL/62/15	OBRA EN PROCESO	B	85.11 %



# INBAL

Tema	Indicador	Periodicidad	Reporte del 20/09 al 27/10	Observaciones
Obras y proyectos de intervención urbana	Número de permisos para la realización de obras y proyectos de intervención urbana	Mensual	39 solicitudes ingresadas	30 Solicitudes de información
				9 Solicitud de obras menores
				0 Solicitud de obras mayores
				20 Inmuebles incluidos






# INBAL

No.	CALLE	NÚMERO	COLONIA	DELEGACIÓN	RESPUESTA	FOLIO	COLINDANTE	TIPO	TRABAJOS	VIGENCIA	IMAGEN
1	AV. 20 DE NOVIEMBRE	82	CENTRO	CUAUHTÉMOC	TRABAJOS AUTORIZADOS	2083	INCLUIDO	INBA 02-006	IMPERMEABILIZACIÓN	UN AÑO	
2	DOLORES	10	CENTRO	CUAUHTÉMOC	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	2109	COLINDANTE	INBA 02-003	NO APLICA	UN AÑO	
3	DOLORES	10	CENTRO	CUAUHTÉMOC	TRABAJOS AUTORIZADOS	2110	COLINDANTE	INBA 02-006	SUSTITUCION DE LAMPARAS EN AREA DE VENTAS Y SERVIOS, SUSTITUCION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y ELECTRICO	UN AÑO	
4	DONCELES	75	CENTRO	CUAUHTÉMOC	TRABAJOS AUTORIZADOS	2146	COLINDANTE	INBA 02-006	TRABAJOS A REALIZAR EN LOS CUBOS DEL INTERIOR DEL INMUEBLE	UN AÑO	






# INBAL

No.	CALLE	NÚMERO	COLONIA	DELEGACIÓN	RESPUESTA	FOLIO	COLINDANTE	TIPO	TRABAJOS	VIGENCIA	IMAGEN
5	DONCELES	75	CENTRO	CUAUHTÉMOC	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	2147	COLINDANTE	INBA 02-003	NO APLICA	UN AÑO	
6	FRANCISCO I, MADERO	30	CENTRO	CUAUHTÉMOC	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	2158	INCLUIDO	INBA 02-003	NO APLICA	UN AÑO	
7	REPÚBLICA DE URUGUAY	73-BIS	CENTRO	CUAUHTÉMOC	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	2172	NO INCLUIDO	INBA 02-003	NO APLICA	UN AÑO	







# INBAL

No.	CALLE	NÚMERO	COLONIA	DELEGACIÓN	RESPUESTA	FOLIO	COLINDANTE	TIPO	TRABAJOS	VIGENCIA	IMAGEN
8	DOLORES	22	CENTRO	CUAUHTÉMOC	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	2175	INCLUIDO	INBA 02-003	NO APLICA	UN AÑO	
9	PALMA	34	CENTRO	CUAUHTÉMOC	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	2176	COLINDANTE	INBA 02-003	NO APLICA	UN AÑO	
10	TACUBA	53	CENTRO	CUAUHTÉMOC	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	2180	INCLUIDO	INBA 02-003	NO APLICA	UN AÑO	






# INBAL

No.	CALLE	NÚMERO	COLONIA	DELEGACIÓN	RESPUESTA	FOLIO	COLINDANTE	TIPO	TRABAJOS	VIGENCIA	IMAGEN
11	VENUSTIANO CARRANZA	63	CENTRO	CUAUHTÉMOC	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	2185	INCLUIDO	INBA 02-003	NO APLICA	UN AÑO	
12	REPÚBLICA DE URUGUAY	107	CENTRO	CUAUHTÉMOC	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	2186	NO INCLUIDO	INBA 02-003	NO APLICA	UN AÑO	
13	AV. 5 DE MAYO	2	CENTRO	CUAUHTÉMOC	TRABAJOS AUTORIZADOS	2191	INCLUIDO	INBA 02-006	PINTURA EN EXTERIORES E INTERIORES, REPOSICIÓN DE APLANADOS EN EXTERIORES E INTERIORES, LIMPIEZA DE FACHADA, INCLUYENDO ELEMENTOS DE CANTERA, TABIQUE O ALGÚN OTRO MATERIAL PÉTREO	UN AÑO	
14	REGINA	165	CENTRO	CUAUHTÉMOC	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	2194	COLINDANTE	INBA 02-003	NO APLICA	UN AÑO	



# INBAL

No.	CALLE	NÚMERO	COLONIA	DELEGACIÓN	RESPUESTA	FOLIO	COLINDANTE	TIPO	TRABAJOS	VIGENCIA	IMAGEN
15	EJE CENTRAL LAZARO CARDENAS	42	CENTRO	CUAUHTÉMOC	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	2200	COLINDANTE	INBA 02-003	NO APLICA	UN AÑO	
16	CORREO MAYOR	89	CENTRO	CUAUHTÉMOC	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	2211	INCLUIDO	INBA 02-003	NO APLICA	UN AÑO	
17	JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	16-18	CENTRO	CUAUHTÉMOC	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	2219	INCLUIDO	INBA 02-003	NO APLICA	UN AÑO	



# INBAL

No.	CALLE	NÚMERO	COLONIA	DELEGACIÓN	RESPUESTA	FOLIO	COLINDANTE	TIPO	TRABAJOS	VIGENCIA	IMAGEN
18	VENUSTIANO CARRANZA	84	CENTRO	CUAUHTÉMOC	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	2234	INCLUIDO	INBA 02-003	NO APLICA	UN AÑO	
19	VENUSTIANO CARRANZA	84	CENTRO	CUAUHTÉMOC	TRABAJOS AUTORIZADOS	2235	INCLUIDO	INBA 02-006	DECORACIÓN NAVIDEÑA CON ILUMINACION TIPO LED	UN AÑO	
20	ISABEL LA CATÓLICA	39	CENTRO	CUAUHTÉMOC	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	2236	INCLUIDO	INBA 02-003	NO APLICA	UN AÑO	





# INBAL

No.	CALLE	NÚMERO	COLONIA	DELEGACIÓN	RESPUESTA	FOLIO	COLINDANTE	TIPO	TRABAJOS	VIGENCIA	IMAGEN
21	ISABEL LA CATÓLICA	39	CENTRO	CUAUHTÉMOC	TRABAJOS AUTORIZADOS	2237	INCLUIDO	INBA 02-006	PINTURA EN EXTERIORES E INTERIORES, REPOSICIÓN DE APLANADOS EN EXTERIORES E INTERIORES, LIMPIEZA DE FACHADA, INCLUYENDO ELEMENTOS DE CANTERA, TABIQUE O ALGÚN OTRO MATERIAL PÉTREO	UN AÑO	
22	JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	44	CENTRO	CUAUHTÉMOC	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	2251	NO INCLUIDO	INBA 02-003	NO APLICA	UN AÑO	
23	BELISARIO DOMÍNGUEZ	42	CENTRO	CUAUHTÉMOC	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	2252	INCLUIDO	INBA 02-003	NO APLICA	UN AÑO	







# INBAL

No.	CALLE	NÚMERO	COLONIA	DELEGACIÓN	RESPUESTA	FOLIO	COLINDANTE	TIPO	TRABAJOS	VIGENCIA	IMAGEN
24	ALLENDE	48	CENTRO	CUAUHTÉMOC	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	2254	COLINDANTE	INBA 02-003	NO APLICA	UN AÑO	
25	BELISARIO DOMÍNGUEZ	60	CENTRO	CUAUHTÉMOC	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	2278	INCLUIDO	INBA 02-003	NO APLICA	UN AÑO	
26	ISABEL LA CATÓLICA	71	CENTRO	CUAUHTÉMOC	TRABAJOS AUTORIZADOS	2284	COLINDANTE	INBA 02-006	PINTURA EN EXTERIORES E INTERIORES, REPOSICIÓN DE PISOS ORIGINALES	UN AÑO	
27	FRAY SERVANDO TERESA DE MIER	172	CENTRO	CUAUHTÉMOC	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	2290	NO INCLUIDO	INBA 02-003	NO APLICA	UN AÑO	




# INBAL

No.	CALLE	NÚMERO	COLONIA	DELEGACIÓN	RESPUESTA	FOLIO	COLINDANTE	TIPO	TRABAJOS	VIGENCIA	IMAGEN
28	FRAY SERVANDO TERESA DE MIER	174	CENTRO	CUAUHTÉMOC	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	2292	NO INCLUIDO	INBA 02-003	NO APLICA	UN AÑO	
29	JOSÉ MARÍA IZAZAGA	65	CENTRO	CUAUHTÉMOC	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	2306	NO INCLUIDO	INBA 02-003	NO APLICA	UN AÑO	
30	REPÚBLICA DE GUATEMALA	24	CENTRO	CUAUHTÉMOC	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	2310	COLINDANTE	INBA 02-003	NO APLICA	UN AÑO	
32	AYUNTAMIENTO	161	CENTRO	CUAUHTÉMOC	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	2319	INCLUIDO	INBA 02-003	NO APLICA	UN AÑO	






# INBAL

No.	CALLE	NÚMERO	COLONIA	DELEGACIÓN	RESPUESTA	FOLIO	COLINDANTE	TIPO	TRABAJOS	VIGENCIA	IMAGEN
33	INDEPENDENCIA	24	CENTRO	CUAUHTÉMOC	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	2320	INCLUIDO	INBA 02-003	NO APLICA	UN AÑO	
34	PALMA	34	CENTRO	CUAUHTÉMOC	TRABAJOS AUTORIZADOS	2321	COLINDANTE	INBA 02-006	PINTURA EN INTERIORES, REPOSICIÓN DE CANCELERÍAS EN PUERTAS Y VENTANAS, REPOSICIÓN DE PISOS ORIGINALES EN INTERIORES, ARREGLO Y REPOSICIÓN DE INSTALACIONES HIDRÁULICA, SANITARIA, AIRE ACONDICIONADO Y OTRAS ESPECIALES EXISTENTES	UN AÑO	
35	ENRICO MARTÍNEZ	35	CENTRO	CUAUHTÉMOC	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	2329	INCLUIDO	INBA 02-003	NO APLICA	UN AÑO	
36	LECUMBERRI	34	CENTRO	CUAUHTÉMOC	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	2335	NO INCLUIDO	INBA 02-003	NO APLICA	UN AÑO	



# INBAL

No.	CALLE	NÚMERO	COLONIA	DELEGACIÓN	RESPUESTA	FOLIO	COLINDANTE	TIPO	TRABAJOS	VIGENCIA	IMAGEN
37	INDEPENDENCIA	40	CENTRO	CUAUHTÉMOC	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	2336	INCLUIDO	INBA 02-003	NO APLICA	UN AÑO	
38	DR. MORA	11	CENTRO	CUAUHTÉMOC	TRABAJOS AUTORIZADOS	2356	INCLUIDO	INBA 02-006	PINTURA EN EXTERIORES E INTERIORES, REPOSICIÓN DE APLANADOS EN EXTERIORES E INTERIORES, LIMPIEZA DE FACHADA, INCLUYENDO ELEMENTOS DE CANTERA, TABIQUE O ALGÚN OTRO MATERIAL PÉTREO	UN AÑO	
39	JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	25	CENTRO	CUAUHTÉMOC	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	2391	NO INCLUIDO	INBA 02-003	NO APLICA	UN AÑO	



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



SECRETARÍA DE  
CULTURA  
CENTRO  
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

# ADIP

<b>Tema</b>	<b>Indicador</b>	<b>Periodicidad</b>	<b>Semana al 28/10</b>	<b>Semana al 04/11</b>	<b>Próximo reporte</b>
Conectividad e infraestructura de telecomunicaciones	Número de puntos de conexión wifi habilitados en postes de C5 (Línea base 589)	Quincenal	<b>327</b>	<b>354</b>	12 de noviembre



# ADIP

589 registros

## Ubicación de puntos de acceso gratuito a internet WiFi vía infraestructura C5 (actuales y próximos)

Filtros activos [Borrar todo](#)

- geopoint Área dibujada en el mapa
- ESTATUS CONECTIVIDAD WIFI
- GRATUITO\_ACTIVO
- ESTATUS CONECTIVIDAD SIN WIFI

Filtros

Buscar registros...


- COLONIA
- CENTRO 297
  - GUERRERO 55
  - ZONA CENTRO 47
  - MORELOS 41
  - DOCTORES 22
  - EL PARQUE 17
  - > Más

- ALCALDIA
- CUAUHTEMOC 460
  - VENUSTIANO CARRANZA 129

- BOTON
- CON BOTON 435
  - SIN BOTON 131
  - N/A 23

- ALTAVOZ
- CON ALTAVOZ 454
  - SIN ALTAVOZ 112
  - N/A 23

- ESTATUS CONECTIVIDAD
- WIFI GRATUITO\_ACTIVO 354
  - SIN WIFI 235

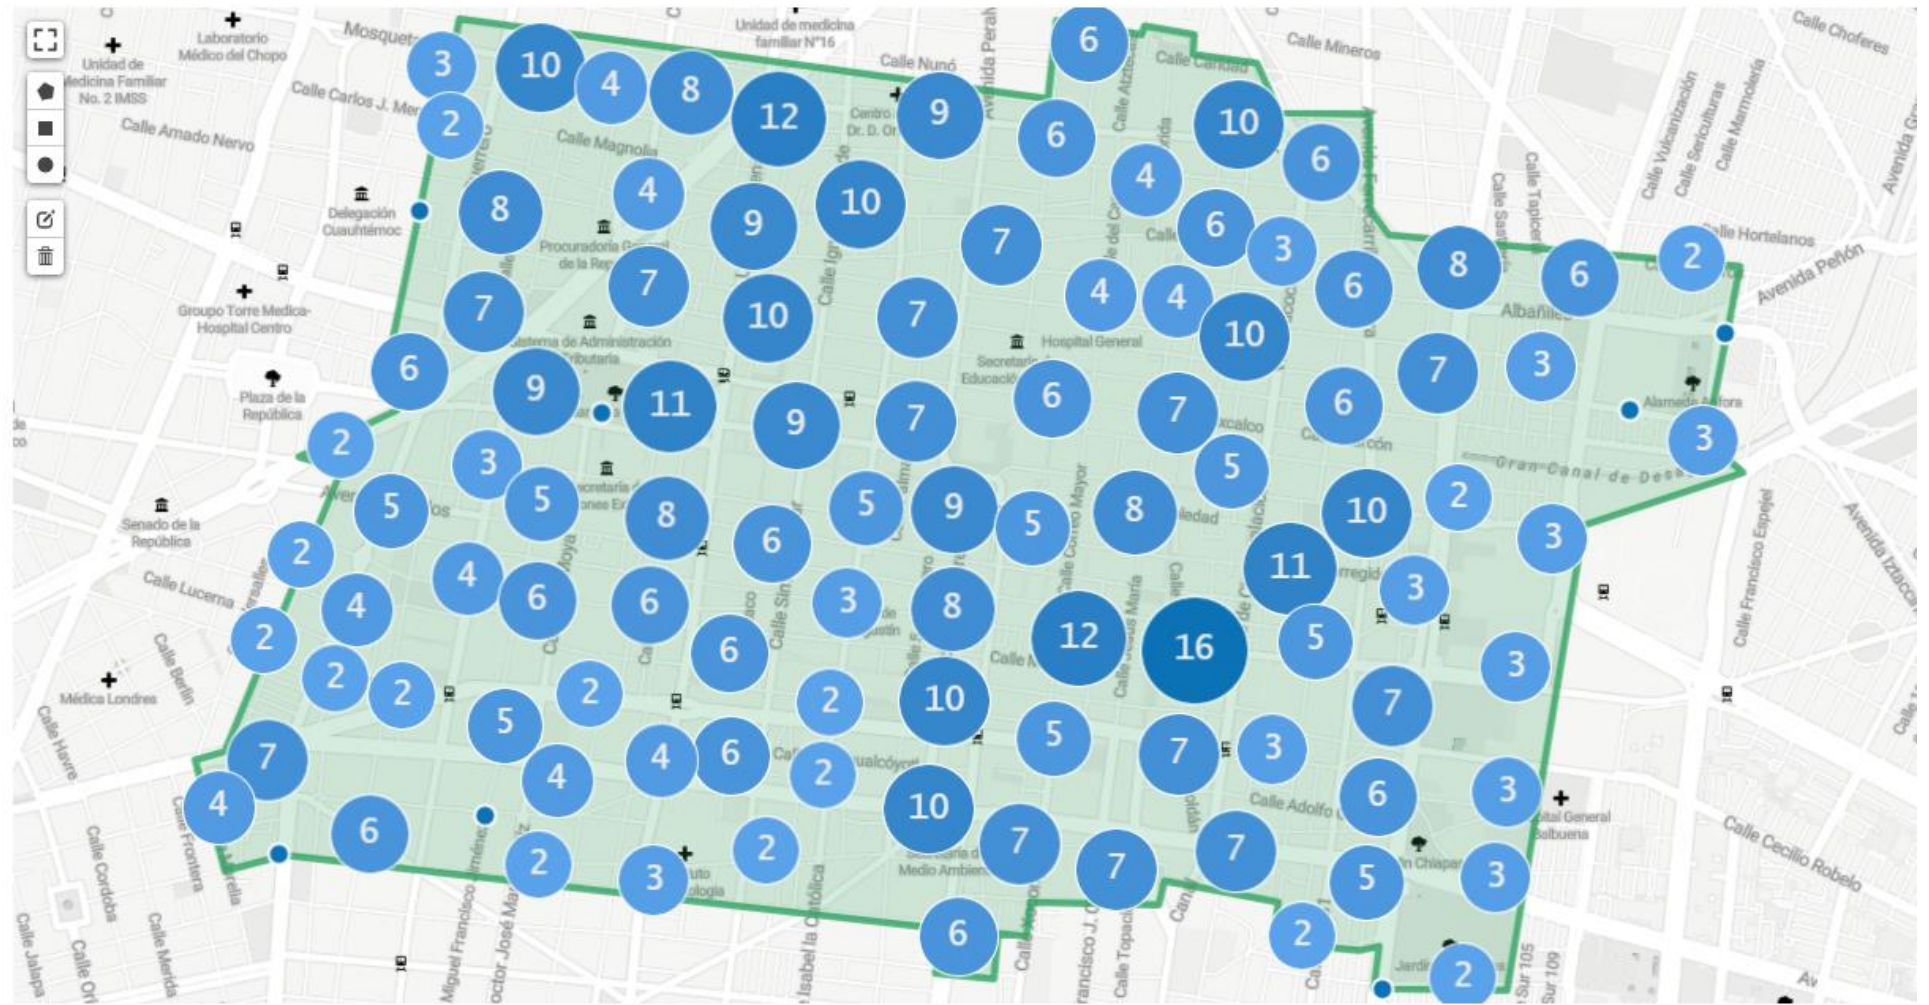



## ILIFE | Inmuebles escolares en proceso de atención 2018 -2019 en Centro Histórico

No.	Plantel	Porcentaje de avance	Observaciones
1	ESCUELA PRIMARIA MIGUEL SERRANO	100.00 %	ENTREGADA JUNIO
2	ESCUELA SECUNDARIA ADRIANA GARCIA CORRAL	42.08 %	
3	ESCUELA SECUNDARIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ SEC TEC No. 6	100.00 %	ENTREGADA ABRIL
4	ESCUELA PRIMARIA REPÚBLICA DE BOLIVIA	100.00 %	ENTREGADA ABRIL
5	ESCUELA PRIMARIA ALFREDO E. URUCHURTU	100.00 %	ENTREGADA ABRIL
6	ESCUELA PRIMARIA PABLO MORENO	100.00 %	
7	ESCUELA PRIMARIA REPÚBLICA DE ARGENTINA	100.00 %	ENTREGADA ABRIL
8	ESCUELA NACIONAL PARA CIEGOS LIC. IGNACIO TRIGUEROS	100.00 %	
9	TELESECUNDARIA NO. 91	88.35 %	
10	ESCUELA PRIMARIA SARA MANZANO	100.00 %	ENTREGADA SEPTIEMBRE
11	ESCUELA PRIMARIA MARCELINO DÁVALOS	62.30 %	
12	ESCUELA PRIMARIA REPÚBLICA DE PANAMÁ	67.80 %	





## ILIFE | Inmuebles escolares en proceso de atención 2018 -2019 en Centro Histórico

No.	Plantel	Porcentaje de avance	Observaciones
13	ESCUELA SECUNDARIA JOSÉ MANUEL RAMOS	100.00 %	ENTREGADA OCTUBRE
14	ESCUELA PRIMARIA ABRAHAM CASTELLANOS	100.00 %	ENTREGADA ABRIL
15	ESCUELA SECUNDARIA ÁNGEL TRÍAS ÁLVAREZ	86.50 %	
16	JARDÍN DE NIÑOS CADETES DE LA NAVAL	100.00 %	ENTREGADA OCTUBRE
17	ESCUELA SECUNDARIA NO. 1 CÉSAR A. RUÍZ	100.00 %	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE BARRA POR FUNDACIÓN BOSCH
18	JARDÍN DE NIÑOS ENRIQUE PESTALOZZI	100.00 %	ENTREGADA OCTUBRE
19	ESCUELA PRIMARIA FRAY PEDRO DE GANTE	100.00 %	ENTREGADA OCTUBRE
20	ESCUELA PRIMARIA JOAQUÍN GARCÍA ICAZBALCETA	22.38 %	
21	JARDÍN DE NIÑOS JUAN JACOBO ROUSSEAU	100.00 %	ENTREGADA OCTUBRE
22	ESCUELA PRIMARIA LIC. PONCIANO ARRIAGA	100.00 %	ENTREGADA OCTUBRE
23	ESCUELA PRIMARIA REPÚBLICA DE LÍBANO	100.00 %	ENTREGADA OCTUBRE



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



CENTRO  
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

# C5

Tema	Línea base	Periodicidad	Semana del 30/10 al 05/11	Próximo reporte
Cámaras de video- vigilancia	No. cámaras con falla o intermitencia	Semanal	21	12 de noviembre



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
CULTURA  
CENTRO  
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

## Orden del día

Reportes

**Turnos e incidencias urbanas**



## Matriz de seguimiento a turnos compilado



Dependencia	Atendido	Proceso	Total general
ACH	26	3	29
ACH		1	1
ADIP	1		1
Al. Cuauhtémoc	11	4	15
Al. Venustiano Carranza	5	1	6
C5	6	1	7
CFE	5	1	6
ILIFE	1		1
INAH	3		3
Metrobús	1		1
PGJ	3		3
SACMEX	7	2	9
SEDEMA	5	3	8
SEMOVI	1		1
SGIRPC	1	2	3
SOS-AP	3	1	4
SOS-DGOIV	4	2	6
SOS-DGSUS	2		2
SSC	8		8
STC-METRO	1		1
TELMEX	3		3
Tránsito	4		4
<b>Total general</b>	<b>101</b>	<b>21</b>	<b>122</b>



# Turnos atendidos

Del 29 de octubre al 04 de noviembre



FECHA DE REPORTE	SOLICITANTE	SOLICITUD	ATIENDE	ESTATUS	FECHA DE ATENCIÓN	OBSERVACIONES
29/10/2019	ACH	Realizar reunión con vecinos de Santa María la Redonda, el miércoles a las 6:00 de la tarde.	SOS-DGOIV	Atendido	30/10/2019	Se llevó a cabo el miércoles 30 de octubre en La Nana
29/10/2019	ACH	Realizar reunión con vecinos de Santa María la Redonda, el miércoles a las 6:00 de la tarde.	SACMEX	Atendido	30/10/2019	Se llevó a cabo el miércoles 30 de octubre en La Nana



## Turnos en proceso

Del 29 de octubre al 04 de noviembre



FECHA DE REPORTE	SOLICITANTE	SOLICITUD	ATIENDE	ESTATUS	FECHA DE ATENCIÓN	OBSERVACIONES
29/10/2019	ACH	Compartan calendarios de trabajo de sus obras y de atención permanente de la señalización y paso seguro de las zonas donde están en obras.	SOS-DGOIV	Proceso		
29/10/2019	ACH	Compartan calendarios de trabajo de sus obras y de atención permanente de la señalización y paso seguro de las zonas donde están en obras.	SACMEX	Proceso		
29/10/2019	ACH	Reforestación en la calle de Victoria.	SEDEMA	Proceso		
29/10/2019	FCH	Retire de árboles secos en la calle de Cuba en el tramo de Brasil a Lázaro Cárdenas, particularmente el ubicado frente a la Antigua Escuela de Economía, Cuba 92.	SEDEMA	Proceso		
29/10/2019	SOS-AP	Gestione con Ordenamiento y SSC apoyo para que SOS realice trabajos en el Callejón Girón para reactivar alumbrado público	ACH	Proceso		



## Matriz de seguimiento a Incidencias del 01 de enero al 04 de noviembre



Dependencia	Atendido	Pendiente	Proceso	Total general
ACH	1,066	24	3	1,093
Al. Cuauhtémoc	22	26	2	50
Al. Venustiano Carranza	4			4
C-5	2	1		3
CFE	92	69	9	170
CIS		2		2
IUSACELL		2		2
MCM TELECOM		1		1
SACMEX	93	38	3	134
SEDEMA		1	2	3
SGIRyPC	1			1
SOS-AP	92	18		110
SOS-DGOIV	10	21		31
SOS-DGOP		1		1
SOS-DGSUS		6		6
STC-METRO	3			3
TELMEX	46	3	2	51
TOTAL PLAY			1	1
Tránsito	26	3		29
<b>Total general</b>	<b>1,457</b>	<b>216</b>	<b>22</b>	<b>1,695</b>



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL  
CENTRO  
HISTÓRICO

# INCIDENCIAS ATENDIDAS

Del 29 de octubre al 04 de noviembre



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

FECHA DE REPORTE	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS
30/10/2019	Falla en alumbrado público	DONCELES	BOLIVAR	ISABELA CATOLICA	Frente al No.39			SOS-DGOIV	Atendido
30/10/2019	Falta tapa de registro	DONCELES	REPÚBLICA DE CHILE		Esquina			TELMEX	Atendido
31/10/2019	Falta tapa de registro	CALLE JESUS MARIA	FRAY SERVANDO TERESA DE MIER	JOSÉ MARIA IZAZAGA	frente al # 49			CFE	Atendido





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL  
CENTRO  
HISTÓRICO

# INCIDENCIAS ATENDIDAS

Del 29 de octubre al 04 de noviembre



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

FECHA DE REPORTE	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS
02/11/2019	Retiro de caseta telefónica	BOLIVAR		MESONES				TELMEX	Atendido
03/11/2019	Caja de Telmex abierta	DONCELES			Frente al No. 75			TELMEX	Atendido
03/11/2019	Falla en alumbrado público	MADERO	PALMA	ISABEL LA CATÓLICA				SOS-AP	Atendido



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL  
CENTRO  
HISTÓRICO

# INCIDENCIAS ATENDIDAS

Del 29 de octubre al 04 de noviembre



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

FECHA DE REPORTE	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS
04/11/2019	Falta de tapa de registro	ALHONDIGA	CORREGIDORA	VENUSTIANO CARRANZA				CFE	Atendido
04/11/2019	Falla en suministro de energía eléctrica	ARGENTINA	DONCELES	GUATEMALA				SOS-AP	Atendido



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL  
CENTRO  
HISTÓRICO

# INCIDENCIAS ATENDIDAS

Del 29 de octubre al 04 de noviembre



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

FECHA DE REPORTE	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS
04/11/2019	Falla en suministro de energía eléctrica	REPUBLICA DE BRASIL	REPUBLICA DE HONDURAS	EJE 1 NORTE				SOS-AP	Atendido



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL  
CENTRO  
HISTÓRICO

# INCIDENCIAS PENDIENTES

Del 29 de octubre al 04 de noviembre



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

FECHA DE REPORTE	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS
29/10/2019	Tapa de registro dañada	CORREO MAYOR	SOLEDAD	CORREGIDORA				CFE	Pendiente
29/10/2019	Falla en alumbrado público	EJE 1 ORIENTE (ANILLO DE CIRCUNVALACION)	ZAPATA	GUATEMALA				SOS-AP	Pendiente
30/10/2019	Falla en suministro de energía eléctrica	PENSADOR MEXICANO	EJE CENTRAL 2 DE ABRIL					CFE	Pendiente
31/10/2019	banqueta en mal estado	CALLE INCAS	REPUBLICA DE PERU	REPUBLICA DE HONDURAS	FRENTE AL # 10			SOS-DGOIV	Pendiente
31/10/2019	Falta tapa de registro	REPÚBLICA DE PERU	REPUBLICA DE CHILE	REPUBLICA DE BRASIL	a un costado de la arena coliseo			CFE	Pendiente
31/10/2019	Alumbrado público que no funciona	REPÚBLICA DE VENEZUELA	RODRÍGUEZ PUEBLA	DEL CARMEN	TEATRO DEL PUEBLO			CFE	Pendiente



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO





AUTORIDAD DEL  
CENTRO  
HISTÓRICO

# INCIDENCIAS PENDIENTES

Del 29 de octubre al 04 de noviembre



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

FECHA DE REPORTE	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS
31/10/2019	Alumbrado público que no funciona	REPUBLICA DE PERU	EJE CENTRAL	ALLENDE				CFE	Pendiente
31/10/2019	alumbrado público que no funciona	5 DE FEBRERO	VENUSTIANO CARRANZA	REPUBLICA DEL SALVADOR				CFE	Pendiente
01/11/2019	semáforo peatonal roto	5 DE MAYO	BOLIVAR	ISABELA CATOLICA	ESQUINA CON MOTOLINEA			Tránsito	Pendiente
01/11/2019	falta de agua	REPUBLICA DE GUATEMALA	REPUBLICA DE BRASIL	REPUBLICA DE ARGENTINA	FRENTE # 30			SACMEX	Pendiente



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO






AUTORIDAD DEL  
CENTRO  
HISTÓRICO

# INCIDENCIAS PENDIENTES

Del 29 de octubre al 04 de noviembre



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

FECHA DE REPORTE	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS
01/11/2019	TAPAS de metal CFE están pandeadas	JESÚS MARÍA	SOLEDAD	JESUS MARIA	CASI ESQUINA			CFE	Pendiente
02/11/2019	Semaforo dañado	ISABEL LA CATÓLICA	ISABEL LA CATÓLICA	REPUBLICA DE URUGUAY	ESQUINA			Tránsito	Pendiente
02/11/2019	Falta de suministro de luz	Teatro Hidalgo del IMSS	2 DE ABRIL	EJE CENTRAL (LÁZARO CARDENAS)				CFE	Pendiente
02/11/2019	Coladeras azolvadas	REPUBLICA DE URUGUAY		5 DE FEBRERO	No.84			SACMEX	Pendiente



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO




AUTORIDAD DEL  
CENTRO  
HISTÓRICO

# INCIDENCIAS PENDIENTES

Del 29 de octubre al 04 de noviembre



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

FECHA DE REPORTE	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS
03/11/2019	Falta tapa de registro	REPUBLICA DE CHILE		REPUBLICA DE HONDURAS	Esquina			CFE	Pendiente
03/11/2019	Tapa de regisytro levantada	REPUBLICA DE BRASIL		REPUBLICA DE CUBA	Esquina			CFE	Pendiente
03/11/2019	Acometida con cables expuestos	REPUBLICA DE BRASIL			No.24			CFE	Pendiente



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO





AUTORIDAD DEL  
CENTRO  
HISTÓRICO

# INCIDENCIAS PENDIENTES

Del 29 de octubre al 04 de noviembre



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

FECHA DE REPORTE	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS
04/11/2019	Daño en poste de alumbrado publico	REPUBLICA DE BRASIL		BELISARIO DOMINGUEZ				Al. Cuauhtémoc	Pendiente
04/11/2019	Rebozo de pozo de visita	VALERIO TRUJANO		AV. HIDALGO	Esquina			SACMEX	Pendiente





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO





AUTORIDAD DEL  
CENTRO  
HISTÓRICO

# INCIDENCIAS PENDIENTES

Del 29 de octubre al 04 de noviembre



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

FECHA DE REPORTE	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS
04/11/2019	Falla en suministro de energía eléctrica	SOLEDAD						SOS-AP	Pendiente
04/11/2019	Falla en suministro de energía eléctrica	PLAZA LA AGUILITA	MESONES	REGINA				SOS-AP	Pendiente



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



SECRETARÍA DE  
CULTURA  
CENTRO  
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

# PRÓXIMA SESIÓN

Martes 12 de noviembre

## A las 10:30 horas
