



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
CULTURA
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Reporte del 3 al 9 de septiembre

10 de septiembre de 2019



Orden del día

Reportes

Turnos e incidencias urbanas



ACH

Tema	Indicador	Periodicidad	Semana al 02/09	Semana al 09/09	Próximo reporte
Tiraderos clandestinos	Metros cúbicos de residuos sólidos levantados en tiraderos clandestinos en el perímetro de ACH	Semanal	1,023 m ³	1,051 m ³	18 de Septiembre
Limpieza	Metros cúbicos de basura recolectada en el Perímetro de la ACH (Producto de Barrido)	Semanal	2,437 m ³	2,479 m ³	18 de Septiembre
Mantenimiento a infraestructura	Número de Incidencias de daño en infraestructura del Perímetro de la ACH reparadas y atendidas	Semanal	168	42	18 de Septiembre



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



CENTRO HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

ACH | Eliminación de grafiti

7,384
m² totales

*La mayoría son reincidencias

calles atendidas	35
cortinas metálicas	493
Fachadas	131





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
CULTURA
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Eliminación de grafiti en cantera

**ISABEL LA CATÓLICA, BOLÍVAR, REPÚBLICA DE EL SALVADOR,
REPÚBLICA DE CHILE, DONCELES, PALMA, REGINA, CORREO MAYOR,
MOTOLINIA, 5 MAYO**

Se han limpiado
767 m²

Se inició en
inmuebles que no
son catalogados con
gel desincrustante





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
CULTURA
CENTRO
HISTÓRICO

ACH | obras menores

Se realizaron trabajos en:

San Ildefonso

Dolores

República de Guatemala


República de Argentina

Eje Central Lázaro Cárdenas

Los trabajos realizados consistieron en **demolición, retiro y posterior reposición de basaltín** en San Ildefonso, **reposición de una pieza de recinto** en Dolores, **reparación de registro** en República de Guatemala, **reparación de registro** en República de Argentina, **pintura de cortinas metálicas** en el Eje Central Lázaro Cárdenas



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

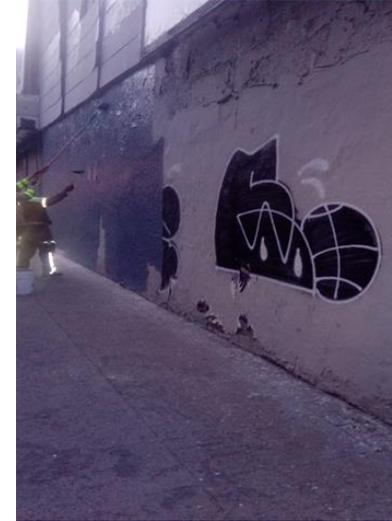



Alc. Venustiano Carranza

Tema	Indicador	Periodicidad	Semana al 02/09	Semana al 09/09	Próximo reporte	Observaciones
Luminarias	Número de Luminarias reparadas en vías secundarias	Semanal	16	86	18 de septiembre	Se detalla la ubicación y la causa en el Anexo.
Tiraderos clandestinos	Toneladas de residuos solidos recolectados de tiraderos clandestinos en el PB de VC (línea base: 26 tiraderos) m3	Semanal	26 (492.8 m3)	26 (477.4 m3)	18 de septiembre	Se recolectaron 31 toneladas diariamente de Residuos Sólidos.



Alc. Venustiano Carranza | Anexo 1

REPORTE DE LUMIARIAS REPARADAS EN EL PERÍMETRO B EN LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA					
DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		COLONIA	CANTIDAD	MOTIVO
MIGUEL DOMINGUEZ 32	JOSE JOAQUIN HERREA	PENITENCIARIA	AMPL. PENITENCIARIA	30	ROBO DE CABLE
SN ANTONIO TOMATLAN 120 C	CDA. SN ANTONIO TOMATLAN		AMPL. PENITENCIARIA	1	MANTENIMIENTO
ANFORA	HEROE DE NACUZARI	ALBAÑILES	AMPL. PENITENCIARIA	1	MANTENIMIENTO
MIGUEL DOMINGUEZ 37	JOSE JOAQUIN HERRERA	PENITENCIARIA	PENITENCIARIA	40	ROBO DE CABLE
MIGUEL DOMINGUEZ	JOSE JOAQUIN HERRERA	PENITENCIARIA	PENITENCIARIA	1	MANTENIMIENTO
JOSE JOAQUIN HERRERA 85	F C DE CINTURA	MIGUEL DOMINGUEZ	PENITENCIARIA	1	MANTENIMIENTO
SN ANTONIO TOMATLAN 92	F C DE CINTURA	MIGUEL DOMINGUEZ	AMPL. PENITENCIARIA	1	MANTENIMIENTO
PENITENCIARIA 70	INTEROCENICO	TAPICERIA	AMPL. PENITENCIARIA	1	MANTENIMIENTO
TAPICERIA 61	MIGUEL NEGRETE		PENITENCIARIA	1	MANTENIMIENTO
ZAPATA 143	SN CIPRIAN	ROSARIO	CENTRO I	1	MANTENIMIENTO
ZAPATA	ROSARIO	CIRCUNVALACION	CENTRO I	3	MANTENIMIENTO
				TOTAL	86



Alc. Venustiano Carranza | Anexo 1

RELACION DE TIRADEROS CLANDESTINOS				
Nº. CONSECUTIVO	UBICACIÓN	TIPO DE RESIDUOS SÓLIDOS %	CANTIDAD TONS	SECTOR
01	MIGUEL DOMINGUEZ Y PENITENCIARIA COL. AMPLIACIÓN PENITENCIARIA	90% BASURA 10% CASCAJO	1	S-1
02	EJE 1 NORTE Y HORTELANOS COL. MORELOS	90% BASURA 10% CASCAJO	2.5	S-1
03	AV. CIRCUNVALACIÓN ENTRE HÉROES DE NACUZARI Y SAN ANTONIO TOMATLAN	85% BASURA 15% CASCAJO	1	S-2
04	ZAPATA ESQ. AV. CIRCUNVALACIÓN	85% BASURA 15% CASCAJO	1	S-2
05	NACIONAL ESQ. VIDAL ALCO CER	85% BASURA 15% CASCAJO	1.5	S-2
06	COSTA RICA ESQ. VIDAL ALCO CER	85% BASURA 15% CASCAJO	1	S-2
07	PEÑA Y PEÑA ESQ. VIDAL ALCO CER	85% BASURA 15% CASCAJO	0.5	S-2
08	VIDAL ALCO CER Y BERRIOZABAL COL. MORELOS	85% BASURA 15% CASCAJO	2	S-2
09	AV. CIRCUNVALACIÓN Y G. PEDRAZA (MERCADO DULCES I) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	2	S-9
10	AV. CIRCUNVALACIÓN Y CARRIZAL (MERCADO DE FLORES) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	1.5	S-9
11	AV. CIRCUNVALACIÓN Y CARRETONES (METRO MERCED) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	1	S-9
12	JUAN DE LA GRANJA Y CORREGIDORA (LAS CANCHAS) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.2	S-9
13	SANTA ESCUELA Y CUADRANTE DE LA SOLEDAD COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.5	S-9

RELACION DE TIRADEROS CLANDESTINOS				
Nº. CONSECUTIVO	UBICACIÓN	TIPO DE RESIDUOS SÓLIDOS %	CANTIDAD TONS	SECTOR
13	SANTA ESCUELA Y CUADRANTE DE LA SOLEDAD COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.5	S-9
14	ROSARIO ESQ. PLAZA SAN LAZARO (ATRÁS DE LA IGLESIA) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.5	S-9
15	AV. CIRCUNVALACIÓN Y SOLEDAD COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	2	S-9
16	AV. CIRCUNVALACIÓN Y MANZANARES COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	2	S-9
17	JUAN PABLO ESQ. CORREGIDORA COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.5	S-9
18	CONGRESO DE LA UNIÓN ESQ. GENERAL ANAYA COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.2	S-9
19	GENERAL ANAYA ESQ. JUAN DE LA GRANJA COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.3	S-9
20	JUAN DE LA GRANJA ESQ. SAN CIPRIAN COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	2.5	S-9
21	CORREGIDORA Y SAN SIMÓN COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	0.2	S-9
22	PLAZA DE LA SOLEDAD, SAN SIMÓN Y SANTA ESCUELA COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	0.5	S-9
23	TOLVA 2 COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	2.6	S-9
24	TOLVA 3 COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	3	S-9
25	AV. CIRCUNVALACIÓN Y CARRETONES COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	0.5	S-9
26	JUAN DE LA GRANJA ESQ. SAN CIPRIAN COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	0.5	S-9




GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

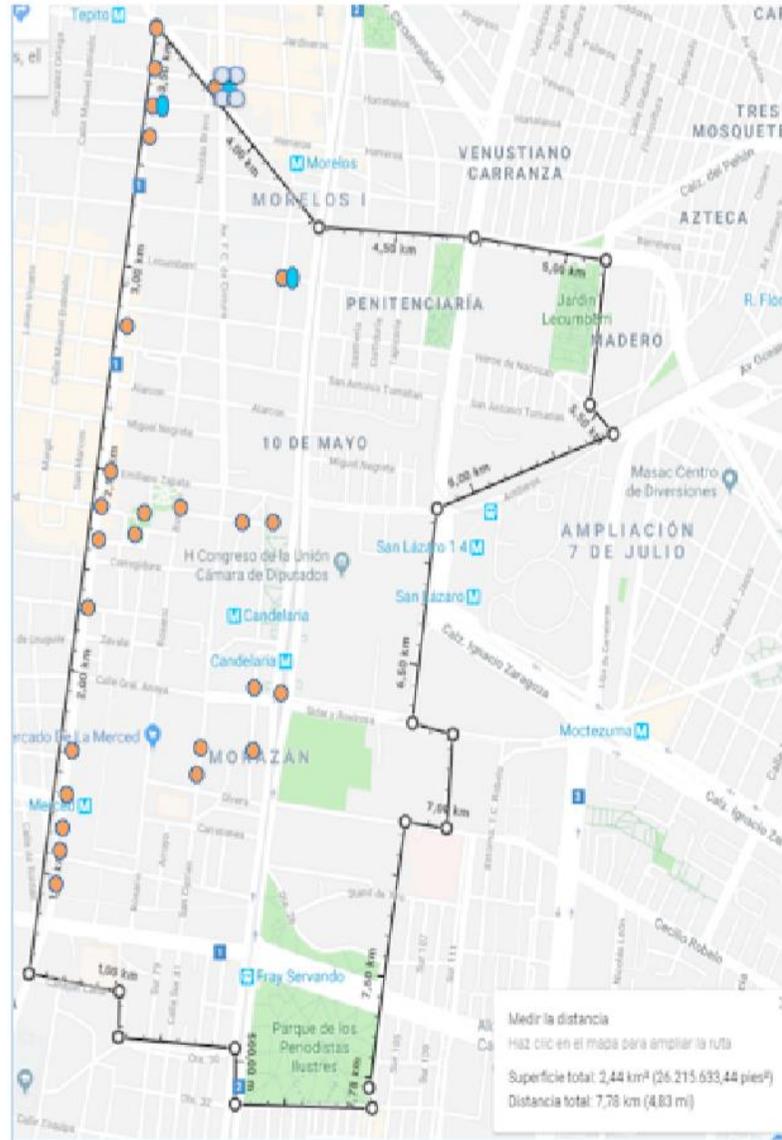

Montón Tradicional



Recolección de cascajo





SOS – Alumbrado Público

Tema	Indicador	Periodicidad	Semana al 02/09	Semana al 09/09	Próximo reporte
Alumbrado Público	Número de luminarias reparadas en vías del PA del CH	Semanal	59	150	18 de septiembre
Alumbrado Público	Número de luminarias reparadas en vías del PB del CH	Semanal	0	0	18 de septiembre



SOS – Alumbrado Público | Anexo 1

Reporte de luminarias reparadas en Centro Histórico Perímetro A

Dirección	Entre calles	Colonia	Cantidad	Motivo	Incidencia	
República de Colombia	Carmen	Callejón de Girón	Centro	1	SE CAMBIA LAMPARA	LUMINARIO APAGADO
República de Cuba	Allende	Callejón del 57	Centro	1	SE CAMBIA LAMPARA	LUMINARIO APAGADO
República de Perú	Leandro Valle	República de Brasil	Centro	1	SE CAMBIA LAMPARA	LUMINARIO APAGADO
AV. AVENIDA JUÁREZ	Doctor Mora	Ángela Peralta	Centro	70	SE RESTABLECE ITM	CIRCUITO APAGADO
República de Guatemala	República de Brasil	República de Argentina	Centro	52	SE RESTABLECE ITM	CIRCUITO APAGADO
ALAMEDA CENTRAL	Cara Av. Hidalgo	Av. Juárez	Centro	22	SE RESTABLECE ITM	CIRCUITO APAGADO
ALHÓNDIGA	Corregidora	Soledad	Centro	1	SE CAMBIA LAMPARA	LUMINARIO APAGADO
Correo Mayor	Venustiano Carranza	República de Uruguay	Centro	1	SE REALIZA RECONEXOÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN	LUMINARIO APAGADO
Justo Sierra	Carmen	Loreto	Centro	1	SE CAMBIA LAMPARA	LUMINARIO APAGADO
		TOTAL		59		



SOS-DGOIV

Rehabilitación y mantenimiento vial - Plaza Loreto-Jardín del Obispo y calle Valerio Trujano

Frente de trabajo	Ubicación vialidad y tramo	Empresa	Concepto	Avance real	Avance programado	Programa de obra
3	Trabajos de rehabilitación y mantenimiento vial en la Plaza Loreto, Jardín del Obispo, Valerio Trujano	Consortio de ingenieros constructores y consultores, s. A de c. V. (CICSA)	Rehabilitación y mantenimiento vial Loreto	5.54%	35.00%	Secuencias



SOS-DGOIV

Rehabilitación y mantenimiento vial - Antiguo barrio San pablo Zoquiapan

Frente de trabajo	Ubicación vialidad y tramo	Empresa	Concepto	Avance real	Avance programado	Programa de obra
4	Trabajos de rehabilitación y mantenimiento vial del antiguo barrio san pablo Zoquiapan, en las calles de Soledad y Leona Vicario	Impulsora de desarrollo integral, s. A. De c. V. (IDINSA)	Rehabilitación y mantenimiento vial	8.31%	32.76%	Secuencias



SOS-DGOIV

Rehabilitación y mantenimiento vial - Calles de Galeana, Soledad, Pedro Moreno, Santísima, Margil y Leona Vicario

Frente de trabajo	Ubicación vialidad y tramo	Empresa	Concepto	Avance real	Avance programado	Programa de obra
5	Trabajos de rehabilitación y mantenimiento vial de las calles de Galeana , calle Riva Palacio y Violeta	Arte y diseño en arquitectura s. A. De c. V.	Rehabilitación y mantenimiento vial	7.47%	35.00%	Secuencias



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
CULTURA
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

PROSOC

RIPUH CENTRO HISTÓRICO




GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

CENTRO
HISTÓRICO




MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

PROSOC | Inmuebles catalogados en el Centro Histórico

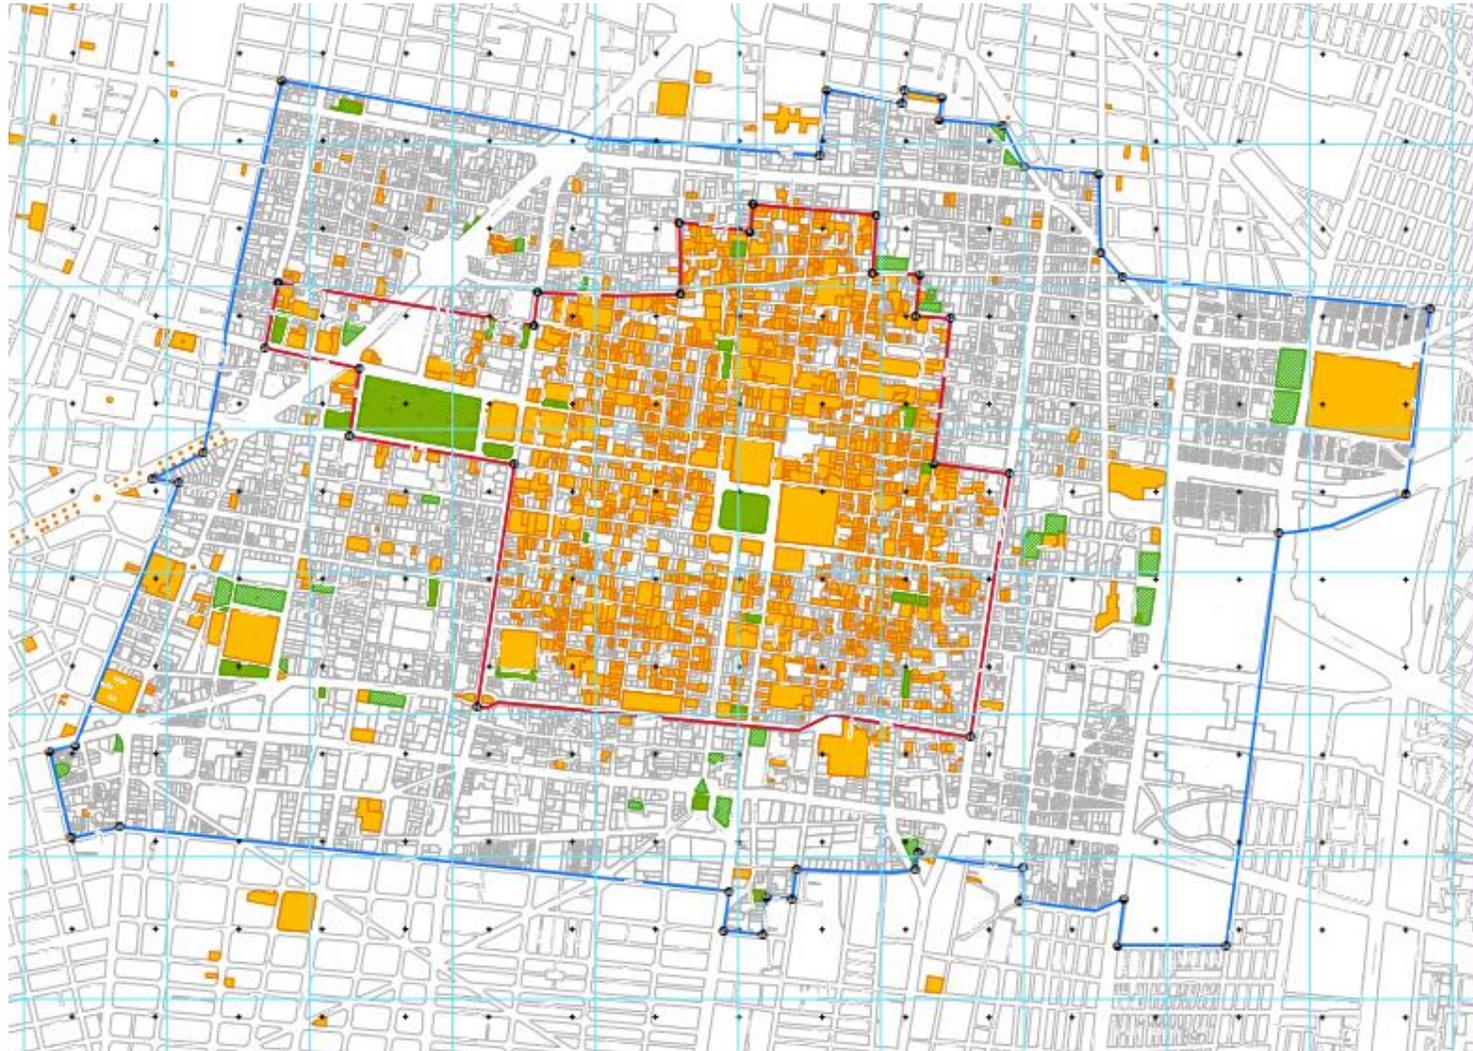



PROSOC | Obras RIPUH Centro Histórico

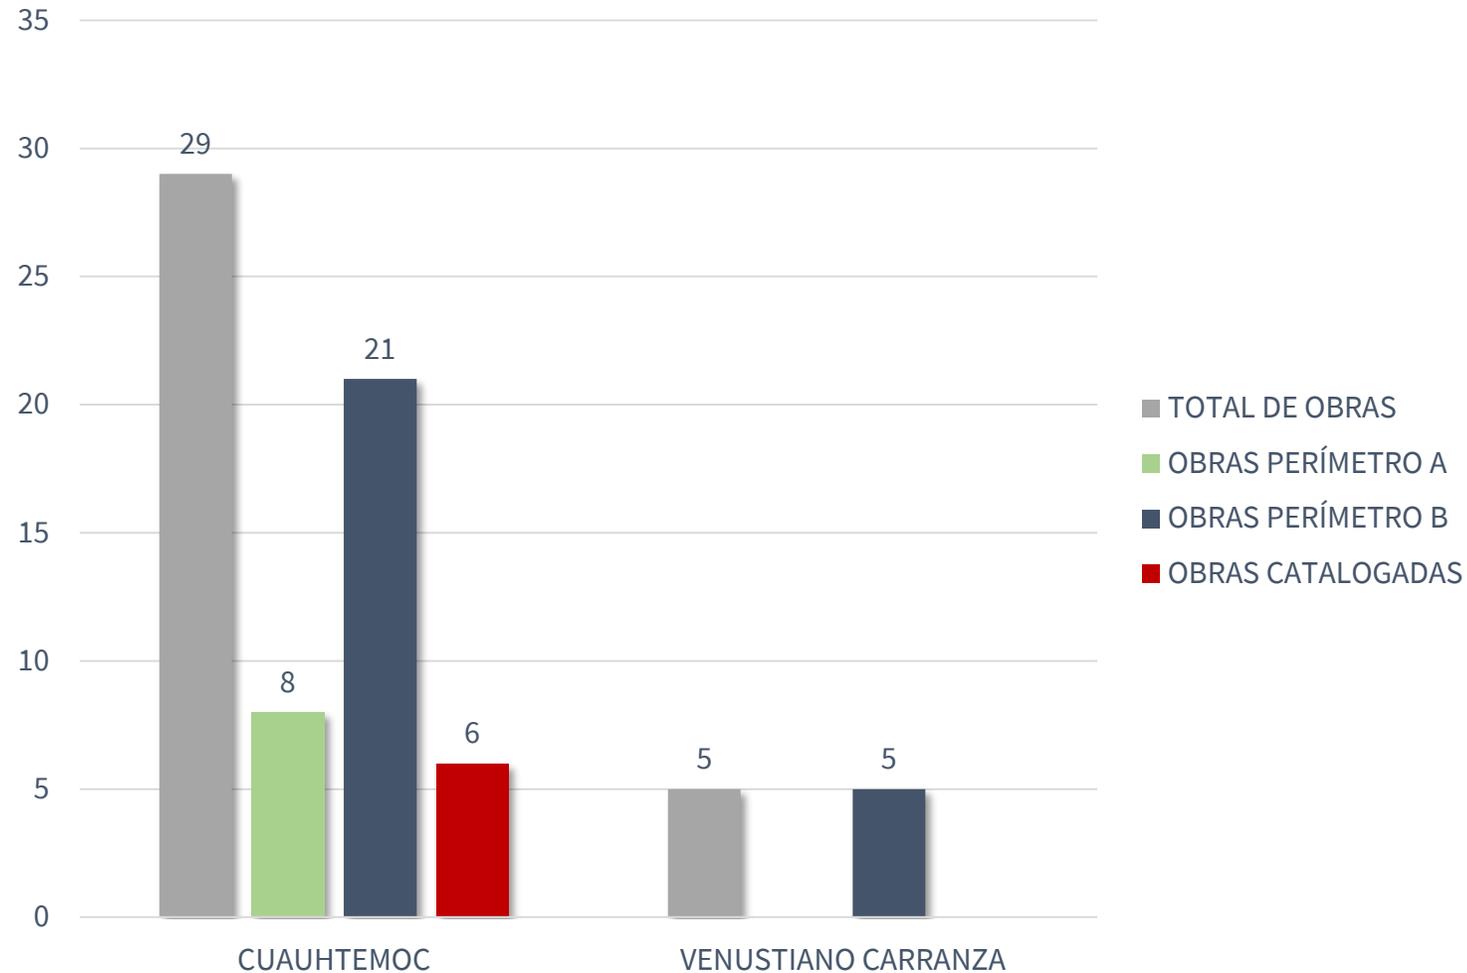



PROSOC | Obras RIPUH Centro Histórico

ALCALDÍA	TOTAL DE OBRAS	OBRAS PERÍMETRO A	OBRAS PERÍMETRO B	OBRAS CATALOGADAS
CUAUHTEMOC	29	8	21	6
VENUSTIANO CARRANZA	5	0	5	0
SUMA	34	8	26	6




PROSOC | Unidades catalogadas en Centro Histórico

NO.	FOLIO	NOMBRE DE LA U.H.	ALCALDIA	DIRECCION	PROYECTO GANADOR	PERIMETRO	CATASTRO CENTRO HISTÓRICO
1	RIPUH-CUAU-19-003	REPUBLICA DE CHILE 47	CUAUHTEMOC	REPUBLICA DE CHILE No. 47, COLONIA CENTRO, C.P. 06010, ALCALDIA CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	A	CATALOGADO
2	RIPUH-CUAU-19-035	MISIONEROS 9	CUAUHTEMOC	MISIONEROS No. 9, COLONIA CENTRO, C.P. 06090, ALCALDIA CUAUHTEMOC	ALBAÑILERIA	A	CATALOGADO
3	RIPUH-CUAU-19-129	REPUBLICA DEL SALVADOR 206	CUAUHTEMOC	REPUBLICA DEL SALVADOR No. 206, COLONIA CENTRO, C.P. 06060, ALCALDIA CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA SANITARIA	A	CATALOGADO
4	RIPUH-CUAU-19-146	REPUBLICA DE PERU 32	CUAUHTEMOC	REPUBLICA DE PERU No. 32, COLONIA CENTRO, C.P. 06010, ALCALDIA CUAUHTEMOC	IMPERMEABILIZACION	A	CATALOGADO
5	RIPUH-CUAU-19-147	LAZARIN DEL TORO 26	CUAUHTEMOC	MARIANA DEL TORO DE LAZARIN No. 26, COLONIA CENTRO, C.P. 06010, ALCALDIA CUAUHTEMOC	HERRERIA	A	CATALOGADO
6	RIPUH-CUAU-19-170	ALDACO 8	CUAUHTEMOC	ALDACO No. 8, COLONIA CENTRO, C.P. 06080, ALCALDIA CUAUHTEMOC	IMPERMEABILIZACION	A	CATALOGADO



PROSOC | Conceptos de obra a trabajar

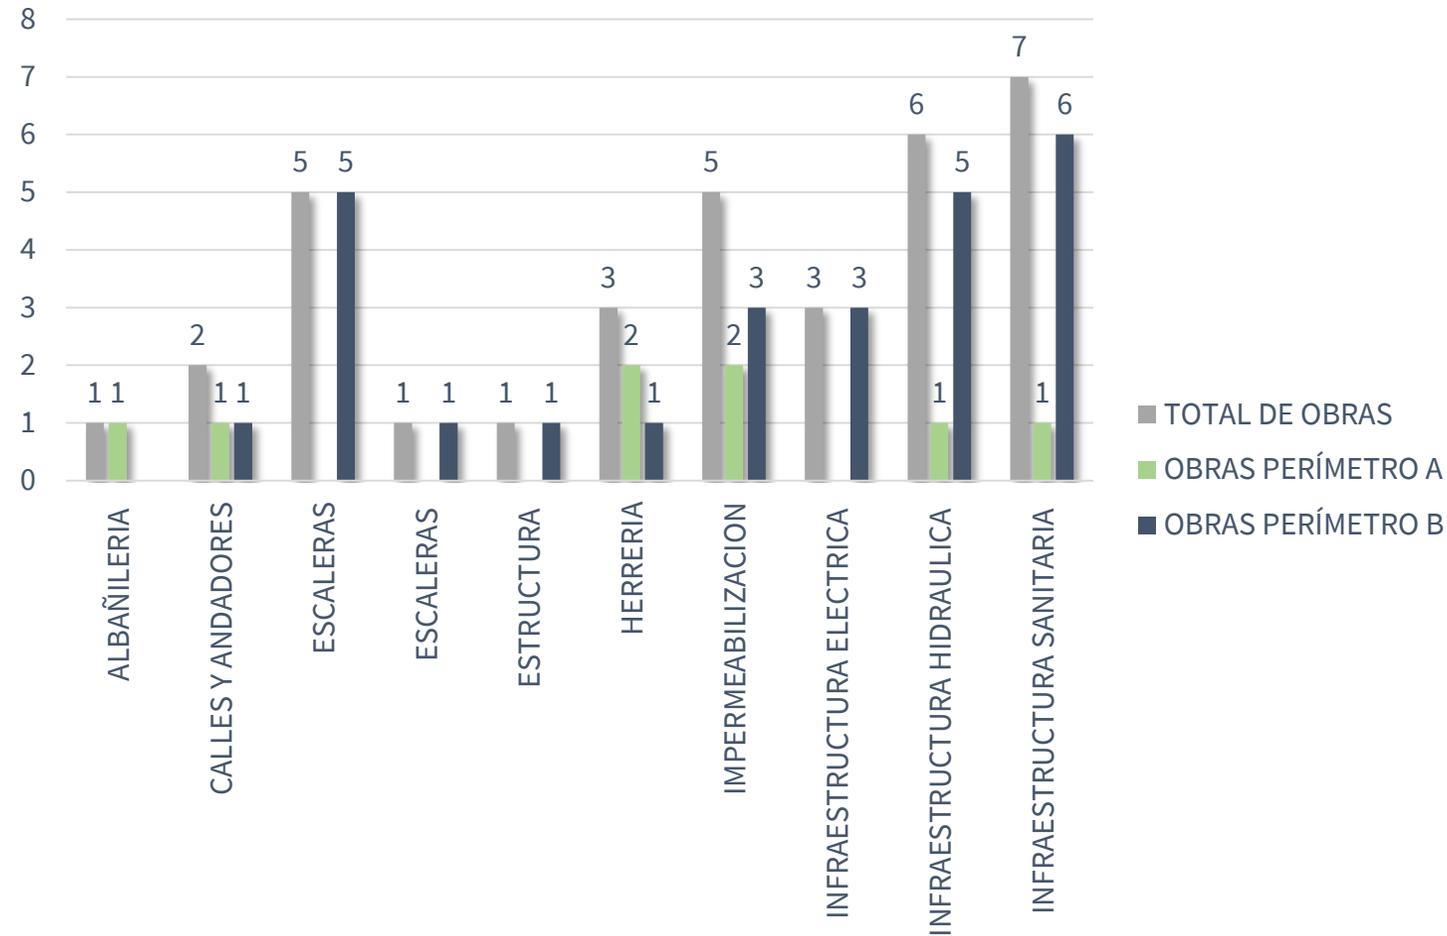



PROSOC | Conceptos a trabajar

CONCEPTO	TOTAL DE OBRAS	OBRAS PERÍMETRO A	OBRAS PERÍMETRO B
ALBAÑILERIA	1	1	0
CALLES Y ANDADORES	2	1	1
ESCALERAS	6	0	6
ESTRUCTURA	1	0	1
HERRERIA	3	2	1
IMPERMEABILIZACION	5	2	3
INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	3	0	3
INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	6	1	5
INFRAESTRUCTURA SANITARIA	7	1	6
Total general	34	8	26



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
CULTURA
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

PROSOC | Obras RIPUH Centro Histórico





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



CENTRO
HISTÓRICO




MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

PROSOC | Listado de conceptos

CONCEPTO	COLOR
Infraestructura Sanitaria	Rojo
Infraestructura Hidráulica	Azul
Infraestructura Eléctrica	Amarillo
Impermeabilización y Pintura	Verde
Herrería	Blanco
Escaleras	Rosa
Albañilería, Calles y Andadores	Morado



PROSOC | Relación de Perímetro - Avance de Obra

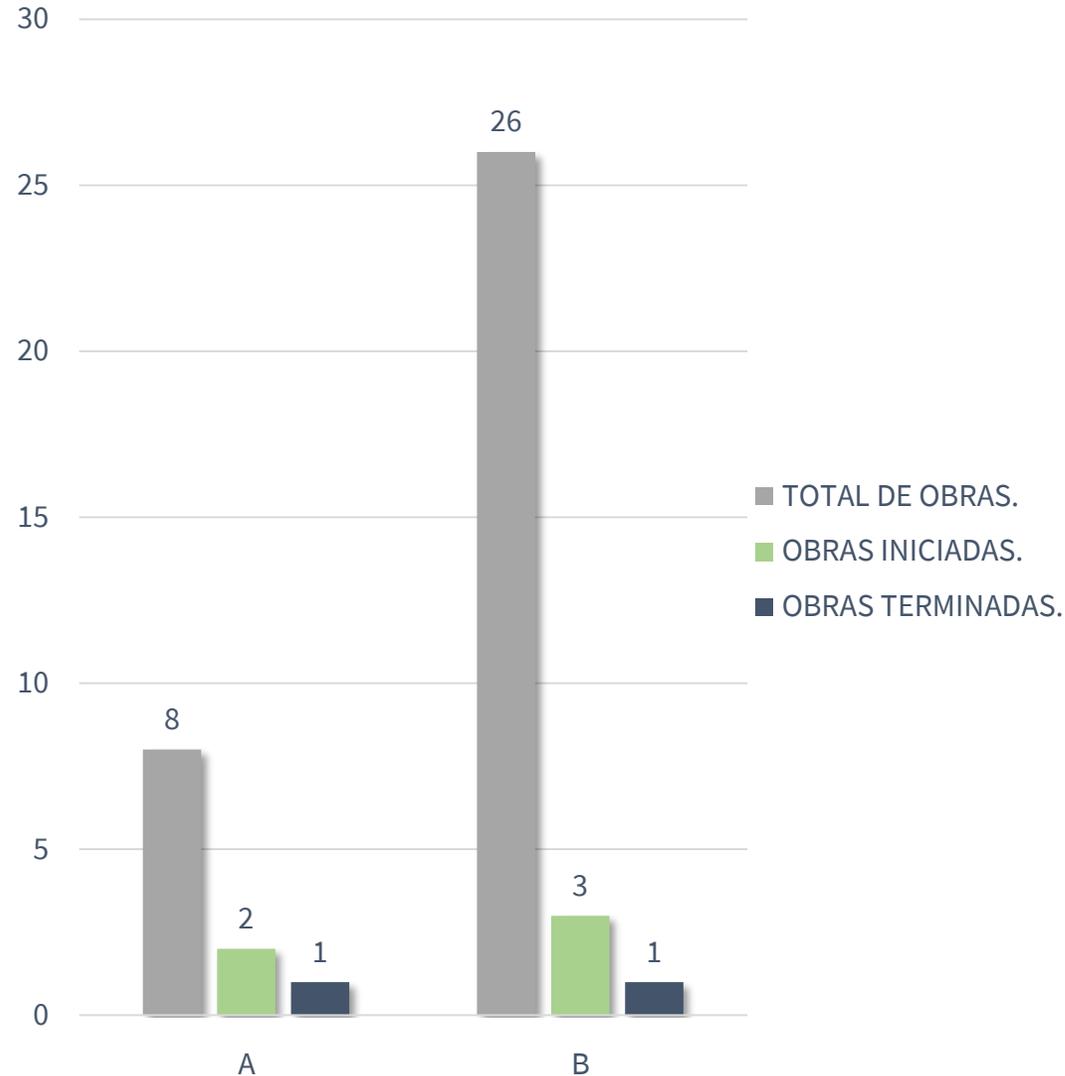



PROSOC | Avance de obra Centro Histórico

NO.	FOLIO	NOMBRE DE LA U.H.	ALCALDIA	DIRECCION	PROYECTO GANADOR	PORCENTAJE DE AVANCE	PERIMETRO	CATASTRO CENTRO HISTÓRICO
1	RIPUH-CUAU-19-005	TIZAPAN 8	CUAUHTEMOC	TIZAPAN No. 8, COLONIA CENTRO, C.P. 06080, ALCALDIA CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA SANITARIA	100%	B	NO CATALOGADO
2	RIPUH-CUAU-19-035	MISIONEROS 9	CUAUHTEMOC	MISIONEROS No. 9, COLONIA CENTRO, C.P. 06090, ALCALDIA CUAUHTEMOC	ALBAÑILERIA	100%	A	CATALOGADO




GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
CULTURA
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

PROSOC | U.H. Misioneros 9

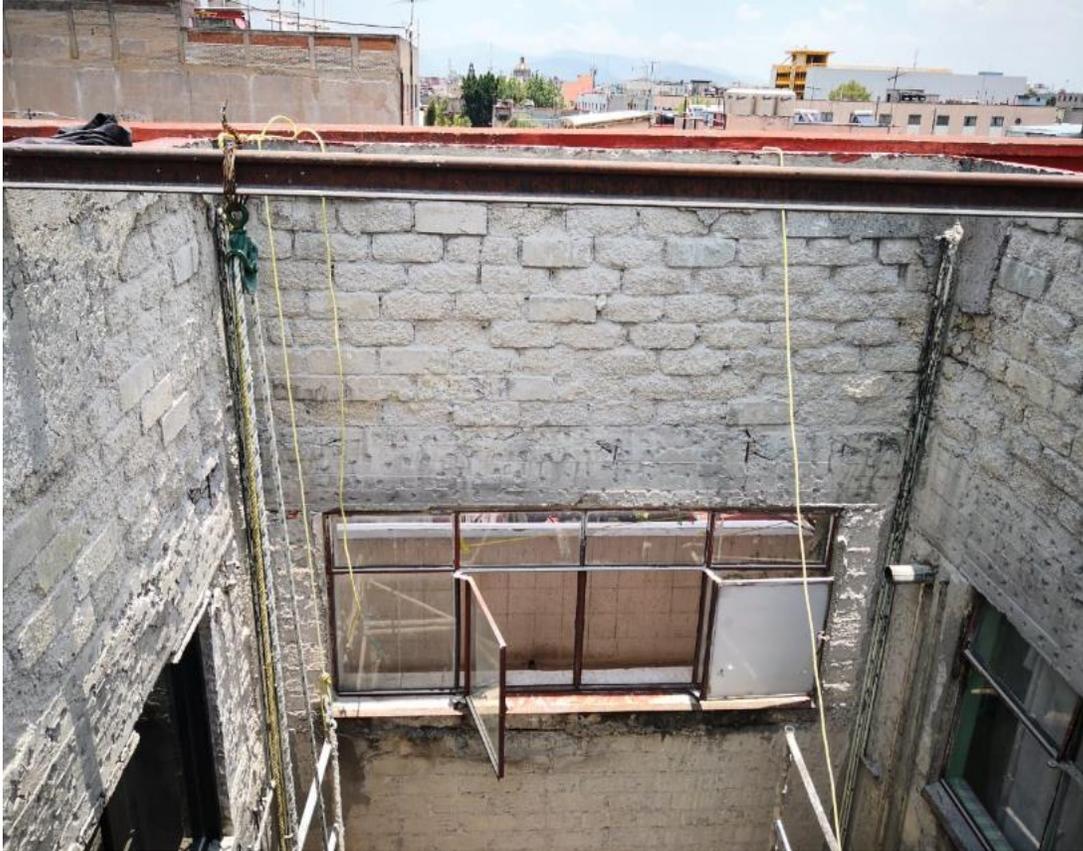



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

PROSOC | U.H. Misioneros 9






GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
CULTURA
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

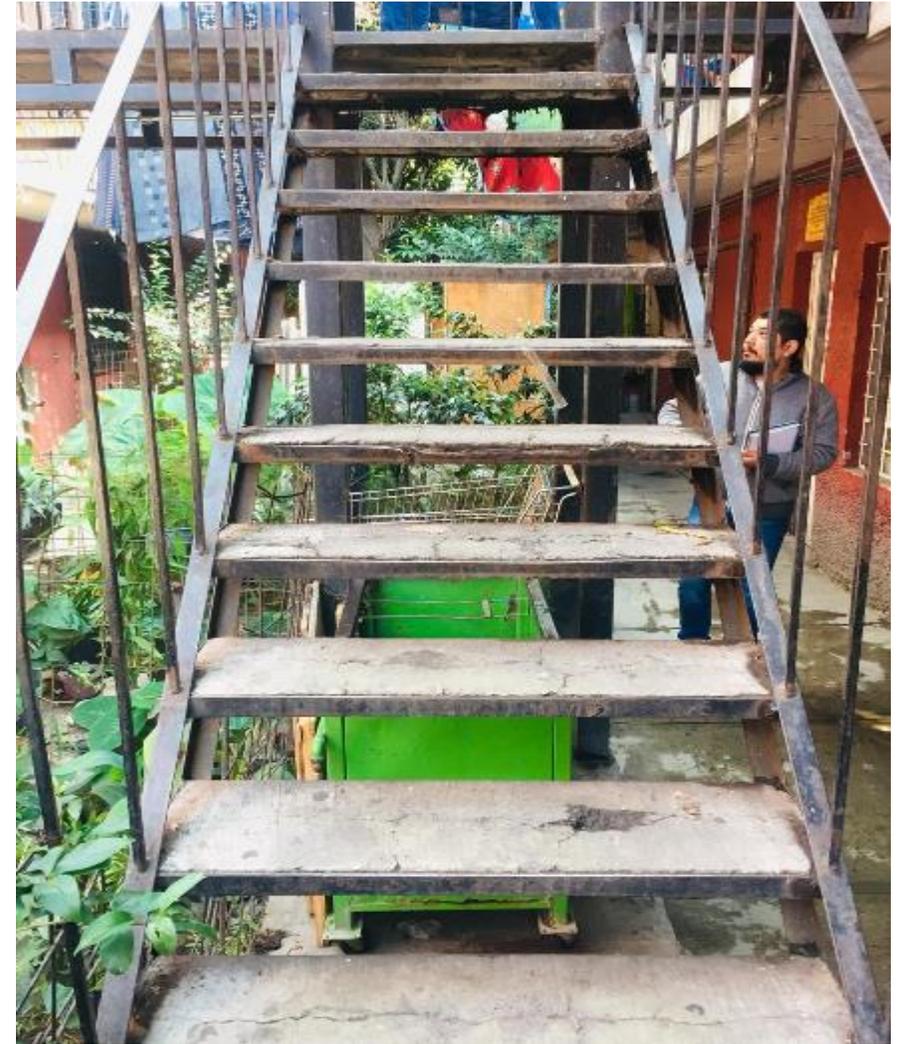




GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
CULTURA
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

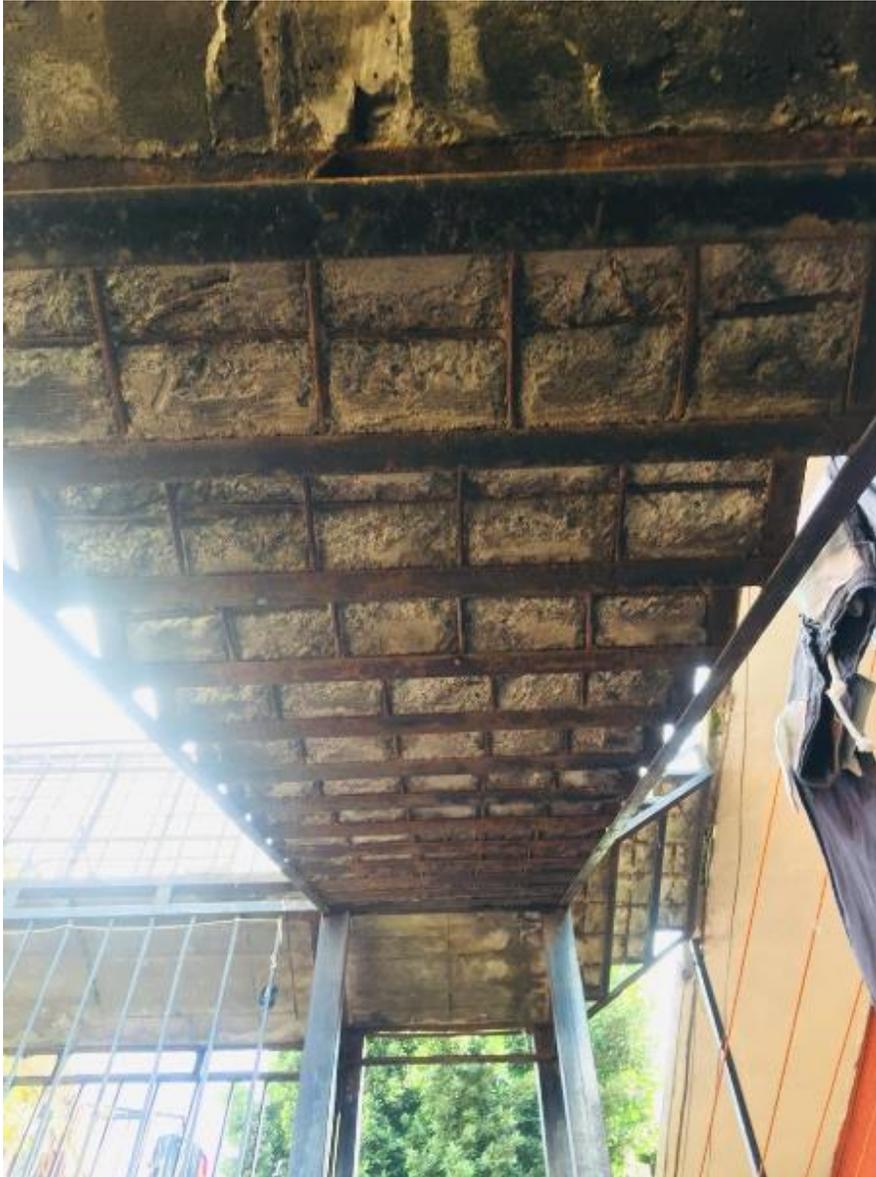



PROSOC | Problemáticas

- INSEGURIDAD
- DIFICULTAD DE ACCESO POR COMERCIO
- HORARIOS NOCTURNOS PARA EJECUCIÓN DE OBRAS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
CULTURA
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

PROSOC | U.H. José Joaquín Herrera 2-4





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
CULTURA
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

PROSOC | U.H. Circunvalación 40





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
CULTURA
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

PROSOC | U.H. Eje Central Lázaro Cárdenas 17






GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

PROSOC | U.H. Nopal

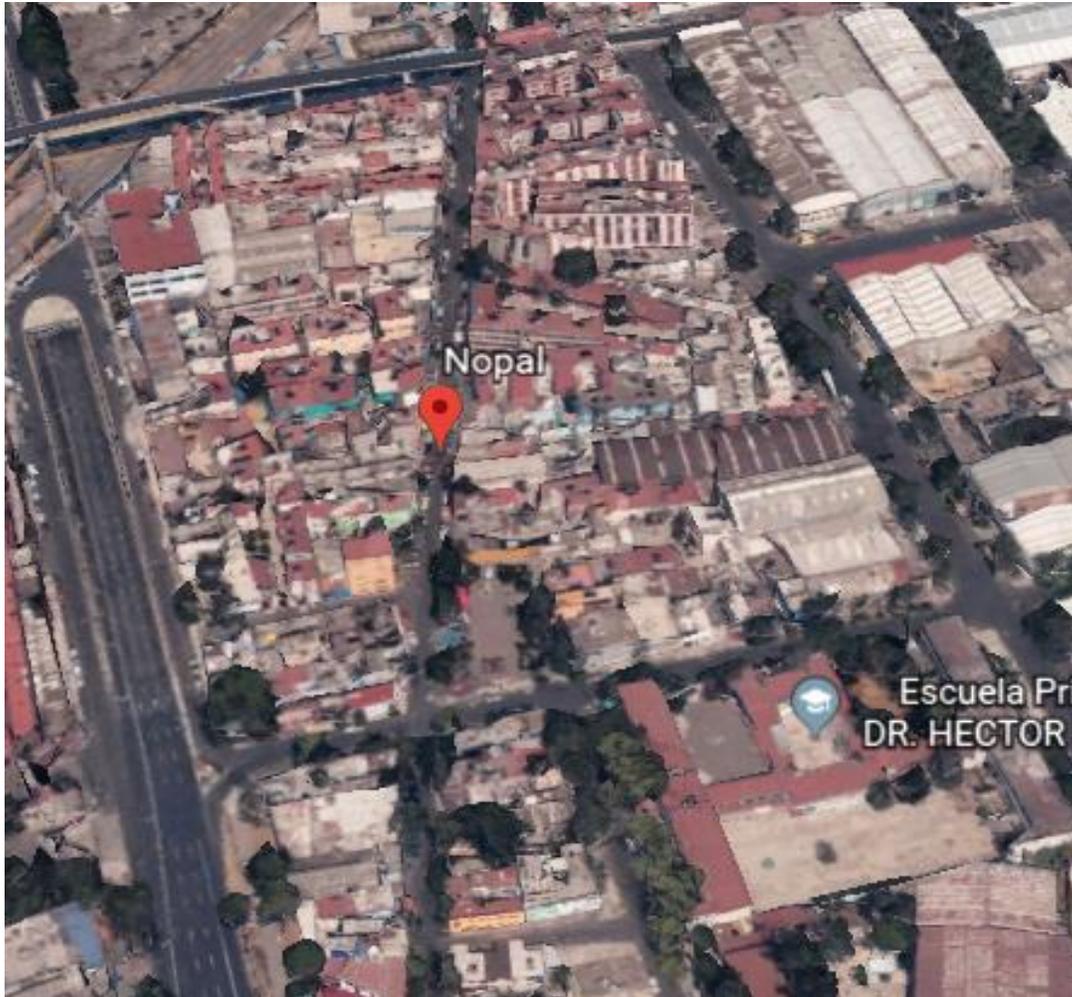



PGJ

Tema	Línea base	Periodicidad	Semana al 09/09	Próximo reporte
Infraestructura	Número de delitos en robo de medidor	Semanal	1	18 de septiembre
	Incidencia delictiva en robos de herrería		1	

No. Carpeta de investigación	Fecha y hora	Delito	Calle	Colonia	Síntesis de los hechos
CI-FCH/CUH-4/UI-3SD/1144/09-2019	06/09/2019 9 10:34	Robo de objetos	Manuel Doblado	Centro de la Ciudad de México Área 3	Manifiesta denunciante que sustrajeron el medidor de agua de su domicilio, sin percatarse de quién lo sustrajo.
CI-FCH/CUH-2/UI-1CD/6389/09-2019	02/09/2019 9 03:06	Robo de objetos		Centro de la Ciudad de México Área 1	Policía remitente pone a disposición al imputado, mismo que es señalado como el que desprendía molduras de la puerta principal de un edificio de la SEP (edificio Sede de la Secretaría de Educación Pública)



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
CULTURA
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Orden del día

Reportes

Turnos e incidencias urbanas



Matriz de seguimiento a turnos compilado



Dependencia	Atendido	Proceso	Total general
ACH	25		25
ADIP	1		1
Al. Cuauhtémoc	10	1	11
Al. Venustiano Carranza	3		3
AL.Venustiano Carranza	1		1
C5	5		5
CFE	5		5
ILIFE		1	1
INAH	3		3
Metrobús	1		1
PGJ	2		2
SACMEX	3	2	5
SEDEMA	4		4
SGIRyPC	1	1	2
SOS-AP	3		3
SOS-DGOIV	3		3
SOS-DGSUS	2		2
SSC	8		8
STC-METRO	1		1
TELMEX	2		2
Telmex	1		1
Tránsito	4		4
Total general	88	5	93



TURNOS ATENDIDOS

Del 03 al 09 de septiembre



FECHA DE REPORTE	SOLICITANTE	SOLICITUD	ATIENDE	ESTATUS	FECHA DE ATENCIÓN	OBSERVACIONES
03/09/2019	ACH	Atienda incidencias, sobre todo en las zonas de afluencia al Zócalo para que no representen riesgo para las personas que acuden a los festejos del 15 de Septiembre	CFE	Atendido	03/09/2019	No se detectaron incidencias
03/09/2019	ACH	Atienda incidencias, sobre todo en las zonas de afluencia al Zócalo para que no representen riesgo para las personas que acuden a los festejos del 15 de Septiembre	TELMEX	Atendido	05/09/2019	Se atendió incidencia en Rep. de Brasil y Tacuba
03/09/2019	ACH	Atienda incidencias, sobre todo en las zonas de afluencia al Zócalo para que no representen riesgo para las personas que acuden a los festejos del 15 de Septiembre	SOS-DGOIV	Atendido	09/09/2019	Se atendieron 2 incidencias de bacheo



TURNOS EN PROCESO

Del 03 al 09 de septiembre



FECHA DE REPORTE	SOLICITANTE	SOLICITUD	ATIENDE	ESTATUS	FECHA DE ATENCIÓN	OBSERVACIONES
03/09/2019	Al. Cuauhtémoc	Solicitud de retiro de cascajo en República de Panamá, en la escuela Lic. José Ismael Fuentes Malagón	ILIFE	Proceso	11/09/2019	Programado el retiro de escombros para hoy a las 8:00 pm
03/09/2019	ACH	Atienda incidencias, sobre todo en las zonas de afluencia al Zócalo para que no representen riesgo para las personas que acuden a los festejos del 15 de Septiembre	SACMEX	Proceso		



Matriz de seguimiento a incidencias



Dependencia	Atendido	Pendiente	Proceso	Total general
ACH	37	32	3	72
Al. Cuauhtémoc	17	15	3	35
Al. Venustiano Carranza	4			4
C-5	2			2
CFE	74	39	11	124
CUS		1		1
IUSACELL		2		2
MCM TELECOM		1		1
SACMEX	68	23	4	95
SEDEMA			2	2
SGIRyPC	1			1
SOS-AP	60	7		67
SOS-DGOIV	4	24		28
SOS-DGOP		1		1
SOS-DGSUS		6		6
STC-METRO	3			3
TELMEX	35		1	36
TOTAL PLAY			1	1
Tránsito	21		1	22
Total general	326	151	26	503



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO




MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Atención chats VIPPSC Incidencias Urbanas

Del 03 al 09 de septiembre

5

Incidencias



1

**Incidencia
urbana
atendida**

TELMEX: 1

4

**Incidencias
urbanas
pendientes**

SACMEX: 4



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO

INCIDENCIAS ATENDIDAS

Del 03 al 09 de septiembre



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

FECHA DE REPORTE	IDENTIFICA	SOLICITUD	UBICACIÓN	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS	FECHA DE ATENCIÓN	OBSERVACIONES
03/09/2019	ACH	Tapa dañada	TACUBA			TELMEX	Atendido	05/09/2019	
03/09/2019	SSC-SCT-DSOT (Tránsito)	Coladera dañada sobre carpeta asfáltica	TOPACIO			SACMEX	Atendido	04/09/2019	
04/09/2019	VIPP 2 Callejón del 57 Plaza de la Concepción	Tapa dañada sobre carpeta asfáltica	REPÚBLICA DE PERÚ			TELMEX	Atendido	04/09/2019	

INCIDENCIAS ATENDIDAS

Del 03 al 09 de septiembre



FECHA DE REPORTE	IDENTIFICA	SOLICITUD	UBICACIÓN	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS	FECHA DE ATENCIÓN	OBSERVACIONES
05/09/2019	ACH	Tapa dañada sobre carpeta asfáltica	REPÚBLICA DE GUATEMALA			CFE	Atendido		
06/09/2019	ACH	Tapa de boveda levantada	REPÚBLICA DE GUATEMALA			CFE	Atendido	06/09/2019	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO

INCIDENCIAS PENDIENTES

Del 03 al 09 de septiembre



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

FECHA DE REPORTE	IDENTIFICA	SOLICITUD	UBICACIÓN	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS	FECHA DE ATENCIÓN	OBSERVACIONES
03/09/2019	Comité de Instalaciones Subterráneas	Falta tapa de bóveda de CFE	REPÚBLICA DE ECUADOR			CFE	Pendiente		
04/09/2019	ACH	Rejilla en mal estado	CORREGIDORA			SACMEX	Pendiente		
04/09/2019	ACH	Pieza faltante en pavimento	CORREGIDORA			ACH	Pendiente		

INCIDENCIAS PENDIENTES

Del 03 al 09 de septiembre



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

FECHA DE REPORTE	IDENTIFICA	SOLICITUD	UBICACIÓN	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS	FECHA DE ATENCIÓN	OBSERVACIONES
04/09/2019	VIPP 1 Santa María la Redonda	Falta de agua potable	HIDALGO			SACMEX	Pendiente		
04/09/2019	VIPP 1 Santa María la Redonda	Falta de agua potable	HIDALGO			SACMEX	Pendiente		
05/09/2019	ACH	Falta tapa de boveda	REPÚBLICA DE CHILE			CFE	Pendiente		
07/09/2019	VIPP 1 Santa María la Redonda	Solicitud de pipa de agua por falta de agua	2 DE ABRIL			SACMEX	Pendiente		Se estaban realizando conexiones de la red de agua potable
07/09/2019	VIPP 1 Santa María la Redonda	Solicitud de pipa de agua por falta de agua	MINA			SACMEX	Pendiente		Se estaban realizando conexiones de la red de agua potable



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

PRÓXIMA SESIÓN
Miércoles 18 de septiembre
A las 10:30 horas
